



Exp. SIAF  
N° 2003

c/p - 5919 - 5920 - 5921  
5922

# ORDEN DE SERVICIO

NUMERO:	
000881	
DE FECHA:	04/11/2020

Señor(es)	<b>CORPORACION SORIANO L &amp; C SAC</b>	RUC N°	<b>20600813715</b>
Dirección	MZA. T LOTE 17 URB SAN ANDRES 5TA VISTOR LARCO HERRERA -TRUJILLO-LA LIBERTAD		
Referencia N°	CONTRATO DE SERVICIOS N° 017-2020-MPSCH-LOG		
Condiciones de Pago :	CCI	OFICINA	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA---IVP
Objeto del Servicio :	EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO SANTA ROSA-SANTA CRUZ DE CHUCA--LLATURPAMBA--LONG 8970 KM CUSHIPPE-ALGALLAMA-EMP PE -3N LA CRUZ LONG6.300KM DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHUCO-LA LIBERTAD.		
Destino a	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO	Pedido N° :	000881

LOS SIGUIENTES SERVICIOS :			VALOR	
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
		<b>PAGO DE VALORIZACION N° 02</b> DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO SANTA ROSA-SANTA CRUZ DE CHUCA--LLATURPAMBA--LONG 8970 KM CUSHIPE-ALGALLAMA-EMP PE -3N LA CRUZ LONG6.300KM DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHUCO-LA LIBERTAD. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.  SEGÚN: INFORME N° 233-2020-IVP-MPSCH/GG/VRRK INFORME N° 1170-2020-MPSCH/DIST/SGI <u>PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 09-2020-MPSCH/CS</u>		S/. 256,672.96
			<b>TOTAL S/.</b>	<b>256,672.96</b>

AFECTACION PRESUPUESTAL DEL SERVICIO			DISTRIBUCION CONTABLE
ACTIVIDAD/PROYECTO:	META	CLASIFICADOR:	CUENTAS POR PAGAR
0138-PROMOCION IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA	0188-MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL	23.27.16	

AUTORIZACION DEL SERVICIO		ÁREA USUARIA:		
 Lic. Yamir J. Rodríguez Marquina JEFE DE LOGISTICA	 Abog. John Jairo Curay Reye ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIA	MES	AÑO
		27	11	2020
UNIDAD DE LOGISTICA	ADMINISTRACION y/o GERENCIA	 Ing. David Ivan Silva Torres SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA FIRMA		

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**PROVEIDO**  
 PASE a: contabilidad  
 PARA: Davengale  
 FECHA: 30/11/20 Firmc:

GT 65,000  
Debit 30,801  
160,871 96

**CORPORACION SORIANO L & C S.A.C.**  
 MZA. T LOTE. 17 URB. URB.SAN ANDRES 5TA  
 VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20600813715**  
**E001-47**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **30/11/2020**  
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD PROVINC  
 SANTIAGO DE CHUCO**  
 RUC : **20187630101**  
 Establecimiento del Emisor : **URB. URB.SAN ANDRES 5TA  
 MZA. T LOTE. 17 LA LIBERTAD-  
 TRUJILLO-VICTOR LARCO  
 HERRERA**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA LLATURPAMPA LONG 8.970 KM, CUSHIPE ALGALLAMA EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG 6.300 KM, EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA	217519.46	0.00

Valor de Venta de Operaciones :   
 Gratuitas :

**SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS Y 96/100 SOLES**

Sub Total :	S/ 217,519.46
Ventas :	S/ 0.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 217,519.46
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 39,153.50
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 256,672.96

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

PEC : 09

**CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO**  
**NOTA N° 000GG0491**  
**(EN SOLES)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  
PROVINCIA : 10 SANTIAGO DE CHUCO  
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO [301197]

MES : JULIO  
FECHA DE DOCUMENTO : 07/07/2020  
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM  
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION. PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA; SANTIAGO DE CHUCO - L.L, EN EL MARCO DEL D.U 070-2020 - ART. 21.1 (ANEXO 13)

FECHA APROBACION : 07/07/20  
ESTADO CERTIFICACION : PROBADO

N° DE DOCUMENTO F01-376-2020-LOG

**DETALLE DEL GASTO**

SECUENCIA	PRG	PRODI	PRY	ACT	IOBR	FN.	DIVF	GRPF	MONTA	
META	FF	RB	CGTT	G	SG	SGD	ESF	ESPSD		
0001	INICIAL									
0138	3000133	5006373	15	033	0066				PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	010,100.00
0208									MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA; SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	645,100.00
3	19								RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	645,100.00
5									GASTOS CORRIENTES	645,100.00
2.3									BIENES Y SERVICIOS	645,100.00
2.3.2									CONTRATACION DE SERVICIOS	645,100.00
2.3.2.4									SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	645,100.00
2.3.2.4.3									DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	645,100.00
2.3.2.4.3.1									DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	645,100.00
2.3.2.7									SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0,000.00
2.3.2.7.1									SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	0,000.00
2.3.2.7.1.6									ESTUDIOS	0,000.00
<b>TOTAL</b>									<b>645,100.00</b>	
<b>TOTAL CERTIFICACION</b>									<b>645,100.00</b>	
<b>TOTAL NOTA</b>									<b>645,100.00</b>	

TR : 18

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
SANTIAGO DE CHUCO

*CPE. Natividad Z. Pereda Sánchez*  
CFC. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Presupuesto y Planificación  
Sello Y Firma

**CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO**  
**NOTA N° 0000000492**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  
PROVINCIA : 10 SANTIAGO DE CHUCO  
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO [301197]

MES : JULIO  
FECHA DE DOCUMENTO : 07/07/2020  
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM  
N° DE DOCUMENTO F01-377-2020-LOG

FECHA APROBACION : 07/07/2020  
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION. PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CUSHIPE - ALGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ); SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD  
CHUCO - L.L, EN EL MARCO DEL D.U 070-2020 - ART. 21.1 (ANEXO 13)

**DETALLE DEL GASTO**

SECUENCIA	PRG	PROD	PRY	ACT	AI	OBR	FN.	DIV	GRPF	MONT	
META	FF	RB	CGTT	G	SG	SGD	ESF	ESF	ESPD		
0001										INICIAL	
0138	3000133	5006373	15	033	0066					PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	453,839.00
0209										MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CUSHIPE - ALGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ); SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	453,839.00
3										19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	453,839.00
5										GASTOS CORRIENTES	453,839.00
2.3										BIENES Y SERVICIOS	453,839.00
2.3.2										CONTRATACION DE SERVICIOS	453,839.00
2.3.2.4										SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	447,539.00
2.3.2.4.3										DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	447,539.00
2.3.2.4.3.1										DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	447,539.00
2.3.2.7										SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	66,300.00
2.3.2.7.1										SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	66,300.00
2.3.2.7.1.6										ESTUDIOS	66,300.00
<b>TOTAL</b>										453,839.00	
<b>TOTAL CERTIFICACION</b>										453,839.00	
<b>TOTAL NOTA</b>										453,839.00	

TR : 18

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
C.P.C. Natividad Z. Rosales Macha  
D.F.C. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Presupuesto y Planificación  
Sello Y Firma

"Año de la universalización de la salud"

**INFORME N° 233-2020-IVP-MPSCH/GG/VRK**

**A** : Dr. JOHN JAIRÓ CURAY REYES.  
Director de administración y Finanzas de la MPSCH

**DE** : ING. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza  
Gerente del Instituto Vial Provincial de Santiago de Chuco

**ASUNTO** : APROBACIÓN DE CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N° 02 DEL  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS  
CAMINOS VECINALES TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA  
- LLATURPAMBA, LONG. 8.970 KM, CUSHIPE - ALGALLAMA - EMP. PE-  
3N (LA CRUZ) LONG. 6.300 KM.

**REFERENCIA** : Informe N° 134-2020-JO/IVP/SCH/LFGCH  
INFORME N° 017-2020-IVP-MPSCH/TACSMRP/NBP  
Informe N° 1170-2020-MPSCH/DST/SGI  
CARTA N° 004-2020-VRA-IO/MPSCH  
Informe N° 004-2020VARA/INSP  
CARTA N° 004-2020/CONSORCIO VIAL SANTA ROSA/RL/EGD  
CONTRATO N° 017-2020-MPSCH-LOG  
DU. N° 070-2020

**FECHA** : Santiago de Chuco, 27 de Noviembre del 2020

Previo cordial saludo y afecto, por medio del presente tengo a bien manifestarle con respecto al asunto de la referencia lo siguiente:

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

**INFORMACIÓN TÉCNICA:**

Ejecución de Servicio : **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS  
CAMINOS VECINALES TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA -  
LLATURPAMBA, LONG. 8.970 KM, CUSHIPE - ALGALLAMA - EMP. PE-3N  
(LA CRUZ) LONG. 6.300 KM.**

Longitud : 15.27 Km.  
Superficie de Rodadura : Afirmado.  
Espesor de Afirmado : 0.15 m.  
Velocidad Directriz : 30 km/h.  
Perfilado de Cunetas : Terreno natural  
Hitos Kilométricos : 17 unidades



**UBICACIÓN**

Distrito : Santiago de Chuco  
Provincia : Santiago de Chuco  
Región : La Libertad

**RESPONSABLES DEL SERVICIO**

**EJECUTOR:**

Fuente de financiamiento : Recursos por operaciones oficios de crédito  
Modalidad Contratación : a Suma Alzada  
Contrato de Servicio : CONTRATO N° 017-2020-MPSCH-LOG  
Contratista : CONSORCIO VIAL SANTA ROSA



Monto Referencial del Servicio : S/. 1, 301,584.26 inc el IGV.  
 Monto del Contrato de Servicio : S/. 1,300,000.00 inc el IGV  
 Plazo de Ejecución mantenimiento Periódico : 120 DIAS CALENDARIOS  
 Inicio Plazo de Servicio Contractual : 22-09-2020  
 Fecha Terminó de Servicio Contractual : 31-12-2020

**INSPECTOR**

INSPECTOR : ING. VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
 Contrato De Servicio : N° 029-2020-MPSCH-LOG

**2. DE LA PRESENTACIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE DEL SERVICIO N° 01-SETIEMBRE 2020**

Mediante Carta N° 003-2020-CRA-IO/MPSCH, del Inspector de Servicio, recepcionada por mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, el día 05/11/2020, el ING. VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA, hace llegar a la Municipalidad la Valorización N° 02 del por los trabajos ejecutados en el periodo comprendido entre el 01/10/2020 hasta el 31/10/2020, del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA, LONG. 8.970 KM, CUSHIPE - ALGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG. 6.300 KM, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD


**3. ANÁLISIS DEL IVP.**

Para la ejecución del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA, LONG. 8.970 KM, CUSHIPE - ALGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG. 6.300 KM, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, en el proceso especial de selección N° 09-2020-MPSCH/CS-Segunda convocatoria, la empresa contratista CONSORCIO SANTA ROSA, ha sido favorecida con la buena pro, por su monto ofertado de S/. 1, 300,000.00 inc. IGV que a continuación se detalla:

- A) Elaboración del Plan de Trabajo la suma de S/. 13,000.00 inc. IGV, que se desarrollara exclusivamente para tal fase.
- B) Ejecución del mantenimiento Periódico la suma de 1, 079,000.00, inc. IGV, que se desarrollara exclusivamente en la fase de Ejecución del Mantenimiento Periódico.

**PRESUPUESTO OFERTADO**

Item	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
		METRADOS		COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
		Unidad	Cantidad		
<b>01</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	2.00	40,220.52	80,441.04
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	15.27	998.09	15,240.83
<b>02</b>	<b>PAVIMENTOS</b>				
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M.	m3	3,817.50	4.62	17,636.85
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M.	m3	11,452.50	32.06	367,167.15



<b>03</b>	<b>TRANSPORTE</b>				
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM.	m3k	11,835.00	6.96	82,323.00
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM.	m3k	49,559.76	0.86	42,434.47
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM.	m3k	6,945.00	6.94	48,185.80
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM.	m3k	13,820.71	0.85	11,810.16
<b>04</b>	<b>OBRAS DE ARTE Y DRENAJE</b>				
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	15,270.00	1.84	28,096.80
<b>05</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>				
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und	17.00	315.24	5,359.08
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	Und	32.00	389.22	12,455.04
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	Und	4.00	389.22	1,556.88
05.11	SEÑALES INFORMATIVAS	Und	5.00	468.3200	2,341.60
<b>06</b>	<b>IMPACTO AMBIENTAL</b>				
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	4.00	7,274.1400	29,096.56
<b>07</b>	<b>EMERGENCIA SANITARIA</b>				
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	2.00	25,495.53	50,991.06
	<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>CD</b>		<b>S/.</b>	<b>795,136.33</b>
	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>GG</b>	<b>10%</b>	<b>S/.</b>	<b>79,513.63</b>
	<b>UTILIDAD</b>	<b>U</b>	<b>5%</b>	<b>S/.</b>	<b>39,756.82</b>
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>CD+GG+U</b>	<b>S/.</b>	<b>914,406.78</b>
	<b>IGV</b>		<b>18%</b>	<b>S/.</b>	<b>164,593.22</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>PT</b>		<b>S/.</b>	<b>1,079,000.00</b>
	<b>PORCENTAJE</b>				<b>100.00%</b>

- C) Ejecución del Mantenimiento Rutinario, la suma de S/. 195,000.00, inc. IGV, que se desarrollara exclusivamente para tal fase.
- D) La Elaboración del Inventario de Condición Vial la Suma de S/. 13,000.00, inc. IGV, que se desarrollara exclusivamente para tal fase.

#### 4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL SERVICIO DURANTE EL MES

De acuerdo a la verificación de los trabajos referidos al "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA, LONG. 8.970 KM, CUSHIPE - ALGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG. 6.300 KM, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD", se ha observado que desde la fecha 01 de octubre hasta 31 de octubre del 2020, se desarrollaron las siguientes actividades:

#### 2.0 PAVIMENTOS.

2.01 CAPA NIVELANTE E=5 CM

2.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=15 CM.

#### 3.0 MANTENIMIENTO DE CALZADA EN AFIRMADO:

3.01 Transporte de material granular hasta 1 km

3.02 Transporte de material granular mayor a 1 km



- 3.03 Transporte de material excedente hasta 1 km.
- 3.04 Transporte de material excedente mayor a 1 km

4.0 Obras de arte y drenaje

4.01 Reconformación de cunetas

5.0 Emergencia sanitaria

5.01 emergencia sanitaria COVID 19

**NOTA: Toda esta información esta detallada en el informe del Ing. Inspector de Servicio mediante Informe N° 004-2020-VARA/INSP**





Instituto Vial Provincial



MPSCH

# Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y BURTADO DE LOS CAMINOS VEICIALES TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CINCHA - LLATERPAMBA, LONG. 8,370 KM., CISHIPE-ALGALLAMA - EM P. PESN (LA CRUZ) LONG. 8,300 KM., DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CINCHA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATO: N° 09/2020-MPSCH/03

INSPECTOR: ING. Vanessa Alajón Rodríguez Asteaga

CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ROSA

PRESEMP. OFERTADO (CD-CC-04) S/ ECV 91,403.78

PRESEMP. OFERTADO (CD-CC-04) MCV/ ECV 1079,000.00

FECHA DE PRESEMPUESTO 01/09/2020

PLAZO DE EJECUCIÓN 20 d.c. (04 meses)

FECHA DE MEDICIÓN Y TERMINO CONTRACTUAL 07/09/2020 - 31/02/2020



PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD

## VALORIZACION DE AVANCE DE SERVICIO N° 02, MANTENIMIENTO PERIODICO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020

FORMULA 01 : SERVICIO PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UNID	MONTO CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE VALORIZACION		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
			P.U.	METRADO	SOLES	%	METRADO	SOLES	%	METRADO	SOLES	METRADO
01	OBRAS PRELIMINARES											
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	gb	40,220.52	2.00	80,441.04	49.24%	0.00	0.00%	47,261.15	1.00	48.33%	48,261.15
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	988.09	15.27	15,240.83	50.00%	7.00	46.04%	6,988.63	7.00	50.00%	40,220.52
02	PAVIMENTOS											
02.01	CAPIA MINERLANTE E-0.06 M.	m3	4.62	3,817.50	17,036.86	29.35%	1,560.00	29.35%	112,308.00	1,560.00	40.60%	7,161.00
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M.	m3	32.06	17,622.50	367,167.15	89.87%	3,300.00	28.81%	105,768.00	3,300.00	28.81%	106,768.00
03	TRANSPORTE											
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM.	m3k	6.88	11,835.00	82,323.00	8.09%	3,300.00	28.32%	28,316.00	3,300.00	28.32%	8,536.00
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM.	m3k	0.86	69,569.78	42,434.47	27.89%	13,800.00	27.89%	11,835.00	13,800.00	27.89%	35,769.78
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM.	m3k	6.84	6,845.00	48,165.00	28.29%	1,940.00	28.29%	13,629.00	1,940.00	28.29%	5,005.00
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM.	m3k	0.85	13,820.71	11,810.18	27.54%	3,800.00	27.54%	3,262.00	3,800.00	27.54%	8,558.18
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE											
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	1.84	15,270.00	28,098.80	8.09%	6,200.00	40.80%	11,408.00	6,200.00	40.80%	16,868.80
04	SEÑALIZACION											
04.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und	315.24	17.00	5,359.08	0.89%	0.00	0.89%	0.00	0.00	0.89%	21,712.00
04.02	SENALES PREVENTIVAS	Und	389.22	32.00	12,455.04	0.89%	0.00	0.89%	0.00	0.00	0.89%	5,360.06
04.03	SENALES REGLAMENTARIAS	Und	389.22	4.00	1,556.88	0.89%	0.00	0.89%	0.00	0.00	0.89%	12,455.04
04.11	SENALES INFORMATIVAS	Und	468.3200	5.00	2,341.60	0.89%	0.00	0.89%	0.00	0.00	0.89%	1,556.88
04	IMPACTO AMBIENTAL											
04.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	hm	7,274.1400	4.00	29,098.56	0.89%	0.00	0.89%	0.00	0.00	0.89%	23,098.56
07	EMERGENCIA SANITARIA											
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	gb	25,485.53	2.00	50,971.06	25.00%	0.50	25.00%	12,742.77	1.00	25.00%	25,485.53
A-	COSTO DIRECTO				785,133.33				58,954.92			248,102.27
B-	GASTOS GENERALES				78,513.63				5,966.49			54,003.40
C-	UTILIDAD				3,758.22				2,867.75			27,301.71
D-	SUB TOTAL				914,405.18				68,589.16			627,558.17
E-	IGV				184,593.22				12,440.97			113,023.65
F-	TOTAL				1,099,000.00				81,335.22			740,581.22
G-	PORCENTAJE				100.00%				7.54%			68.67%



Jr. Paco Yunque N° 735 - Ciudad de Santiago de Chuco

e-mail: ivpstgodechuco@yahoo.com

El resumen de la valorización de Servicio N° 02 octubre 2020, para efectos de pago al contratista CONSORCIO VIAL SANTA ROSA, se ha determinado el importe de **SI. 256,672.96 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 96/100 SOLES), INC. EL IGV** cuyo detalle es el siguiente.

ENTIDAD: :M UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: : " MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINA RIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO-SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA --LLA TURPAMBA, LONG. 8.970 KM., CUSHPE-ALGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG. 6.300 KM., DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO--LA LIBERTAD"

CONTRATO : N°07-2020-M PSCH/LOG  
INSPECTOR : ING. Vanessa Abigail Rodríguez Artoaga  
CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ROSA



*Instituto Vial Provincial*  
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD



**RESUMEN GENERAL VALORIZACION N° 02-OCTUBRE MANTENIMIENTO PERIODICO**

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO	VALORIZACION				% AVANCE
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUM.	SALDO	
<b>1.- VALORIZACION CONTRACTUAL</b>						
Valorización No. 02	914,406.78	-	217,519.46	217,519.46	696,887.32	23.79%
	914,406.78	0.00	217,519.46	217,519.46	696,887.32	23.79%
Avance Ejecutado		0.000%	23.788%	23.788%		
Avance Programado		0.000%	4.681%	4.681%		
<b>2.- REAJUSTES</b>						
Reajuste de la Valorización No. 02		-	-	-		
Regularización Reajuste Valorización anteriores		-	-	-		
Retención por atraso de Obra		-	-	-		
*El reajuste no se aplica según CGC 47.1		0.00	0.00	0.00		
<b>A.- VALORIZACION BRUTA (sin IGV) (1+2)</b>		0.00	217,519.46	217,519.46		
<b>3.- RETENCIÓN POR GARANTIA</b>						
Valorización No.02		-	55,084.75	55,084.75		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
* Contratista si solicita retención de garantía		0.00	55,084.75	55,084.75	55,084.75	
<b>4.- AMORTIZACION POR ADELANTO MATERIALES</b>						
Valorización No.02		-	-	-		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
<b>5.- DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE</b>						
Por Adelanto Directo		-	-	-		
Por Adelanto de Materiales		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto Directo		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto de Materiales		-	-	-		
		0.00	0.00	0.00		
<b>B.- VALORIZACION NETA (sin IGV) (1)</b>		0.00	162,434.71	162,434.71		
<b>C.- MONTO NETO</b>		0.00	162,434.71	162,434.71		
<b>D.- I.G.V.(18% DE B)</b>		0.00	29,238.25	29,238.25		
<b>E.- MONTO A CANCELAR (C+D)</b>		0.00	191,672.96	191,672.96		
<b>F.- MONTO A FACTURAR (A*0.18)</b>		0.00	256,672.96	256,672.96		



Para efectos de control de avance de ejecución del servicio, se ha determinado que Como el monto de la valorización acumulada ejecutada es mayor que el 80% del monto de la valorización acumulada programada, la obra se encuentra dentro del atraso permisible, por lo que no es necesario que el contratista presente el calendario acelerado de avance de obra (CAAO), en ella se puede visualizar que el avance programado para el mes de octubre 2020, incluyendo la situación actual del servicio y el realmente ejecutado acumulado Promedio de los dos tramos es de 31.33 %, es decir la obra está atrasada un 6.11 %, frente a lo programado de 37.44%.



Instituto Vial Provincial



MPSCH

# Instituto Vial Provincial

## PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VEICUALES TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHILCA - LLANTIPAMBA, LONG. 6.300 KM., DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHILCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

CONTRATO: Nº 09-2020-MI-PIDM-05  
INSPECTOR: ING. Vanessa Abigail Rodríguez Almagro  
CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ROSA



Instituto Vial Provincial  
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD

PRESEMP. OFERTADO (CD-026-40) S/ EV 914,402.78  
PRESEMP. OFERTADO (CD-026-40) NCI/ EV 1,079,000.00  
FECHA DE PRESEMPUESTO 07/09/2020  
PLAZO DE EJECUCION 20 d.c. (04 meses)  
FECHA DE INICIO Y TERMINO CONTRACTUAL 07/09/2020 - 31/02/2020

### VALORIZACION DE AVANCE DE SERVICIO Nº 02, MANTENIMIENTO PERIODICO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020

FORMULA 01 : SERVICIO PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	P.U.	MONTO CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE VALORIZACION			ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
				METRADO	SOLES	%	METRADO	SOLES	%	METRADO	SOLES	%	METRADO	SOLES	%				
01	OBRAS PRELIMINARES																		
01.01	MOVILIZACION Y DESMOLIZACION DE EQUIPOS	gb	40,220.92	2.00	80,441.84	40.34%	1.00	40,220.92	40.34%	0.00%	1.00	40,220.92	40.34%	1,000.00	40,220.92	40.34%	1,000.00	40,220.92	40.34%
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	980.00	15.27	15,240.83	45.94%	7.00	6,868.63	45.94%	50.00%	7.00	6,868.63	45.94%	8.27	8,264.20	45.94%	8.27	8,264.20	45.94%
02	PAVIMENTOS																		
02.01	CAPA MINERANTE E=0.05 M.	m <sup>2</sup>	4.92	3,817.50	17,636.95	50.97%	1,500.00	7,161.00	50.97%	28.33%	1,500.00	7,161.00	50.97%	2,287.50	10,415.85	50.97%	2,287.50	10,415.85	50.97%
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M.	m <sup>3</sup>	32.06	11,452.50	367,167.15	105.79%	3,300.00	105,796.00	105.79%	40.00%	3,300.00	105,796.00	105.79%	6,152.50	261,389.15	71.19%	6,152.50	261,389.15	71.19%
03	TRANSPORTE																		
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM.	m <sup>3</sup> km	6.86	82,323.00	564,753.93	164.32%	3,300.00	23,316.00	164.32%	28.17%	3,300.00	23,316.00	164.32%	6,535.00	59,807.00	71.84%	6,535.00	59,807.00	71.84%
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM.	m <sup>3</sup> km	6.86	49,559.76	42,324.47	11,835.00	13,800.00	11,835.00	28.32%	27.89%	13,800.00	11,835.00	27.89%	35,789.76	30,999.47	72.11%	35,789.76	30,999.47	72.11%
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM.	m <sup>3</sup> km	6.84	6,945.00	48,165.80	13,629.00	1,940.00	13,629.00	28.29%	28.29%	1,940.00	13,629.00	28.29%	5,005.00	34,556.20	71.71%	5,005.00	34,556.20	71.71%
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM.	m <sup>3</sup> km	0.85	13,620.71	11,910.16	3,262.00	3,800.00	3,262.00	27.54%	27.54%	3,800.00	3,262.00	27.54%	10,020.71	8,568.16	72.46%	10,020.71	8,568.16	72.46%
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE																		
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	1.84	15,270.00	28,096.80	11,408.00	6,200.00	11,408.00	40.89%	40.89%	6,200.00	11,408.00	40.89%	9,070.00	16,888.80	69.40%	9,070.00	16,888.80	69.40%
05	SEÑALIZACION																		
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und	315.24	5,399.06	24,712.08	6.00	6,200.00	6.00	8.89%	8.89%	6,200.00	6.00	8.89%	17.00	5,399.06	100.00%	17.00	5,399.06	100.00%
05.02	SENALES PREVENTIVAS	Und	389.22	12,155.04	12,155.04	32.00	12,155.04	12,155.04	100.00%	100.00%	32.00	12,155.04	100.00%	32.00	12,155.04	100.00%	32.00	12,155.04	100.00%
5.03	SENALES REGULATORIAS	Und	389.22	1,568.88	1,568.88	4.00	1,568.88	1,568.88	100.00%	100.00%	4.00	1,568.88	100.00%	4.00	1,568.88	100.00%	4.00	1,568.88	100.00%
05.11	SENALES INFORMATIVAS	Und	488.3000	2,341.60	2,341.60	5.00	2,341.60	2,341.60	100.00%	100.00%	5.00	2,341.60	100.00%	5.00	2,341.60	100.00%	5.00	2,341.60	100.00%
06	IMPACTO AMBIENTAL																		
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	7,274.1400	20,008.56	20,008.56	4.00	20,008.56	20,008.56	100.00%	100.00%	4.00	20,008.56	100.00%	4.00	20,008.56	100.00%	4.00	20,008.56	100.00%
07	EMERGENCIA SANITARIA																		
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gb	26,486.53	2.00	50,973.06	12,747.77	0.50	12,747.77	25.00%	25.00%	0.50	12,747.77	25.00%	1.00	25,495.53	50.00%	1.00	25,495.53	50.00%
A-	COSTO DIRECTO				795,138.33			59,854.92		189,147.35			246,102.27						
B-	GASTOS GENERALES				79,513.63			5,885.49		18,914.74			24,910.23						
C-	UTILIDAD				39,759.82			2,897.75		9,451.74			12,455.11						
D-	SUB TOTAL				914,406.78			68,548.16		217,513.83			286,467.61						
E-	I.G.V.				164,552.22			12,140.67		39,153.50			51,564.17						
F-	TOTAL				1,079,000.00			81,358.92		286,821.96			388,181.78						
G-	PORCENTAJE				100.00%			7.59%		23.19%			31.33%						

A-	COSTO DIRECTO				795,138.33			59,854.92		189,147.35			246,102.27						
B-	GASTOS GENERALES				79,513.63			5,885.49		18,914.74			24,910.23						
C-	UTILIDAD				39,759.82			2,897.75		9,451.74			12,455.11						
D-	SUB TOTAL				914,406.78			68,548.16		217,513.83			286,467.61						
E-	I.G.V.				164,552.22			12,140.67		39,153.50			51,564.17						
F-	TOTAL				1,079,000.00			81,358.92		286,821.96			388,181.78						
G-	PORCENTAJE				100.00%			7.59%		23.19%			31.33%						



El resumen de la valorización de Servicio N° 02 octubre 2020, para efectos de pago al contratista CONSORCIO VIAL SANTA ROSA, se ha determinado el importe de **S/. 256,672.96 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 96/100 SOLES), INC. EL IGV** cuyo detalle es el siguiente.

ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: : " MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA, LONG. 6.970 KM., CUSHPE-ALGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG. 6.300 KM., DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD "

CONTRATO : N° 07-2020-MPSCH/LOG  
INSPECTOR : ING. Vanessa Abigail Rodríguez Arteaga  
CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ROSA

**RESUMEN GENERAL VALORIZACION N° 02-OCTUBRE MANTENIMIENTO PERIODICO**

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO	VALORIZACION			SALDO	% AVANCE
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUM.		
<b>1.- VALORIZACION CONTRACTUAL</b>						
Valorización No. 02	914,406.78	-	217,519.46	217,519.46	696,887.32	23.79%
	914,406.78	0.00	217,519.46	217,519.46	696,887.32	23.79%
Avance Ejecutado		0.000%	23.788%	23.788%		
Avance Programado		0.000%	4.681%	4.681%		
<b>2.- REAJUSTES</b>						
Reajuste de la Valorización No. 02		-	-	-		
Regularización Reajuste Valorización anteriores		-	-	-		
Retención por atraso de Obra		-	-	-		
*El reajuste no se aplica según CGC 47.1		0.00	0.00	0.00		
<b>A.- VALORIZACION BRUTA (sin IGV) (1+2)</b>		0.00	217,519.46	217,519.46		
<b>3.- RETENCIÓN POR GARANTIA</b>						
Valorización No.02		-	55,084.75	55,084.75		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
* Contratista al solicitar retención de garantía		0.00	55,084.75	55,084.75	55,084.75	
<b>4.- AMORTIZACION POR ADELANTO MATERIALES</b>						
Valorización No.02		-	-	-	-	
Regularización Valorización anteriores		-	-	-	-	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
<b>5.- DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE</b>						
Por Adelanto Directo		-	-	-		
Por Adelanto de Materiales		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto Directo		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto de Materiales		-	-	-		
		0.00	0.00	0.00		
<b>B.- VALORIZACION NETA (sin IGV) (1)</b>		0.00	162,434.71	162,434.71		
<b>C.- MONTO NETO</b>		0.00	162,434.71	162,434.71		
<b>D.- I.G.V. (18% DE B)</b>		0.00	29,238.25	29,238.25		
<b>E.- MONTO A CANCELAR (C+D)</b>		0.00	191,672.96	191,672.96		
<b>F.- MONTO A FACTURAR (A*0.18)</b>		0.00	256,672.96	256,672.96		

Para efectos de control de avance de ejecución del servicio, se ha determinado que Como el monto de la valorización acumulada ejecutada es mayor que el 80% del monto de la valorización acumulada programada, la obra se encuentra dentro del atraso permisible, por lo que no es necesario que el contratista presente el calendario acelerado de avance de obra (CAAO), en ella se puede visualizar que el avance programado para el mes de octubre 2020, incluyendo la situación actual del servicio y el realmente ejecutado acumulado Promedio de los dos tramos es de 31.33 %, es decir la obra está atrasada un 6.11 %, frente a lo programado de 37.44%.

PERIODO	VALORIZACIONES DE SERVICIO PROGRAMADA					VALORIZACIONES DE SERVICIO REAL				
	CONTRATO ORIGINAL	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)		PRINCIPAL TOTAL	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)	
		PARCIAL	ACUM. (A)	PARCIAL	ACUM.		PARCIAL	ACUM. (B)	PARCIAL	ACUMULADO
SET. 2020	50,502.60	50,502.60	50,502.60	4.68%	4.68%	81,358.82	81,358.82	81,358.82	7.54%	7.54%
OCT. 2020	353,518.19	353,518.19	404,020.79	32.76%	37.44%	256,672.96	256,672.96	338,031.78	23.79%	31.33%
NOV. 2020	353,518.19	353,518.19	757,538.98	32.76%	70.21%					
DIC. 2020	321,461.02	321,461.02	1,079,000.00	29.79%	100.00%					
<b>TOTALES</b>	<b>1,079,000.00</b>	<b>1,079,000.00</b>				<b>338,031.78</b>	<b>338,031.78</b>			

**DIAGRAMA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO**



La retención de la Garantía de Fiel Cumplimiento, que tiene como responsabilidad el CONSORCIO VIAL SANTA ROSA, en dejar como garantía del trabajo a ejecutar, será descontado en las dos primeras Valorizaciones concerniente a los meses de Setiembre y Octubre del 2020, de las cuales será retenido el 10% del monto del contrato.

Dentro del contenido del informe mensual del contratista, de valorización N° 02 al mes de octubre del 2020, nos detalla las pólizas de seguros por la compañía de seguros LA POSITIVA relacionadas al SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD, vigente desde el 22/09/2020 hasta el 22/12/2020, seguros contra accidentes personales emitidas por la compañía aseguradora cuya fecha debe de coincidir al mes de Setiembre del 2020, Pólizas de seguros contra todo riesgo (SCTR – SALUD), FUE EMITIDA EL 24/09/2020, Que cubre la vigencia desde 22/09/2020 hasta el 22/12/2020.

**CONCLUSIÓN:**

Conforme al calendario de avance del SERVICIO vigente, la ejecución del servicio de SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA, LONG. 8.970 KM, CUSHIPE - ALGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG. 6.300 KM, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, ubicado en el distrito de Santa Cruz de Chuca, Provincia de Santiago de Chuco, Departamento la Libertad, se encuentra atrasado; por cuanto el acumulado programado para el mes de octubre del 2020 es el 37.44% contra lo realmente ejecutado que es el 31.33%, de las cuales se tiene la



257

monto de la valorización acumulado ejecutada es mayor que el 80% del monto de la valorización acumulada programada, la obra se encuentra dentro del atraso permisible, por lo que no es necesario que el contratista presente el calendario acelerado de avance de obra (CAAO)

LOS METRADOS CONCILIADOS ENTRE EL INSPECTOR y el Residente del SERVICIO, han generado la VALORIZACION DEL SERVICIO N° 02, correspondiente a los trabajos ejecutados en el periodo comprendido entre el 01/10/2020 hasta el 31/10/2020 por la empresa contratista CONSORCIO VIAL SANTA ROSA, el mismo que asciende a la suma de **S/. 256,672.96 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 96/100 SOLES)**

Las pólizas de seguros contra accidentes personales emitidas por la compañía aseguradora LA POSITIVA relacionadas al SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD, con SCTR PENSIONES PÓLIZA 6647360, mas SCTR SALUD Contrato 611918 y sus normas reglamentarias, a favor de la empresa CORPORACIÓN SORIANO L & C S.A.C., DE FECHA 24/09/2020, se encuentra vigente.


La Retención de la Garantía, que garantiza el **FIEL CUMPLIMIENTO** de la ejecución del servicio por un monto a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO, se realizará en las dos primeras Valorizaciones concerniente a los meses de Setiembre Y Octubre del 2020, sumando el monto de **S/. 130,000.00 (CIENTO TREINTA MIL CON 00/100 SOLES)**, de las cuales se recomienda la retención a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO, la suma de **S/. 65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES)** referente al 10% del monto total del contrato, referido al reporte de retenciones de la valorización N° 1 del mes de setiembre.

El Inspector del Servicio del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA, LONG. 8.970 KM, CUSHIPE - ALGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG. 6.300 KM, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD", ha presentado a esta municipalidad el informe relacionado a la valorización del servicio N° 05, el día 05/11/2020.

Después de haber evaluado el informe del Inspector con respecto a la valorización del servicio N° 02 por los trabajos ejecutados por el **CONSORCIO VIAL SANTA ROSA**, durante el periodo comprendido entre el 01/10/2020 hasta el 31/10/2020, del servicio de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA, LONG. 8.970 KM, CUSHIPE - ALGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG. 6.300 KM, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD", la misma que asciende a la suma de **S/. 256,672.96 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 96/100 SOLES)**, INC. El IGV, esta gerencia da su **CONFORMIDAD** respectiva al informe N° 134-2020-JO/IVPSCH/LFGCH, así mismo refrendando la opinión favorable del informe N° 1170-2020-MPSCH/DIST/SGI, de la MPSCH.

La Retención de la Garantía, que garantiza el **FIEL CUMPLIMIENTO** de la ejecución del servicio por un monto a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO, contemplada al mes de octubre del 2020, se recomienda hacer el descuento respectivo la suma de **S/. 65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES)**, respecto al 10% del monto total del contrato de servicio.

Concluyendo que el monto a cancelar es de **S/. 191,672.96 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 96/100 SOLES)**, INC. El IGV, haciendo un descuento de la retención de la Garantía de Fiel Cumplimiento, según su ficha resumen de la entidad, que es de **S/. 65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES)**, Resumiendo esto en el cuadro resumen de Valorización N° 02 octubre del 2020.



**RECOMENDACION**


Hacer efectivo la Valorización del SERVICIO N° 02 mes de octubre 2020, por un monto a Pagar de **S S/. 191,672.96 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 96/100 SOLES), INC. El IGV**, por el periodo comprendido entre el 01/10/2020 hasta el 31/10/2020, generado por el avance de los trabajos ejecutados en el servicio DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA, LONG. 8.970 KM, CUSHIPE - ALGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG. 6.300 KM, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, la misma que está a cargo del contratista, **CONSORCIO VIAL SANTA ROSA** e Inspeccionado por el Inspector de servicio el **ING. VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA**, para efectos consiguientes a este informe se hace llegar la siguiente documentación:

Adjunta:

- ✚ Informe N° 134-2020-JO/IVPSCH/LFGCH
- ✚ INFORME N° 017-2020-IVP-MPSCH/TACSMRP/NBP
- ✚ Informe N° 1170-2020-MPSCH/DST/SGI
- ✚ CARTA N° 004-2020-VRA-IO/MPSCH
- ✚ Informe N° 004-2020VARA/INSP
- ✚ CARTA N° 004-2020/CONSORCIO VIAL SANTA ROSA/RL/EGD
- ✚ CONTRATO N° 017-2020-MPSCH-LOG
- ✚ DU. N° 070-2020.
- ✚ 01 folder manila del Original de la valorización presentada por el contratista
- ✚ Planilla de Valorización N° 02 resumida por la entidad
- ✚ Resumen de la Valorización del servicio N° 02 por la entidad

Sin otro particular, me suscribo de Usted, no sin antes reiterar mi estima personal.

Atentamente,

  
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
Ing. Vanessa Rodríguez Arteaga  
GERENTE GENERAL



RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 02 OCTUBRE 2020, POR LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA, LONG. 8.970 KM, CUSHIPE - ALGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ), LONG. 6.300 KM., DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCA - LA LIBERTAD"

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL SANTA ROSA  
INSPECTOR : ING. VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
SERVICIO TRAMO: SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG. 8.970 KM, CUSHIPE - ALGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ)  
LONG. 6.300 KM

N° Contrato : N° 006-2020-MPSC/HLOG

Plazo de Ejecución : 120 Días Calendarios  
Anticipo : S/0.00 Sin IGV  
Adelanto de Materiales : S/0.00 Sin IGV

ACTIVIDAD	COSTO DIRECTO (S/.)	GASTOS GENERALES 10%	UTILIDAD 5%	SUB TOTAL	IGV 18%	TOTAL S/.
PLAN DE TRABAJO	9,579.96	958.00	479.00	11,016.95	1,983.05	13,000.00
MANTENIMIENTO PERIÓDICO	795,136.33	79,513.63	39,756.82	914,406.78	164,593.22	1,079,000.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO	143,899.34	14,389.93	7,184.97	165,254.24	29,745.76	195,000.00
INVENTARIO DE CONDICION VIAL	9,579.96	958.00	479.00	11,016.95	1,983.05	13,000.00
<b>TOTAL S/.</b>	<b>957,995.58</b>	<b>95,799.58</b>	<b>47,899.78</b>	<b>1,101,694.92</b>	<b>198,305.08</b>	<b>1,300,000.00</b>

0.00

N° Valorización	Valorización Bruta	Reintegro de Valorización	Reajuste de Reintegro de Valorización	Deducción del reajuste que no corresponde	Retención Según Art. 151 DS 344-2018-EF Reglamento de la ley N° 30225		Anticipo Materiales Adelanto	MONTONTO A PAGAR		Valorización del mes
					Retención de Garantía 10%	Retención Inc. IGV		S/IGV	IGV	
V. N° 01. Set. 2020	68,948.16	0.00	0.00	0.00	130,000.00	55,084.75	0.00	13,865.41	2,485.41	16,350.83
V. N° 02. Oct. 2020	217,519.46	0.00	0.00	0.00	65,000.00	55,084.75	0.00	162,434.72	29,238.25	191,672.96
V. N° 03. Nov. 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. N° 04. Dic. 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Parcial</b>	<b>286,467.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>110,169.49</b>	<b>0.00</b>	<b>176,298.13</b>	<b>31,733.66</b>	<b>208,031.79</b>

valorización	Avance Mensual	
	Actual	Acumulado
1 ra. VAL	7.54%	7.54%
2 ra. VAL	23.78%	31.33%

ADICIONALES	
0	0.00
<b>Total General</b>	<b>286,467.62</b>

NOTA: Conforme lo establece el Resolución de Superintendencia N° 071-2018/SUNAT, a partir del 01 de abril de 2018, los siguientes servicios, contenidos en el Anexo 3 de la R.S. 183-2004/SUNAT, cuyo nacimiento de la obligación tributaria del IGV se origine a partir de dicha fecha, estarán sujetos a la aplicación del 12%.

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCA  
DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCA  
GERENTE GENERAL  
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

JEFE DE OPERACIONES  
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

255

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: \*MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO:SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA, LONG. 8.970 KM, CUSHIPE - ALGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG. 6.300 KM., DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

CONTRATO : N° 017-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR : ING. Vanessa Abigail Rodríguez Arleaga

CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ROSA



Instituto Vial Provincial  
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD



## RESUMEN DE PAGO N° 02 OCTUBRE 2020

CONTRATO N° 004-2020-MPSCH/LOG

MES DE OCTUBRE 2020

### PAGO A CUENTA A CANCELAR AL CONTRATISTA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

CONCEPTO		MONTOS
		S/.
<b>1.- Monto Valorizado sin Reajuste en el presente mes :</b>		<b>217,519.46</b>
- Valorización No.02		217,519.46
<b>2.- Reajuste de las Valorizaciones :</b>		<b>0.00</b>
- Reajuste de la Valorización No.02		0.00
- Regularización Reajuste Valorización anterior		0.00
- Retención por atraso de Obra		0.00
* El reajuste no se aplica según CGC 47.1		
<b>A.- VALORIZACION BRUTA (VB) (sin IGV) (1+2)</b>	<b>S/.</b>	<b>217,519.46</b>
<b>3.- Retención de Garantía :</b>		<b>55,084.75</b>
- En la Valorización No.02		55,084.75
- Regularización Valorizaciones anteriores		0.00
* Contratista no solicitó retención de Garantía		
<b>4.- Amortización del Adelanto de Materiales :</b>		<b>0.00</b>
- En la Valorización No.02		0.00
- Regularización Valorizaciones anteriores		0.00
* Contratista no solicitó adelanto		
<b>5.- Deducción del Reajuste que no corresponde :</b>		<b>0.00</b>
- Por Adelanto Directo		0.00
- Por Adelanto de Materiales		0.00
- Por Regularización del Adelanto Directo		0.00
- Por Regularización del Adelanto de Materiales		0.00
<b>B.- VALORIZACION NETA (sin IGV) (1)</b>	<b>S/.</b>	<b>162,434.71</b>
<b>C.- MONTO NETO</b>	<b>S/.</b>	<b>162,434.71</b>
<b>D.- I.G.V. ( 18% DE B )</b>	<b>S/.</b>	<b>29,238.25</b>
<b>E.- MONTO A CANCELAR ( C+D )</b>	<b>S/.</b>	<b>191,672.96</b>
<b>F.- MONTO A FACTURAR (A*0.18)</b>	<b>S/.</b>	<b>256,672.96</b>



ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA, LONG. 8.970 KM, CUSHIPE - ALGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG. 6.300 KM., DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

SERVICIO:

CONTRATO : N° 017-2020-MPSCH/LOG  
 INSPECTOR : ING. Vanessa Abigail Rodríguez Arteaga  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ROSA



*Instituto Vial Provincial*  
 PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD



**RESUMEN GENERAL VALORIZACION N° 02-OCTUBRE MANTENIMIENTO PERIODICO**

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO	VALORIZACION			SALDO	% AVANCE
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUM.		
<b>1.- VALORIZACION CONTRACTUAL</b> Valorizacion No. 02	914,406.78	-	217,519.46	217,519.46	696,887.32	23.79%
<b>Avance Ejecutado</b>	914,406.78	0.00	217,519.46	217,519.46	696,887.32	23.79%
<b>Avance Programado</b>		0.000%	23.788%	23.788%		4.681%
<b>2.- REAJUSTES</b>						
Reajuste de la Valorizacion No. 02		-	-	-		
Regularización Reajuste Valorización anteriores		-	-	-		
Retención por atraso de Obra		0.00	0.00	0.00		
*El reajuste no se aplica según CGC 47.1						
<b>A.- VALORIZACION BRUTA (sin IGV) (1+2)</b>		0.00	217,519.46	217,519.46		
<b>3.- RETENCIÓN POR GARANTIA</b> Valorizacion No.02		-	55,084.75	55,084.75		
Regularización Valorización anteriores		0.00	55,084.75	55,084.75	55,084.75	
* Contratista si solicito retención de garantía						
<b>4.- AMORTIZACION POR ADELANTO MATERIALES</b> Valorizacion No.02		-	-	-		
Regularización Valorización anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
<b>5.- DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE</b> Por Adelanto Directo		-	-	-		
Por Adelanto de Materiales		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto Directo		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto de Materiales		0.00	0.00	0.00		
<b>B.- VALORIZACION NETA (sin IGV) (1)</b>		0.00	162,434.71	162,434.71		
<b>C.- MONTO NETO</b>		0.00	162,434.71	162,434.71		
<b>D.- I.G.V. (18% DE B)</b>		0.00	29,238.25	29,238.25		
<b>E.- MONTO A CANCELAR (C+D)</b>		0.00	191,672.96	191,672.96		
<b>F.- MONTO A FACTURAR (A*0.18)</b>		0.00	256,672.96	256,672.96		



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHICO

S/IGV 914,468.78

(CD-GG4U)

PRESUP. OFERTADO

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHICO - REGION LA LIBERTAD

WFSCH

IVPE Instituto Vial Provincial

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LATUPURMBA, LONG. 6.300 KM., DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHICO - LA LIBERTAD

S/IGV 1,079,000.00

(CD-GG4U)

PRESUP. OFERTADO

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHICO - REGION LA LIBERTAD

WFSCH

IVPE Instituto Vial Provincial

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LATUPURMBA, LONG. 6.300 KM., DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHICO - LA LIBERTAD

CONTRATO: N° 017-2020/MP/SCH/LOG

INC/IGV

(CD-GG4U)

FECHA DE PRESUPUESTO

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHICO - REGION LA LIBERTAD

WFSCH

IVPE Instituto Vial Provincial

CONTRATO: N° 017-2020/MP/SCH/LOG

INSPECTOR: ING. Vanessa Abigail Rodríguez Almagro

INC/IGV

(CD-GG4U)

FECHA DE PRESUPUESTO

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHICO - REGION LA LIBERTAD

WFSCH

IVPE Instituto Vial Provincial

CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ROSA

INC/IGV

(CD-GG4U)

FECHA DE PRESUPUESTO

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHICO - REGION LA LIBERTAD

WFSCH

IVPE Instituto Vial Provincial

CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ROSA

VALORIZACION DE AVANCE DE SERVICIO N° 02, MANTENIMIENTO PERIODICO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020

FORMULA 01 - SERVICIO PRINCIPAL

Table with columns: ITEM, DESCRIPCION, U/M, P.U., MONTO CONTRATO, METRADO, SOLES, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE VALORIZACION, METRADO, SOLES, ACUMULADO ACTUAL, % METRADO, % VALORIZACION, METRADO, SOLES, SALDO POR VALORIZAR, %.

Summary table with columns: A-G, COSTO DIRECTO, GASTOS GENERALES, UTILIDAD, SUB TOTAL, IGV, TOTAL, PORCENTAJE.



ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO : MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG. 8.970 KM. CUSHIFE - ALGULLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG. 6.300 KM. DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

CONTRATO : N° 017-2020-MPSC/LOG  
INSPECTOR : ING. Vanessa Abigail Rodríguez Altesga  
CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ROSA



Instituto Vial Provincial



PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD



### CUADRO COMPARATIVO DE AVANCES : PROGRAMADO VS EJECUTADO (CURVA "S") COMPARACION EFECTUADA CON EL CV

PERIODO	VALORIZACIONES DE SERVICIO PROGRAMADA				VALORIZACIONES DE SERVICIO REAL				SITUACION DE SERVICIO	
	CONTRATO ORIGINAL	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)	PRINCIPAL TOTAL	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)	SERVICIO	%
		PARCIAL	ACUM. (A)			PARCIAL	ACUM. (B)			
SET. 2020	50,502.60	50,502.60	4.68%	81,358.82	81,358.82	7.54%	7.54%	ADELANTADA	61.10%	
OCT. 2020	353,518.19	353,518.19	32.76%	256,672.96	338,031.78	23.79%	31.33%	ATRASADA	16.33%	
NOV. 2020	353,518.19	757,538.98	32.76%							
DIC. 2020	321,461.02	1,079,000.00	29.79%							
<b>TOTALES</b>	<b>1,079,000.00</b>	<b>1,079,000.00</b>		<b>338,031.78</b>	<b>338,031.78</b>					

NOTAS:  
1.- Montos que considera costo directo + gastos generales + utilidad, montos sin incluir IGV.  
2.- En el avance programado se ha considerado el Calendario de Avance Servicio que corresponde al mes de setiembre

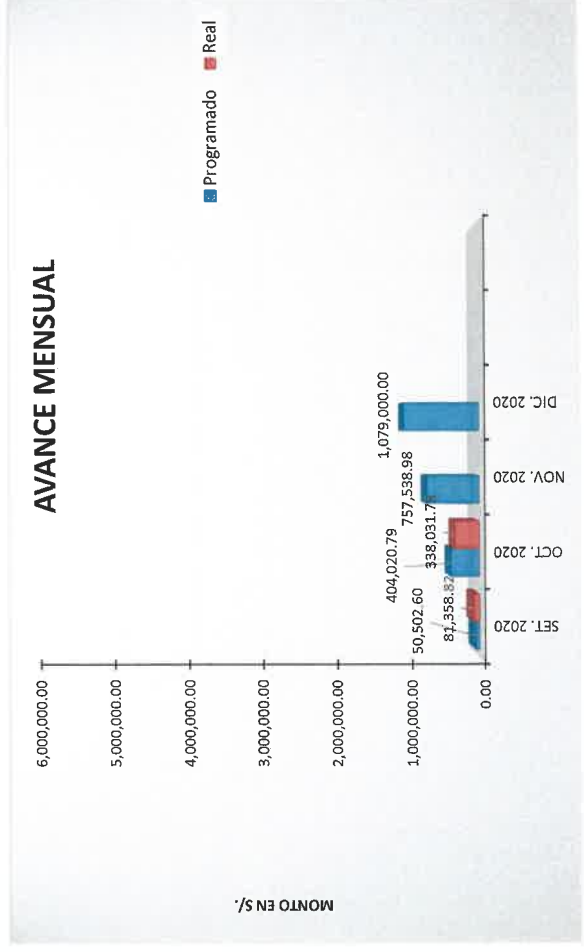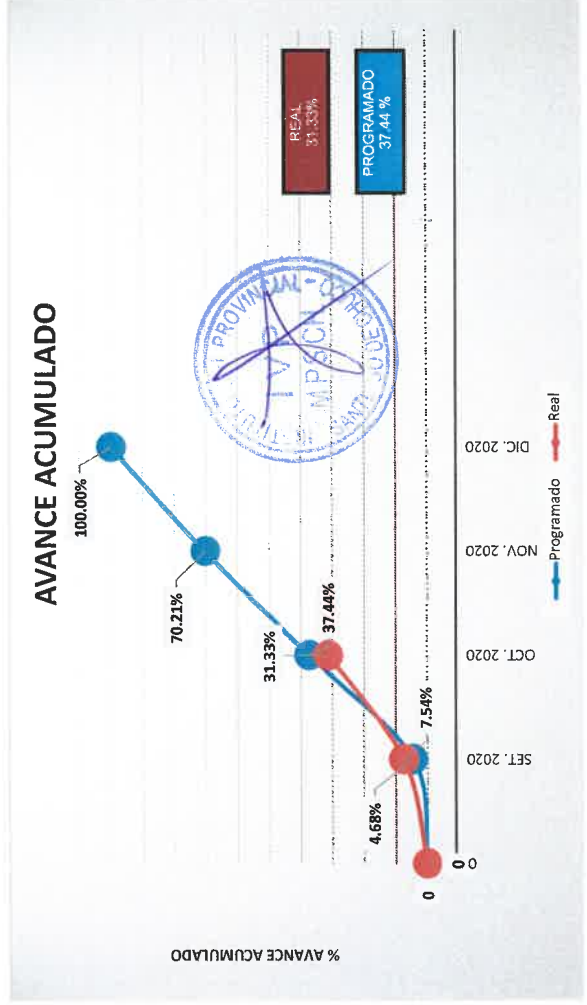

251

ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: : 'MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA, LONG. 8.970 KM, CUSHPE - ALGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG. 6.300 KM., DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD'

CONTRATO: : N° 017-2020-MPSCH/LOG  
 INSPECTOR : ING. Vanessa Abigail Rodríguez Artega  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ROSA



*Instituto Vial Provincial*  
 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL  
 PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD



**PLANILLA DE RESUMEN DE METRADOS, MANTENIMIENTO PERIODICO  
 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020**

Partida	Descripción	Und	Metrado Contrato Original	Acumulado Anterior	Val N° 02	Acumulado Actual		Saldos por Valorizar	
				Metrado	Oct-20	Metrado	%	Metrado	%
<b>01</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>								
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	2.00	1.000	-	1.000	50.00%	1.0000	50.00%
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	15.27	7.00	-	7.000	45.84%	8.2700	54.16%
<b>02</b>	<b>PAVIMENTOS</b>								
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M.	m3	3,817.50	-	1,550.000	1,550.000	40.60%	2,267.5000	59.40%
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M.	m3	11,452.50	-	3,300.000	3,300.000	28.81%	8,152.5000	71.19%
<b>03</b>	<b>TRANSPORTE</b>								
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM.	m3k	11,835.00	-	3,300.000	3,300.000	27.88%	8,535.0000	72.12%
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM.	m3k	49,559.76	-	13,800.000	13,800.000	27.85%	35,759.7600	72.15%
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM.	m3k	6,945.00	-	1,940.000	1,940.000	27.93%	5,005.0000	72.07%
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM.	m3k	13,820.71	-	3,800.000	3,800.000	27.49%	10,020.7100	72.51%
<b>04</b>	<b>OBRAS DE ARTE Y DRENAJE</b>								
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	15,270.00	-	6,200.000	6,200.000	40.60%	9,070.0000	59.40%
<b>05</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>								
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und	17.00	-	-	-	-	17.0000	100.00%
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	Und	32.00	-	-	-	-	32.0000	100.00%
5.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	Und	4.00	-	-	-	-	4.0000	100.00%
05.11	SEÑALES INFORMATIVAS	Und	5.00	-	-	-	-	5.0000	100.00%
<b>06</b>	<b>IMPACTO AMBIENTAL</b>								
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	4.00	-	-	-	-	4.0000	100.00%
<b>07</b>	<b>EMERGENCIA SANITARIA</b>								
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	2.00	0.500	0.500	1.000	50.00%	1.0000	50.00%



249

ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: : "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA, LONG. 8.970 KM, CUSHIPE - ALGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG. 6.300 KM., DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"

CONTRATO: : N° 017-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR : ING. Vanessa Abigail Rodríguez Arteaga

CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ROSA



*Instituto Vial Provincial*  
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD



**EVALUACION DEL AVANCE VALORIZADO RESPECTO AL PROGRAMADO**

PRESUPUESTO	MONTO TOTAL X PRESUPUESTO	MONTO AVANCE ACUMULADO	
		VALORIZADO	PROGRAMADO
SERVICIO PRINCIPAL	1,079,000.00	338,031.79	404,020.79
<b>TOTAL (Sin IGV)</b>	<b>1,079,000.00</b>	<b>338,031.79</b>	<b>404,020.79</b>
		<b>31.33%</b>	<b>37.44%</b>

<b>Situacion de Obra</b>	$S/.338,031.79 < S/.404,020.79 ==>$	<b>Atrasada</b>
		<b>16.333%</b>

**VERIFICACION SI REQUIERE CALENDARIO ACELERADO (ART. 205 DEL RLCE)**

a.- Monto Valorizacion Acumulado Programado	404,020.79
b.- Porcentaje art. 205 del Reglamento.	80%
c.- Monto Tope (80% de a)	323,216.63
d.- Monto Valorizacion Acumulado Ejecutado	338,031.79

Se tiene que:  
(d) > (c) => S/.338,031.79 > S/.323,216.63

**Conclusion :**

Como el monto de la valorizacion acumulado ejecutada es mayor que el 80% del monto de la valorizacion acumulada programada, la obra se encuentra dentro del atraso permisible, por lo que no es necesario que el contratista presente el calendario acelerado de avance de obra (CAAO)



248

ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: : "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO:SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA, LONG. 8.970 KM, CUSHIPE - ALGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG. 6.300 KM., DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"

CONTRATO : N° 017-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR : ING. Vanessa Abigail Rodríguez Arteaga

CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ROSA



*Instituto Vial Provincial*  
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD



## RESUMEN DE METRADOS MANTENIMIENTO PERIODICO VALORIZACIÓN N° 02

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO
01	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>		
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	-
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	-
02	<b>PAVIMENTOS</b>		
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M.	m3	1,550.00
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M.	m3	3,300.00
03	<b>TRANSPORTE</b>		
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM.	m3k	3,300.00
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM.	m3k	13,800.00
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM.	m3k	1,940.00
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM.	m3k	3,800.00
04	<b>OBRAS DE ARTE Y DRENAJE</b>		
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	6,200.00
05	<b>SEÑALIZACIÓN</b>		
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und	-
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	Und	-
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	Und	-
05.11	SEÑALES INFORMATIVAS	Und	-
06	<b>IMPACTO AMBIENTAL</b>		
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	-
07	<b>EMERGENCIA SANITARIA</b>		
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	0.5



“Año de la Universalización de la Salud”

**INFORME N° 134-2020-JO/IVPSCH/LFGCH**



**A** : ING. RAFAEL K. VALENCIA REBAZA  
GERENTE DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

**DE** : ING. LUIS F. GUTIERREZ CHÁVEZ  
JEFE DE OPERACIONES DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

**ASUNTO** : EVALUACIÓN Y CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N° 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: “SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA LONG= 8.970 KM” Y “CUSHIPE – ALLGALLAMA – EMP. PE-3N LONG=6.300 KM” DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.

**REFERENCIA :**

MONITOR DESIGNADO POR IVP	a)	INF. N°017-2020-IVP-MPSCH/CEGB/TA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	b)	INF. N°1170-2020-MPSCH/DIST/SGI
INSPECTOR DE SERVICIO	c)	CARTA N°004-2020-VRA-IO/MPSCH
CONTRATISTA	d)	CARTA N°004-2020/CONSORCIO VIAL SANTA ROSA/RL/EGD

**FECHA** : SANTIAGO DE CHUCO, 27 DE OCTUBRE DE 2020

*Por medio del presente, le expreso mi cordial saludo y afecto, a su vez presento la VALORIZACIÓN N°02 del SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: “SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA LONG= 8.970 KM” Y “CUSHIPE – ALLGALLAMA – EMP. PE-3N LONG=6.300 KM” DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, correspondiente al mes de octubre (del 01 al 31) de 2020, la cual fue elaborada por el CONSORCIO VIAL SANTA ROSA y alcanzada al Inspector de servicio mediante documento de referencia d); este a su vez dio su Conformidad y la ingresó a la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad) con documento de referencia c) para realizar el trámite correspondiente.*

*Para el pago de la VALORIZACIÓN N° 02, se debe contar con la CONFORMIDAD del área responsable (Sub Gerencia de Infraestructura) y posteriormente se dará la APROBACIÓN del área usuaria (Instituto Vial Provincial de Santiago de Chuco), según se estipula los Términos de Referencia del D.U. N° 070-2020 para los Mantenimientos Viales de los caminos vecinales de la provincia de Santiago de Chuco.*

*Dentro de este marco, a su vez contando con la CONFORMIDAD de VALORIZACIÓN N° 02 del área responsable (documento de referencia b); siguiendo el trámite correspondiente; esta Jefatura de Operaciones del IVP de Santiago de Chuco, como parte de sus funciones, realizó la evaluación dicha documentación por medio del Monitor designado, el Ing. Marcial Nicolás Barrantes Parimango, la cual se detalla en su informe respectivo (documento de referencia a); de esta manera se dará COMFORMIDAD (de no haber observaciones); a fin de dar paso a la evaluación para la APROBACIÓN por parte de su persona.*

**I. INFORME GENERAL:**

**A) INFORMACIÓN TÉCNICA:**

Nombre de Servicio

VECINALES: “SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA LONG= 8.970 KM” Y “CUSHIPE –



ALLGALLAMA – EMP. PE-3N LONG=6.300 KM” DEL  
DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE  
SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.

**EJECUTOR:**

Convocatoria del servicio	: RES-PROC-9-2020-MPSCH/CS-1
Fuente de Financiamiento	: Recursos por operaciones oficios de crédito
Modalidad Contratación	: A suma alzada
Contrato de Servicio	: N° 017-2020-MPSCH-LOG
Decreto de Urgencia	: N° 070-2020
Fecha de Suscripción	: 28-08-2020
Contratista	: CONSORCIO VIAL SANTA ROSA
Residente del Servicio	: Ing. Luis Alberto Gonzales Navarro
Monto Referencial del Servicio	: S/. 1,301,584.26 (INCL. IGV)
Monto del Contrato del Servicio	: S/. 1,300,000.00 (INCL. IGV).
Adelanto Directo	: NO APLICA
Plazo de Ejecución	: MANTENIMIENTO PERIODICO - 120 DC (sujeto a firma de contrato). MANTENIMIENTO RUTINARIO – 360 DC
Fecha Entrega Terreno	: 29/08/2020
Resolución de Aprobación de P.T.	: RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 149A-2020- MPSCH/GM
Fecha de Aprobación	: 21/09/2020
Fecha Inicio Servicio Contractual	: 22/09/2020
Fecha Término Servicio Contractual	: 31/12/2021

**INSPECCIÓN:**

Inspector de Servicio	: Ing. Vanessa Abigail Rodríguez Arteaga
Contrato de Inspección	: N° 029-2020-MPSCH-LOG
Fecha de Designación	: 24/08/2020
Monto Contractual	: S/. 14,506.50
Plazo de Designación	: 120 DC (MANTENIMIENTO PERIÓDICO)

**II. ANALISIS**

Según lo detallado y analizado en el Informe del Monitor designado, la Sub Gerencia de Infraestructura (área responsable) y del Inspector concerniente a la VALORIZACIÓN N° 02 (del 01 al 31 de octubre) de la Fase II: MANTENIMIENTO PERIÓDICO del servicio en

mención, presentada por el Contratista, se tiene la siguiente información resumida a considerar:

**A) DEL AVANCE EJECUTADO**

Los metrados ejecutados por tramos son:

**TRAMO: SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATADO	CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS				% EJECUTADO
				ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR EJECUTAR	
<b>1.00</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>							
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00		0.00	0.50	0.50	50.00%
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	8.97		0.00	4.00	4.97	44.59%
<b>2.00</b>	<b>PAVIMENTOS</b>							
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	2,242.50		900.00	900.00	1,342.50	40.13%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	6,727.50		2,100.00	2,100.00	4,627.50	31.22%
<b>3.00</b>	<b>TRANSPORTE</b>							
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	6,952.50		2,100.00	2,100.00	4,852.50	30.20%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	26,808.88		8,100.00	8,100.00	18,708.88	30.21%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	4,025.00		1,200.00	1,200.00	2,825.00	29.81%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	6,692.21		2,000.00	2,000.00	4,692.21	29.89%
<b>4.00</b>	<b>OBRAS DE ARTE Y DRENAJE</b>							
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	8,970.00		3,600.00	3,600.00	5,370.00	40.13%
<b>5.00</b>	<b>SEÑALIZACION</b>							
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	10.00		0.00	0.00	10.00	0.00%
05.02.	SENALES PREVENTIVAS	und	26.00		0.00	0.00	26.00	0.00%
05.03.	SENALES REGLAMENTARIAS	und	2.00		0.00	0.00	2.00	0.00%
05.04.	SENALES INFORMATIVAS	und	3.00		0.00	0.00	3.00	0.00%
<b>6.00</b>	<b>IMPACTO AMBIENTAL</b>							
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00		0.00	0.00	2.00	0.00%
<b>7.00</b>	<b>EMERGENCIA SANITARIA</b>							
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00		0.25	0.50	0.50	50.00%

**TRAMO: CUSHIPE – ALLGALLAMA – EMP. PE-3N**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATADO	CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS				% EJECUTADO
				ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR EJECUTAR	
<b>1.00</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>							
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00		0.00	0.50	0.50	50.00%
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	6.30		0.00	3.00	3.30	47.62%
<b>2.00</b>	<b>PAVIMENTOS</b>							
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	1,575.00		650.00	650.00	925.00	41.27%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	4,725.00		1,200.00	1,200.00	3,525.00	25.40%
<b>3.00</b>	<b>TRANSPORTE</b>							
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	4,882.50		1,200.00	1,200.00	3,682.50	24.58%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	22,750.88		5,700.00	5,700.00	17,050.88	25.05%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	2,920.00		740.00	740.00	2,180.00	25.34%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	7,128.50		1,800.00	1,800.00	5,328.50	25.25%
<b>4.00</b>	<b>OBRAS DE ARTE Y DRENAJE</b>							
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	6,300.00		2,600.00	2,600.00	3,700.00	41.27%
<b>5.00</b>	<b>SEÑALIZACION</b>							
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	7.00		0.00	0.00	7.00	0.00%
05.02.	SENALES PREVENTIVAS	und	6.00		0.00	0.00	6.00	0.00%
05.03.	SENALES REGLAMENTARIAS	und	2.00		0.00	0.00	2.00	0.00%
05.04.	SENALES INFORMATIVAS	und	2.00		0.00	0.00	2.00	0.00%
<b>6.00</b>	<b>IMPACTO AMBIENTAL</b>							
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00		0.00	0.00	2.00	0.00%
<b>7.00</b>	<b>EMERGENCIA SANITARIA</b>							
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00		0.25	0.50	0.50	50.00%

Las partidas que se vienen ejecutando a la fecha corresponden a las obras preliminares (movilización y desmovilización de equipos, trazo y replanteo), asimismo, se está ejecutando las partidas de colocación de pavimento (capa nivelante y afirmado) por lo cual se ejecuta a su vez las partidas de transporte de material excedente; también se realizó parte de la partida reconformación de cunetas; finalmente la partida de emergencia sanitaria COVID 19 se ejecutó a un 50%. Todo viene siendo ejecutado conforme a las normas de evaluación, dentro de los lineamientos y Especificaciones Técnicas establecidos en el Plan de Trabajo, elaborado por el Contratista y previamente aprobado por la Entidad.

En cuanto al avance acumulado ejecutado respecto al programado (curva S) tenemos el siguiente resumen:

N° VAL.	MES	PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCE MENSUAL ACUM.	
				EJECUTADO	PROGRAMADO
2	OCTUBRE	01/10/2020	31/10/2020	31.33%	37.44%

Se observa un porcentaje de avance NEGATIVO del **-6.11%**, lo cual significa que la ejecución está atrasada, sin embargo, dicho porcentaje es mayor al 80% de lo programado (83.68%) por lo que no supone la elaboración de cronograma acelerado.

**B) DEL MONTO VALORIZADO**

De acuerdo con las actividades ejecutadas se tiene una valorización con la siguiente configuración:

N° Valorización	Valorización Bruta	MONTO A PAGAR	IGV	Valorización del mes
		S/IGV		

N° 01. Septiembre	S/.68,948.16	S/.68,948.16	S/.12,410.67	S/.81,358.83
N° 02. Octubre	S/.217,519.46	S/.217,519.46	S/.39,153.50	<b>S/.256,672.96</b>
N° 03. Noviembre	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00
N° 04. Diciembre	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00

Parcial	S/.286,467.62	S/.286,467.62	S/.51,564.17	S/.338,031.79
---------	---------------	---------------	--------------	---------------

**ADICIONALES**

0	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00
---	---------	---------	---------	---------

<b>Total General</b>	<b>S/.286,467.62</b>	<b>S/.286,467.62</b>	<b>S/.51,564.17</b>	<b>S/.338,031.79</b>
----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Se observa que la VALORIZACIÓN N° 02 del mes de octubre corresponde a un monto de **S/. 256,672.96 (inc. IGV)**.

**C) DE LA RETENCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)**

Según la CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍAS del contrato de servicio, estipula una retención del 10% como garantía de FIEL CUMPLIMIENTO del monto contractual total, el cual será retenido de manera particionada de las dos primeras valorizaciones según lo estipula el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado en su artículo 149° "Garantía de fiel cumplimiento", inciso 149.5, para servicios, como se muestra en el siguiente cuadro:

MONTO CONTRACTUAL	RETENCIÓN G.F.C. (10%)	RETENCIÓN EN CADA VAL.	
		VAL. 01 (5%)	VAL. 02 (5%)
S/. 1,300,000.00	S/. 130,000.00	S/. 65,000.00	S/. 65,000.00

Por lo cual se tiene el siguiente detalle:

➤ VALORIZACIÓN BRUTA	S/.	217,519.46
➤ IGV (18%)	S/.	39,153.50
➤ VALORIZACIÓN NETA	S/.	256,672.96
➤ RETENCIÓN G.F.V (5%)	S/.	65,000.00



243

➤ **SALDO A COBRAR****S/. 191,672.96**

El saldo a cobrar por la VALORIZACIÓN N° 02 del 01 al 31 del mes de octubre es de **S/. 191,672.96 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 96/100 NUEVOS SOLES) incluido el I.G.V.**

**D) DE PENALIDADES PRESENTADAS**

No se presentó ninguna ocurrencia que suponga la aplicación de PENALIDAD según las estipulaciones del contrato de servicio de en su CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.

**III. CONCLUSIONES**

Tomando en cuenta todo lo analizado anteriormente, se hace las siguientes conclusiones:

- ❖ La diferencia entre el avance ejecutado respecto al programado arroja un **porcentaje negativo de -6.11%, pero supera el 80% de lo programado.**
- ❖ El saldo a pagar por la VALORIZACIÓN N° 02 del mes de octubre es **S/. 191,672.96 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 96/100 NUEVOS SOLES inc. IGV).**
- ❖ **No se presentaron PENALIDADES.**
- ❖ Se da **CONFORMIDAD** por parte de la oficina de Jefatura de Operaciones del IVP Santiago de Chuco a la VALORIZACIÓN N° 02 del servicio en mención.

**IV. RECOMENDACIONES**

Se recomienda **APROBAR** la presente VALORIZACIÓN N° 02 por su persona, a fin de realizar el pago correspondiente al CONSORCIO VIAL SANTA ROSA, conforme a lo estipulado en el cronograma programado del Plan de Trabajo del servicio y a lo ejecutado en campo. De igual modo, se sugiere seguir las recomendaciones indicadas en el Informe del Monitor designado (documento de referencia a). Por último, se recomienda agregar las copias de los cuadernos de ocurrencias de los dos tramos que componen el paquete contractual.

*Es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y fines.*

**ATENTAMENTE**

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
Jefe de Operaciones  
Luis F. Javez Luis F.

242 24



Instituto Vial Provincial

Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD



MPSCH

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

**INFORME N° 017-2020-IVP-MPSCH/TACSMRP/NBP**



**A** : **Ing. Luis Francisco Gutierrez Chavez**  
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Santiago Chuco

**DE** : Ing. Nicolás Barrantes Parimango  
Técnico Administrativo del Área del IVP – MSCH – La Libertad

**ASUNTO** : **ALCANZO INFORME DE VALORIZACION N° 02 del 01/10/2020 al 31/10/2020 PARA TRAMITE RESPECTIVO**  
**Servicio:** “Mantenimiento Periódico y Rutinario de los Caminos Vecinales Tramo Santa Rosa –Santa Cruz de Chuca – Llaturpamba Long= 8.970 Km – Cushipe – Argallama – Emp. PE – 3N (La Cruz) – Long. = 6.300 Km – Distrito de Santa Cruz de Chuca – Provincia de Santiago de Chuco – La Libertad

**REFERENCIA** : **INFORME N° 1170-2020-MPSCH/DIST/SGI, de fecha 26/11/2020**  
**INFORME N° 214-2020-HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH, de fecha 24/11/2020**  
**Carta N° 004-2020-VRA-IO/MPSCH**  
**INFORME N° 004-2020-VARA-INSP**  
**CONTRATO N°017-2020-MPSCH-LOG, de fecha 28/08/2020**  
**D.U.N° 070-2020**

**FECHA** : Santiago de Chuco, 27 de Noviembre del 2020

**I.- ANTECEDENTES:**

**1. DEL CONTRATISTA**

Con fecha 13 de agosto de 2020 el Comité de Selección, adjudico la Buena Pro del **PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 009-2020-MPSCH/CS – SEGUNDA CONVOCATORIA**, para la ejecución del **SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA – LONG. = 8.970 KM, - CUSHIPE – ARGALLAMA – EMP. PE-3N (LA CRUZ) – LONG. = 6.300 KM – DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD** al **CONSORCIO VIAL SANTA ROSA**.

Mediante **CONTRATO DE SERVICIO N° 017-2020-MPSCH-LOG**, que celebra de una parte la **Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco**, en adelante la **ENTIDAD**, con **RUC N° 20187630101**, con domicilio legal en calle Paco Yunque N° 735 – Santiago de Chuco, representada por su Gerente Municipal **Abog. Felipe Wilmer Angulo Zavaleta**, identificado con **D.N.I. N° 18185361**, con delegación de facultades mediante **Resolución de Alcaldía N° 219-2020-MPSCH** de fecha 10 de agosto de 2020, y de otra parte el **CONSORCIO VIAL SANTA ROSA**, conformado por **ECAN**

2011 15



# Instituto Vial Provincial



Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD

MPSCH

INGENIERIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – ECAN INGENIERIA S.R.L. (20% de participación), con RUC N° 20568073658, con domicilio legal en Pro Huancabamba N° 211-Urb. Oxapampa (Sum 72875055 A 1 CDA COLEGIO JEAN PIAGET) – OXAPAMPA – PISCO inscrita en la Partida Electrónica N° 11057473, en la Oficina Registral La Merced, debidamente representado por su Representante Legal Sr. Jean Herbert Eche Mostacero, con DNI N° 42736265 y **CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.**, (80% de participación), con RUC N° 20600813715, con domicilio legal en Mz. A T LOTE 17 Urb. San Andres La Libertad – Trujillo- Victor Larco Herrera, inscrita en la Partida Electrónica N° 11277775, del Registro de Personas Jurídicas en la Oficina Registral de Trujillo, debidamente representado por su Representante Legal Sr. Edgar Gomez Dominguez, con DNI N° 44944779, consignado como representante común del Consorcio al Sr. Edgar Gomez Dominguez, con DNI N° 44944779, con domicilio legal en Mz. T Lote 17 Urb. San Andres V Etapa – Victor Lerco – Trujillo – La Libertad, a quien en adelante se le denominara **EL CONTRATISTA**.

El presente contrato tiene por objeto la **CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL: MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA – LONG. = 8.970 KM – CUSHIPE – ARGALLAMA – EMP. PE – 3N (LA CRUZ) LONG. = 6.300 KM – DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD..**

El monto total para la ejecución del servicio asciende a S/. 1,300,000.00 (Un millón Ttescientos Mil con 00/100 Soles), que incluyen todos los impuestos de ley.

## 2.- DEL INSPECTOR

Mediante **CONTRATO DE SERVICIO N° 029-2020-MPSCH-LOG**, que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO**, en adelante la **ENTIDAD**, con RUC N° 20187630101, con domicilio legal en Calle Paco Yunque N° 735 – Santiago de Chuco, representada por su Gerente Municipal, **Abg. FELIPE WILMER ANGULO ZAVALETA**, identificado con D.N.I. N° 18185361, con delegación de facultades mediante Resolución de Alcaldía N° 219-2020-MPSCH de fecha 10 de Agosto de 2020, y de otra parte el **ING. VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA**, con RUC N° 10467434344, con domicilio legal en hermanos García Ruiz N° 234 – Huamachuco – Sanchez Carrión – La Libertad a quien en adelante se le denominara **EL CONTRATISTA**.

El presente contrato tiene por objeto la **CONTRATACION DE SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA – DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS TRAMO CUSHIPE – ARGALLAMA – EMP. PE 3N (LA CRUZ) DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO –LA LIBERTAD .**





Instituto Vial Provincial

*Instituto Vial Provincial*



PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD

MPSCH

El monto total para la Inspección del Mantenimiento Periódico asciende a la suma de S/. 14,506.50 (Catorce Mil Quinientos Seis con 50/100 soles).

1.- INFORMACION CONTRACTUAL

- 1.1. NOMBRE DEL SERVICIO : Mantenimiento Periódico y Rutinario de los Caminos Vecinales Tramo Santa Rosa –Santa Cruz de Chuca – Llaturpamba Long= 8.970 Km – Cushipe – Argallama – Emp. PE – 3N (La Cruz) – Long. = 6.300 Km – Distrito de Santa Cruz de Chuca – Provincia de Santiago de Chuco – La Libertad
- 1.2. N° DE CONTRATO : CONTRATO N° 017-2020-MPSCH-LOG
- 1.3. ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
- 1.4. CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL SANTA ROSA (ECAN INGENIERIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – ECAN INGENIERIA S.R.L)
- 1.5. INSPECTOR : ING. VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA (CONTRATO N° 029-2020-MPSCH-LOG), fecha 24/08/2020.
- 1.6. PLAZO DE EJECUCION : 120 Días Calendarios. (Mantenimiento Periódico)
- 1.7. MONTO DE CONTRATO : S/. 1,300,000.00
- 1.8. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO : S/. 1,079,000.00
- 1.9. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO : S/. 195,000.00
- 1.10. PLAZO DE EJECUCION : 120 Días Calendario
- 1.11. FECHA DE INICIO : 22/09/2020
- 1.12. FECHA DE CULMINACION : 31/12/2020



2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS – FASE II

Las actividades ejecutadas desde el 01/10/2020 al 31/10/2020 son las siguientes:

- 1.- SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLACTURPAMBA LONG. = 8.970 KM
- 2.- CUSHIPE – ALGALLAMA – EMP. PE – 3N (LA CRUZ) LONG. = 6.300 KM

FASE II

02.01 MANTENIMIENTO PERIODICO

02.01 MANTENIMIENTO PERIODICO

02.01.02 PAVIMENTOS

02.01.02.01 CAPA NIVELANTE E= 0.05 M

DESCRIPCION:

239 #



# Instituto Vial Provincial



Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD

MPSCH

Se ejecutó la nivelación de la plataforma que se encuentren desniveladas respecto del borde del pavimento, que estén deformadas o cuya geometría no se ajuste a un plano liso con una pendiente uniforme y adecuada.

### MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Afirmado, materiales con características de Subbase Granular.

### PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION

1. Se procedió a Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad, con las que se garantizó, la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito para evitar accidentes.
2. El personal cuenta con los uniformes, y todo el equipo de protección personal de acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia.
3. Se identificaron las zonas de las bermas que presentan desniveles respecto del borde del pavimento o que se encuentren deterioradas y proceder a delimitarlas para el trabajo diario.

### MEDICION

La unidad de medida es el metro cubico (m3) metro cubico.

### PAGO

El pago se realiza de acuerdo al avance ejecutado, el pago constituirá compensación total por los trabajos prescritos en esta partida, el cual dará V°B° el Inspector de Servicio.

02.01.02.01 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E= 0.15 M

### DESCRIPCION:

Se ejecutó la nivelación de la plataforma que se encuentren desniveladas respecto del borde del pavimento, que estén deformadas o cuya geometría no se ajuste a un plano liso con una pendiente uniforme y adecuada..

### MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Afirmado, materiales con características de Subbase Granular.

### PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION

1. Se procedió a Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad, con las que se garantizo, la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito para evitar accidentes.
2. El personal cuenta con los uniformes, y todo el equipo de protección personal de acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia.
3. Se identificaron las zonas de las bermas que presentan desniveles respecto del borde del pavimento o que se encuentren deterioradas y proceder a delimitarlas para el trabajo diario.

### MEDICION

La unidad de medida es el metro cubico (m3) metro cubico.

### PAGO

El pago se realiza de acuerdo al avance ejecutado, el pago constituirá compensación total por los trabajos prescritos en esta partida, el cual dará V°B° el Inspector de Servicio.



238  
to



Instituto Vial Provincial

*Instituto Vial Provincial*

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD



MPSCH

### 02.01.03 TRANSPORTE

#### 02.01.03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM

##### DESCRIPCION:

Se realizó la actividad de extracción, apilamiento, carguío y transporte de material seleccionado de cantera. El material deberá tener características similares a los del camino.

##### MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

1. Zaranda manual
2. lampas, picos y otros.

##### PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION

1. Se realizo la extracción y apilamiento del material seleccionado.
2. Se procedió a cargar al vehículo el material.
3. Se Transporte el material de cantera al lugar de trabajo.

##### MEDICION

La unidad de medida es el metro cúbico (m3).

##### PAGO

El pago se realiza de acuerdo al avance ejecutado, el pago constituirá compensación total por los trabajos prescritos en esta partida, el cual dará V°B° el Inspector de Servicio.

#### 02.01.03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM

##### DESCRIPCION:

Se realizó la actividad de extracción, apilamiento, carguío y transporte de material seleccionado de cantera. El material deberá tener características similares a los del camino.

##### MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

1. Zaranda manual
2. lampas, picos y otros.

##### PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION

1. Se realizo la extracción y apilamiento del material seleccionado.
2. Se procedió a cargar al vehículo el material.
3. se Transporte el material de cantera al lugar de trabajo.

##### MEDICION

La unidad de medida es el metro cúbico (m3).

##### PAGO

El pago se realiza de acuerdo al avance ejecutado, el pago constituirá compensación total por los trabajos prescritos en esta partida, el cual dará V°B° el Inspector de Servicio.





Instituto Vial Provincial

*Instituto Vial Provincial*

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD



MPSCH

02.01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM

DESCRIPCION:

Consiste en Transportar el material excedente, después de haber ejecutado los trabajos del Mantenimiento Periódico.

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

1. Cargador Frontal, Lampas, picos y otros.

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION

1. Eliminar el material excedente.
2. Cargar al vehículo el material.
3. Transportar el material Excedente a los DME autorizados.

MEDICION

La unidad de medida es el metro cúbico (m3).

PAGO

El pago se realiza de acuerdo al avance ejecutado, el pago constituirá compensación total por los trabajos prescritos en esta partida, el cual dará V°B° el Inspector de Servicio.

02.01.03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM

DESCRIPCION:

Consiste en Transportar el material excedente, después de haber ejecutado los trabajos del Mantenimiento Periódico.

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

1. Cargador Frontal, Lampas, picos y otros.

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION

1. Eliminar el material excedente.
2. Cargar al vehículo el material.
3. Transportar el material Excedente a los DME autorizados.

MEDICION

La unidad de medida es el metro cúbico (m3).

PAGO

El pago se realiza de acuerdo al avance ejecutado, el pago constituirá compensación total por los trabajos prescritos en esta partida, el cual dará V°B° el Inspector de Servicio.

02.01.04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

02.01.04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS

DESCRIPCION:



236 08



# Instituto Vial Provincial



Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD

MPSCH

Se realizó la reconfiguración de la sección transversal y la pendiente longitudinal de las cunetas las cuales no son revestidas, para que no dificulten o impidan el libre flujo del agua.

### MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

lampas, picos y otros.

### PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION

1. Se realizo la colocación de señales preventivas y dispositivos de seguridad, con lo cual garanticen la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes durante el tiempo requerido.
2. El personal tiene uniformes, y todo el equipo de protección personal de acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia.
4. Conformación de la cuneta y se procedió a retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetación, depositándolos en los DME autorizados.
5. Se verifico que la pendiente del fondo de la cuneta garantice el flujo libre de agua y que no haya depresiones que produzcan estancamientos.
6. Al termino de los trabajos se retiraron las señales y dispositivos de seguridad.

### MEDICION

La unidad de medida es el metro lineal (m).

### PAGO

El pago se realiza de acuerdo al avance ejecutado, el pago constituirá compensación total por los trabajos prescritos en esta partida, el cual dará V°B° el Inspector de Servicio.

### 02.01.07 EMERGENCIA SANITARIA

#### 02.01.07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

#### DESCRIPCION:

Se practicaron los protocolos en la implementación de herramientas y equipos de salud para la seguridad y protección del personal de trabajo en obra.

### MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

EPP COVID-19 (mascarillas, guantes, bandejas, alcohol, protector facial, etc)

### PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION

1. Tomar pruebas a los trabajadores.
2. Ingresar a centro de trabajo con mascarilla.
3. Rociar alcohol al momento de ingreso y salida.
4. Mantener el distanciamiento social permitido.
5. Manipulación de objetos personales sin compartirlos, obligatoriamente.

### MEDICION

La medida es Global (Glb).





234  
06



# Instituto Vial Provincial



Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD

MPSCH

## TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM

%	%	%	%
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
0.00	29.81	29.81	70.19

## TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM

%	%	%	%
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
0.00	29.89	29.89	70.11

## OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

### RECONFORMACION DE CUNETAS

%	%	%	%
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
0.00	40.13	40.13	59.87

## EMERGENCIA SANITARIA

### EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

%	%	%	%
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
25.00	25.00	50.00	50.00

## 3.2. SITUACION DE EJECUCION ADMINISTRATIVA

### 3.2.1. Retención de Garantías

Se realizara la retención de garantía de

CONTRATO S/.	G.F.C 10%	VALORIZACION N° 02	RETENCION Valoriz. N° 02
1,300,000.00	130,000.00	163,282.84	32,500.00



233  
05



# Instituto Vial Provincial



Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD

MPSCH

CUSHIPE – ALGALLAMA – EMP. PE – 3N (LA CRUZ) LONG. = 6.300 KM

## MANTENIMIENTO PERIODICO

### MANTENIMIENTO PERIODICO

CAPA NIVELANTE E= 0.05 M.

%	%	%	%
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
0.00	41.27	41.27	58.73

MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E= 0.15 M

%	%	%	%
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
0.00	25.40	25.40	74.60

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM

%	%	%	%
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
0.00	24.58	24.58	75.42

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM

%	%	%	%
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
0.00	25.05	25.05	74.95

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM

%	%	%	%
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
0.00	25.34	25.34	74.66



232  
09



### TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM

%	%	%	%
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
0.00	25.25	25.25	74.75

### OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

#### RECONFORMACION DE CUNETAS

%	%	%	%
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
0.00	41.27	41.27	58.73

### EMERGENCIA SANITARIA

#### EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

%	%	%	%
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
25.00	25.00	50.00	50.00

### 3.3. SITUACION DE EJECUCION ADMINISTRATIVA

#### 3.3.1. Retención de Garantías

Se realizara la retención de garantía de

CONTRATO	G.F.C	VALORIZACION	RETENCION
SI.	10%	N° 02	Valoriz. N° 02
1,300,000.00	130,000.00	93,390.12	32,500.00



#### 3.3.2. Vigencia de las Cartas Fianzas

NO PRESENTO en Informe de Valorización N° 01, CARTA DE AUTORIZACION, para la retención del 10% del monto contractual como Fondo de Garantía de Fiel Cumplimiento.

#### 3.3.3. Vigencia de los seguros (SCTR,SOAT) y anexar copias

Presento la CONSTANCIA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD SCTR PENSIONES POLIZA 6647360, en la Compañía de seguros LA POSITIVA, la cual se tiene vigencia desde el 22/09/2020 hasta el 22/12/2020. (Folio N° 27)

**3.3.4. Penalidades (aplicadas y cobradas)**

En los informes emitidos por el Inspector del Servicio y el Sub Gerente de Infraestructura – MPSCH, no aplican penalidades.

**3.3.5. Relación de personal que trabajo (profesional)**

Datos Personales	Cargo	CIP
Luis Alberto Gonzales Navarro	Residente de Servicio	113398

**4. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO (% AVANCE MENSUAL)**

Del Informe N° 1170-2020-MPSCH/DIST/SGI: Se tiene:

PAQUETE N° 09	VALORIZACION N° 02	VALORIZACION TOTAL N° 2	RETENCION VALOR. 02	MONTO A CANCELAR	CORRESPONDE
TRAMO 1: SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLACTURPAMBA LONG. = 8.970 KM	163,282.84	256,672.96	121,864.12	134,808.84	NO CORRESPONDE
TRAMO 2: CUSHIPE – ALGALLAMA – EMP. PE – 3N (LA CRUZ) LONG. = 6.300 KM	93,390.12				NO CORRESPONDE

De Informe N° 214-2020-HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH.:

PAQUETE N° 08	VALORIZACION N° 02	MONTO A CANCELAR	RETENCION VALORIZ. 02	CORRESPONDE
TRAMO 1: SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLACTURPAMBA LONG. = 8.970 KM	163,282.84	256,672.96	0.00	NO CORRESPONDE
TRAMO 2: CUSHIPE – ALGALLAMA – EMP. PE – 3N (LA CRUZ) LONG. = 6.300 KM	93,390.12			NO CORRESPONDE



230 02



# Instituto Vial Provincial



Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD

MPSCH

POR TANTO:

SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLACTURPAMBA LONG. = 8.970 KM

CUSHIPE – ARGALLAMA – EMP. PE – 3N (LA CRUZ) LONG. = 6.300 KM

MONTO CONTRATO	RETENCION CONTRATO 10%	VALORIZACION N° 02	RETENCION DE G.F.C.	MONTO A CANCELAR	CORRESPONDE
1,300,000.00	130,000.00	163,282.84	32,500.00	130,782.84	CORRESPONDE
		93,390.12	32,500.00	60,890.12	CORRESPONDE
TOTAL		256,672.96	* 65,000.00	191,672.96	CORRESPONDE

\* La RETENCION del monto de S/. 65,000.00, corresponde al saldo que es el 5% (Retención de Contrato del 10%), informando que en la Valorización N° 01, el área de TESORERIA, realizó la retención de S/. 65,000.00, que corresponde al 5% (Retención de Contrato del 10%), SIAF N° 2003.

MONTO CONTRATO	RETENCION CONTRATO 10%	RETENCION VALORIZ. 01	RETENCION VALORIZ. 02	TOTAL RETENCION
1,300,000.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00

El monto a cancelar al COSORCIO VIAL SANTA ROSA, asciende a la suma de S/. 191,672.96 (Ciento Noventiun Mil Seiscientos Setentidos con 96/100 Soles). con un avance físico Actual de 23.79%.

**5. CONCLUSIONES:**

Se esta alcanzando el Jefe de Operaciones del IVP-SCH, Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez, para el tramite correspondiente.

**6. RECOMENDACIONES**

Se recomienda realizar las coordinaciones respectivas con los profesionales que emitieron sus respectivos informes de la Valorización N° 02, del **Servicio: "MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA – LONG. = 8.970 KM – CUSHIPE – ARGALLAMA – EMP. PE – 3N (LA CRUZ) LONG. = 6.300 KM – DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.**, para la correcta presentación.



229  
OT



Instituto Vial Provincial

*Instituto Vial Provincial*

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD



MPSCH

Es cuanto tengo que informar a Ud., para los fines que estime conveniente.

ADJUNTO:

INFORME N° 1170-2020-MPSCH/DIST/SGI

INFORME N° 214-2020-HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH

CARTA N° 004-2020-VRA-IO/MPSCH

INFORME N° 004-2020-VARA/INSP. (225 FOLIOS Inc. Valorización N° 01)

Atentamente,

  
-----  
Marcial Nicolás Barrantes Parimango  
ING. CIVIL  
R. CIP. N° 225678





# Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD




228

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019  
E-mail: mpsch@terra.com.pe

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

## INFORME N° 1170 - 2020-MPSCH/DIST/SGI



**A :** ING. RAFAEL K. VALENCIA REBAZA  
Gerente de IVP de la MPSCH

**DE :** ING. DAVID IVAN SILVA TORRES  
Sub Gerente de Infraestructura – MPSCH

**ASUNTO :** CONFORMIDAD DE VALORIZACION N° 02 CONTRATISTA – CONTRACTUAL (TRAMO 09)

**REFERENCIA :** (01) INFORME N°0214-2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH  
(02) CARTA N° 004-2020-VRA-IO/MPSCH  
(03) OBRA: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: TRAMO 01: SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA" - LONG. = 8.970 KM - TRAMO 02: CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ)" - LONG. = 6.300 KM EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD." Perteneciente al paquete N°09  
(04) CONTRATO DE SERVICIO N° 017-2020-MPSCH-LOG

**FECHA :** Santiago de Chuco, 25 de Noviembre del 2020

Me es sumamente honroso dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo; por otro lado referente al asunto de la presente manifiesto lo siguiente:

### I. BASE LEGAL

- Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 27972 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
- Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
- Reglamento Nacional de Edificaciones

### II. ANTECEDENTE

✓ Mediante el documento de la referencia, **INFORME N°0214-2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH**, el Encargado de la División de Supervisión y Liquidación de Obras, con fecha 24 de Noviembre del 2020, da la **CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION N° 02 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO** del contratista "**CONSORCIO VIAL SANTA ROSA**"; presentado por el Ing. **VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA** - INSPECTOR de la obra denominada: "**MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: TRAMO 01: SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA**" - LONG. = 8.970 KM - TRAMO 02: **CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ)**" - LONG. = 6.300 KM EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"; quien solicita

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: TRAMO 01: SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA  
TRAMO 02: CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ)  
Ing. David Ivan Silva Torres  
Sub Gerente de Infraestructura



# Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019  
E-mail: mpsch@terra.com.pe

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

el Pago N° 02 por servicios de ejecución de obra al CONTRATISTA “CONSORCIO VIAL SANTA ROSA.”

### III. ANALISIS FINANCIERO

Se detallan en los cuadros de los tramos valorizados

**TRAMOS N°09.01: SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA” - LONG. = 8.970 KM**

VALORIZACION BRUTA	S/. 138,375.29
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (-) SIN IGV	S/. -
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (-) SIN IGV	S/. -
VALORIZACION NETA	S/. 138,375.29
IGV (18%)	S/. 24,907.55
VALORIZACION (INCL. IGV)	S/. 163,282.84
RETENCION DE 10% FIEL CUMPLIMIENTO	

**TRAMOS N°09.02: CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ)” - LONG. = 6.300 KM**

VALORIZACION BRUTA	S/. 79,144.17
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (-) SIN IGV	S/. -
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (-) SIN IGV	S/. -
VALORIZACION NETA	S/. 79,144.17
IGV (18%)	S/. 14,245.95
VALORIZACION (INCL. IGV)	S/. 93,390.12
RETENCION DE 10% FIEL CUMPLIMIENTO	

### COSTO GLOBAL DE TODO EL SERVICIO

VALORIZACION BRUTA	S/. 217,519.46
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (-) SIN IGV	S/. -
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (-) SIN IGV	S/. -
VALORIZACION NETA	S/. 217,519.46
IGV (18%)	S/. 39,153.50
VALORIZACION (INCL. IGV)	S/. 256,672.96
RETENCION DE 10% FIEL CUMPLIMIENTO	S/. 121,864.12
MONTO TOTAL	S/. 134,808.84

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
CALLE 19 DE ABRIL N° 1000  
SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco  
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019  
E-mail: mpsch@terra.com.pe

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ La **Valorización Bruta N° 02 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO** del contratista fue por **S/. 217,519.46 (DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS DIESCINUEVE CON 46/100 SOLES)**.
- ✓ Se recomienda hacer el descuento por el monto de la **RETENCION DE 10 % GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO ES DE S/. 121,864.12 (CIENTO VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 12/100 SOLES) INCLU IGV**; si esta recomendación ya se aplicó obviarla.
- ✓ La Amortización del Adelanto Directo: -
- ✓ La Amortización del Adelanto de Materiales: -
- ✓ Por lo tanto, el monto a cancelar al **CONTRATISTA POR CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA VALORIZACION N°02 – POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO**; asciende a **S/. 256,672.96 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 96/100 SOLES) INCL. IGV**; se recomienda hacer la retención de fiel cumplimiento.

*Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y acciones que estime por conveniente, salvo mejor parecer.*

Atentamente,

Adjunto:

- Referencias
- Val N°02( )
- Digital ( )

Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco  
SUSCRIPCIÓN DE INFR...



# Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019  
E-mail: mpsch@terra.com.pe



## INFORME N° 214 - 2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH

**A :** ING° DAVID IVAN SILVA TORRES  
SUB-GERENTE DE INFRAESTRUCTURA MPSCH

**DEL :** ING. HERMES M. MELENDEZ TAMAYO  
JEFE (e) DIVISION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

**ASUNTO :** VALORIZACIÓN DE SERVICIO N°02 - OCTUBRE 2020

**REFERENCIA:** a) "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO I: SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG=8.970KM -TRAMO II: CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG=6.300KM - DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"  
b) Carta N°004-2020 - VRA- IO/MPSCH  
c) Carta N°004-2020/CONSORCIO VIAL SANTA ROSA/RL/EGD

**FECHA :** Santiago de Chuco, 19 de Noviembre del 2020

Es grato dirigirme a Usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo, vistos los documentos de la referencia, el suscrito como Jefe de la División (e) de Supervisión y Liquidaciones de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco **OTORGA LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN N° 02- OCTUBRE 2020** del Servicio de "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO I: SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG=8.970KM -TRAMO II: CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG=6.300KM - DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD" y elaborado por el Contratista **CONSORCIO VIAL SANTA ROSA** según Contrato de Servicios N° 017-2020-MPSCH-LOG.

Se informa trabajos valorizados en el periodo del 01 al 31 de Octubre 2020. Se adjunta 01 original + 01 copia + CD.

### DATOS GENERALES

#### 1.- DENOMINACION

"MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO I: SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG=8.970KM -TRAMO II: CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG=6.300KM - DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

#### 2.- UBICACIÓN

- Caseríos : TRAMO I: Santa Rosa, Santa Cruz de Chuca, Llaturpamba  
TRAMO II: Cushipe, Argallama
- Distrito : Santiago de Chuco
- Provincia : Santiago de Chuco
- Región : La Libertad

#### 3.- DATOS DEL MANTENIMIENTO:

##### EJECUTOR

- Proceso de Selección : RES-PROG-09-2020-MPSCH/CS
- Contratista : CONSORCIO VIAL SANTA ROSA
- Representante Legal : Edgar Gómez Domínguez
- Contrato de Servicios : N° 017-2020-MPSCH-LOG.
- Suscripción de Contrato : 28/08/2020
- Modalidad : A Suma Alzada



# Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019

E-mail: mpsch@terra.com.pe

- Monto Contratado (inc. IGV) : S/ 1'300,000.00
- Monto del Tramo : S/ 1'300,000.00
- Factor de Relación : 1.0000
- Plazo de Ejecución Inicial : 500 Días Calendarios
- Entrega de Terreno : 29/08/2020
- Inicio de Plazo Contractual Serv. : 22 de Setiembre del 2020
- Fecha Término Programado : 31 de Diciembre del 2020
- Residente de Obra : Ing. Luis Alberto Gonzales Navarro CIP 113398

## TRAMO I: Santa Rosa, Santa Cruz de Chuca, Llaturpamba

- Porcentaje Programado : 32.75 %
- Porcentaje Programado Acumulado : 37.43 %
- Porcentaje Ejecutado : 25.76 %
- Porcentaje Ejecutado Acumulado : 32.51 %
- Estado del Mantenimiento : Atrasado
- Monto Valorizado : S/ 163,282.84

## TRAMO II: Cushipe, Argallama

- Porcentaje Programado : 32.78 %
- Porcentaje Programado Acumulado : 37.46 %
- Porcentaje Ejecutado : 20.98 %
- Porcentaje Ejecutado Acumulado : 29.64 %
- Estado del Mantenimiento : Atrasado
- Monto Valorizado : S/ 93,390.12

## INSPECTOR

- Inspector : Ing. Vanessa Abigail Rodríguez Arteaga CIP 194012
- Contrato de Inspección de Obra : N° 029-2020-MPSCH-LOG.
- Fecha de Contrato : 24/08/2020
- Plazo de Prestación de Servicio : 120 Días Calendario
- Monto Contratado (inc. IGV) : S/ 14,506.50



## 4.- ANTECEDENTES

- Con fecha 28 de Agosto del 2020 se firma el Contrato de Servicios N°0017-2020-MPSCH-LOG del Mantenimiento Periódico y Rutinario "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO I: SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA LONG=8.970KM – TRAMO II: CUSHIPE – ARGALLAMA – EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG=6.300KM - DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD" con la Empresa Contratista CONSORCIO VIAL SANTA ROSA por un monto de S/ 1'300,000.00, con un plazo de ejecución de 500 días calendario.
- El día 24 de Agosto del 2020 se firma el Contrato de Inspección de Servicio N°029-2020-MPSCH-LOG con el Consultor Ing. Vanessa Abigail Rodríguez Arteaga CIP 194012 por un monto de S/ 14,506.50, con un plazo de ejecución de 120 días calendario.
- Con fecha 29/08/2020 se firma el Acta de Entrega de Terreno con la participación de representantes de todos los involucrados.
- El 22/09/2020 se firma el Acta de Inicio de Obra con una fecha programada de término de servicio del 31 de Diciembre 2021.
- Con fecha 12 de Setiembre el Inspector recepciona la Carta N°002-2020/CONSORCIO VIAL SANTA ROSA/RL/EGD con la cual el Consorcio Vial Miraflores hace entrega del Plan de Trabajo para su revisión y tramite respectivo.
- El Ingeniero Inspector del Servicio mediante Carta N°002-2020-VRA-IO/MPSCH del 15 de Setiembre del 2020 ingresa por mesa de partes de la Entidad con Expediente Administrativo N° 4438 el Plan de Trabajo aprobado para su Conformidad.
- Mediante INFORME N°123-2020-HMMT/DEYP/SGI/MPSCH, de fecha 17 de Setiembre del 2020 la División de Estudios y Proyectos otorga la Conformidad del Plan de Trabajo y sugiere su aprobación mediante la Resolución Respectiva.



# Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD


Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019

E-mail: mpsch@terra.com.pe



223

- Con Resolución de Gerencia Municipal N°00312-2020-MPSCH/GM de fecha 28 de Setiembre 2020 de Aprueban el Plan de Trabajo del Mantenimiento Rutinario y Periódico.
- Mediante Carta N°003-2020-VRA-IO/MPSCH el Ing. Inspector hace llegar la Valorización de Servicio N°01 – Setiembre 2020 incluyendo la Carta N°003-2020/CONSORCIO VIAL SANTA ROSA/RL/EGD para su revisión y conformidad de pago.
- Mediante Carta N°004-2020-VRA-IO/MPSCH El Ing. Inspector hace llegar la Valorización de Servicio N°02 – Octubre 2020 incluyendo la Carta N°004-2020/CONSORCIO VIAL SANTA ROSA/RL/EGD para su revisión y conformidad de pago.



## 5.- DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

- Movilización de Equipos y Maquinaria desde Trujillo a pie de obra. Se ha trasladado 01 excavadora, 01 motoniveladora, 01 rodillo liso autopropulsado, 01 cisterna para agua, 04 volquetes de 15m<sup>3</sup>, 01 camioneta.
- Ejecución de partida de Trazo y Replanteo al 50% aproximadamente del total de los tramos con el uso de equipo topográfico completo y dejando monumentados BMs y niveles.
- Ejecución de Capa Nivelante de e=0.05m empleando 1,550m<sup>3</sup> de material, acumulando 1,550 m<sup>3</sup> que representa aprox. el 55% del metrado total.
- Colocación, nivelación, conformación y compactación de Material Granular para afirmado habiendo empleado 3,300m<sup>3</sup> de material con el uso de maquinaria, acumulando 3,300 m<sup>3</sup> correspondiendo al 55% aprox. del total.
- Extracción, selección, acarreo y apilamiento en lugares estratégicos de 17,100 m<sup>3</sup> aprox. De material para afirmado.
- Eliminación de aproximadamente 5,750 m<sup>3</sup> de material excedente hasta botaderos autorizados.
- Conformación y Perfilado de Cunetas con maquinaria y mano de obra en tramo de 7,200 ml, acumulando 7,200 ml que es el 58% aprox. de la longitud total.
- Implementación de protocolos de seguridad y equipamiento con EPPs para todo el personal.

## 6.- DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

### RESUMEN VALORIZACIÓN N° 02 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (Octubre 2020)

#### TRAMO I: Santa Rosa, Santa Cruz de Chuca, Llaturpamba

<b>VALORIZACIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>SIN IGV</b>		<b>S/. 138,375.29</b>
	S/.	0.00	
<b>REINTEGROS ( REAJUSTES RECONOCIDOS )</b>	<b>SIN IGV</b>		<b>S/. 0.00</b>
	S/.	0.00	
<b>VALORIZACION BRUTA</b>			<b>S/.138,375.29</b>
<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>SIN IGV</b>		<b>S/.0.00 (-)</b>
ADELANTO DIRECTO	S/.	0.00	
ADELANTO PARA MATERIALES	S/.	0.00	
<b>DEDUCCIONES ( DQNC )</b>			<b>S/. 0.00</b>
ADELANTO DIRECTO	S/.	0.00	
ADELANTO PARA MATERIALES	S/.	0.00	
<b>VALORIZACION NETA</b>			<b>S/. 138,375.29</b>
<b>I. G. V. 18.00%</b>			<b>S/. 24,907.55</b>



# Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019  
E-mail: mpsch@terra.com.pe



**NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA**

**S/. 163,282.84**

SON : CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 84/100 SOLES

RESUMEN VALORIZACIÓN N° 02 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO  
(Octubre 2020)

TRAMO II: Cushipe, Argallama



<b>VALORIZACIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>SIN IGV</b>	<b>S/. 79,144.17</b>
	S/. 0.00	
<b>REINTEGROS ( REAJUSTES RECONOCIDOS )</b>	<b>SIN IGV</b>	<b>S/. 0.00</b>
	S/. 0.00	
<b>VALORIZACION BRUTA</b>		<b>S/.79,144.17</b>
<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>SIN IGV</b>	<b>S/0.00 (-)</b>
ADELANTO DIRECTO	S/. 0.00	
ADELANTO PARA MATERIALES	S/. 0.00	
<b>DEDUCCIONES ( DQNC )</b>		<b>S/. 0.00</b>
ADELANTO DIRECTO	S/. 0.00	
ADELANTO PARA MATERIALES	S/. 0.00	
<b>VALORIZACION NETA</b>		<b>S/. 79,144.17</b>
<b>I. G. V. 18.00%</b>		<b>S/. 14,245.95</b>
<b>NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA</b>		<b>S/. 93,390.12</b>

SON : NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 12/100 SOLES

## 7.- TOTAL A CANCELAR POR VALORIZACIÓN DE SERVICIO N°02 – OCTUBRE 2020

TRAMO I: Santa Rosa, Santa Cruz de Chuca, Llaturpamba S/. 163,282.84

TRAMO II: Cushipe, Argallama S/. 93,390.12

**TOTAL A CANCELAR VALORIZACIÓN DE SERVICIO N°02 – OCTUBRE 2020 S/. 256,672.96**

**SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 96/100 SOLES**

## 8.- ANALISIS

- Se ha revisado el trámite seguido a los documentos de la referencia generados por el Contratista y el Inspector del Servicio.
- El Ing. Inspector del Servicio, en las conclusiones de su informe, debe ser claro y específico respecto a la aprobación de la Valorización de Servicio correspondiente.
- El Informe de Aprobación de la Valorización del Servicio emitido por el Inspector indica que la valorización está de acuerdo con lo ejecutado y cumple con el contenido de documentos e



# Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019  
E-mail: mpsch@terra.com.pe

información técnica requerida y necesaria para el cumplimiento de las metas y objetivos del servicio contratado.

- La obra se encuentra ATRASADA en su ejecución con un avance ejecutado acumulado del 31.33% y un acumulado programado 37.44% (Atrasado en 6.11%)

## 9.- RECOMENDACIONES

- Se recomienda al Ing. Residente e Ing Inspector que deben presentar la documentación con el número de ejemplares originales y copias establecidos, contenido en formato digital y con el uso de separadores y la numeración requerida.
- Se recomienda al Ing. Residente e Ing Inspector que deben firmar todos los folios de la Valorización de todos los documentos que se presenten para su trámite. El Representante Legal también debe firmar todos los folios.
- Presentar todos los Análisis de Materiales y pruebas de campo requeridos (Estudio de Canteras, CBR, Densidad de Campo, etc) realizados en un laboratorio que cuente con autorización de INDECOPI.
- Presentar registro fotográfico de la ejecución de las partidas con su respectiva descripción.
- Verificar el cumplimiento de plan de trabajo, especialmente la Adecuación e Implementación de Protocolos ante la Emergencia Sanitaria por el Covid 19.

## 10.- CONCLUSIONES

- El Ing. Inspector del Servicio, en su informe, APRUEBA la Valorización de Servicio N°02 - Octubre 2020.
- Luego de su revisión, la Jefatura de la División de Supervisión y Liquidación de Obras de la Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, **OTORGA LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN N°02 - OCTUBRE** del Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario – Paquete N°09 “MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO I: SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA LONG=8.970KM –TRAMO II: CUSHIPE – ARGALLAMA – EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG=6.300KM - DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD” y aprobado por el Inspector de Obra y sugiere su **CANCELACION** en cumplimiento de las cláusulas contractuales.

Es todo cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
  
Ing. **Hermes M. Meléndez Tamayo**  
CIP. 111451  
División de Supervisión y Liquidaciones



VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERA CIVIL

000 220

C.I.P. N°: 194012

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Santiago de Chuco, 05 de noviembre de 2020.

PROCESO 9  
(02 TRAMOS)

**CARTA N° 004-2020-VRA-IO/MPSCH.**

**A: DR. FELIPE WILMER ANGULO ZAVALETA**  
Gerente de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.

**DE: ING. VANESSA ABIGAIL RODRÍGUEZ ARTEAGA**

**ASUNTO: PRESENTO VALORIZACIÓN N° 02 DEL CONTRATISTA**

REFERENCIA:

**SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - "SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG=8.970KM", - "CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM" - DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.**

A consideración:

Tengo a bien dirigirme a usted como inspector para saludarlo cordialmente, al mismo tiempo presentarle la Valorización N° 02 del contratista CONSORCIO VIAL SANTA ROSA que corresponde al "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - "SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG=8.970KM", - "CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM" - DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"; en el periodo desde el 01 hasta 31 de octubre del presente año.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO  
GERENCIA MUNICIPAL  
**PROVEIDO**  
PASE a: INFRAESTRUCTURA  
PARA: SU ATENCIÓN  
PREVIA REVISIÓN V°B°  
FECHA: 05/11/20

*Vanessa*  
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO  
**MESA DE PARTES**  
N° Exp: 622  
**05 NOV. 2020**  
N° Folios: 1 original  
Hora: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_



"Año de la universalización de la salud"

**INFORME N° 004 – 2020 –VARA/INSP**

**A** : **ING. RAFAEL K. VALENCIA REBAZA.**  
Gerente de IVP de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.

**DE** : **ING. VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTIAGA.**  
Inspector del servicio

**ASUNTO** : **VALORIZACIÓN N° 02 - PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.**

**REFERENCIA** : **SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - "SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG=8.970KM", - "CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM" - DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD**

**FECHA** : Santiago de Chuco 05 de Noviembre del 2020

Mediante el presente tengo a bien de alcanzarle el pronunciamiento al informe mensual del contratista referente a la Valorización N° 02 del: "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - "SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG=8.970KM", - "CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM" - DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD", detallando lo siguiente:

**I. ANTECEDENTES.**

- a) Conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local.
- b) La Ley Orgánica de Municipalidades señala que las municipalidades provinciales y distritales, dentro del marco de las competencias y funciones específicas, son competentes para promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales.
- c) Mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprobó la reanudación de las actividades: "Mantenimientos, Mejoramiento y Conservación Rutinarios y Periódicos de Vías Nacionales, Departamentales y Locales" y de acuerdo a lo señalado en el numeral 1.2 del Artículo 1 del mencionado decreto supremo, las referidas actividades se encuentran autorizadas para su reanudación de forma automática, una vez que las personas jurídicas que realizan dichas labores registren su "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.
- d) Con Decreto de Urgencia N° 070-2020 se dictó medidas destinadas a generar empleo para la ejecución de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional, departamental y vecinal a efectos de establecer medidas necesarias, en materia económica y financiera, que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco de sus competencias, la ejecución de acciones oportunas para la reactivación de la actividad económica, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento periódico y rutinario de las vías nacionales, departamentales y vecinales. Los trabajos de mantenimiento proyectado facilitan el





C.I.P. N°: 194012

**VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA**  
INGENIERA CIVIL

traslado de los productos agropecuarios de las zonas a intervenir, hasta los centros de consumo, permitiendo garantizar el abastecimiento de los productos a consecuencia de la Emergencia Sanitaria generada por el brote del Coronavirus (COVID 19).

- e) El Decreto de Urgencia N° 070-2020 014-2019 estableció, entre otras, medidas que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco de sus competencias, la ejecución de acciones oportunas, en el marco de la emergencia sanitaria generada por el pandemia COVID-19, para la reactivación de la actividad económica a nivel nacional y atención a la población, fomentando trabajo local a través de mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento periódico y rutinario de las vías departamentales y vecinales.
- f) Al respecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 del D.U. N° 070- 2020, numeral 21.3, los Titulares de los pliegos habilitados en la presente transferencia de partidas aprueban mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 21.1, a nivel programático, dentro de los cuales se registran el desagregado del **INSPECTOR**, quien estará a cargo de Monitorear y evaluar la calidad técnica del servicio, considerando al plan de trabajo como documento técnico de calidad del servicio.
- g) En ese sentido, la presencia del Inspector, es prioritario y como profesional competente para Monitorear y evaluar la calidad técnica del servicio mediante las actividades programadas en el Plan de Trabajo de cada uno de los caminos vecinales priorizados por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, en el marco del D.U. N° 070-2020.
- h) El objetivo como profesional es Inspeccionar, controlar, Fiscalizar y verificar la ejecución de las actividades de mantenimiento vial dando cumplimiento al Plan de Trabajo aprobado por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, en el marco del D.U. N° 070-2020.

## II. DATOS GENERALES DEL SERVICIO:

### 1. Nombre del Servicio

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - "SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG=8.970KM", - "CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM" - DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD".

### 2. Ubicación

Región : LA LIBERTAD

Provincia : SANTIAGO DE CHUCO

Distrito : SANTA CRUZ DE CHUCA

Caserío : SANTA ROSA - LLATURPAMBA - CUSHIPE - ARGALLAMA

### 3. Proceso De Adjudicación del Servicio

PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 009-2020-MPSCH/CS

### 4. Fuente de financiamiento

Recursos por operaciones oficiales de crédito (ROOC)



*Vanessa*  
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012



C.I.P. N°: 194012

**VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA**  
**INGENIERA CIVIL**

5. **Modalidad Contratación**  
a Suma Alzada
  6. **Contrato de Servicio**  
N° 017-2020-MPSCH/LOG
  7. **Decreto de Urgencia**  
N° 070-2020
  8. **Fecha de Suscripción**  
28 de agosto del 2020
  9. **Ejecutor De Servicio**  
CONSORCIO VIAL SANTA ROSA  
Conformado por:  
CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C. RUC: 20568073658  
ECAN INGENIERIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ECAN INGENIERIA S.R.L. RUC: 20600813715  
Representante Legal: Sr. Edgar Gomez Dominguez.
  10. **Residente De Obra**  
ING. LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO
  11. **Monto Contratado Para La Ejecución Del Servicio**  
S/. 1,300,000.00 (Un millón Trescientos mil con 00/100 Soles). inc el IGV.
  12. **Fecha Entrega Terreno**  
29 de agosto del 2020 (Elaboración del Plan de Trabajo)
  13. **Fecha de Conformidad de Plan de Trabajo**  
21 de Setiembre del 2020
  14. **Fecha de Inicio de Servicio**  
22 de Setiembre del 2020
  15. **Plazo de Ejecución**  
120 DIAS CALENDARIOS
  16. **Fecha Límite de ejecución**  
31 de Diciembre del 2020
- DATOS DE INSPECCIÓN**
17. **Contrato Inspección**  
N° 029 - 2020 - MPSCH-LOG.



*Vanessa Arteaga*  
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERA CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012



**18. Fecha Contrato Inspección**

24 de Agosto 2020

**19. Inspector del Servicio**

ING. VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA

Ingeniero Civil con Reg. CIP N° 194012

**20. Monto Contratado Para La Inspección del Servicio**

S/. 14,506.50 (Catorce mil Quinientos Seis con 50/100 Soles).

**21. Plazo Prestación Inspección**

120 días calendarios


**III. DE LA PRESENTACIÓN DE LA VALORIZACION**

Mediante la Carta N° 0004-CONSORCIO VIAL SANTA ROSA, de fecha 30 de Octubre, la empresa CONSORCIO VIAL SANTA ROSA, con representante común Edgar Gomez Dominguez, realizo la entrega de la Valorización N° 02 del "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - "SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG=8.970KM", - "CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM" - DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"- a mi persona en calidad de INSPECTOR para su evaluacion y posteriormente su aprobacion.

**IV. ESTADO FÍSICO DE LA OBRA**

El Avance Físico de la obra en los dos tramos nos refleja un avance ejecutado de 23.79%, en el periodo comprendido para el mes de Octubre del 2020, en comparación al 32.76% del Avance Programado Mensual; además se hace mención que el avance ejecutado Acumulado es 31.33 %, contra el avance programado acumulado que es de 37.44%, por lo tanto, nos refleja un atraso en el presente periodo de -6.11%.

**Cuadro de Avance de Obra**

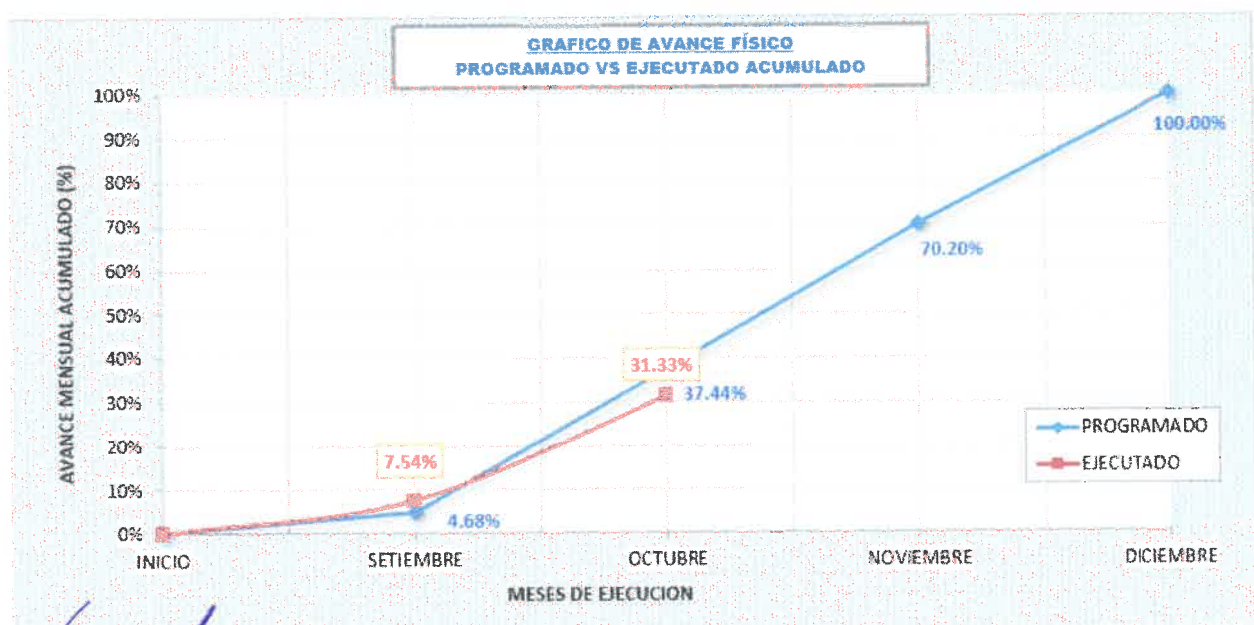

*Vanessa Arteaga*  
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012



## 1. SITUACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra en ejecución; documentado en los datos de la ficha de control del avance programado vigente, el avance programado acumulado es de 37.44%, y el ejecutado acumulado 31.33%.

### COMENTARIOS:

La obra se viene desarrollando con normalidad en los dos tramos desde el 22 de setiembre del 2020.

## 2. LABORES EFECTUADAS POR EL INSPECTOR EN EL PRESENTE PERIODO

- Verificación de la movilización de equipos y maquinaria a obra.
- Verificación de los trabajos de trazo y replanteo.
- Inspección de los trabajos correspondientes a la capa nivelante E=0.05m.
- Verificación de los trabajos de conformación de base con material granular de cantera E=0.15m.
- Control y verificación de las actividades correspondientes al transporte de material granular y material excedente hasta y mayor a un KM.
- Se verificaron los trabajos de reconfiguración de cunetas.
- Revisión y control de la Programación del servicio.
- Verificación de los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las partidas conformantes del Plan de Trabajo.
- Elaboración de metrados de obra ejecutada.
- Control de la Programación y Avance de Obra.
- Coordinaciones y reuniones con el Contratista para lograr que la obra se ejecute de acuerdo a lo programado.
- Preparación y presentación de Informe Mensual.
- Control del Plan de Seguridad y Salud en Obra, incluyendo las medidas del plan para la vigilancia prevención y control del COVID-19.
- Se verifico la ejecución de partidas correspondientes al periodo del 01 al 31 de octubre del 2020.



*Vanessa Arteaga*  
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERA CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012



C.I.P. N°: 194012

**VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA**  
**INGENIERA CIVIL**

**V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

Finalmente, se concluye dando opinión favorable de esta supervisión para la conformidad del Pago a Favor del **CONSORCIO VIAL SANTA ROSA** por concepto de ejecución del: **SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - "SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG=8.970KM", - "CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM" - DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"** correspondiente a la Valorización N° 02 del Mes de Octubre del 2020 por el monto de S/.256,672.96 (Doscientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Setenta y Dos con 96/100 Soles).; incluido el IGV, que corresponde al 23.79 % de Avance Físico de Obra.

Sin otro particular y atento de brindarle mi servicio, me suscribo de Usted..


Atentamente,

  
  
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERA CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012



- CARTA DE LA  
EMPRESA  
DIRIGIDA AL  
INSPECTOR.

**Luis A. Gonzales Navarro**  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398





**CARTA N°004-2020/CONSORCIO VIAL SANTA ROSA/RL/EGD.**

**SR.** : **ING. VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA**  
Inspector de Servicio

**ASUNTO** : **ALCANZA VALORIZACION DE SERVICIO N° 02**

**REFERENCIA** : “SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG. =8.970KM, - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD”.

**FECHA** : **31 DE OCTUBRE DEL 2020**

---

Me es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo y al mismo tiempo alcanzarle el INFORME DE VALORIZACION N° 02 correspondiente al mes de octubre del 2020 (periodo de 01 de octubre del 2020 al 31 de octubre del 2020). Para su respectiva revisión y aprobación.


Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente:

CONSORCIO VIAL SANTA ROSA  
  
.....  
EDGAR GOMEZ DOMINGUEZ  
DNI N° 44944779  
REPRESENTANTE COMUN

Cc:

- Archivo






- FICHA  
TECNICA.

  
  
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

  
Luis A. Gonzales Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398



# 1-A: FICHA TECNICA DEL CAMINO VECINAL

000216

1. **Municipalidad**

2. **Datos Responsable:**  Fecha:

Cargo:

3. **Ubicación Política Administrativa:** **Cod. Ubigeo:**

Distrito(s):

Provincia(s):

Departamento:

4. **Datos del SINAC: Clasificador de Rutas Vigente**

Jerarquía Vial:  Código de Ruta:

Código de Ruta Provisional (Rutas sin Clasificar):

Trayectoria:

5. **Ubicación Geográfica:**

De la Ruta:

**Inicio:** Descripción

Progresiva:  Cota:  msnm ZONA:

Coordenada (UTM - WGS84):  N  E

**Fin:** Descripción

Progresiva:  Cota:  msnm ZONA:

Coordenada (UTM - WGS84):  N  E

Sello y Firma de Responsable de elaboración del ICV

**Nota:** La Información de la Ficha debe tener el respaldo de la Información digital respectiva: Archivos GPS (Puntos=Waypoints y Eje Vial=Tracks), Fotografías (jpg), Video de la Obra (formato Avi). Deberá entregar en DVD.



*Vanessa Rzt.*  
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

*Luis A. Gonzales Navarro*  
Luis A. Gonzales Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398


**1-A: FICHA TECNICA DEL CAMINO VECINAL**1. **Municipalidad** 2. **Datos Responsable:**  Fecha: Cargo: 3. **Ubicación Política Administrativa:**  **Cod. Ubigeo:** Distrito(s):  Provincia(s):  Departamento:  4. **Datos del SINAC: Clasificador de Rutas Vigente**Jerarquía Vial:  Código de Ruta: R131032 – R131033Código de Ruta Provisional (Rutas sin Clasificar): Trayectoria: 5. **Ubicación Geográfica:****De la Ruta:**Inicio: Descripción Progresiva:  Cota:  msnm ZONA: Coordenada (UTM - WGS84):  N  EFin: Descripción Progresiva:  Cota:  msnm ZONA: Coordenada (UTM - WGS84):  N  E

Sello y Firma de Responsable de elaboración del ICV

**Nota:** La Información de la Ficha debe tener el respaldo de la Información digital respectiva: Archivos GPS (Puntos=Waypoints y Eje Vial=Tracks), Fotografías (jpg), Video de la Obra (formato Avi). Deberá entregar en DVD.



Vanessa  
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

  
Luis A. Gonzales Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398



- **FACTURA DEL  
CONTRATISTA.**

*Vanesa R. A.*  
 VANESSA ABIGAIL RODRÍGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

*Luis A. Gonzales Navarro*  
Luis A. Gonzales Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398



000212




- **INFORME DE RESIDENTE.**



*Vanessa Arcaid R. Arteaga*  
VANESSA ARCAID RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

Luis A. Gonzales Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398





**VALORIZACION N°02 – OCTUBRE 2020**

OBRA : "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG.=8.970KM, - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL SANTA ROSA

INSPECTOR : VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA – CIP 194012

RESIDENTE : LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO – CIP 113398

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

PERIODO : DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020



*Vanessa 02x*  
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

**OCTUBRE 2020**

*Luis A. Gonzales Navarro*  
Luis A. Gonzales Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398





INFORME MENSUAL 02  
(OCTUBRE – 2020)  
EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO  
FASE: II

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

1.1. NOMBRE DEL SERVICIO:

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG. =8.970KM, - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

1.2. N° DE CONTRATO:



CONTRATO DE SEVICIO: N° 017-2020-MPSCH-LOG.

1.3. ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

1.4. CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL SANTA ROSA

  
  
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

DATOS DEL CONSORCIADO 1

RUC: 20568073658

RAZÓN SOCIAL: ECAN INGENIERIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RLTD.

DIRECCIÓN: PRO. HUANCABAMBA N° 211 (URB. OXAPAMPA)

DATOS DEL CONSORCIADO 2

RUC: 20600813715

RAZON SOCIAL: CORPORACIÓN SORIANO L Y C S.A.C.

DIRECCION: MZA. T LOTE 17 – Urbanización San Andrés 5ta. La libertad

  
Luis A. Gonzales Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398

1.5. INSPECTOR:

VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA con CIP 194012.





**1.6. RESIDENTE:**

LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO con CIP 113398.

**1.7. MONTO DE CONTRATO:**

S/. 1,300,000.00 INC. IGV.

**1.8. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO:**

S/. 1,079,000.00 INC. IGV.

**1.9. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:**

S/. 195,000.00 INC. IGV.

**1.10. PLAZO DE EJECUCIÓN:**

120 DIAS CALENDARIOS

**1.11. FECHA DE INICIO:**

22 DE SETIEMBRE DEL 2020

**1.12. FECHA DE CULMINACIÓN:**

31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

**2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS – FASE II:**

**2.1. TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA - SANTA CRUZ DE CHUCA - SANTIAGO DE CHUCO**

**2.1.1. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.**

Durante el periodo de 01 de octubre del 2020 al 31 de octubre del 2020  
Se trabajó en las siguientes partidas:

**02.00 PAVIMENTOS**

02.01 Capa Nivelante E=0.05M

02.02 Material Granular de Cantera E=0.15M

**03.00 TRANSPORTE**

03.01 Transporte de Material Granular hasta 1 KM


03.02 Transporte de Material Granular mayor a 1 KM

03.03 Transporte de Material Excedente hasta 1 KM

03.04 Transporte de Material Excedente mayor a 1 KM

**04.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE**

04.01 Reconformación de Cunetas

*Vanessa P. et.*  
  
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

*Luis A. Gonzales Navarro*  
  
Luis A. Gonzales Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398





**07.00 EMERGENCIA SANITARIA**

07.01 Emergencia sanitaria COVID-19

**2.1.2. DETALLE DE CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADOS Y ANEXAR LOS CERTIFICADOS DE LABORATORIO.**

Durante el periodo de 01 de octubre del 2020 al 31 de octubre del 2020 se realizaron actividades que ameriten controles de calidad como densidad de campo en el tramo intervenido.

**2.2. TRAMO CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) - SANTA CRUZ DE CHUCA - SANTIAGO DE CHUCO**

**2.2.1. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.**

Durante el periodo de 01 de octubre del 2020 al 31 de octubre del 2020 Se trabajo en las siguientes partidas:

**02.00 PAVIMENTOS**

02.01 Capa Nivelante E=0.05M

02.02 Material Granular de Cantera E=0.15M

**03.00 TRANSPORTE**

03.01 Transporte de Material Granular hasta 1 KM

03.02 Transporte de Material Granular mayor a 1 KM

03.03 Transporte de Material Excedente hasta 1 KM

03.04 Transporte de Material Excedente mayor a 1 KM

**04.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE**

04.01 Reconformación de Cunetas

**07.00 EMERGENCIA SANITARIA**

07.01 Emergencia sanitaria COVID-19



*Vanessa Art.*  
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

**2.2.2. DETALLE DE CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADOS Y ANEXAR LOS CERTIFICADOS DE LABORATORIO.**

Durante el periodo de 01 de octubre del 2020 al 31 de octubre del 2020 se realizaron actividades que ameriten controles de calidad como densidad de campo en el tramo intervenido.

**3. ESTADO DE SITUACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO – FASE II:**

**3.1. SITUACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES**

**3.1.1. TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA - SANTA CRUZ DE CHUCA - SANTIAGO DE CHUCO**

**3.1.1.1. DETALLAR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y LOS PORCENTAJES DE AVANCE.**

Durante el periodo de 01 de octubre del 2020 al 31 de octubre del 2020 Se realizaron los trabajos en las siguientes partidas.

*Luis A. Gonzales Navarro*  
Luis A. Gonzales Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398





**CONSORCIO VIAL**  
**SANTA ROSA**

000207

**02.00 PAVIMENTOS**

02.01 Capa Nivelante E=0.05M

Esta partida cuenta con un avance del 40.13%.

02.02 Material Granular de Cantera E=0.15M

Esta partida cuenta con un avance del 31.22%.

**03.00 TRANSPORTES**

03.01 Transporte de Material Granular hasta 1 KM

Esta partida cuenta con un avance del 30.20%.

03.02 Transporte de Material Granular mayor a 1 KM

Esta partida cuenta con un avance del 30.21%.

03.03 Transporte de Material Excedente hasta 1 KM

Esta partida cuenta con un avance del 29.81%.

03.04 Transporte de Material Excedente mayor a 1 KM

Esta partida cuenta con un avance del 29.89%.

**04.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE**

04.01 Reconfirmación de Cunetas

Esta partida cuenta con un avance del 40.13%.

**07.00 EMERGENCIA SANITARIA**

07.01 Emergencia sanitaria COVID-19

Esta partida cuenta con un avance del 25.00%.

*Vanessa R. A.*  
  
VANESSA ARZOBAL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

**3.1.1.2. DETALLAR LOS CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADAS Y ANEXAR LOS CERTIFICADOS DE LABORATORIO.**

Durante el periodo de 01 de octubre del 2020 al 31 de octubre del 2020 se realizaron actividades que ameriten controles de calidad como densidad de campo en el tramo intervenido.

**3.1.1.3. CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS**

Ver anexos.

**3.1.2. TRAMO CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) - SANTA CRUZ DE CHUCA - SANTIAGO DE CHUCO**

**3.1.2.1. DETALLAR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y LOS PORCENTAJES DE AVANCE.**


Durante el periodo de 01 de octubre del 2020 al 31 de octubre del 2020 Se realizaron los trabajos en las siguientes partidas.

**02.00 PAVIMENTOS**

02.01 Capa Nivelante E=0.05M

Esta partida cuenta con un avance del 41.27%.

*Luis A. Gonzalez Navarro*  
  
Luis A. Gonzalez Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398





02.02 Material Granular de Cantera E=0.15M  
Esta partida cuenta con un avance del 25.40%.

**03.00 TRANSPORTES**

03.01 Transporte de Material Granular hasta 1 KM  
Esta partida cuenta con un avance del 24.58%.

03.02 Transporte de Material Granular mayor a 1 KM  
Esta partida cuenta con un avance del 25.05%.

03.03 Transporte de Material Excedente hasta 1 KM  
Esta partida cuenta con un avance del 25.34%.

03.04 Transporte de Material Excedente mayor a 1 KM  
Esta partida cuenta con un avance del 25.25%.

**04.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE**

04.01 Reconformación de Cunetas  
Esta partida cuenta con un avance del 41.27%.

**07.00 EMERGENCIA SANITARIA**

07.01 Emergencia sanitaria COVID-19  
Esta partida cuenta con un avance del 25.00%.

**3.1.2.2. DETALLAR LOS CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADAS Y ANEXAR LOS CERTIFICADOS DE LABORATORIO.**

Durante el periodo de 01 de octubre del 2020 al 31 de octubre del 2020 se realizaron actividades que ameriten controles de calidad como densidad de campo en el tramo intervenido.

**3.1.2.3. CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS**

Ver anexos.

**3.2 SITUACIÓN DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA**

**3.2.1 RETENCIÓN DE GARANTÍAS.**

Retención del 10% como fondo de garantía de fiel cumplimiento, según cláusula séptima: Garantías, del contrato.

**3.2.2 VIGENCIA DE LAS CARTAS FIANZAS.**

No aplica.

**3.2.3 VIGENCIA DE LOS SEGUROS (SCTR, SOAT) Y ANEXAR COPIAS.**

22/12/2020.

**3.2.4 PENALIDADES (APLICADAS Y COBRADAS).**

No aplica.

*Vanessa P. A.*  
  
VANESSA ADRIANA RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

Luis A. Gonzales Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398





# CONSORCIO VIAL SANTA ROSA

000206

## 3.2.5 RELACIÓN DE PERSONAL QUE TRABAJÓ (PROFESIONAL, TÉCNICOS Y OBREROS).

PERSONAL ASEGURADO

SEDE: CONSTRUCCIÓN

Nro	NOMBRES	PATERNO	MATERNO	TIPODOC	NRODOC
1	WALDIR YON	BACILIO	BURGOS	DNI	71686699
2	DENNIS EDINSON	CABANILLAS	DEZA	DNI	76362900
3	SEM	CASTAÑEDA	CHICLAYO	DNI	75670272
4	JOSE FRANCISCO	CRUZ	SANCHEZ	DNI	47091860
5	ERICK RUBEN	DIAZ	HOYOS	DNI	42985469
6	DAVID	GALVEZ	DELGADO	DNI	80629089
7	JOSE LUIS	GARCIA	DEZA	DNI	40613637
8	CARLOS GEANPIER	GARCIA	SALAZAR	DNI	76983345
9	GILMAN HEBER	GARCIA	URBINA	DNI	43154668
10	JHONY JHONATAN	GONZALES	PINEDO	DNI	44758656
11	ISMAEL ANTONIO	GONZALEZ	GOMEZ	PAS	133697610
12	FIRMO ALEXANDER	HORNA	SOLANO	DNI	47871863
13	EDGUER	HUAMURO	GÁLVEZ	DNI	47522871
14	RAUL GUILLERMO	LEZAMA	ACON	DNI	18160028
15	LUIS IVAN	LEZAMA	ESQUIVEL	DNI	41028200
16	MEIDER ALBERTO	LLIQUE	VASQUEZ	DNI	44331477
17	JUSTO JAVIER	LOZANO	LUCAS	DNI	42456926
18	JOSE	MIRANDA	ALAYA	DNI	26618552
19	NESTOR JOSE	PADILLA	GONZALES	CE	17943813
20	ANTONELLA MARILIN	PALOMINO	BARRERA	DNI	60455306
21	LUIS WILLIAM	PASAPERA	TERRONES	DNI	19210322
22	ERICK JONATHAN	RUIZ	RIOS	DNI	70513162
23	VICTOR MANUEL	TERRONES	CRUZ	DNI	19251873
24	RICHARD	VALDERRAMA	GOMEZ	DNI	44671002
25	JOSÉLITO RUBEN	VALENCIA	LEZAMA	DNI	45676493

Extendemos la presente constancia a solicitud de nuestro cliente: CORPORACION SORIANO L &amp; C S.A.C.

## 3.2.6 RELACIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS.

Se utiliza la misma cantidad de equipos en cada uno de los tramos:

- 01 excavadora
- 01 motoniveladora
- 01 rodillo liso vibratorio
- 01 cisterna para agua
- 04 camión volquete
- 01 camioneta Pick Up



Vanessa Argañal Rodríguez Arteaga  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

Luis A. Gonzales Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398

## 3.2.7 SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIA SANITARIA.

Se viene realizando todos los trabajos respetando todos los parámetros de Emergencia Sanitaria COVID-19 según plan de trabajo.

## 4. CONCLUSIONES

- El informe mensual de Valorización N°02, obedece a los trabajos realizados desde el 01 de octubre del 2020 al 31 de octubre del 2020, dichos trabajos aprobados por el inspector designado por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.
- El porcentaje de avance físico en el Tramo SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA - SANTA CRUZ DE CHUCA Y CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) - SANTA CRUZ DE CHUCA - SANTIAGO DE CHUCO del informe mensual de Valorización N°02 es del 23.79% del ejecutado real mensual contra el 32.76% ejecutado programado mensual, frente






**CONSORCIO VIAL**  
**SANTA ROSA**

a 31.33% un programado del mes y un acumulado programado de 37.44% estando el estado del Servicio atrasado en un 8.97%.

- El monto correspondiente al informe Mensual de Valorización N°02 es de S/. 256,672.96 (doscientos cincuenta y seis mil seiscientos setenta y dos con 96100 soles).
- Recomendamos a la entidad contratante la Municipalidad Provincial de Provincial de Santiago De Chuco, revisar, aprobar y tramitar el informe mensual de Valorización N°02 correspondiente al mes de octubre del 2020.



Luis A. Gonzales Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398





- RESUMEN DE  
VALORIZACION  
MENSUAL.



*Vanessa RZA*  
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

*Luis A. Gonzalez Navarro*  
Luis A. Gonzalez Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398




## RESUMEN DE VALORIZACION N° 02

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

**Obra :** "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG=8.970KM, - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM. - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"  
**Cliente :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
**Ubicación :** SANTA CRUZ DE CHUCA  
**Contratista :** CONSORCIO VIAL SANTA ROSA  
**Inspector :** VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA CIP 194012  
**Residente :** LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO CIP 113398

Item	PRESUPUESTADO		VALORIZADO ANTERIOR		VALORIZADO DEL MES		ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
	Descripción	MONTO CONTRATADO PERIODICO	EJECUTADO ANT. ACUM.	%	EJECUTADO EN EL MES	%	EJECUTADO ACT. ACUM	%	Parcial EJECUCION	%
1.00	TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA LLATURPAMBA	S/. 467,084.01	S/. 31,529.96		S/. 120,326.34		S/. 151,856.30		S/. 315,227.71	
2.00	TRAMO CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ)	S/. 328,052.32	S/. 28,424.95		S/. 68,821.02		S/. 97,245.97		S/. 230,806.35	
	<b>SUB TOTALES COSTO DIRECTO</b>	<b>795,136.33</b>	<b>59,954.91</b>		<b>189,147.36</b>		<b>249,102.27</b>		<b>546,034.06</b>	
	GASTOS GENERALES (10%)	79,513.63	5,995.49		18,914.73		24,910.22		54,603.41	
	UTILIDAD (5%)	39,756.82	2,997.75		9,457.37		12,455.12		27,301.70	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/. 914,406.78</b>	<b>S/. 68,948.15</b>		<b>S/. 217,519.46</b>		<b>S/. 286,467.61</b>		<b>S/. 627,938.17</b>	
	I.G.V. (18 %)	164,593.22	12,410.67		39,163.50		51,564.17		113,029.05	
	<b>TOTAL</b>	<b>S/. 1,079,000.00</b>	<b>S/. 81,358.82</b>	<b>7.54%</b>	<b>S/. 256,672.96</b>	<b>23.79%</b>	<b>S/. 338,031.78</b>	<b>31.33%</b>	<b>S/. 740,968.22</b>	<b>68.67%</b>

  
**Luis A. Gonzales Navarro**  
 ING. CIVIL  
 R. CIP. 113398


  
**VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012



- CONTROL Y  
SUSTENTO DE  
METRADOS Y  
ACTIVIDADES  
EJECUTADAS.

*Vanessa*  
  
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

*Luis A. Gonzales Navarro*  
Luis A. Gonzales Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398



## CONTROL Y SUSTENTO DE METRADOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

**Proyecto :** "SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG.=8.970KM, - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

**Cliente :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
**Ubicación :** SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA  
**Contratista :** CONSORCIO VIAL SANTA ROSA  
**Inspector :** VANNESA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTIAGA  
**Residente :** LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO

**Monto Contratado** S/. 1,300,000.00  
**Plazo de ejecucion** 120 días calendario

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATADO	CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS				% EJECUTADO
				ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR EJECUTAR	
<b>1.00</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>							
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00		0.00	0.50	0.50	50.00%
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	8.97		0.00	4.00	4.97	44.59%
<b>2.00</b>	<b>PAVIMENTOS</b>							
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	2,242.50		900.00	900.00	1,342.50	40.13%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	6,727.50		2,100.00	2,100.00	4,627.50	31.22%
<b>3.00</b>	<b>TRANSPORTE</b>							
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	6,952.50		2,100.00	2,100.00	4,852.50	30.20%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	26,808.88		8,100.00	8,100.00	18,708.88	30.21%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	4,025.00		1,200.00	1,200.00	2,825.00	29.81%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	6,692.21		2,000.00	2,000.00	4,692.21	29.89%
<b>4.00</b>	<b>OBRAS DE ARTE Y DRENAJE</b>							
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	8,970.00		3,600.00	3,600.00	5,370.00	40.13%
<b>5.00</b>	<b>SEÑALIZACION</b>							
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	10.00		0.00	0.00	10.00	0.00%
05.02.	SEÑALES PREVENTIVAS	und	26.00		0.00	0.00	26.00	0.00%
05.03.	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	2.00		0.00	0.00	2.00	0.00%
05.04.	SEÑALES INFORMATIVAS	und	3.00		0.00	0.00	3.00	0.00%
<b>6.00</b>	<b>IMPACTO AMBIENTAL</b>							
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00		0.00	0.00	2.00	0.00%
<b>7.00</b>	<b>EMERGENCIA SANITARIA</b>							
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00		0.25	0.50	0.50	50.00%

## CONTROL Y SUSTENTO DE METRADOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

**Servicio :** "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG.=8.970KM, - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

**Cliente :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
**Ubicación :** CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ)  
**Contratista :** CONSORCIO VIAL SANTA ROSA  
**Inspector :** VANNESA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTIAGA  
**Residente :** LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO

**Monto Contratado** S/. 1,300,000.00  
**Plazo de ejecucion** 120 días calendario

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATADO	CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS				% EJECUTADO
				ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR EJECUTAR	
<b>1.00</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>							
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00		0.00	0.50	0.50	50.00%
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	6.30		0.00	3.00	3.30	47.62%
<b>2.00</b>	<b>PAVIMENTOS</b>							
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	1,575.00		650.00	650.00	925.00	41.27%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	4,725.00		1,200.00	1,200.00	3,525.00	25.40%
<b>3.00</b>	<b>TRANSPORTE</b>							
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	4,882.50		1,200.00	1,200.00	3,682.50	24.58%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	22,750.88		5,700.00	5,700.00	17,050.88	25.05%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	2,920.00		740.00	740.00	2,180.00	25.34%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	7,128.50		1,800.00	1,800.00	5,328.50	25.25%
<b>4.00</b>	<b>OBRAS DE ARTE Y DRENAJE</b>							
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	6,300.00		2,600.00	2,600.00	3,700.00	41.27%
<b>5.00</b>	<b>SEÑALIZACION</b>							
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	7.00		0.00	0.00	7.00	0.00%
05.02.	SEÑALES PREVENTIVAS	und	6.00		0.00	0.00	6.00	0.00%
05.03.	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	2.00		0.00	0.00	2.00	0.00%
05.04.	SEÑALES INFORMATIVAS	und	2.00		0.00	0.00	2.00	0.00%
<b>6.00</b>	<b>IMPACTO AMBIENTAL</b>							
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00		0.00	0.00	2.00	0.00%
<b>7.00</b>	<b>EMERGENCIA SANITARIA</b>							
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00		0.25	0.50	0.50	50.00%



Vanessa R. A.  
**VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

Luis A. Gonzales Navarro  
**Luis A. Gonzales Navarro**  
 ING. CIVIL  
 R. CIP. 113398



- **ANALISIS DE  
VALORIZACION  
MENSUAL.**

  
  
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

  
Luis A. Gonzales Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398





## ANALISIS DE VALORIZACION MENSUAL N° 02

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

\*SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG.=8.970KM. - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD\*

**Proyecto:** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
**Ubicación :** TRAMO CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ)  
**Contratista:** CONSORCIO VIAL SANTA ROSA  
**Inspector:** VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA CIP 194012  
**Residente:** LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO CIP 113398

**Monto Contratado:** S/. 1,300,000.00  
**Plazo de ejecución:** 120 días calendario

Código	Descripción	PRESUPUESTO GENERAL		AVANCE ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR			
		Unid	METRADO	PRECIO SI.	PARCIAL SI.	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO
1.00	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>												
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	gib	1.00	S/. 40,220.52	S/. 40,220.52	0.50	20,110.26	50.00%	0.50	0.00%	0.50	20,110.26	50.00%
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	6.30	S/. 998.09	S/. 6,287.97	3.00	2,984.27	47.62%	3.00	0.00%	3.30	3,293.70	52.38%
02.01	PAVIMENTOS												
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	1575.00	S/. 4.62	S/. 7,276.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	650.00	3,003.00	41.27%
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	4725.00	S/. 32.06	S/. 151,483.50	0.00	0.00	0.00%	1,200.00	38,472.00	1,200.00	3,525.00	25.40%
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	4882.50	S/. 5.64	S/. 27,537.30	0.00	0.00	0.00%	1,200.00	6,768.00	1,200.00	3,662.50	24.58%
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	22750.88	S/. 0.84	S/. 19,110.74	0.00	0.00	0.00%	5,700.00	4,768.00	5,700.00	17,050.88	25.05%
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	29200.00	S/. 5.64	S/. 16,468.80	0.00	0.00	0.00%	740.00	4,173.60	740.00	4,173.60	25.34%
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	7128.80	S/. 0.84	S/. 5,987.94	0.00	0.00	0.00%	1,800.00	1,512.00	1,800.00	5,328.80	25.25%
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE												
4.00	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	6300.00	S/. 1.84	S/. 11,592.00	0.00	0.00	0.00%	2,600.00	4,784.00	2,600.00	3,700.00	41.27%
5.00	SEÑALIZACION												
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	7.00	S/. 315.24	S/. 2,206.68	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	7.00	2,206.68
05.02	SENALES PREVENTIVAS	und	6.00	S/. 2,335.32	S/. 14,011.92	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	6.00	14,011.92
05.03	SENALES REGLAMENTARIAS	und	2.00	S/. 389.22	S/. 778.44	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	2.00	778.44
05.04	SENALES INFORMATIVAS	und	2.00	S/. 468.32	S/. 936.64	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	2.00	936.64
6.00	IMPACTO AMBIENTAL												
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	S/. 7,274.14	S/. 14,548.28	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	2.00	14,548.28
7.00	EMERGENCIA AMBIENTAL												
7.00	EMERGENCIA SANITARIA	gib	1.00	S/. 21,281.69	S/. 21,281.69	0.25	5,320.42	25.00%	0.25	5,320.42	0.50	10,640.85	50.00%
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19												
	<b>Costo Directo</b>												
	GASTOS GENERALES (10%) C.D.		10.00%	328,052.32	328,052.32	28,424.95	68,821.02		68,821.02		97,245.97	230,806.35	
	UTILIDAD (5%) C.D.		5.00%	16,402.62	16,402.62	2,842.50	6,862.10		6,862.10		9,724.60	23,080.63	
	<b>SUB TOTAL</b>												
	IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (IGV 18%)		18.00%	377,260.17	377,260.17	32,688.70	79,144.17		79,144.17		111,832.87	265,427.30	
	VALOR REFERENCIAL DE OBRA			67,906.83	67,906.83	5,883.97	14,245.95		14,245.95		20,129.91	47,776.92	
	<b>VALOR REFERENCIAL DE OBRA</b>												
	<b>PORCENTAJE AVANCE DE OBRA</b>												
				100.00%	100.00%	8.66%	20.98%		20.98%		29.64%	70.36%	

  
**Luis A. Gonzales Navarro**  
 ING. CIVIL  
 R. CIP. 113398



  
**Vanessa Arce**  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. Colegio de Ingenieros N° 194012


000197



- HOJA DE CANCELACION.

  
  
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

  
Luis A. González Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398



000195

**HOJA DE CANCELACION**

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

<b>Proyecto</b>	"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG.=8.970KM, - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"	
<b>Cliente</b>	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO	
<b>Ubicación</b>	SANTA CRUZ DE CHUCA	
<b>Contratista</b>	CONSORCIO VIAL SANTA ROSA	
<b>Inspector</b>	VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA CIP 194012	
<b>Residente</b>	LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO CIP 113398	
<b>MONTO REFERENCIAL</b>		1,301,584.26
<b>MONTO CONTRATADO</b>		1,300,000.00
<b>MONTO CONTRATADO MANTENIMIENTO PERIODICO</b>		1,079,000.00
<b>MONTO CONTRATADO MANTENIMIENTO RUTINARIO</b>		195,000.00
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>MONTO VALORIZADO</b>
01	TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA	120,326.34
02	TRAMO CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ)	68,821.02
<b>1.00.00</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/. 189,147.36</b>
	GASTOS GENERALES 10%	S/. 18,914.73
	UTILIDAD 5%	S/. 9,457.37
<b>2.00.00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>S/. 217,519.46</b>
	REAJUSTES	0.00
<b>3.00.00</b>	<b>SUBTOTAL CON REAJUSTES</b>	<b>S/. 217,519.46</b>
	AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO 10%	S/. 0.00
	AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES 20%	S/. 0.00
<b>4.00.00</b>	<b>SUBTOTAL CON AMORTIZACIONES</b>	<b>S/. 217,519.46</b>
<b>5.00.00</b>	<b>IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)</b>	<b>S/. 39,153.50</b>
<b>6.00.00</b>	<b>TOTAL NETO A RECIBIR</b>	<b>S/. 256,672.96</b>
<b>Porcentaje de avance ejecutado en el mes (%)</b>		<b>23.79%</b>



*Vanessa*  
 VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

*Luis A. Gonzales Navarro*  
 Luis A. Gonzales Navarro  
 ING. CIVIL  
 R. CIP. 113398



- CUADRO  
COMPARATIVO  
DE AVANCE  
DEL SERVICIO  
(PROGRAMADO  
- EJECUTADO -  
PAGADO).



*Vanessa A.R.T.*  
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

*Luis A. Gonzales Navarro*  
Luis A. Gonzales Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398



000191

# CUADRO COMPARATIVO DE AVANCE - PROGRAMADO - EJECUTADO - PAGADO.

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG.=8.970KM, - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Proyecto :  
 Cliente :  
 Ubicación :  
 Contratista :  
 Inspector :  
 Residente :


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
 TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA  
 CONSORCIO VIAL SANTA ROSA  
 VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA CIP 194012  
 LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO CIP 113398

Monto Contratado **S/. 1,300,000.00**  
 Plazo de ejecucion **120 días calendarios**

MES	MONTOS (Inc/IGV) ACUMUL.		PORCENTAJES ACUMUL.	
	S/.	%	%	%
22-Sep-20	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
30-Sep-20	29,655.91	4.68%	4.68%	4.68%
31-Oct-20	207,591.25	32.75%	32.75%	37.43%
30-Nov-20	207,591.25	32.75%	32.75%	70.18%
31-Dic-20	188,994.59	29.82%	29.82%	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>633,833.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	

MES	MONTOS (Inc/IGV) ACUMUL.		PORCENTAJES ACUMUL.	
	S/.	%	%	%
22-Sep-20	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
30-Sep-20	42,786.16	6.75%	6.75%	6.75%
31-Oct-20	163,282.84	25.76%	25.76%	32.51%
30-Nov-20	0.00	0.00%	0.00%	
31-Dic-20	0.00	0.00%	0.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>206,069.00</b>	<b>32.51%</b>	<b>32.51%</b>	

  
**Luis A. Gonzales Navarro**  
 ING. CIVIL  
 R. CIP. 113398

  
**Vanessa Arteaga**  
 INGENIERO CIVIL  
 VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
 Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

000192

# CUADRO COMPRATIVO DE AVANCE - PROGRAMADO - EJECUTADO - PAGADO.

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020


**Proyecto :** "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG =8.970KM, - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

**Cliente :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
**Ubicación :** TRAMO CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ)  
**Contratista :** CONSORCIO VIAL SANTA ROSA  
**Inspector :** VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA CIP 194012  
**Residente :** LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO CIP 113398

**Monto Contratado** S/. 1,300,000.00  
**Plazo de ejecucion** 120 dias calendarios

MES	MONTOS (Inc/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	20,846.74	20,846.74	4.68%	4.68%
31-Oct-20	145,926.95	166,773.69	32.78%	37.46%
30-Nov-20	145,926.95	312,700.64	32.78%	70.24%
31-Dic-20	132,466.36	445,167.00	29.76%	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>445,167.00</b>		<b>100.00%</b>	

MES	MONTOS (Inc/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	38,572.66	38,572.66	8.66%	8.66%
31-Oct-20	93,390.12	131,962.78	20.98%	29.64%
30-Nov-20	0.00	131,962.78	0.00%	29.64%
31-Dic-20	0.00	131,962.78	0.00%	29.64%
<b>TOTAL</b>	<b>131,962.78</b>		<b>29.64%</b>	

  
**Luis A. Gonzales Navarro**  
 ING. CIVIL  
 R. CIP. 113398

  
**VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012



# CUADRO COMPARATIVO DE AVANCE PROGRAMADO - EJECUTADO - PAGADO - GENERAL

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020  
 "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG.=8.970KM, - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Proyecto :  
 Cliente :  
 Ubicación :  
 Contratista :  
 Inspector :  
 Residente :

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
 TRAMO CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ)  
 CONSORCIO VIAL SANTA ROSA  
 VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA CIP 194012  
 LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO CIP 113398

Monto Contratado \$/. 1,300,000.00  
 Plazo de ejecccion 120 dias calendarios

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS				
MES	MONTOS (incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL \$/.	ACUMUL. \$/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	50,502.65	50,502.65	4.68%	4.68%
31-Oct-20	353,518.20	404,020.85	32.76%	37.44%
30-Nov-20	353,518.20	757,539.05	32.76%	70.20%
31-Dic-20	321,460.95	1,079,000.00	29.80%	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,079,000.00</b>		<b>100.00%</b>	

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS				
MES	MONTOS (incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL \$/.	ACUMUL. \$/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	81,358.82	81,358.82	7.54%	7.54%
31-Oct-20	256,672.96	338,031.78	23.79%	31.33%
30-Nov-20	0.00	338,031.78	0.00%	0.00%
31-Dic-20	0.00	338,031.78	0.00%	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>338,031.78</b>		<b>31.33%</b>	

*[Signature]*  
**Luis A. Gonzales Navarro**  
 ING. CIVIL  
 R. CIP. 113398

*[Signature]*  
**VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012



- CUADRO DE BARRAS Y CURVA S.

  
  
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

  
Luis A. Gonzalez Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398



# CUADRO DE BARRAS Y CURVA S.


DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG.=8.970KM, - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Proyecto :

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
 Ubicación : TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA  
 Contratista : CONSORCIO VIAL SANTA ROSA  
 Inspector : VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA CIP 194012  
 Residente : LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO CIP 113398

Monto Contratado : S/. 1,300,000.00  
 Plazo de ejecución : 120 días calendarios

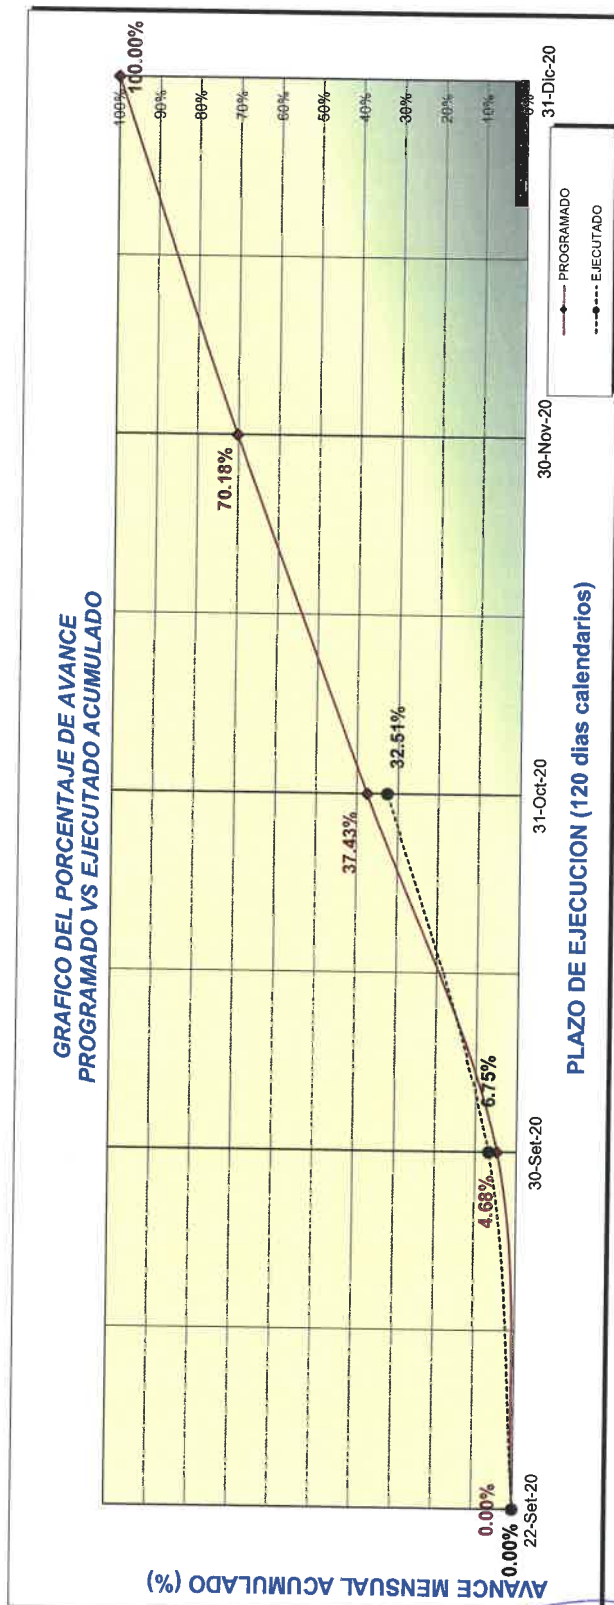

*[Signature]*  
**Luis A. Gonzales Navarro**  
 ING. CIVIL  
 R. CIP. 113398

## MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV) ACUMUL.		PORCENTAJES ACUMUL.	
	Si.	Si.	%	%
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	29,655.91	29,655.91	4.68%	4.68%
31-Oct-20	207,591.25	237,247.16	32.75%	37.43%
30-Nov-20	207,591.25	444,838.41	32.75%	70.18%
31-Dic-20	188,994.59	633,833.00	29.82%	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>633,833.00</b>		<b>100.00%</b>	

## MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV) ACUMUL.		PORCENTAJES ACUMUL.	
	Si.	Si.	%	%
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	42,786.16	42,786.16	6.75%	6.75%
31-Oct-20	163,282.84	206,069.00	25.76%	32.51%
30-Nov-20	0.00	206,069.00	0.00%	0.00%
31-Dic-20	0.00	206,069.00	0.00%	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>206,069.00</b>		<b>32.51%</b>	



*[Signature]*  
**Vanessa R. A.**

VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012


# CUADRO DE BARRAS Y CURVA S.

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Proyecto : "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG.=8.970KM", - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
 Ubicación : TRAMO CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ)  
 Contratista : CONSORCIO VIAL SANTA ROSA  
 Inspector : VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA CIP 194012  
 Residente : LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO CIP 113398

Monto Contratado : S/. 1,300,000.00  
 Plazo de ejecucion : 120 dias calendarios

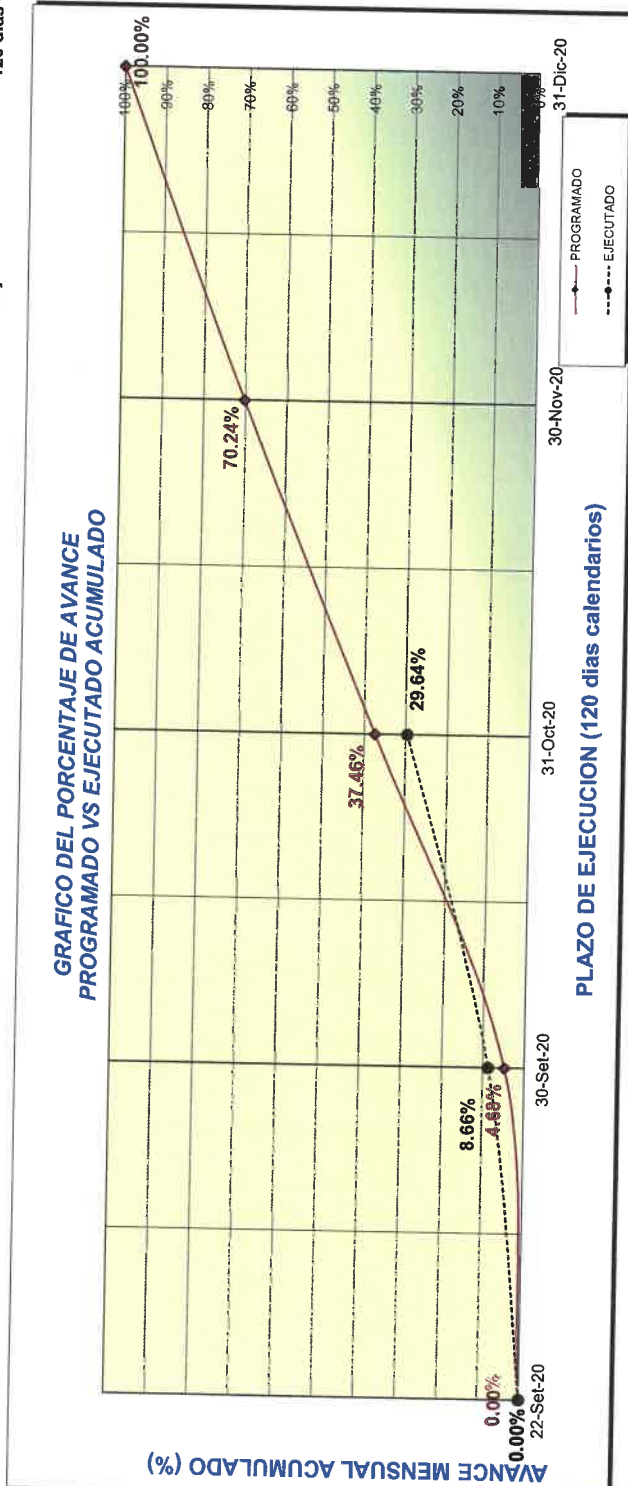

*[Signature]*  
 Luis A. Gonzales Navarro  
 ING. CIVIL  
 R. CIP. 113398

## MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	20,846.74	20,846.74	4.68%	4.68%
31-Oct-20	145,926.95	166,773.69	32.78%	37.46%
30-Nov-20	145,926.95	312,700.64	32.78%	70.24%
31-Dic-20	132,466.36	445,167.00	29.76%	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>445,167.00</b>		<b>100.00%</b>	

## MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	38,572.66	38,572.66	8.66%	8.66%
31-Oct-20	93,390.12	131,962.78	20.98%	29.64%
30-Nov-20	0.00	131,962.78	0.00%	0.00%
31-Dic-20	0.00	131,962.78	0.00%	29.64%
<b>TOTAL</b>	<b>131,962.78</b>		<b>29.64%</b>	

*[Signature]*  
 VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012



# CUADRO DE BARRAS Y CURVA S. - GENERAL


DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG.=8.970KM, - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Proyecto :

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
 Ubicación : SANTA CRUZ DE CHUCA — SANTIAGO DE CHUCO  
 Contratista : CONSORCIO VIAL SANTA ROSA  
 Inspector : VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA CIP 194012  
 Residente : LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO CIP 113398

Monto Contratado \$/. 1,300,000.00  
 Plazo de ejecución 120 días calendario

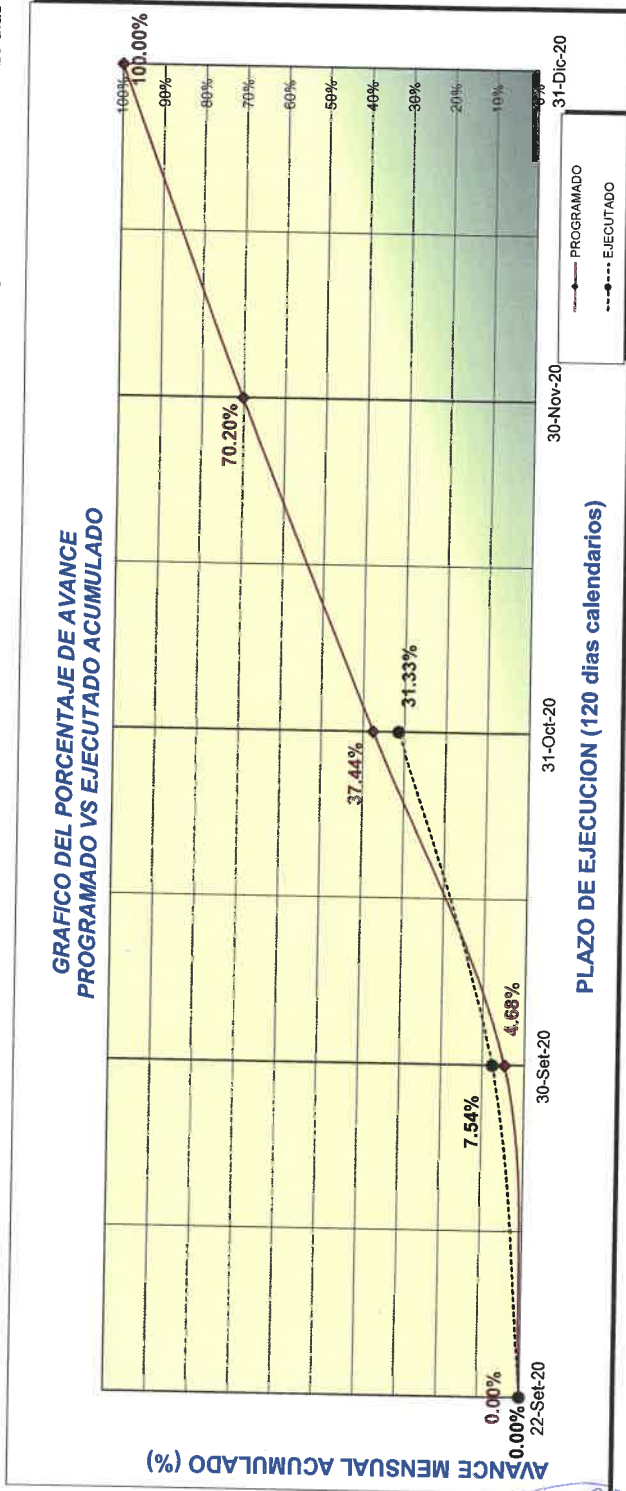

*[Signature]*  
**Luis A. Gonzales Navarro**  
 ING. CIVIL  
 R. CIP. 113398

## MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	PARCIAL \$/.	ACUMUL. \$/.	PARCIALES %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	50,502.65	50,502.65	4.68%	4.68%
31-Oct-20	353,518.20	404,020.85	32.76%	37.44%
30-Nov-20	353,518.20	757,539.05	32.76%	70.20%
31-Dic-20	321,460.95	1,079,000.00	29.80%	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,079,000.00</b>		<b>100.00%</b>	


## MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	PARCIAL \$/.	ACUMUL. \$/.	PARCIALES %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	81,358.82	81,358.82	7.54%	7.54%
31-Oct-20	256,672.96	338,031.78	23.79%	31.33%
30-Nov-20	0.00	338,031.78	0.00%	0.00%
31-Dic-20	0.00	338,031.78	0.00%	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>338,031.78</b>		<b>31.33%</b>	


*[Signature]*  
**Vanessa Arteaga**  
 VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012



- **CRONOGRAMA  
DE AVANCE  
DEL SERVICIO  
PROGRAMADO.**

*Vanessa Rzt.*  
  
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

*Luis A. Gonzalez Navarro*  
Luis A. Gonzalez Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398



**CRONOGRAMA DE AVANCE DE SERVICIO PROGRAMADO**

**Proyecto :** "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG=8.970KM., - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

**Cliente :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
**Ubicación :** SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA  
**Contratista :** CONSORCIO VIAL SANTA ROSA  
**Inspector :** VANNESA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTIAGA  
**Residente :** LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO

**Monto Contratado**  
**Plazo de ejecucion**

S/ 1,300,000.00  
 120 días calendarios

ITEM	PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04
01	OBRAS PRELIMINARES								
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	gib	1.00	40,220.52	40,220.52	2,011.03	14,077.18	14,077.18	10,055.13
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	8.97	998.09	8,952.87	447.64	3,133.50	3,133.50	2,238.22
02	PAVIMENTOS				0.00				
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	2,242.50	4.62	10,360.35	518.02	3,626.12	3,626.12	2,590.09
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	m3	6,727.50	32.06	215,683.65	10,784.18	75,489.28	75,489.28	53,920.91
03	TRANSPORTE				0.00				
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	6,952.50	7.88	54,785.70	2,739.29	19,175.00	19,175.00	13,696.43
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	26,808.88	0.87	23,323.73	1,166.19	8,163.31	8,163.31	5,830.93
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	4,025.00	7.88	31,717.00	1,585.85	11,100.95	11,100.95	7,929.25
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	6,692.21	0.87	5,822.22	291.11	2,037.78	2,037.78	1,455.56
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				0.00				
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	8,970.00	1.84	16,504.80	825.24	5,776.68	5,776.68	4,126.20
05	SEÑALIZACION				0.00				
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	10.00	315.24	3,152.40				3,152.40
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	26.00	389.22	10,119.72				10,119.72
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	2.00	389.22	778.44				778.44
05.04	SEÑALES INFORMATIVAS	und	3.00	468.32	1,404.96				1,404.96
06	IMPACTO AMBIENTAL				0.00				
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	7,274.14	14,548.28				14,548.28
07	EMERGENCIA SANITARIA				0.00				
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gib	1.00	29,709.37	29,709.37	1,485.47	10,398.28	10,398.28	7,427.34
	<b>COSTO DIRECTO</b>				S/ 467,084.01	S/ 21,854.01	S/ 152,978.07	S/ 152,978.07	S/ 139,273.85
	<b>COSTO INDIRECTO (10.00%)</b>				S/ 46,708.40	S/ 2,185.40	S/ 15,297.81	S/ 15,297.81	S/ 13,927.39
	<b>UTILIDAD (5%)</b>				S/ 23,354.20	S/ 1,092.70	S/ 7,648.90	S/ 7,648.90	S/ 6,963.69
	<b>SUB TOTAL</b>				S/ 537,146.61	S/ 25,132.11	S/ 175,924.78	S/ 175,924.78	S/ 160,164.93
	<b>IGV (18%)</b>				S/ 96,686.39	S/ 4,523.78	S/ 31,666.46	S/ 31,666.46	S/ 28,829.69
	<b>COSTO TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL</b>				S/ 633,833.00	S/ 29,655.89	S/ 207,591.25	S/ 207,591.25	S/ 188,994.62

000185

*M. Gonzales*  
 VANNESA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTIAGA  
 INGENIERA CIVIL  
 Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

AVANCE TOTAL CONTRACTUAL	4.68%	32.75%	29.82%
PROGRAMADO MENSUAL	4.68%	37.43%	70.18%
ACUMULADO			100.00%

*Luis A. Gonzales Navarro*  
 Luis A. Gonzales Navarro  
 ING. CIVIL  
 R. CIP. 113398

**CRONOGRAMA DE AVANCE DE SERVICIO PROGRAMADO**

**Proyecto :** "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG.=8.970KM, - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

**Cliente :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
**Ubicación :** CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ)  
**Contratista :** CONSORCIO VIAL SANTA ROSA  
**Inspector :** VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTIAGA  
**Residente :** LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO

**Monto Contratado** S/. 1,300,000.00  
**Plazo de ejecución** 120 días calendarios

ITEM	PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04
01	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>								
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	glb	1.00	40,220.52	40,220.52	2,011.03	14,077.18	14,077.18	10,055.13
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	6.30	998.09	6,287.97	314.40	2,200.79	2,200.79	1,571.99
02	<b>PAVIMENTOS</b>				0.00				
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	1,575.00	4.62	7,276.50	363.83	2,546.78	2,546.78	1,819.13
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	m3	4,725.00	32.06	151,483.50	7,574.18	53,019.23	53,019.23	37,870.88
03	<b>TRANSPORTE</b>				0.00				
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	4,882.50	5.64	27,537.30	1,376.87	9,638.06	9,638.06	6,884.33
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	22,750.88	0.84	19,110.74	955.54	6,688.76	6,688.76	4,777.69
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	2,920.00	5.64	16,488.80	823.44	5,764.08	5,764.08	4,117.20
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	7,128.50	0.84	5,987.94	299.40	2,095.78	2,095.78	1,496.99
04	<b>OBRAS DE ARTE Y DRENAJE</b>				0.00				
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	6,300.00	1.84	11,592.00	579.60	4,057.20	4,057.20	2,898.00
05	<b>SEÑALIZACION</b>				0.00				
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	7.00	315.24	2,206.68				2,206.68
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	6.00	389.22	2,335.32				2,335.32
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	2.00	389.22	778.44				778.44
05.04	SEÑALES INFORMATIVAS	und	2.00	468.32	936.64				936.64
06	<b>IMPACTO AMBIENTAL</b>				0.00				
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	7,274.14	14,548.28				14,548.28
07	<b>EMERGENCIA SANITARIA</b>				0.00				
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	21,281.69	21,281.69	1,064.08	7,448.59	7,448.59	5,320.42
	<b>COSTO DIRECTO</b>				S/.328,052.32	S/.15,362.35	S/.107,536.44	S/.107,536.44	S/.97,617.10
	<b>COSTO INDIRECTO (10.00%)</b>				S/.32,805.23	S/.1,536.23	S/.10,753.64	S/.10,753.64	S/.9,761.71
	<b>UTILIDAD (5%)</b>				S/.16,402.62	S/.768.12	S/.5,376.82	S/.5,376.82	S/.4,880.86
	<b>SUB TOTAL</b>				S/.377,260.17	S/.17,666.70	S/.123,666.90	S/.123,666.90	S/.112,259.67
	<b>IGV (18%)</b>				S/.67,906.83	S/.3,180.01	S/.22,260.04	S/.22,260.04	S/.20,206.74
	<b>COSTO TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL</b>				S/.445,167.00	S/.20,846.71	S/.145,926.94	S/.145,926.94	S/.132,466.40

**AVANCE TOTAL CONTRACTUAL**  
 PROGRAMADO MENSUAL  
 ACUMULADO

4.68%	32.78%	32.78%	29.76%
4.68%	37.46%	70.24%	100.00%

**Luis A. Gonzales Navarro**  
 ING. CIVIL  
 R. CIP. 113398


*Vanessa*  
  
**VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTIAGA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012



- **PANEL  
FOTOGRAFICO.**

*Vanessa R. A.*  
  
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

*Luis A. Gonzales Navarro*  
Luis A. Gonzales Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398





CONSORCIO VIAL  
**SANTA ROSA**  
PANEL FOTOGRAFICO

000188

TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMPA LONG 8.970 KM



RECONFORMACIÓN DE CUNETAS

*Vanessa R. et.*  
  
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012



RECONFORMACIÓN DE CUNETAS KM 0+060

*Luis A. Gonzalez Navarro*  
Luis A. Gonzalez Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398





CONSORCIO VIAL

# SANTA ROSA

000101



RECONFORMACIÓN DE CUNETAS KM 0+140



*Vanessa A. R.*


VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012



RECONFORMACIÓN DE CUNETAS KM 0+660

*Luis A. G.*

Luis A. Gonzales Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398





RECONFORMACIÓN DE CUNETAS KM 2+000




CANTERA 4+800

*Vanessa*  
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012



FUENTE DE AGUA KM 5+000

*Luis A. Gonzales*  
Luis A. Gonzales Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398





CONSORCIO VIAL  
**SANTA ROSA**

000,179



RECONFORMACIÓN DE CUNETAS Y CAPA NIVELANTE KM 4+100


*Vanessa G. A.*  
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

TRAMO CUSHIPE – ALGALLAMA – EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG 6.300 KM



RECONFORMACIÓN DE CUNETAS Y CAPA NIVELANTE KM 3+000

*Luis A. Gonzales Navarro*  
Luis A. Gonzales Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398





CUNETA RECONFORMADA KM 3+700



CAPA NIVELANTE KM 0+100




*Vanessa*

VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

*Luis A. Gonzalez Navarro*

**Luis A. Gonzalez Navarro**  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398





CONSORCIO VIAL  
**SANTA ROSA**

000177



RECONFORMACIÓN DE CUNETAS KM 0+500



CAPA NIVELANTE KM 1+000

*Vanessa*  
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012




CAPA NIVELANTE KM 2+400

*Luis A. Gonzalez Navarro*  
Luis A. Gonzalez Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398





- ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.

*Vanesa R. A.*  
  
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

*Luis A. González Navarro*  
Luis A. González Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398



**“ACTA DE ENTREGA DE TERRENO”**



Servicio

MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA LONG= 8.970 KM” Y “CUSHIPE – ALGALLAMA – EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM”, DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.



Tramo

“SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA” LONG= 8.970 KM

Provincia

SANTIAGO DE CHUCO

Distrito

SANTA CRUZ DE CHUCA

Entidad Contratante

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)

Empresa Ejecutora

CONSORCIO VIAL SANTA ROSA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.)

N.º de Contrato

CONTRATO DE SERVICIO N.º 017-2020-MPSCH-LOG

Fecha de Contrato

28/08/2020

Modalidad

SUMA ALZADA

Monto Presupuestado

S/. 764,584.86 soles Inc. (I.G.V.)

Monto Contractual

S/. 763,655.00soles Inc. (I.G.V.)

Inspector de Servicio

Ing. VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA

Plazo de Ejecución

PLAN DE TRABAJO: 20 D.C.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C.

MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C.

INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C.

TOTAL: 505 DÍAS CALENDARIOS (sujeto a fecha de contrato)

Fecha de Culminación

31/12/2021

Genaro Alberto Cossic  
INGENIERO CIVIL  
REG. C.I.P. N° 192701

Vanessa Abigail Rodríguez Arteaga  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

Luis A. Gonzales Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398

Edgar Gómez Domínguez  
DNI N° 4494479  
REPRESENTANTE GENERAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
Ing. David Iván Silva Torres  
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
CIP N° 63635

En la ciudad de Santa Cruz de Chuca, provincia de Santiago de Chuco – La libertad, siendo las 9:00 p.m. del 29 de agosto del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza con CIP. N° 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N° 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N° 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Ing. Vanessa Abigail Rodríguez Arteaga con CIP N° 194012 y por último, por parte del Contratista el Ing. Luis Alberto Gonzales Navarro con CIP N° 113398 como Residente de servicio y el Sr. Edgar Gómez Domínguez con DNI N° 44944779, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL SANTA ROSA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.). A fin de realizar la ENTREGA DE TERRENO del tramo: “SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA” con una longitud de 8.970 km.


Este acto protocolar tiene por finalidad hacer la entrega de la ruta mencionada en todo su recorrido físico para la recolección de información necesaria y de esta manera hacer la elaboración del PLAN DE TRABAJO de la ruta, que es parte de la FASE I del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y formatos (anexos) estipulados en los Términos de Referencia del D.U. N° 070-2020 presentados para la contratación.

Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA LONG= 8.970 KM” Y “CUSHIPE – ALGALLAMA – EMP. PE-3N (LA

**CRUZ) LONG= 6.300 KM", DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**

Siendo las 9:30 p.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para dar inicio a la elaboración del Plan de Trabajo y continuar con los procedimientos posteriores para dar inicio a la FASE II y III (mantenimiento periódico y rutinario) del servicio. Del mismo día, se da por concluida el acto de **ENTREGA DE TERRENO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.

**AREA USUARIA**



INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez  
CIP: 190782  
JEFE DE OPERACIONES

**Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez**  
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH  
CIP N° 190782



INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza  
CIP: 218511  
GERENTE GENERAL

**Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza**  
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH  
CIP N° 218511

**AREA RESPONSABLE**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
Ing. David Iván Silva Torres  
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
CIP N° 63635

**Ing. David Iván Silva Torres**  
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH  
CIP N° 63635

**EMPRESA EJECUTORA**



Luis A. Gonzales Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398

**Ing. Luis Alberto Gonzales Navarro**  
Residente de Servicio  
CIP N° 113398



CONSORCIO VIAL SANTA ROSA  
EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ  
DNI N° 44944779  
REPRESENTANTE COMUN


**Sr. Edgar Gómez Domínguez**  
Representante Común de CONSORCIO VIAL SANTA ROSA  
DNI N° 44944779

**INSPECTOR**



INGENIERO CIVIL  
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

**Ing. Vanessa Abigail Rodríguez Arteaga**  
Inspector del Servicio  
CIP N° 194012



Comité de Control  
Instituto Vial Provincial  
Reg. CIP. N° 192701

**“ACTA DE ENTREGA DE TERRENO”**



Servicio

**MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA LONG= 8.970 KM” Y “CUSHIPE – ALGALLAMA – EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM”, DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**



Tramo

**“CUSHIPE – ALGALLAMA – EMP. PE-3N (LA CRUZ)” LONG= 6.300 KM SANTIAGO DE CHUCO**

Provincia

**SANTA CRUZ DE CHUCA**

Distrito

Entidad Contratante

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)**

Empresa Ejecutora

**CONSORCIO VIAL SANTA ROSA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.)**

N.º de Contrato

**CONTRATO DE SERVICIO N.º 017-2020-MPSCH-LOG**

Fecha de Contrato

**28/08/2020**

Modalidad

**SUMA ALZADA**

Monto Presupuestado

**S/. 536,999.40 soles Inc. (I.G.V.)**

Monto Contractual

**S/. 536,345.00 soles Inc. (I.G.V.)**

Inspector de Servicio

**Ing. VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA**

Plazo de Ejecución

**PLAN DE TRABAJO: 20 D.C.  
MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C.**

**MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C.**

**INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C.**

**TOTAL: 505 DÍAS CALENDARIOS (sujeto a fecha de contrato)**

Fecha de Culminación

**31/12/2021**

Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco  
Ing. David Iván Silva Torres  
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
IP N° 63635

Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012



INGENIERO CIVIL

VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA

Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

INGENIERO CIVIL

VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA

Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

INGENIERO CIVIL

VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA

Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

INGENIERO CIVIL

VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA

Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

INGENIERO CIVIL

VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA

Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

INGENIERO CIVIL

VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA

Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

INGENIERO CIVIL

VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA

Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

INGENIERO CIVIL

VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA

Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

INGENIERO CIVIL

VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA

Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

INGENIERO CIVIL

VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA

Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

INGENIERO CIVIL

VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA

Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

INGENIERO CIVIL

VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA

Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

INGENIERO CIVIL

VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA

En la ciudad de Santa Cruz de Chuca, provincia de Santiago de Chuco – La libertad, siendo las 9:00 p.m. del 29 de agosto del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza con CIP. N° 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N° 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N° 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Ing. Vanessa Abigail Rodríguez Arteaga con CIP N° 194012 y por último, por parte del Contratista el Ing. Luis Alberto Gonzales Navarro con CIP N° 113398 como Residente de servicio y el Sr. Edgar Gómez Domínguez con DNI N° 44944779, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL SANTA ROSA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.). A fin de realizar la ENTREGA DE TERRENO del tramo: “CUSHIPE – ALGALLAMA – EMP. PE-3N (LA CRUZ)” con una longitud de 6.300 km.

Este acto protocolar tiene por finalidad hacer la entrega de la ruta mencionada en todo su recorrido físico para la recolección de información necesaria y de esta manera hacer la elaboración del PLAN DE TRABAJO de la ruta, que es parte de la FASE I del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y formatos (anexos) estipulados en los Términos de Referencia del D.U. N° 070-2020 presentados para la contratación.

Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA LONG= 8.970 KM” Y “CUSHIPE – ALGALLAMA – EMP. PE-3N (LA


Luis A. Gonzales Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398

CONSORCIO VIAL SANTA ROSA  
EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ  
DNI N° 44944779  
REPRESENTANTE COMÚN

**CRUZ) LONG= 6.300 KM", DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**


Siendo las 9:30 p.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para dar inicio a la elaboración del Plan de Trabajo y continuar con los procedimientos posteriores para dar inicio a la FASE II y III (mantenimiento periódico y rutinario) del servicio. Del mismo día, se da por concluida el acto de **ENTREGA DE TERRENO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.

**AREA USUARIA**



INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
GUTIÉRREZ LUIS F  
JEFE DE OPERACIONES

**Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez**  
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH  
CIP N° 190782



INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
REBAZA RAFAEL K  
GERENTE GENERAL

**Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza**  
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH  
CIP N° 218511


**AREA RESPONSABLE**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
Ing. David Iván Silva Torres  
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
CIP N° 63635

**Ing. David Iván Silva Torres**  
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH  
CIP N° 63635

**EMPRESA EJECUTORA**



Luis A. Gonzales Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398

**Ing. Luis Alberto Gonzales Navarro**  
Residente de Servicio  
CIP N° 113398

**CONSORCIO VIAL SANTA ROSA**



EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ  
DNI N° 44944779  
REPRESENTANTE COMUN


**Sr. Edgar Gómez Domínguez**  
Representante Común de CONSORCIO VIAL SANTA ROSA  
DNI N° 44944779

**INSPECTOR**



INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

**Ing. Vanessa Abigail Rodríguez Arteaga**  
Inspector del Servicio  
CIP N° 194012




EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ  
DNI N° 44944779  
Reg. N° 192701



- ACTA DE INICIO DE SERVICIO.

*Vanessa R 21.*  
  
VANESSA FABIAN RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

*Luis A. Gonzalez Navarro*  
Luis A. Gonzalez Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398



**“ACTA DE INICIO DE SERVICIO”**

Servicio	MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA LONG= 8.970 KM” Y “CUSHIPE – ALGALLAMA – EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM”, DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
Tramo	“CUSHIPE – ALGALLAMA – EMP. PE-3N (LA CRUZ)” LONG= 6.300 KM
Provincia	SANTIAGO DE CHUCO
Distrito	SANTA CRUZ DE CHUCA
Entidad Contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)
Empresa Ejecutora	CONSORCIO VIAL SANTA ROSA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.)
N.º de Contrato	CONTRATO DE SERVICIO N.º 017-2020-MPSCH-LOG
Fecha de Contrato	28/08/2020
Modalidad	SUMA ALZADA
Monto Presupuestado	S/. 536,999.40 soles Inc. (I.G.V.)
Monto Contractual	S/. 536,345.00 soles Inc. (I.G.V.)
Inspector de Servicio	Ing. VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
Aprobación Plan de Trabajo	RESOLUCIÓN GERENCIAL N.º 149A-2020-MPSCH/GM
Fecha de Aprobación	21/09/2020
Fecha de Inicio	22/09/2020
Plazo de Ejecución	MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C. (sujeto a fecha de contrato) MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C. INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.
Fecha de Culminación	31/12/2021



*[Signature]*  
Marcel Nicolás Barrantes Parimango  
ING. CIVIL  
R. C.I.P. N.º 225678

*[Signature]*  
Edith...  
ANALISTA...  
Y SEGUIMIENTO DEL...  
PROV. SANTIAGO DE CHUCO

*[Signature]*  
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N.º 194012



*[Signature]*  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
Ing. David Iván Silva Torres  
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

*[Signature]*  
Gabriel Omar Panta Cossio  
INGENIERO CIVIL  
Reg. C.I.P. N.º 192701

*[Signature]*  
Luis A. Gonzales Navarro  
ING. CIVIL  
R. C.I.P. 113398

CONSORCIO VIAL SANTA ROSA  
EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ  
DNI N.º 44944779  
REPRESENTANTE COMÚN

En la ciudad de Santa Cruz de Chuca, provincia de Santiago de Chuco – La Libertad, siendo las 9:00 p.m. del 22 de septiembre del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza con CIP. N.º 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N.º 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH, el Ing. Marcial Nicolás Barrantes Parimango con CIP N.º 225678 como monitor designado del servicio intervenido (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N.º 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Ing. Vanessa Abigail Rodríguez Arteaga con CIP N.º 194012; asimismo, representando a Provias Descentralizado está el Ing. Gabriel Omar Panta Cossio con CIP N.º 192701 encargado de Monitoreo y Seguimiento y el Ing. Bach. Eduardo Rafael Príncipe León con DNI N.º 46839109 como Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento; finalmente, por parte del Contratista Ing. el Ing. Luis Alberto Gonzales Navarro con CIP N.º 113398 como Residente de servicio y el Sr. Edgar Gómez Domínguez con DNI N.º 44944779, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL SANTA ROSA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.). A fin de realizar el INICIO DE SERVICIO del tramo: “CUSHIPE – ALGALLAMA – EMP. PE-3N (LA CRUZ)” con una longitud de 6.300 KM.

Este acto protocolar tiene por finalidad dar inicio a la ejecución de las actividades de **MANTENIMIENTO PERIÓDICO** de la ruta mencionada en todo su recorrido físico correspondiente a la FASE II del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y partidas estipulados en el Plan de Trabajo previamente aprobado por la Entidad.

Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “SANTA ROSA –**

**SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA LONG= 8.970 KM” Y “CUSHIPE – ALGALLAMA – EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM”, DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**

Siendo las 9:30 a.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas acorde con el Plan de Trabajo, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para empezar la ejecución del Mantenimiento Periódico. Del mismo día, se da por concluido el acto de **INICIO DE SERVICIO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.

**AREA USUARIA**

**Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez**  
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH  
CIP N° 190782

**Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza**  
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH  
CIP N° 218511

ORCIO VIAL SANTA ROSA  
EDGAR COMEZ DOMINGUEZ  
DNI N° 4494479  
REPRESENTANTE COMBIN

Luis A. Gonzales Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398

**Ing. Marcial Nicolás Barrantes Parimango**  
Monitor Designado del Instituto Vial Provincial MPSCH  
CIP N° 225678

**AREA RESPONSABLE**

**Ing. David Iván Silva Torres**  
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH  
CIP N° 63635

**REPRESENTANTES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD**

**Ing. Gabriel Omar Panta Cossio**  
Monitoreo y Seguimiento a Mantenimiento Vial  
Provincia de Santiago de Chuco  
CIP N° 192701

**Ing. Bach. Eduardo Rafael Príncipe León**  
Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento  
Provincia de Santiago de Chuco  
DNI N° 46839109

**EMPRESA EJECUTORA**



  
Luis A. Gonzales Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398

Ing. Luis Alberto Gonzales Navarro  
Residente de Servicio  
CIP N° 113398


CONSORCIO VIAL SANTA ROSA

  
EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ  
DNI N° 44944779  
REPRESENTANTE COMÚN

Sr. Edgar Gómez Domínguez  
Representante Común de CONSORCIO VIAL SANTA ROSA  
DNI N° 44944779

INSPECTOR



  
VANESSA ABIGAIL RODRÍGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

Ing. Vanessa Abigail Rodríguez Arteaga  
Inspector del Servicio  
CIP N° 194012

**“ACTA DE INICIO DE SERVICIO”**



Servicio

**MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA LONG= 8.970 KM” Y “CUSHIPE – ALGALLAMA – EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM”, DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**



Tramo

**“SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA” LONG= 8.970 KM**

Provincia

**SANTIAGO DE CHUCO**

Distrito

**SANTA CRUZ DE CHUCA**

Entidad Contratante

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)**

Empresa Ejecutora

**CONSORCIO VIAL SANTA ROSA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.)**

N.º de Contrato

**CONTRATO DE SERVICIO N.º 017-2020-MPSCH-LOG**

Fecha de Contrato

**28/08/2020**

Modalidad

**SUMA ALZADA**

Monto Presupuestado

**S/. 764,584.86 soles Inc. (I.G.V.)**

Monto Contractual

**S/. 763,655.00soles Inc. (I.G.V.)**

Inspector de Servicio

**Ing. VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA**

Aprobación Plan de Trabajo

**RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 149A-2020-MPSCH/GM**

Fecha de Aprobación

**21/09/2020**

Fecha de Inicio

**22/09/2020**

Plazo de Ejecución

**MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C. (sujeto a fecha de contrato)**

**MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C.**

**INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C.**

Fecha de Culminación

**31/12/2021**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
Ing. David Iván Silva Torres  
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
CIP N° 63635

Marcial Nicolás Barrantes Parimango  
ING. CIVIL  
R. CIP. N° 225678

Luis A. Gonzales Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398

CONSORCIO VIAL SANTA ROSA  
EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ  
RMI N° 4494778  
REPRESENTANTE COMÚN

En la ciudad de Santa Cruz de Chuca, provincia de Santiago de Chuco – La libertad, siendo las 9:00 p.m. del 22 de septiembre del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza con CIP. N° 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N° 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH, el Ing. Marcial Nicolás Barrantes Parimango con CIP N° 225678 como monitor designado del servicio intervenido (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N° 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Ing. Vanessa Abigail Rodríguez Arteaga con CIP N° 194012; asimismo, representando a Provías Descentralizado está el Ing. Gabriel Omar Panta Cossio con CIP N° 192701 encargado de Monitoreo y Seguimiento y el Ing. Bach. Eduardo Rafael Príncipe León con DNI N° 46839109 como Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento; finalmente, por parte del Contratista Ing. el Ing. Luis Alberto Gonzales Navarro con CIP N° 113398 como Residente de servicio y el Sr. Edgar Gómez Domínguez con DNI N° 44944779, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL SANTA ROSA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.). A fin de realizar el **INICIO DE SERVICIO** del tramo: **“SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA”** con una longitud de **8.970 KM**.

Este acto protocolar tiene por finalidad dar inicio a la ejecución de las actividades de **MANTENIMIENTO PERIÓDICO** de la ruta mencionada en todo su recorrido físico correspondiente a la FASE II del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y partidas estipulados en el Plan de Trabajo previamente aprobado por la Entidad.

Gabriel Omar Panta  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP. N° 192701




VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL

Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: "SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA LONG= 8.970 KM" Y "CUSHIPE – ALGALLAMA – EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM", DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**


Siendo las 9:30 a.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas acorde con el Plan de Trabajo, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para empezar la ejecución del Mantenimiento Periódico. Del mismo día, se da por concluido el acto de **INICIO DE SERVICIO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.

**AREA USUARIA**



INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
Gutiérrez Chávez Luis F.  
CIP: 190782  
JEFE DE OPERACIONES

**Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez**  
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH  
CIP N° 190782



INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
Valencia Rebaza Rafael K.  
CIP: 218511  
GERENTE GENERAL

**Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza**  
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH  
CIP N° 218511

CONSORCIO VIAL SANTA ROSA  
D.GAR. GÓMEZ DOMÍNGUEZ  
DNI N° 44944779  
REPRESENTANTE COMÚN



**Luis A. Gonzales Navarro**  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398



Marcial Nicolás Barrantes Parimango  
ING. CIVIL  
CIP: 225678

**Ing. Marcial Nicolás Barrantes Parimango**  
Monitor Designado del Instituto Vial Provincial MPSCH  
CIP N° 225678

**AREA RESPONSABLE**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
Ing. David Iván Silva Torres  
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
CIP N° 63635


**Ing. David Iván Silva Torres**  
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH  
CIP N° 63635

**REPRESENTANTES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD**



Gabriel Omar Panta Cossio  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 192701

**Ing. Gabriel Omar Panta Cossio**  
Monitoreo y Seguimiento a Mantenimiento Vial  
Provincia de Santiago de Chuco  
CIP N° 192701



Eduardo Rafael Príncipe León  
ANALISTA Y REGISTRADOR DEL MONITOREO  
Y SEGUIMIENTO A MANTENIMIENTO VIAL  
PROV. SANTIAGO DE CHUCO

**Ing. Bach. Eduardo Rafael Príncipe León**  
Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento  
Provincia de Santiago de Chuco  
DNI N° 46839109

**EMPRESA EJECUTORA**

  
Luis A. Gonzales Navarro  
ING. CIVIL  
R. CIP. 113398

Ing. Luis Alberto Gonzales Navarro  
Residente de Servicio  
CIP N° 113398

**CONSORCIO VIAL SANTA ROSA**

  
EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ  
DNI N° 44944779  
REPRESENTANTE COMÚN

Sr. Edgar Gómez Domínguez  
Representante Común de CONSORCIO VIAL SANTA ROSA  
DNI N° 44944779

**INSPECTOR**



  
VANESSA ABIGAIL RODRÍGUEZ ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

Ing. Vanessa Abigail Rodríguez Arteaga  
Inspector del Servicio  
CIP N° 194012
