



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

INFORME N° 1449 - 2020-MPSCH/DIST/SGI

600 N° 1447

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RECIBIDO
FECHA: 28 DIC. 2020
N° Folios: 238 Hora: 6:23
Firma: [Firma]
LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO NO INDICA CONFORMIDAD

A : ABOG. JHON JAIRO CURAY REYES
Administración de la MPSCH

DE : ING. DAVID IVAN SILVA TORRES
Sub Gerente de Infraestructura – MPSCH

ASUNTO : CONFORMIDAD DE VALORIZACION N° 04 CONTRATISTA – CONTRACTUAL
(TRAMO 09)

REFERENCIA : (01) INFORME N° 288-2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH
(02) CARTA N° 008-2020-VRA-IO/MPSCH
(03) OBRA: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: TRAMO 01: SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA" - LONG. = 8.970 KM - TRAMO 02: CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ)" - LONG. = 6.300 KM EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD." Perteneciente al paquete N°09
(04) CONTRATO DE SERVICIO N° 017-2020-MPSCH-LOG

FECHA : Santiago de Chuco, 28 de Diciembre del 2020

Me es sumamente honroso dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo; por otro lado referente al asunto de la presente manifiesto lo siguiente:

I. BASE LEGAL

- Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 27972 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
- Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
- Reglamento Nacional de Edificaciones

II. ANTECEDENTE

- ✓ Mediante el documento de la referencia, **INFORME N°0288-2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH**, el Encargado de la División de Supervisión y Liquidación de Obras, con fecha 28 de diciembre del 2020, da la **CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION N° 04 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO** del contratista "**CONSORCIO VIAL SANTA ROSA**"; presentado por el Ing. **VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA** - INSPECTOR de la obra denominada: "**MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: TRAMO 01: SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA**" - LONG. = 8.970 KM - TRAMO 02: **CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ)**" - LONG. = 6.300 KM EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"; quien solicita

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO
ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROVEIDO
PASE a: Logística
PARA: Trámite que
Correspondiente
FECHA: 28/12/20 Firma: [Firma]



[Firma]
Ing. David Ivan Silva Torres
Sub Gerente de Infraestructura



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

el Pago N° 04 por servicios de ejecución de obra al CONTRATISTA “CONSORCIO VIAL SANTA ROSA.”

III. ANALISIS FINANCIERO

Se detallan en los cuadros de los tramos valorizados

TRAMOS N°09.01: SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA” - LONG. = 8.970 KM

VALORIZACION BRUTA	S/. 346,557.55
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (-) SIN IGV	S/. -
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (-) SIN IGV	S/. -
VALORIZACION NETA	S/. 346,557.55
IGV (18%)	S/. 62,380.36
VALORIZACION (INCL. IGV)	S/. 408,937.91
RETENCION DE 10% FIEL CUMPLIMIENTO	

TRAMOS N°09.02: CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ)” - LONG. = 6.300 KM

VALORIZACION BRUTA	S/. 53,171.49
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (-) SIN IGV	S/. -
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (-) SIN IGV	S/. -
VALORIZACION NETA	S/. 53,171.49
IGV (18%)	S/. 9,570.87
VALORIZACION (INCL. IGV)	S/. 62,742.36
RETENCION DE 10% FIEL CUMPLIMIENTO	

COSTO GLOBAL DE TODO EL SERVICIO

VALORIZACION BRUTA	S/. 399,729.04
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (-) SIN IGV	S/. -
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (-) SIN IGV	S/. -
VALORIZACION NETA	S/. 399,729.04
IGV (18%)	S/. 71,951.23
VALORIZACION (INCL. IGV)	S/. 471,680.27
RETENCION DE 10% FIEL CUMPLIMIENTO	SE RETUBO EL TOTAL
MONTO TOTAL	S/. 471,680.27


CARLOS IVÁN SILVA TORRES
SU GERENTE DE INFRAESTRUCTURA



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ La **Valorización Bruta N° 04 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO** del contratista fue por **S/. 399,729.04 (TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTI NUEVE CON 04/100 SOLES)**.
- ✓ Se recomendó hacer el descuento por el monto de la **RETENCION DE 10 % GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO ES DE S/. 121,864.12 (CIENTO VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 12/100 SOLES) INCLU IGV en la segunda valorización y en la primera valorización se recomendó que se retenga S/. 8,135.88 (OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 88/100 SOLES INCLU IGV; en total se ha solicitado que se retenga el 10% que viene hacer el monto de S/. 130,000.00 (CIENTO TREINTA MIL CON 00/100 SOLES)**
- ✓ La Amortización del Adelanto Directo: -
- ✓ La Amortización del Adelanto de Materiales: -
- ✓ Por lo tanto, el monto a cancelar al **CONTRATISTA POR CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA VALORIZACION N°04 – POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO;** asciende a S/. 471,680.27 **(CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 27/100 SOLES) INCL. IGV;** se recomienda hacer la retención de fiel cumplimiento.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y acciones que estime por conveniente, salvo mejor parecer.

Atentamente,

Adjunto:

- Referencias
- Val N°04()
- Digital ()



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



INFORME N° 288 – 2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH

A : **ING° DAVID IVAN SILVA TORRES**
SUB-GERENTE DE INFRAESTRUCTURA MPSCH

DEL : **ING. HERMES M. MELENDEZ TAMAYO**
JEFE (e) DIVISIÓN DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

ASUNTO : **VALORIZACIÓN DE SERVICIO N°04 – DICIEMBRE 2020**



REFERENCIA: a) **TRAMO I: “MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA LONG=8.970KM - DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD”**

TRAMO II: “MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES CUSHIPE – ARGALLAMA – EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG=6.300KM - DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD”

b) **Carta N°008-2020 – VRA– IO/MPSCH**

c) **Carta N°007-2020/CONSORCIO VIAL SANTA ROSA/RL/EGD**

FECHA : **Santiago de Chuco, 22 de Diciembre del 2020**

Es grato dirigirme a Usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo, vistos los documentos de la referencia, el suscrito como Jefe de la División (e) de Supervisión y Liquidaciones de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco **OTORGA LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN N° 04- DICIEMBRE 2020** del Servicio de **“MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO I: SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA LONG=8.970KM –TRAMO II: CUSHIPE – ARGALLAMA – EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG=6.300KM - DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO -LA LIBERTAD”** y elaborado por el Contratista **CONSORCIO VIAL SANTA ROSA** según Contrato de Servicios N° 017-2020-MPSCH-LOG.

Se informa trabajos valorizados en el periodo Diciembre del 2020.

DATOS GENERALES

1.- DENOMINACION

“MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO I: SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA LONG=8.970KM –TRAMO II: CUSHIPE – ARGALLAMA – EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG=6.300KM - DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD”


2.- UBICACIÓN

- Caseríos : TRAMO I: Santa Rosa, Santa Cruz de Chuca, Llaturpamba
TRAMO II: Cushipe, Argallama
- Distrito : Santiago de Chuco
- Provincia : Santiago de Chuco
- Región : La Libertad

3.- DATOS DEL MANTENIMIENTO:

EJECUTOR

- Proceso de Selección : RES-PROG-09-2020-MPSCH/CS
- Contratista : CONSORCIO VIAL SANTA ROSA
- Representante Legal : Edgar Gómez Domínguez





Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe

- Contrato de Servicios : N° 017-2020-MPSCH-LOG.
- Suscripción de Contrato : 28/08/2020
- Modalidad : A Suma Alzada
- Valor Referencial (inc. IGV) : S/ 1'300,000.00
- Monto Contratado (inc. IGV) : S/ 1'300,000.00
- Monto del Tramo : S/ 1'300,000.00
- Factor de Relación : 1.0000
- Fuente de Financiamiento : Ministerio de Transportes y Comunicaciones -Provincia
- Plazo de Ejecución Inicial : 500 Días Calendarios
- Entrega de Terreno : 05 de Setiembre del 2020
- Inicio de Plazo Contractual : 22 de Setiembre del 2020
- Fecha Término Programado : 31 de Diciembre del 2020
- Residente de Obra : Ing. Luis Alberto Gonzales Navarro CIP 113398

TRAMO I: Santa Rosa, Santa Cruz de Chuca, Llaturpamba

- Porcentaje Programado : 29.82 %
- Porcentaje Programado Acumulado : 100.00 %
- Porcentaje Ejecutado : 64.52 %
- Porcentaje Ejecutado Acumulado : 100.00 %
- Estado del Mantenimiento : Terminado
- Monto Valorizado : S/ 633,833.00

TRAMO II: Cushipe, Argallama

- Porcentaje Programado : 29.76 %
- Porcentaje Programado Acumulado : 100.00 %
- Porcentaje Ejecutado : 14.09 %
- Porcentaje Ejecutado Acumulado : 100.00 %
- Estado del Mantenimiento : Terminado
- Monto Valorizado : S/ 445,167.00

INSPECTOR

- Inspector : Ing. Vanessa Abigail Rodríguez Arteaga CIP 194012
- Contrato de Inspección de Obra : N° 029-2020-MPSCH-LOG.
- Fecha de Contrato : 24/08/2020
- Plazo de Prestación de Servicio : 120 Días Calendario
- Monto Contratado (inc. IGV) : S/ 14,506.50



4.- ANTECEDENTES

- Con fecha 28 de Agosto del 2020 se firma el Contrato de Servicios N°0017-2020-MPSCH-LOG del Mantenimiento Periódico y Rutinario "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO I: SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA LONG=8.970KM –TRAMO II: CUSHIPE – ARGALLAMA – EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG=6.300KM - DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD" con la Empresa Contratista CONSORCIO VIAL SANTA ROSA por un monto de S/. 1'300,000.00, con un plazo de ejecución de 500 días calendario.
- El día 24 de Agosto del 2020 se firma el Contrato de Inspección de Servicio N°029-2020-MPSCH-LOG con el Consultor Ing. Vanessa Abigail Rodríguez Arteaga CIP 194012 por un monto de S/. 14,506.50, con un plazo de ejecución de 120 días calendario.
- Con fecha 05/09/2020 se firma el Acta de Entrega de Terreno con la participación de representantes de todos los involucrados.
- El 22/09/2020 se firma el Acta de Inicio de Obra con una fecha programada de término de servicio del 31 de Diciembre 2021.
- Con fecha 12 de Setiembre el Inspector recepciona la Carta N°002-2020/CONSORCIO VIAL SANTA ROSAR/EGD con la cual el Consorcio Vial Miraflores hace entrega del Plan de Trabajo para su revisión y tramite respectivo.
- El Ingeniero Inspector del Servicio mediante Carta N°002-2020-VRA-IO/MPSCH del 15 de Setiembre del 2020 ingresa por mesa de partes de la Entidad con Expediente Administrativo N° 4438 el Plan de Trabajo aprobado para su Conformidad.



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019

E-mail: mpsch@terra.com.pe

- Mediante INFORME N°123-2020-HMMT/DEYP/SGI/MPSCH, de fecha 17 de Setiembre del 2020 la División de Estudios y Proyectos otorga la Conformidad del Plan de Trabajo y sugiere su aprobación mediante la Resolución Respectiva.
- Con Resolución de Gerencia Municipal N°00312-2020-MPSCH/GM de fecha 28 de Setiembre 2020 de Aprueban el Plan de Trabajo del Mantenimiento Rutinario y Periódico.
- Mediante Carta N°003-2020-VRA-IO/MPSCH el Ing. Inspector hace llegar la Valorización de Servicio N°01 – Setiembre 2020 incluyendo la Carta N°003-2020/CONSORCIO VIAL SANTA ROSA/RL/EGD para su revisión y conformidad de pago.
- Mediante Carta N°004-2020-VRA-IO/MPSCH El Ing. Inspector hace llegar la Valorización de Servicio N°02 – Octubre 2020 incluyendo la Carta N°004-2020/CONSORCIO VIAL SANTA ROSA/RL/EGD para su revisión y conformidad de pago.
- Mediante Carta N°007-2020-VRA-IO/MPSCH El Ing. Inspector hace llegar la Valorización de Servicio N°02 – Octubre 2020 incluyendo la Carta N°006-2020/CONSORCIO VIAL SANTA ROSA/RL/EGD para su revisión y conformidad de pago.
- Mediante Carta N°008-2020-VRA-IO/MPSCH El Ing. Inspector hace llegar la Valorización de Servicio N°04 – Diciembre 2020 incluyendo la Carta N°007-2020/CONSORCIO VIAL SANTA ROSA/RL/EGD para su revisión y conformidad de pago.



5.- DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

- Movilización de Equipos y Maquinaria desde Trujillo a pie de obra y viceversa. Se ha trasladado la maquinaria que se describe en el informe del Ing. Inspector.
- Ejecución de partida de Trazo y Replanteo al 100.00% del tramo con el uso de equipo topográfico completo y dejando monumentados BMs y niveles.
- Colocación de una Capa Nivelante de e=5 cm en un volumen que representa el 100 % del Metrado total.
- Colocación de Material Granular, Emplantillado, Nivelación y Compactado e=15cm que representa el 100% del metrado.
- Extracción, selección, carguío y acumulación o apilamiento en zonas estratégicas, de material granular al 100% del metrado total.
- Eliminación de Material Excedente a botaderos autorizados en un volumen que representa el 100% aprox. del total.
- Conformación y Perfilado de Cunetas con maquinaria y mano de obra en ambos tramos acumulando que es el 100% de la longitud total.
- En Señalización con la totalidad de Postes Kilométricos, Señales Preventivas, Señales Reglamentarias y Señales Informativas consideradas.
- Se ha realizado la Recuperación Ambiental del 100% de áreas ocupadas en ambos Tramos.
- Implementación de protocolos de seguridad y equipamiento con EPPs para todo el personal.

6.-DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICION:

RESUMEN VALORIZACIÓN N° 04 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (DICIEMBRE 2020)

TRAMO I: Santa Rosa, Santa Cruz de Chuca, Llaturpamba

VALORIZACIÓN CONTRACTUAL	SIN IGV	S/. 346,557.55
	S/. 0.00	
REINTEGROS (REAJUSTES RECONOCIDOS)	SIN IGV	S/. 0.00
	S/. 0.00	
VALORIZACION BRUTA		S/.346,557.55
AMORTIZACIONES	SIN IGV	S/.0.00 (-)
ADELANTO DIRECTO	S/. 0.00	



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019

E-mail: mpsch@terra.com.pe



DEDUCCIONES (DQNC)	ADELANTO PARA MATERIALES	S/.	0.00	S/.	0.00
	ADELANTO DIRECTO	S/.	0.00		
	ADELANTO PARA MATERIALES	S/.	0.00		
VALORIZACION NETA				S/.	346,557.55
I. G. V. 18.00%				S/.	62,380.36
NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA				S/.	408,937.91

SON : CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 91/100 SOLES

RESUMEN VALORIZACIÓN N° 04 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (DICIEMBRE 2020)

TRAMO II: Cushipe, Argallama

VALORIZACIÓN CONTRACTUAL	SIN IGV	S/.	53,171.49
	S/.	0.00	
REINTEGROS (REAJUSTES RECONOCIDOS)	SIN IGV	S/.	0.00
	S/.	0.00	
VALORIZACION BRUTA			S/. 53,171.49
AMORTIZACIONES	SIN IGV	S/.	0.00 (-)
	S/.	0.00	
DEDUCCIONES (DQNC)	S/.	0.00	
	S/.	0.00	
	S/.	0.00	
	S/.	0.00	
VALORIZACION NETA			S/. 53,171.49
I. G. V. 18.00%			S/. 9,570.87
NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA			S/. 62,742.36

SON : DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 86/100 SOLES

7.- TOTAL A CANCELAR POR VALORIZACIÓN DE SERVICIO N°04 – DICIEMBRE 2020

TRAMO I: Santa Rosa, Santa Cruz de Chuca, Llaturpamba S/.

TRAMO II: Cushipe, Argallama

S/.

S/.

S/.

TOTAL A CANCELAR VALORIZACIÓN DE SERVICIO N°04 – DICIEMBRE 2020 S/.

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 27/100 SOLES



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe

8.- ANALISIS

- Se ha revisado el trámite seguido a los documentos de la referencia generados por el Contratista y el Inspector del Servicio.
- El Ing. Inspector del Servicio, en las conclusiones de su informe, debe ser claro y específico respecto a la aprobación de la Valorización de Servicio correspondiente.
- El Informe de Aprobación de la Valorización del Servicio emitido por el Inspector indica que la valorización está de acuerdo con lo ejecutado y cumple con el contenido de documentos e información técnica requerida y necesaria para el cumplimiento de las metas y objetivos del servicio contratado.
- La obra se encuentra TERMINADA.

9.- RECOMENDACIONES

- Se recomienda al Ing. Residente e Ing Inspector que deben presentar la documentación con el número de ejemplares originales y copias establecidos, contenido en formato digital y con el uso de separadores y la numeración requerida.
- Se recomienda al Ing. Residente e Ing Inspector que deben firmar todos los folios de la Valorización de todos los documentos que se presenten para su trámite. El Representante Legal también debe firmar todos los folios.
- Presentar todos los Análisis de Materiales y pruebas de campo requeridos (Estudio de Canteras, CBR, Densidad de Campo, etc) realizados en un laboratorio que cuente con autorización de INDECOPI.
- Presentar registro fotográfico de la ejecución de las partidas con su respectiva descripción.
- Verificar el cumplimiento de plan de trabajo, especialmente la Adecuación e Implementación de Protocolos ante la Emergencia Sanitaria por el Covid 19.

10.- CONCLUSIONES

- El Ing. Inspector del Servicio, en su informe, APRUEBA la Valorización de Servicio N°04 – Diciembre del 2020 e INFORMA LA TERMINACIÓN DEL SERVICIO. .
- Luego de su revisión, la Jefatura de la División de Supervisión y Liquidación de Obras de la Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, **OTORGA LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN N°04 – DICIEMBRE 2020** del Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario – Paquete N°09 “**MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO I: SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA LONG=8.970KM –TRAMO II: CUSHIPE – ARGALLAMA – EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG=6.300KM - DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD**” y aprobado por el Inspector de Obra y sugiere su CANCELACION en cumplimiento de las cláusulas contractuales.

Es todo cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Hermes M. Meléndez Tamayo
CIP: 111401
Jefe División de Supervisión y Liquidaciones



C.I.P. N°: 194012

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Santiago de Chuco, 21 de diciembre de 2020.

CARTA N° 008-2020-VRA-IO/MPSCH.

A: **DR. FELIPE WILMER ANGULO ZAVALETA.**
Gerente de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.

DE: **ING. VANESSA ABIGAIL RODRÍGUEZ ARTEAGA**

ASUNTO: **PRESENTO VALORIZACIÓN N° 04 DEL CONTRATISTA**

REFERENCIA:

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - "SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG=8.970KM", - "CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM" - DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

A consideración:

Tengo a bien dirigirme a usted como inspector para saludarlo cordialmente, al mismo tiempo presentarle la Valorización N° 04 del contratista CONSORCIO VIAL SANTA ROSA que corresponde al "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - "SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG=8.970KM", - "CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM" - DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"; correspondiente al mes de diciembre del 2020.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO
MESA DE PARTES
N° Exp: 7735
21 DIC. 2020
N° Folios: 230 + 200 + 100
Hora: 3:44 Firm: [Signature]



Vanessa [Signature]
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO
GERENCIA MUNICIPAL
PROVEIDO
PASE a: INFRAESTRUCTURA/MP
PARA: SU ATEN CON DRE/DA
REVISOR
FECHA: 22.12.20 Firm: [Signature]





"Año de la universalización de la salud"

INFORME N° 007 – 2020 –VARA/INSP

A : **ING. RAFAEL K. VALENCIA REBAZA.**
Gerente de IVP de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.

DE : **ING. VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTIAGA.**
Inspector del servicio

ASUNTO : **VALORIZACIÓN N° 04 - PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.**

REFERENCIA : **SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - "SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG=8.970KM", - "CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM" - DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD**

FECHA : Santiago de Chuco 21 de diciembre del 2020

Mediante el presente tengo a bien de alcanzarle el pronunciamiento al informe mensual del contratista referente a la Valorización N° 04 del: "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - "SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG=8.970KM", - "CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM" - DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD", detallando lo siguiente:

I. ANTECEDENTES.

- a) Conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local.
- b) La Ley Orgánica de Municipalidades señala que las municipalidades provinciales y distritales, dentro del marco de las competencias y funciones específicas, son competentes para promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales.
- c) Mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprobó la reanudación de las actividades: "Mantenimientos, Mejoramiento y Conservación Rutinarios y Periódicos de Vías Nacionales, Departamentales y Locales" y de acuerdo a lo señalado en el numeral 1.2 del Artículo 1 del mencionado decreto supremo, las referidas actividades se encuentran autorizadas para su reanudación de forma automática, una vez que las personas jurídicas que realizan dichas labores registren su "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.
- d) Con Decreto de Urgencia N° 070-2020 se dictó medidas destinadas a generar empleo para la ejecución de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional, departamental y vecinal a efectos de establecer medidas necesarias, en materia económica y financiera, que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco de sus competencias, la ejecución de acciones oportunas para la reactivación de la actividad económica, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento periódico y rutinario de las vías nacionales, departamentales y vecinales. Los trabajos de mantenimiento proyectado facilitan el





traslado de los productos agropecuarios de las zonas a intervenir, hasta los centros de consumo, permitiendo garantizar el abastecimiento de los productos a consecuencia de la Emergencia Sanitaria generada por el brote del Coronavirus (COVID-19).

- e) El Decreto de Urgencia N° 070-2020 014-2019 estableció, entre otras, medidas que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco de sus competencias, la ejecución de acciones oportunas, en el marco de la emergencia sanitaria generada por el pandemia COVID-19, para la reactivación de la actividad económica a nivel nacional y atención a la población, fomentando trabajo local a través de mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento periódico y rutinario de las vías departamentales y vecinales.
- f) Al respecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 del D.U. N° 070- 2020, numeral 21.3, los Titulares de los pliegos habilitados en la presente transferencia de partidas aprueban mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 21.1, a nivel programático, dentro de los cuales se registran el desagregado del **INSPECTOR**, quien estará a cargo de Monitorear y evaluar la calidad técnica del servicio, considerando al plan de trabajo como documento técnico de calidad del servicio.
- g) En ese sentido, la presencia del Inspector, es prioritario y como profesional competente para Monitorear y evaluar la calidad técnica del servicio mediante las actividades programadas en el Plan de Trabajo de cada uno de los caminos vecinales priorizados por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, en el marco del D.U. N° 070-2020.
- h) El objetivo como profesional es Inspeccionar, controlar, Fiscalizar y verificar la ejecución de las actividades de mantenimiento vial dando cumplimiento al Plan de Trabajo aprobado por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, en el marco del D.U. N° 070-2020.

II. DATOS GENERALES DEL SERVICIO:

1. Nombre del Servicio

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - "SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG=8.970KM", - "CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM" - DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD",

2. Ubicación

Región : LA LIBERTAD

Provincia : SANTIAGO DE CHUCO

Distrito : SANTA CRUZ DE CHUCA

Caserío : SANTA ROSA – LLATURPAMBA – CUSHIPE – ARGALLAMA

3. Proceso De Adjudicación del Servicio

PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 009-2020-MPSCH/CS

4. Fuente de financiamiento

Recursos por operaciones oficiales de crédito (ROOC)



5. **Modalidad Contratación**

a Suma Alzada

6. **Contrato de Servicio**

N° 017-2020-MPSCH/LOG

7. **Decreto de Urgencia**

N° 070-2020

8. **Fecha de Suscripción**

28 de agosto del 2020

9. **Ejecutor De Servicio**

CONSORCIO VIAL SANTA ROSA

Conformado por:

CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.

RUC: 20568073658

ECAN INGENIERIA SOCIEDAD COMERCIAL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ECAN
INGENIERIA S.R.L.

RUC: 20600813715

Representante Legal: Sr. Edgar Gomez Dominguez.

10. **Residente De Obra**

ING. LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO

11. **Monto Contratado Para La Ejecución Del Servicio**

S/. 1,300,000.00 (Un millón Trescientos mil con 00/100 Soles). inc el IGV.

12. **Fecha Entrega Terreno**

29 de agosto del 2020 (Elaboración del Plan de Trabajo)

13. **Fecha de Conformidad de Plan de Trabajo**

21 de Setiembre del 2020

14. **Fecha de Inicio de Servicio**

22 de Setiembre del 2020

15. **Plazo de Ejecución**

120 DIAS CALENDARIOS

16. **Fecha Límite de ejecución**

31 de Diciembre del 2020

DATOS DE INSPECCIÓN

17. **Contrato Inspección**

N° 029 – 2020 – MPSCH-LOG.



Vanessa Art.
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012



- 18. **Fecha Contrato Inspección**
24 de Agosto 2020
- 19. **Inspector del Servicio**
ING. VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
Ingeniero Civil con Reg. CIP N° 194012
- 20. **Monto Contratado Para La Inspección del Servicio**
S/. 14,506.50 (Catorce mil Quinientos Seis con 50/100 Soles).
- 21. **Plazo Prestación Inspección**
120 días calendarios


III. DE LA PRESENTACIÓN DE LA VALORIZACION

Mediante la **Carta N° 0007-CONSORCIO VIAL SANTA ROSA**, de fecha 16 de Diciembre, la empresa **CONSORCIO VIAL SANTA ROSA**, con representante común Edgar Gomez Dominguez, realizo la entrega de la Valorización N° 04 del "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - "SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG=8.970KM", - "CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM" - DISTRICTO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"- a mi persona en calidad de INSPECTOR para su evaluacion y posteriormente su aprobavacion.

IV. ESTADO FÍSICO DE LA OBRA

El Avance Físico de la obra en los dos tramos nos refleja un avance ejecutado de 43.71%, en el periodo comprendido para el mes de diciembre del 2020, en comparación al 29.80% del Avance Programado Mensual; además se hace mención que el avance ejecutado Acumulado es 100 % contra el avance programado acumulado que es de 100%, por lo tanto, nos refleja la culminación.

Cuadro de Avance de Obra

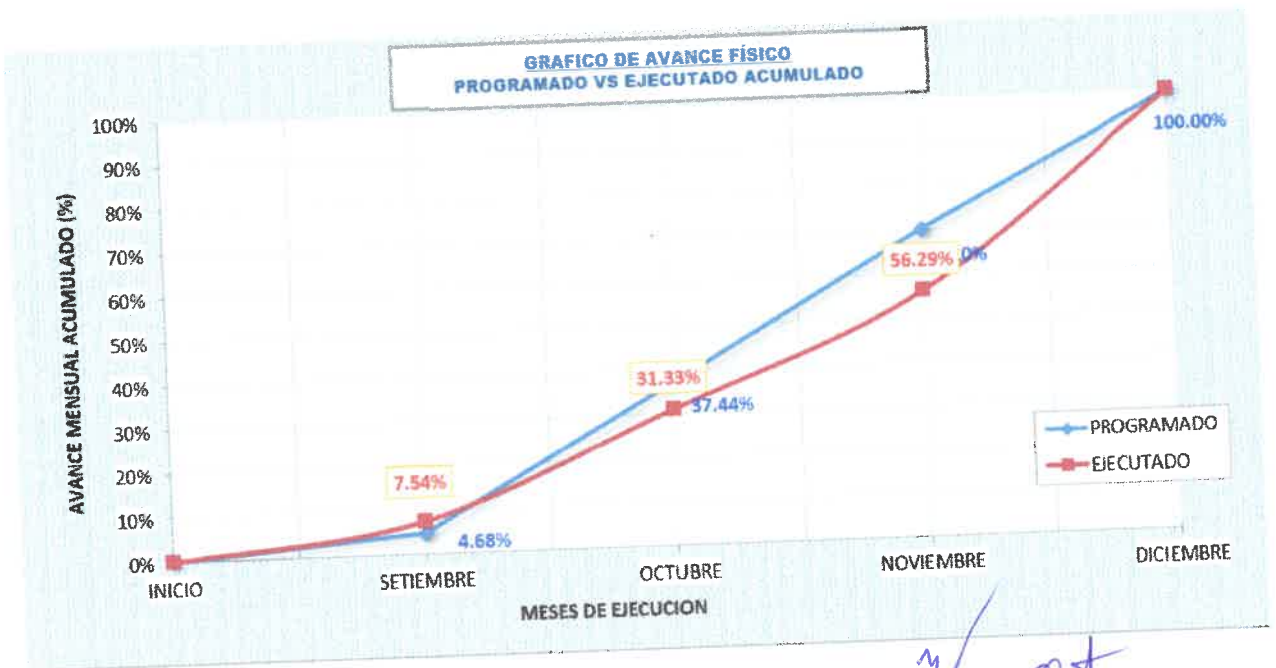

Vanessa O.S.T.
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012



1. SITUACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra concluido; documentado en los datos de la ficha de control del avance programado vigente, el avance programado acumulado es de 100%, y el ejecutado acumulado 100%.

COMENTARIOS:

La obra se viene desarrollando con normalidad en los dos tramos desde el 22 de setiembre del 2020.

2. LABORES EFECTUADAS POR EL INSPECTOR EN EL PRESENTE PERIODO

- Verificación de la desmovilización de equipos y maquinaria a obra.
- Verificación de los trabajos de trazo y replanteo.
- Inspección de los trabajos correspondientes a la capa nivelante E=0.05m.
- Verificación de los trabajos de conformación de base con material granular de cantera E=0.15m.
- Control y verificación de las actividades correspondientes al transporte de material granular y material excedente hasta y mayor a un KM.
- Verificación en instalación de postes kilométricos, señales preventivas, señales reglamentarias y señales informativas.
- Se verificaron los trabajos de reconfiguración de cunetas.
- Revisión y control de la Programación del servicio.
- Verificación de los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las partidas conformantes del Plan de Trabajo.
- Elaboración de metrados de obra ejecutada.
- Control de la Programación y Avance de Obra.
- Coordinaciones y reuniones con el Contratista para lograr que la obra se ejecute de acuerdo a lo programado.
- Preparación y presentación de Informe Mensual.
- Control del Plan de Seguridad y Salud en Obra, incluyendo las medidas del plan para la vigilancia prevención y control del COVID-19.
- Se verifico la ejecución de partidas correspondientes al periodo del 01 al 16 de diciembre del 2020.



Vanessa R.A.
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Finalmente, se concluye dando opinión favorable a la documentación presentada por el **CONSORCIO VIAL SANTA ROSA** por concepto de ejecución del: **SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - "SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG=8.970KM", - "CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM" - DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD**" correspondiente a la Valorización N° 04 del Mes de Diciembre del 2020 por el monto de S/.471, 680.27 (Cuatrocientos Setenta y Un Mil Seiscientos Ochenta con 27/100).; incluido el IGV, que corresponde al 43.71 % del Avance Físico de Obra.

Sin otro particular y atento de brindarle mi servicio, me suscribo de Usted..

Atentamente,



Vanessa R.A.
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012



- CARTA DE LA
EMPRESA
DIRIGIDA AL
INSPECTOR.


Luis A. Gonzalez Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398





CARTA N°007-2020/CONSORCIO VIAL SANTA ROSA/RL/EGD.

SR. : **ING. VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA**
Inspector de Servicio


ASUNTO : **ALCANZA VALORIZACION DE SERVICIO N° 04**

REFERENCIA : “SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG. =8.970KM, - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD”.

FECHA : **16 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Me es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo y al mismo tiempo alcanzarle el INFORME DE VALORIZACION N° 04 correspondiente al mes de diciembre del 2020 (periodo de 01 de diciembre del 2020 al 16 de diciembre del 2020). Para su respectiva revisión y aprobación.

Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración y estima.


Luis A. Gonzales Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398

Atentamente:


CONSORCIO VIAL SANTA ROSA
EDGAR GOMEZ DOMINGUEZ
DNI N° 44944779
REPRESENTANTE COMÚN

Cc:

- Archivo





- FICHA
TECNICA.


Luis A. Gonzalez Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398



VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012



1-A: FICHA TECNICA DEL CAMINO VECINAL

1. **Municipalidad**

2. **Datos Responsable:** Fecha:

Cargo:

3. **Ubicación Política Administrativa:** **Cod. Ubigeo:**

Distrito(s):

Provincia(s):

Departamento:

4. Datos del SINAC: Clasificador de Rutas Vigente

Jerarquía Vial: Código de Ruta:

Código de Ruta Provisional (Rutas sin Clasificar):

Trayectoria:

5. Ubicación Geográfica:

De la Ruta:

Inicio: Descripción

Progresiva: Cota: msnm ZONA:

Coordenada (UTM - WGS84):

Fin: Descripción

Progresiva: Cota: msnm ZONA:

Coordenada (UTM - WGS84):

Sello y Firma de Responsable de elaboración del ICV


Luis A. Gonzales Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398

Nota: La Información de la Ficha debe tener el respaldo de la Información digital respectiva: Archivos GPS (Puntos=Waypoints y Eje Vial=Tracks), Fotografías (jpg), Video de la Obra (formato Avi). Deberá entregar en DVD.



VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

1-A: FICHA TECNICA DEL CAMINO VECINAL

1. **Municipalidad**

2. **Datos Responsable:** Fecha:

Cargo:

3. **Ubicación Política Administrativa:** **Cod. Ubigeo:**

Distrito(s):

Provincia(s):

Departamento:

4. **Datos del SINAC: Clasificador de Rutas Vigente**

Jerarquía Vial: Código de Ruta: R131032 – R131033

Código de Ruta Provisional (Rutas sin Clasificar):

Trayectoria:

5. **Ubicación Geográfica:**

De la Ruta:

Inicio: Descripción


Progresiva: Cota: msnm ZONA:

Coordenada (UTM - WGS84):

Fin: Descripción

Progresiva: Cota: msnm ZONA:

Coordenada (UTM - WGS84):


 Luis A. Gonzales Navarro
 ING. CIVIL
 R. CIP. 113398

Sello y Firma de Responsable de elaboración del ICV

Nota: La Información de la Ficha debe tener el respaldo de la Información digital respectiva: Archivos GPS (Puntos=Waypoints y Eje Vial=Tracks), Fotografías (jpg), Video de la Obra (formato Avi). Deberá entregar en DVD.




 VANESSA ARCAID RODRIGUEZ ARTEAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012




- **FACTURA DEL CONTRATISTA.**


Luis A. Gonzales Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398



VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012



Factura



- INFORME DE RESIDENTE.



Luis A. Gonzales Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398



VANESSA ARCAÑAL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012





VALORIZACION N°04 - DICIEMBRE 2020

OBRA : "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG.=8.970KM, - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"


CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL SANTA ROSA

INSPECTOR : VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA - CIP 194012

RESIDENTE : LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO - CIP 113398



ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO


PERIODO : DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020


Luis A. Gonzales Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398



DICIEMBRE 2020



VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012





INFORME MENSUAL 04
(DICIEMBRE – 2020)
EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO
FASE: II

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

1.1. NOMBRE DEL SERVICIO:

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG. =8.970KM, - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

1.2. N° DE CONTRATO:

CONTRATO DE SEVICIO: N° 017-2020-MPSCH-LOG.

1.3. ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

1.4. CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL SANTA ROSA

DATOS DEL CONSORCIADO 1

RUC: 20568073658

RAZÓN SOCIAL: ECAN INGENIERIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RLTD.


DIRECCIÓN: PRO. HUANCABAMBA N° 211 (URB. OXAPAMPA)

DATOS DEL CONSORCIADO 2

RUC: 20600813715

RAZON SOCIAL: CORPORACIÓN SORIANO L Y C S.A.C.

DIRECCION: MZA. T LOTE 17 – Urbanización San Andrés 5ta. La libertad


Luis A. Gonzales Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398

1.5. INSPECTOR:

VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA con CIP 194012.



VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012





1.6. RESIDENTE:

LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO con CIP 113398.

1.7. MONTO DE CONTRATO:

S/. 1,300,000.00 INC. IG.V.

1.8. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO:

S/. 1,079,000.00 INC. IG.V.

1.9. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:

S/. 195,000.00 INC. IG.V.

1.10. PLAZO DE EJECUCIÓN:

120 DIAS CALENDARIOS

1.11. FECHA DE INICIO:

22 DE SETIEMBRE DEL 2020

1.12. FECHA DE CULMINACIÓN:

31 DE DICIEMBRE DEL 2020.


Luis A. Gonzales Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS – FASE II:

2.1. TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA - SANTA CRUZ DE CHUCA - SANTIAGO DE CHUCO

2.1.1. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Durante el periodo de 01 de diciembre del 2020 al 16 de diciembre del 2020
Se trabajó en las siguientes partidas:

01.00 OBRAS PROVINCIONALES

01.01 Movilización y Desmovilización de Equipos

02.00 PAVIMENTOS

02.01 Capa Nivelante E=0.05M

02.02 Material Granular de Cantera E=0.15M

03.00 TRANSPORTE

03.01 Transporte de Material Granular hasta 1 KM

03.02 Transporte de Material Granular mayor a 1 KM

03.03 Transporte de Material Excedente hasta 1 KM

03.04 Transporte de Material Excedente mayor a 1 KM



VANESSA ARIGAL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012





04.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01 Reconfiguración de Cunetas

05.00 SEÑALIZACIÓN

05.01 Instalación de Postes Kilométricos

05.02 Señales Preventivas

05.03 Señales Reglamentarias

05.04 Señales Informativas

06.00 IMPACTO AMBIENTAL

06.01 Recuperación Ambiental de Áreas Ocupadas

07.00 EMERGENCIA SANITARIA

07.01 Emergencia sanitaria COVID-19

2.1.2. DETALLE DE CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADOS Y ANEXAR LOS CERTIFICADOS DE LABORATORIO.

Durante el periodo 01 de diciembre del 2020 al 16 de diciembre del 2020

Se realizaron actividades que ameriten controles de calidad como densidad de campo en el tramo intervenido.

2.2. TRAMO CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) - SANTA CRUZ DE CHUCA - SANTIAGO DE CHUCO

2.2.1. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Durante el periodo de 01 de diciembre del 2020 al 16 de diciembre del 2020

Se trabajó en las siguientes partidas:

01.00 OBRAS PROVICIONALES

01.01 Movilización y Desmovilización de Equipos

05.00 SEÑALIZACIÓN

05.01 Instalación de Postes Kilométricos

05.02 Señales Preventivas

05.03 Señales Reglamentarias

05.04 Señales Informativas

06.00 IMPACTO AMBIENTAL

06.01 Recuperación Ambiental de Áreas Ocupadas



07.00 EMERGENCIA SANITARIA

07.01 Emergencia sanitaria COVID-19

2.2.2. DETALLE DE CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADOS Y ANEXAR LOS CERTIFICADOS DE LABORATORIO.

Durante el periodo de 01 de diciembre del 2020 al 16 de diciembre del 2020

Se realizaron actividades que ameriten controles de calidad como densidad de campo en el tramo intervenido.



VANESSA ABICAL RODRIGUEZ ARTEGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012


Luis A. Gonzales Navarria
ING. CIVIL
R. CIP. 113398





3. ESTADO DE SITUACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO – FASE II:

3.1. SITUACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

3.1.1. TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA - SANTA CRUZ DE CHUCA - SANTIAGO DE CHUCO

3.1.1.1. DETALLAR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y LOS PORCENTAJES DE AVANCE.

Durante el periodo de 01 de diciembre del 2020 al 16 de diciembre del 2020
Se realizaron los trabajos en las siguientes partidas.

01.00 OBRAS PROVINCIALES

01.01 Movilización y Desmovilización de Equipos

Esta partida cuenta con un avance del 50.00%.

A la fecha la partida se encuentra en un 100%

02.00 PAVIMENTOS

02.01 Capa Nivelante E=0.05M

Esta partida cuenta con un avance del 59.87%.

A la fecha la partida se encuentra en un 100%

02.02 Material Granular de Cantera E=0.15M

Esta partida cuenta con un avance del 68.78%.

A la fecha la partida se encuentra en un 100%

03.00 TRANSPORTES

03.01 Transporte de Material Granular hasta 1 KM

Esta partida cuenta con un avance del 69.80%.

A la fecha la partida se encuentra en un 100%

03.02 Transporte de Material Granular mayor a 1 KM

Esta partida cuenta con un avance del 69.79%.

A la fecha la partida se encuentra en un 100%

03.03 Transporte de Material Excedente hasta 1 KM

Esta partida cuenta con un avance del 70.19%.

A la fecha la partida se encuentra en un 100%

03.04 Transporte de Material Excedente mayor a 1 KM

Esta partida cuenta con un avance del 70.11%.


A la fecha la partida se encuentra en un 100%

04.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01 Reconfirmación de Cunetas

Esta partida cuenta con un avance del 59.87%.

A la fecha la partida se encuentra en un 100%


Luis A. Gonzales Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398



VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012





05.00 SEÑALIZACIÓN

05.01 Instalación de Postes Kilométricos

Esta partida cuenta con un avance del 100%.

05.02 Señales Preventivas

Esta partida cuenta con un avance del 100%.

05.03 Señales Reglamentarias

Esta partida cuenta con un avance del 100%.

05.04 Señales Informativas

Esta partida cuenta con un avance del 100%.

06.00 IMPACTO AMBIENTAL

06.01 Recuperación Ambiental de Áreas Ocupadas

Esta partida cuenta con un avance del 100%.

07.00 EMERGENCIA SANITARIA

07.01 Emergencia sanitaria COVID-19

Esta partida cuenta con un avance del 20.00%.

A la fecha la partida se encuentra en un 100%

3.1.1.2. DETALLAR LOS CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADAS Y ANEXAR LOS CERTIFICADOS DE LABORATORIO.

Durante el periodo de 01 de diciembre del 2020 al 16 de diciembre del 2020 se realizaron actividades que ameriten controles de calidad como densidad de campo en el tramo intervenido.

3.1.1.3. CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS

Ver anexos.

3.1.2. TRAMO CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) - SANTA CRUZ DE CHUCA - SANTIAGO DE CHUCO

3.1.2.1. DETALLAR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y LOS PORCENTAJES DE AVANCE.

Durante el periodo 01 de diciembre del 2020 al 16 de diciembre del 2020 Se realizaron los trabajos en las siguientes partidas.

01.00 OBRAS PROVICIONALES

01.01 Movilización y Desmovilización de Equipos

Esta partida cuenta con un avance del 50.00%.

A la fecha la partida se encuentra en un 100%

02.00 PAVIMENTOS


02.01 Capa Nivelante E=0.05M

A la fecha la partida se encuentra en un 100%

02.02 Material Granular de Cantera E=0.15M


Luis A. Gonzales Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398


VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012





A la fecha la partida se encuentra en un 100%

03.00 TRANSPORTES

03.01 Transporte de Material Granular hasta 1 KM

A la fecha la partida se encuentra en un 100%

03.02 Transporte de Material Granular mayor a 1 KM

A la fecha la partida se encuentra en un 100%

03.03 Transporte de Material Excedente hasta 1 KM

A la fecha la partida se encuentra en un 100%

03.04 Transporte de Material Excedente mayor a 1 KM

A la fecha la partida se encuentra en un 100%

04.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01 Reconfiguración de Cunetas

A la fecha la partida se encuentra en un 100%

05.00 SEÑALIZACIÓN

05.01 Instalación de Postes Kilométricos

Esta partida cuenta con un avance del 100%.

05.02 Señales Preventivas

Esta partida cuenta con un avance del 100%.

05.03 Señales Reglamentarias

Esta partida cuenta con un avance del 100%.

05.04 Señales Informativas

Esta partida cuenta con un avance del 100%.



VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

06.00 IMPACTO AMBIENTAL

06.01 Recuperación Ambiental de Áreas Ocupadas


Esta partida cuenta con un avance del 100%.

07.00 EMERGENCIA SANITARIA

07.01 Emergencia sanitaria COVID-19

Esta partida cuenta con un avance del 25.00%.

A la fecha la partida se encuentra en un 100%


Luis A. González Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398

3.1.2.2. DETALLAR LOS CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADAS Y ANEXAR LOS CERTIFICADOS DE LABORATORIO.

Durante el periodo de 01 de diciembre del 2020 al 16 de diciembre del 2020 se realizaron actividades que ameriten controles de calidad como densidad de campo en el tramo intervenido.





3.1.2.3. CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS
Ver anexos.

3.2 SITUACIÓN DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA

3.2.1 RETENCIÓN DE GARANTÍAS.

Retención del 10% como fondo de garantía de fiel cumplimiento, según cláusula séptima: Garantías, del contrato.

3.2.2 VIGENCIA DE LAS CARTAS FIANZAS.

No aplica.

3.2.3 VIGENCIA DE LOS SEGUROS (SCTR, SOAT) Y ANEXAR COPIAS.

22/12/2020.

3.2.4 PENALIDADES (APLICADAS Y COBRADAS).

No aplica.

3.2.5 RELACIÓN DE PERSONAL QUE TRABAJÓ (PROFESIONAL, TÉCNICOS Y OBREROS).

PERSONAL ASEGURADO					
SEDE: CONSTRUCCION					
Nro	PATERNO	MATERNO	NOMBRES	DNI	FECHA DE NACIMIENTO
1	RONCAL	MORALES	CARLOS EDUARDO	18010553	16/04/1972
2	SALINAS	DE LA CRUZ	ELVIS HECTOR	70893861	16/01/1992
3	CHÁVEZ	ESPEJO	WALTER	47271818	19/09/1991
4	SÁNCHEZ	ASUNCIÓN	LAZARO	42828408	14/02/1983
5	LIMAY	CHAVARRIA	RUPERTO	41840754	17/08/1982
6	MARDONADO	NOGUERA	JUAN	15236259	04/05/1976
7	POLO	LAYZA	WALTER	47750955	08/04/1953
8	GUEVARA	LLAURY	LORGIO	80459091	02/03/1978
9	CASTILLO	FLORES	JORGE	47037843	23/04/1991
10	MARIÑOS	GUEVARA	CARLOS	63151922	05/11/2002
11	MARIÑOS	RUIZ	AGUSTÍN	48739396	21/05/1996
12	CASTILLO	VASQUEZ	JUAN	80470817	30/03/1978
13	FLORES	VASQUEZ	ADRIANA	48220937	06/03/1994
14	CHACON	ARAUJO	KALIN	71647271	23/06/1999
15	PAITAN	CALDERON	EDGAR	42322993	25/02/1983



VANESSA ABICAL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

3.2.6 RELACIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS.


Se utiliza la misma cantidad de equipos en cada uno de los tramos:

- 01 excavadora
- 01 motoniveladora
- 01 rodillo liso vibratorio
- 01 cisterna para agua
- 04 camión volquete
- 01 camioneta Pick Up


Luis A. González Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398

3.2.7 SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIA SANITARIA.



Se viene realizando todos los trabajos respetando todos los parámetros de Emergencia Sanitaria COVID-19 según plan de trabajo.





4. CONCLUSIONES

- El informe mensual de Valorización N°04, obedece a los trabajos realizados desde el 01 de diciembre del 2020 al 16 de diciembre del 2020, dichos trabajos aprobados por el inspector designado por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.
- El porcentaje de avance físico en el Tramo SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA - SANTA CRUZ DE CHUCA Y CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) - SANTA CRUZ DE CHUCA - SANTIAGO DE CHUCO del informe mensual de Valorización N°04 es del **43.71%** del ejecutado real mensual contra el **29.80%** ejecutado programado mensual, frente a **100%** un programado del mes y un acumulado programado de **100%** estando el estado del Servicio Culminado 100%.
- El monto correspondiente al informe Mensual de Valorización N°04 es de **S/. 471,680.27** (cuatrocientos setenta y un mil seiscientos ochenta con 27/100 soles).
- Recomendamos a la entidad contratante la Municipalidad Provincial de Provincial de Santiago De Chuco, revisar, aprobar y tramitar el informe mensual de Valorización N°04 correspondiente al mes de diciembre del 2020.



VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012


Luis A. Gonzales Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398






- RESUMEN DE
VALORIZACION
MENSUAL.



VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012


Luis A. Gonzalez Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398



RESUMEN DE VALORIZACION N° 04

DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020

Obra : "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG =8.970KM, - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Ciente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

Ubicación : SANTA CRUZ DE CHUCA

Contratista : CONSORCIO VIAL SANTA ROSA

Inspector : VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA CIP 194012

Residente : LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO CIP 113398

Item	Descripción	MONTO CONTRATADO PERIÓDICO	VALORIZADO ANTERIOR		VALORIZADO DEL MES		ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
			EJECUTADO ANT. ACUM.	%	EJECUTADO EN EL MES	%	EJECUTADO ACT. ACUM	%	Parcial EJECUCION	%
1.00	TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA LLATURPAMBA	S/. 467,084.01	S/. 165,729.62		S/. 301,354.39		S/. 467,084.01		S/. 0.00	
2.00	TRAMO CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ)	S/. 328,052.32	S/. 281,816.24		S/. 46,236.08		S/. 328,052.32		S/. 0.00	
	SUB TOTALES COSTO DIRECTO	795,136.33	447,545.86		347,590.47		795,136.33		0.00	
	GASTOS GENERALES (10%)	79,513.63	44,754.58		34,759.05		79,513.63		0.00	
	UTILIDAD (5%)	39,756.82	22,377.30		17,379.52		39,756.82		0.00	
	SUB TOTAL	S/. 914,406.78	S/. 514,677.74		S/. 399,729.04		S/. 914,406.78		S/. 0.00	
	I.G.V. (18 %)	164,593.22	92,641.99		71,951.23		164,593.22		0.00	
	TOTAL	S/. 1,079,000.00	S/. 607,319.73	56.29%	S/. 471,680.27	43.71%	S/. 1,079,000.00	100.00%	S/. 0.00	0.00%


Vanessa Art.
 VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012


Luis A. Gonzales Navarro
 ING. CIVIL
 R. CIP. 113398




- CONTROL Y
SUSTENTO DE
METRADOS Y
ACTIVIDADES
EJECUTADAS.


Luis A. González Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398



VANESSA ABIGAIL RODRÍGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012



CONTROL Y SUSTENTO DE METRADOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS

DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG.=8.970KM, - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Servicio

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : TRAMO CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ)
Contratista : CONSORCIO VIAL SANTA ROSA
Inspector : VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA CIP 194012
Residente : LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO CIP 113398

Monto Contratado S/. 1,300,000.00
Plazo de ejecucion 120 dias calendarios

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATADO	CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS				% EJECUTADO
				ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR EJECUTAR	
1.00	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	0.50	0.50	1.00	0.00	100.00%
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	6.30	6.30	0.00	6.30	0.00	100.00%
2.00	PAVIMENTOS							
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	1,575.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	100.00%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	4,725.00	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	100.00%
3.00	TRANSPORTE							
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	4,882.50	4,882.50	0.00	4,882.50	0.00	100.00%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	22,750.88	22,750.88	0.00	22,750.88	0.00	100.00%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	2,920.00	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	100.00%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	7,128.50	7,128.50	0.00	7,128.50	0.00	100.00%
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE							
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	100.00%
5.00	SEÑALIZACION							
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	100.00%
05.02.	SENALES PREVENTIVAS	und	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	100.00%
05.03.	SENALES REGLAMENTARIAS	und	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	100.00%
05.04.	SENALES INFORMATIVAS	und	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	100.00%
6.00	IMPACTO AMBIENTAL							
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	100.00%
7.00	EMERGENCIA SANITARIA							
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	0.75	0.25	1.00	0.00	100.00%


Luis A. Gonzales Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398




VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

CONTROL Y SUSTENTO DE METRADOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS

DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020

202

Proyecto : "SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG.=8.970KM, - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA
Contratista : CONSORCIO VIAL SANTA ROSA
Inspector : VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA CIP 194012
Residente : LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO CIP 113398

Monto Contratado S/. 1,300,000.00
Plazo de ejecucion 120 dias calendarios

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATADO	CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS				% EJECUTADO
				ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR EJECUTAR	
1.00	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	0.50	0.50	1.00	0.00	100.00%
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	8.97	8.97	0.00	8.97	0.00	100.00%
2.00	PAVIMENTOS							
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	2,242.50	900.00	1,342.50	2,242.50	0.00	100.00%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	6,727.50	2,100.00	4,627.50	6,727.50	0.00	100.00%
3.00	TRANSPORTE							
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	6,952.50	2,100.00	4,852.50	6,952.50	0.00	100.00%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	26,808.88	8,100.00	18,708.88	26,808.88	0.00	100.00%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	4,025.00	1,200.00	2,825.00	4,025.00	0.00	100.00%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	6,692.21	2,000.00	4,692.21	6,692.21	0.00	100.00%
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE							
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	8,970.00	3,600.00	5,370.00	8,970.00	0.00	100.00%
5.00	SENALEZACION							
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	100.00%
05.02.	SENALES PREVENTIVAS	und	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	100.00%
05.03.	SENALES REGLAMENTARIAS	und	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	100.00%
05.04.	SENALES INFORMATIVAS	und	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	100.00%
6.00	IMPACTO AMBIENTAL							
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	100.00%
7.00	EMERGENCIA SANITARIA							
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	0.80	0.20	1.00	0.00	100.00%


Luis A. Gonzales Navarro
 ING. CIVIL
 R. CIP. 113398



VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

SUSTENTO DE METRADOS

DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020

Proyecto : "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG.=8.970KM, - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 Ubicación : TRAMO CUSHIPE- ARGALLAMA
 Contratista : CONSORCIO SANTA ROSA
 Inspector : VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA CIP 194012
 Residente : LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO CIP 113398

Monto Contratado S/ 1,300,000.00
 Plazo de ejecución 120 días calendarios

1.00 OBRAS PROVISIONALES
 01.01. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Descripción		Longitud	Parcial
Inicio	Fin	(gib)	(gib)
0.50	0.60	0.10	0.10
0.60	0.70	0.10	0.10
0.70	0.80	0.10	0.10
0.80	0.90	0.10	0.10
0.90	1.00	0.10	0.10
TOTAL			0.50

5.00 SEÑALIZACIÓN
 05.01. INSTALACIÓN DE POSTES KILOMETRICOS

Descripción	Und	Progresiva	Metrado	Total
INSTALACIÓN DE POSTES KILOMETRICOS	Und	0+000-6+300	7	12.00

05.02. SEÑALES PREVENTIVAS

Descripción	Und	Progresiva	Metrado	Total
SEÑALES PREVENTIVAS	Und	0+000-6+300	6	10.00

05.03. SEÑALES REGLAMENTARIAS


Descripción	Und	Progresiva	Metrado	Total
SEÑALES REGLAMENTARIAS	Und	0+000-6+300	2	5.00

05.04. SEÑALES INFORMATIVAS

Descripción	Und	Progresiva	Metrado	Total
SEÑALES INFORMATIVAS	Und	0+000-6+300	2	5.00

6.00 IMPACTO AMBIENTAL
 06.01. RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS

Descripción	Und	Progresiva	Metrado	Total
RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0+000-6+300	2	2.00


 Luis A. Gonzales Navarro
 ING. CIVIL
 R. CIP. 113398




 VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

SUSTENTO DE METRADOS

DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA
 Proyecto : LONG.=8.970KM. - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 Ubicación : TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA
 Contratista : CONSORCIO SANTA ROSA
 Inspector : VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA CIP 194012
 Residente : LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO CIP 113398

Monto Contratado
 Plazo de ejecución

S/. 1,300,000.00
 120 días calendario

1.00 OBRAS PROVISIONALES
 01.01. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Descripcion		Longitud	Parcial
Inicio	Fin	(#lb)	(#lb)
0.50	0.60	0.10	0.10
0.60	0.70	0.10	0.10
0.70	0.80	0.10	0.10
0.80	0.90	0.10	0.10
0.90	1.00	0.10	0.10
TOTAL			0.50

02 PAVIMENTOS
 02.01 CAPA NIVELANTE E=0.05 M

M3

Progresiva		Longitud	Ancho	Espesor	Area	Volumen
Inicio	Fin	(m)	(m)	(m)	(m2)	(m3)
3+800	4+000	400.00	5.00	0.05	2,000.00	100.00
4+000	5+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
5+000	6+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
6+000	7+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
7+000	8+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
8+000	8+970	970.00	5.00	0.05	4,850.00	242.50
TOTAL						1,342.50

02.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M

M3

Progresiva		Longitud	Ancho	Espesor	Area	Volumen
Inicio	Fin	(m)	(m)	(m)	(m2)	(m3)
2+800	3+000	200.00	5.00	0.15	1,000.00	150.00
3+000	4+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
4+000	5+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
5+000	6+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
6+000	7+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
7+000	8+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
8+000	8+970	970.00	5.00	0.15	4,850.00	727.50
TOTAL						4,627.50


03 TRANSPORTE

03.01. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM
 03.02. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM

Progresiva		CANTERA	CANTERA	DISTANCIA	Longitud	Ancho	Area	Plazoletas 3%	ESPESOR	VOLUMEN	D<=1km	D>1km
Inicio	Fin	UBICACION (km)	ACCESO (km)	(KM)	(m)	(m)	(m2)	(m2)	(m)	(m3)		
2.69	3.00	0.97	0.00	1.87	312.00	5.00	1,560.00	46.80	0.15	241.13	241.13	210.04
3.00	4.00	0.97	0.00	2.53	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	1,181.93
4.00	5.00	0.97	0.00	3.53	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	1,951.34
5.00	6.00	0.97	0.00	4.53	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	2,723.84
6.00	7.00	0.97	0.00	5.53	999.41	5.00	4,997.06	149.91	0.15	772.05	772.05	3,494.05
7.00	8.00	0.97	0.00	6.53	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	4,268.84
8.00	8.97	0.97	0.00	7.51	970.00	5.00	4,850.00	145.50	0.15	749.33	749.33	4,878.86
TOTAL											4,852.50	18,708.88

03.03. TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM
 03.04. TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM

Progresiva		DME	DME	DISTANCIA	Longitud	Ancho	Area	Plazoletas 3%	ESPESOR	VOLUMEN	D<=1km	D>1km
Inicio	Fin	UBICACION (km)	ACCESO (km)	(KM)	(m)	(m)	(m2)	(m2)	(m)	(m3)		
2.30	3.00	3.62	0.00	0.97	700.00	5.00	3,500.00	0	0.10	350.00	340.29	0.00
3.00	4.00	3.62	0.00	0.12	1,000.00	5.00	5,000.00	0	0.10	500.00	61.00	0.00
4.00	5.00	3.62	0.00	0.88	1,000.00	5.00	5,000.00	0	0.10	500.00	439.00	0.00
5.00	6.00	3.62	0.00	1.88	1,000.00	5.00	5,000.00	0	0.10	500.00	500.00	438.93
6.00	7.00	3.62	0.00	2.88	999.41	5.00	4,997.06	0	0.10	499.71	499.71	938.85
7.00	8.00	3.62	0.00	3.88	1,000.00	5.00	5,000.00	0	0.10	500.00	500.00	1,439.96
8.00	8.97	3.62	0.00	4.86	970.00	5.00	4,850.00	0	0.10	485.00	485.00	1,874.48
TOTAL											2,825.00	4,692.21


 Luis A. Gonzales Navarro
 ING. CIVIL
 R. CIP. 113398




 VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

4.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
04.01. RECONFORMACION DE CUNETAS

Progresiva		Longitud	Parcial
Inicio	Fin	(m)	(m)
3+600	4+000	400.00	400.00
4+000	5+000	1,000.00	1,000.00
5+000	6+000	1,000.00	1,000.00
6+000	7+000	1,000.00	1,000.00
7+000	8+000	1,000.00	1,000.00
8+000	8+970	970.00	970.00
TOTAL			5,370.00

5.00 SEÑALIZACIÓN
05.01. INSTALACIÓN DE POSTES KILOMETRICOS

Descripción	Und	Progresiva	Metrado	Total
INSTALACIÓN DE POSTES KILOMETRICOS	Und	0+000-8+970	10	10.00

05.02. SEÑALES PREVENTIVAS

Descripción	Und	Progresiva	Metrado	Total
SEÑALES PREVENTIVAS	Und	0+000-8+970	26	26.00

05.03. SEÑALES REGLAMENTARIAS

Descripción	Und	Progresiva	Metrado	Total
SEÑALES REGLAMENTARIAS	Und	0+000-8+970	2	2.00

05.04. SEÑALES INFORMATIVAS

Descripción	Und	Progresiva	Metrado	Total
SEÑALES INFORMATIVAS	Und	0+000-8+970	3	3.00

6.00 IMPACTO AMBIENTAL
06.01. RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS

Descripción	Und	Progresiva	Metrado	Total
RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0+000-8+970	2	2.00


Luis A. Gonzales Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398



VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012




- ANALISIS DE
VALORIZACION
MENSUAL.


Luis A. Gonzales Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398



VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012



ANALISIS DE VALORIZACION MENSUAL N° 04

DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG.=6.970KM. - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM. - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Proyecto: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación: TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA
Contratista: CONSORCIO VIAL SANTA ROSA
Inspector: VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA CIP 194012
Residente: LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO CIP 113398

Monto Contratado: S/ 1,300,000.00
Plazo de ejecución: 120 días calendario

Código	Descripción	PRESUPUESTO GENERAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		Und	METRADO	PRECIO SI.	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%
1.00	OBRAS PROVISIONALES															
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	S/ 40,220.52	0.50	20,110.26	50.00%	0.50	20,110.26	50.00%	1.00	40,220.52	100.00%	0.00	0.00	0.00%
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	8.97	S/ 8,952.87	8.97	8,952.87	100.00%	0.00	0.00	0.00%	8.97	8,952.87	100.00%	0.00	0.00	0.00%
2.00	PAVIMENTOS															
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	2,242.50	S/ 4.62	900.00	4,158.00	40.13%	1,342.50	6,202.35	59.87%	2,242.50	10,360.35	100.00%	0.00	0.00	0.00%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	6,727.50	S/ 32.06	2,100.00	67,326.00	31.22%	4,627.50	148,357.65	68.78%	6,727.50	215,683.65	100.00%	0.00	0.00	0.00%
3.00	TRANSPORTE															
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	6,952.50	S/ 7.88	2,100.00	16,548.00	30.20%	4,852.50	38,237.70	69.80%	6,952.50	54,785.70	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	26,808.88	S/ 0.87	8,100.00	7,047.00	30.21%	18,708.88	16,276.72	69.79%	26,808.88	23,323.73	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	4,025.00	S/ 7.88	1,200.00	9,456.00	29.81%	2,825.00	22,260.96	70.19%	4,025.00	31,717.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	6,692.21	S/ 0.87	2,000.00	1,740.00	29.89%	4,692.21	4,082.22	70.11%	6,692.21	5,822.22	100.00%	0.00	0.00	0.00%
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE															
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	8,970.00	S/ 1.84	3,600.00	6,624.00	40.13%	5,370.00	9,880.80	59.87%	8,970.00	16,504.80	100.00%	0.00	0.00	0.00%
5.00	SEÑALIZACION															
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	10.00	S/ 315.24	0.00	0.00	0.00%	10.00	3,152.40	100.00%	10.00	3,152.40	100.00%	0.00	0.00	0.00%
05.02.	SENALES PREVENTIVAS	und	26.00	S/ 389.22	0.00	0.00	0.00%	26.00	10,119.72	100.00%	26.00	10,119.72	100.00%	0.00	0.00	0.00%
05.03.	SENALES REGLAMENTARIAS	und	2.00	S/ 389.22	0.00	0.00	0.00%	2.00	778.44	100.00%	2.00	778.44	100.00%	0.00	0.00	0.00%
05.04.	SENALES INFORMATIVAS	und	3.00	S/ 468.32	0.00	0.00	0.00%	3.00	1,404.96	100.00%	3.00	1,404.96	100.00%	0.00	0.00	0.00%
6.00	IMPACTO AMBIENTAL															
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	S/ 7,274.14	0.00	0.00	0.00%	2.00	14,548.28	100.00%	2.00	14,548.28	100.00%	0.00	0.00	0.00%
7.00	EMERGENCIA SANITARIA															
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	S/ 29,709.37	0.80	23,767.50	80.00%	0.20	5,941.87	20.00%	1.00	29,709.37	100.00%	0.00	0.00	0.00%
	Costo Directo															
	GASTOS GENERALES (10%) C.D.		10.00%			467,084.01			301,354.39			467,084.01			0.00	
	UTILIDAD (5%) C.D.		5.00%			46,708.40			30,135.44			46,708.40			0.00	
						23,354.20			15,067.72			23,354.20			0.00	
	SUB TOTAL					537,146.61			346,557.55			537,146.61			0.00	
	IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (IGV 18%)		18.00%			96,686.39			62,380.36			96,686.39			0.00	
	VALOR REFERENCIAL DE OBRA					633,833.00			408,937.91			633,833.00			0.00	
	PORCENTAJE AVANCE DE OBRA					100.00%			64.52%			100.00%			0.00%	

Vanessa
Vanessa Abigail Rodríguez Arteaga
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

Rubén
Rubén Gonzales Navarro
 ING. CIVIL
 R. CIP. 113398

ANALISIS DE VALORIZACION MENSUAL N° 04

DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020


"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG=8.970KM. - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM. - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Proyecto: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Cliente : TRAMO CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ)
Ubicación : CONSORCIO VIAL SANTA ROSA
Contratista: VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA CIP: 194012
Inspector: LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO CIP: 113398
Residente:

Monto Contratado: S/. 1,300,000.00
Plazo de ejecución: 120 días calendario


Código	Descripción	PRESUPUESTO GENERAL		AVANCE ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
		METRAO	PRECIO SI.	METRAO	VALORIZADO	METRAO	VALORIZADO	METRAO	VALORIZADO	METRAO	VALORIZADO
1.00	OBRAS PROVISIONALES										
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	1.00	S/. 40,220.52	0.50	20,110.26	0.50	20,110.26	1.00	40,220.52	0.00	0.00
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	6.30	S/. 988.09	6.30	6,287.97	0.00	0.00	6.30	6,287.97	0.00	0.00
2.00	PAVIMENTOS										
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	1575.00	S/. 4.62	1,575.00	7,276.50	0.00	0.00	1,575.00	7,276.50	0.00	0.00
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	4725.00	S/. 32.06	4,725.00	151,483.50	0.00	0.00	4,725.00	151,483.50	0.00	0.00
3.00	TRANSPORTE										
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	4882.50	S/. 5.64	4,882.50	27,537.30	0.00	0.00	4,882.50	27,537.30	0.00	0.00
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	22750.88	S/. 0.84	22,750.88	19,110.74	0.00	0.00	22,750.88	19,110.74	0.00	0.00
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	2920.00	S/. 5.64	2,920.00	16,468.77	0.00	0.00	2,920.00	16,468.80	0.00	0.00
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	7128.50	S/. 0.84	7,128.50	5,987.94	0.00	0.00	7,128.50	5,987.94	0.00	0.00
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE										
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	6300.00	S/. 1.84	6,300.00	11,592.00	0.00	0.00	6,300.00	11,592.00	0.00	0.00
5.00	SEÑALIZACION										
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	7.00	S/. 315.24	0.00	0.00	7.00	2,206.68	7.00	2,206.68	0.00	0.00
05.02.	SENALES PREVENTIVAS	6.00	S/. 389.22	0.00	0.00	6.00	2,335.32	6.00	2,335.32	0.00	0.00
05.03.	SENALES REGLAMENTARIAS	2.00	S/. 389.22	0.00	0.00	2.00	778.44	2.00	778.44	0.00	0.00
05.04.	SENALES INFORMATIVAS	2.00	S/. 468.32	0.00	0.00	2.00	936.64	2.00	936.64	0.00	0.00
6.00	IMPACTO AMBIENTAL										
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	2.00	S/. 7,274.14	0.00	0.00	2.00	14,548.28	2.00	14,548.28	0.00	0.00
7.00	EMERGENCIA SANITARIA										
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	1.00	S/. 21,281.69	0.75	15,961.27	0.25	5,320.42	1.00	21,281.69	0.00	0.00
	Costo Directo				281,816.24		46,236.08		328,052.32		0.00
	GASTOS GENERALES (10%) C.D.				28,181.63		4,623.60		32,805.23		0.00
	UTILIDAD (5%) C.D.				14,090.81		2,311.81		16,402.62		0.00
	SUB TOTAL				324,088.68		53,171.49		377,260.17		0.00
	IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (IGY 18%)				58,335.96		9,570.87		67,906.83		0.00
	VALOR REFERENCIAL DE OBRA				382,424.64		62,742.36		445,167.00		0.00
	PORCENTAJE AVANCE DE OBRA				85.91%		14.09%		100.00%		0.00%


Vanessa Abigail Rodríguez Arteaga
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012


Luis A. González Navarro
 ING. CIVIL
 R. CIP. 113398



- HOJA DE CANCELACION.


Luis A. Gonzales Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398



VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012




HOJA DE CANCELACION

DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020

Proyecto	"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG.=8.970KM, - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"
Cliente	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación	SANTA CRUZ DE CHUCA
Contratista	CONSORCIO VIAL SANTA ROSA
Inspector	VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA CIP 194012
Residente	LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO CIP 113398

MONTO REFERENCIAL	1,301,584.26
MONTO CONTRATADO	1,300,000.00
MONTO CONTRATADO MANTENIMIENTO PERIODICO	1,079,000.00
MONTO CONTRATADO MANTENIMIENTO RUTINARIO	195,000.00

ITEM	DESCRIPCION	MONTO VALORIZADO
01	TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA	301,354.39
02	TRAMO CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ)	46,236.08
1.00.00	COSTO DIRECTO	S/. 347,590.47
	GASTOS GENERALES 10%	S/. 34,759.05
	UTILIDAD 5%	S/. 17,379.52
2.00.00	SUBTOTAL	S/. 399,729.04
	REAJUSTES	0.00
3.00.00	SUBTOTAL CON REAJUSTES	S/. 399,729.04
	AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO 10%	S/. 0.00
	AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES 20%	S/. 0.00
4.00.00	SUBTOTAL CON AMORTIZACIONES	S/. 399,729.04
5.00.00	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)	S/. 71,951.23
6.00.00	TOTAL NETO A RECIBIR	S/. 471,680.27
Porcentaje de avance ejecutado en el mes (%)		43.71%



 Luis A. Gonzales Navarro
 ING. CIVIL
 R. CIP. 113398



 VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012




- CUADRO
COMPARATIVO
DE AVANCE
DEL SERVICIO
(PROGRAMADO
- EJECUTADO -
PAGADO).


Luis A. González Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398



VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012



CUADRO COMPRATIVO DE AVANCE - PROGRAMADO - EJECUTADO - PAGADO.

DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG.=8.970KM, - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Proyecto :

Ciente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

Ubicación : TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA

Contratista : CONSORCIO VIAL SANTA ROSA

Inspector : VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA CIP 194012

Residente : LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO CIP 113398

Monto Contratado S/. 1,300,000.00
Plazo de ejecucion 120 dias calendarios

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	29,655.91	29,655.91	4.68%	4.68%
31-Oct-20	207,591.25	237,247.16	32.75%	37.43%
30-Nov-20	207,591.25	444,838.41	32.75%	70.18%
31-Dic-20	188,994.59	633,833.00	29.82%	100.00%
TOTAL	633,833.00		100.00%	

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	42,786.16	42,786.16	6.75%	6.75%
31-Oct-20	163,282.84	206,069.00	25.76%	32.51%
30-Nov-20	18,826.09	224,895.09	2.97%	35.48%
16-Dic-20	408,937.91	633,833.00	64.52%	100.00%
TOTAL	633,833.00		100.00%	



Vanessa R. A.
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

Luis A. Gonzalez Navarro
Luis A. Gonzalez Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398

CUADRO COMPRATIVO DE AVANCE - PROGRAMADO - EJECUTADO - PAGADO.

DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG.=6.970KM, - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Proyecto :

Cliente :

Ubicación :

Contratista :

Inspector :

Residente :

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 TRAMO CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ)
 CONSORCIO VIAL SANTA ROSA
 VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA CIP 194012
 LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO CIP 113398

Monto Contratado S/. 1,300,000.00
 Plazo de ejecución 120 días calendarios

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	20,846.74	20,846.74	4.68%	4.68%
31-Oct-20	145,926.95	166,773.69	32.78%	37.46%
30-Nov-20	145,926.95	312,700.64	32.78%	70.24%
31-Dic-20	132,466.36	445,167.00	29.76%	100.00%
TOTAL	445,167.00		100.00%	

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	38,572.66	38,572.66	8.66%	8.66%
31-Oct-20	93,390.12	131,962.78	20.98%	29.64%
30-Nov-20	250,461.86	382,424.64	56.26%	85.91%
16-Dic-20	62,742.36	445,167.00	14.09%	100.00%
TOTAL	445,167.00		100.00%	



VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

Luis A. Gonzales Navarro
 LUIS A. GONZALES NAVARRO
 ING. CIVIL
 R. CIP. 113398

CUADRO COMPARATIVO DE AVANCE PROGRAMADO - EJECUTADO - PAGADO - GENERAL

DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020

Proyecto : "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG=8.970KM, - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : TRAMO CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ)
Contratista : CONSORCIO VIAL SANTA ROSA
Inspector : VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA CIP 194012
Residente : LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO CIP 113398

Monto Contratado S/. 1,300,000.00
Plazo de ejecucion 120 dias calendarios

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	50,502.65	50,502.65	4.68%	4.68%
31-Oct-20	353,518.20	404,020.85	32.76%	37.44%
30-Nov-20	353,518.20	757,539.05	32.76%	70.20%
31-Dic-20	321,460.95	1,079,000.00	29.80%	100.00%
TOTAL	1,079,000.00		100.00%	

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	81,358.82	81,358.82	7.54%	7.54%
31-Oct-20	256,672.96	338,031.78	23.79%	31.33%
30-Nov-20	269,287.95	607,319.73	24.96%	56.29%
16-Dic-20	471,680.27	1,079,000.00	43.71%	100.00%
TOTAL	1,079,000.00		100.00%	




VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

Luis A. Gonzales Navarro
 Luis A. Gonzales Navarro
 ING. CIVIL
 R. CIP. 113398




- CUADRO DE BARRAS Y CURVAS.


Luis A. Gonzales Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398



VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012



CUADRO DE BARRAS Y CURVA S.


DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG.=8.970KM. - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Proyecto :

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 Ubicación : TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA
 Contratista : CONSORCIO VIAL SANTA ROSA
 Inspector : VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA CIP 194012
 Residente : LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO CIP 113398

Monto Contratado : S/. 1,300,000.00
 Plazo de ejecución : 120 días calendario

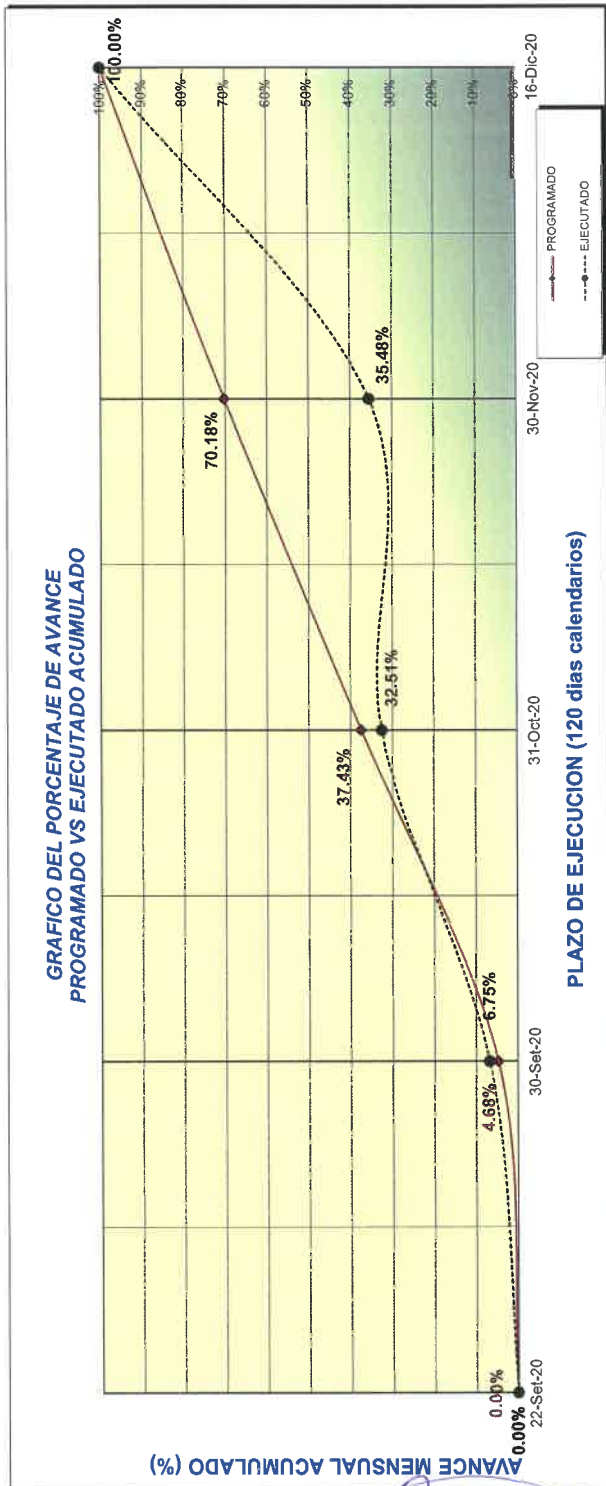

[Firma]
Luis A. Gonzales Navarro
 ING. CIVIL
 R. CIP. 113398

MONITOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (Inc/IGV)		PORCENTAJES ACUMUL.	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	42,786.16	42,786.16	6.75%	6.75%
31-Oct-20	163,282.84	206,069.00	25.76%	32.51%
30-Nov-20	18,826.09	224,895.09	2.97%	35.48%
16-Dic-20	408,937.91	633,833.00	64.52%	100.00%
TOTAL	633,833.00		100.00%	

MONITOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Inc/IGV)		PORCENTAJES ACUMUL.	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	29,655.91	29,655.91	4.68%	4.68%
31-Oct-20	207,591.25	237,247.16	32.75%	37.43%
30-Nov-20	207,591.25	444,838.41	32.75%	70.18%
31-Dic-20	188,994.59	633,833.00	29.82%	100.00%
TOTAL	633,833.00		100.00%	

[Firma]
Vanessa
 VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

CUADRO DE BARRAS Y CURVA S.


DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG= 8.970KM, - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Proyecto :

Cilente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 Ubicación : TRAMO CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ)
 Contratista : CONSORCIO VIAL SANTA ROSA
 Inspector : VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA CIP 194012
 Residente : LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO CIP 113398

Monto Contratado S/. 1,300,000.00
 Plazo de ejeccion 120 dias calendarios

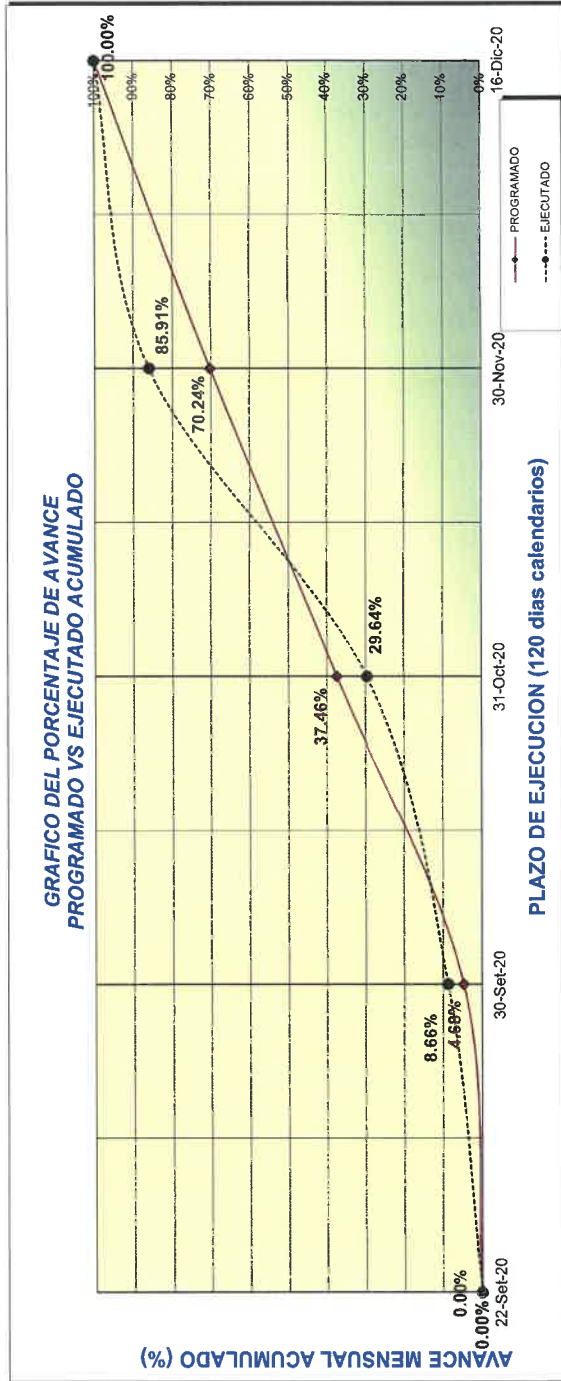

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (Inc/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	36,572.66	36,572.66	8.66%	8.66%
31-Oct-20	93,390.12	131,962.78	20.98%	29.64%
30-Nov-20	250,461.86	382,424.64	56.26%	85.91%
16-Dic-20	62,742.36	445,167.00	14.09%	100.00%
TOTAL	445,167.00	445,167.00	100.00%	100.00%

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Inc/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	20,846.74	20,846.74	4.68%	4.68%
31-Oct-20	145,926.95	166,773.69	32.78%	37.46%
30-Nov-20	145,926.95	312,700.64	32.78%	70.24%
31-Dic-20	132,466.36	445,167.00	29.76%	100.00%
TOTAL	445,167.00	445,167.00	100.00%	100.00%



Vanessa R. A.
 VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

Luis A. Gonzales Navarro
 ING. CIVIL
 R. CIP. 113398

CUADRO DE BARRAS Y CURVA S. - GENERAL


DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG.=8.970KM, - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Proyecto :

Ciente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 Ubicación : SANTA CRUZ DE CHUCA — SANTIAGO DE CHUCO
 Contratista : CONSORCIO VIAL SANTA ROSA
 Inspector : VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA CIP 194012
 Residente : LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO CIP 113398

Monto Contratado S/. 1,300,000.00
 Plazo de ejecución 120 días calendario

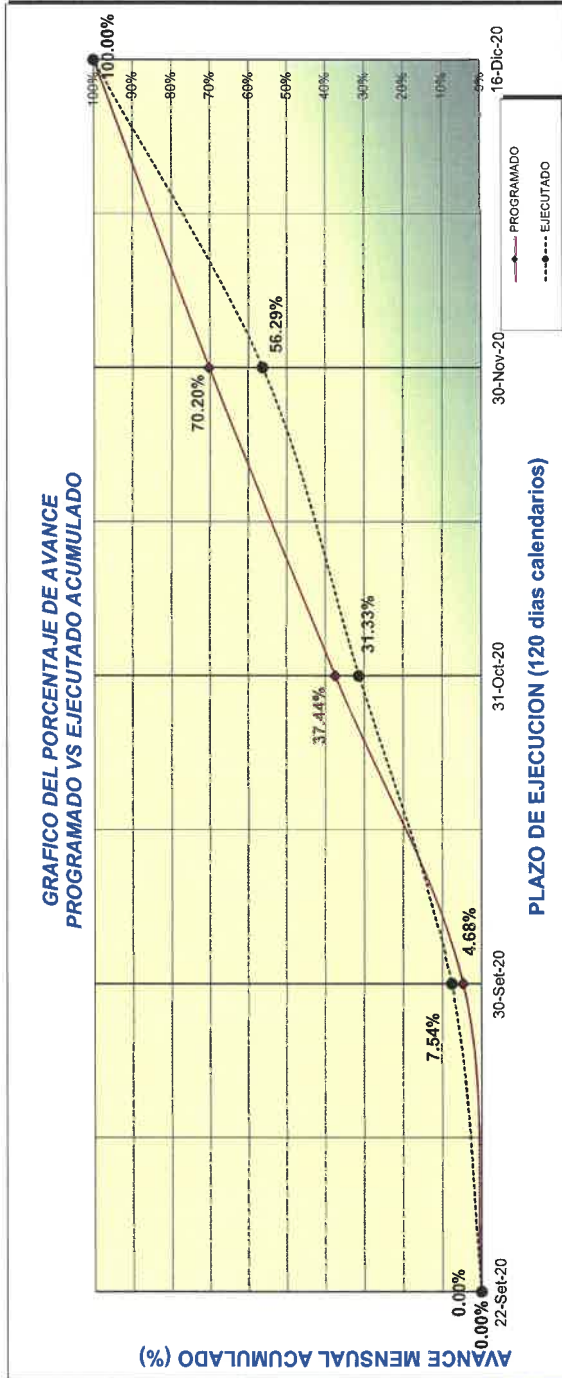

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	81,358.82	81,358.82	7.54%	7.54%
31-Oct-20	256,672.96	338,031.78	23.79%	31.33%
30-Nov-20	269,287.95	607,319.73	24.96%	56.29%
16-Dic-20	471,680.27	1,079,000.00	43.71%	100.00%
TOTAL	1,079,000.00	1,079,000.00	100.00%	100.00%

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	50,502.65	50,502.65	4.68%	4.68%
31-Oct-20	353,518.20	404,020.85	32.76%	37.44%
30-Nov-20	353,518.20	757,539.05	32.76%	70.20%
31-Dic-20	321,460.95	1,079,000.00	29.80%	100.00%
TOTAL	1,079,000.00	1,079,000.00	100.00%	100.00%




VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

Luis A. Gonzales Navarro
 Luis A. Gonzales Navarro
 ING. CIVIL
 R. CIP. 113398




- **CRONOGRAMA
DE AVANCE
DEL SERVICIO
PROGRAMADO.**


Luis A. Gonzalez Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398



VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012



CRONOGRAMA DE AVANCE DE SERVICIO PROGRAMADO

Proyecto : "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG.=8.970KM, - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA
Contratista : CONSORCIO VIAL SANTA ROSA
Inspector : VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA CIP 194012
Residente : LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO CIP 113398

Monto Contratado : S/. 1,300,000.00
Plazo de ejecucion : 120 dias calendarios

ITEM	PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04
01	OBRAS PRELIMINARES								
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	gib	1.00	40,220.52	40,220.52	2,011.03	14,077.18	14,077.18	10,055.13
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	8.97	998.09	8,952.87	447.64	3,133.50	3,133.50	2,238.23
02	PAVIMENTOS								
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	2,242.50	4.62	10,360.35	518.02	3,626.12	3,626.12	2,590.09
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	m3	6,727.50	32.06	215,683.65	10,784.18	75,489.28	75,489.28	53,920.91
03	TRANSPORTE								
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	6,952.50	7.88	54,785.70	2,739.29	19,175.00	19,175.00	13,696.41
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	28,808.88	0.87	23,323.73	1,166.19	8,163.31	8,163.31	5,630.92
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	4,025.00	7.88	31,717.00	1,585.85	11,100.95	11,100.95	7,929.25
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	6,692.21	0.87	5,822.22	291.11	2,037.78	2,037.78	1,455.55
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE								
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	8,970.00	1.84	16,504.80	825.24	5,776.68	5,776.68	4,126.20
05	SEÑALIZACION								
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	10.00	315.24	3,152.40				3,152.40
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	26.00	389.22	10,119.72				10,119.72
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	2.00	389.22	778.44				778.44
05.04	SEÑALES INFORMATIVAS	und	3.00	468.32	1,404.96				1,404.96
06	IMPACTO AMBIENTAL								
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	7,274.14	14,548.28				14,548.28
07	EMERGENCIA SANITARIA								
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gib	1.00	29,709.37	29,709.37	1,485.47	10,398.28	10,398.28	7,427.34
	COSTO DIRECTO				S/.467,084.01	S/.21,854.02	S/.152,978.08	S/.152,978.08	S/.139,273.83
	COSTO INDIRECTO (10.00%)				S/.46,708.40	S/.2,185.40	S/.15,297.81	S/.15,297.81	S/.13,927.38
	UTILIDAD (5%)				S/.23,354.20	S/.1,092.70	S/.7,648.90	S/.7,648.90	S/.6,963.70
	SUB TOTAL				S/.537,146.61	S/.25,132.12	S/.175,924.79	S/.175,924.79	S/.160,164.91
	IGV (18%)				S/.96,686.39	S/.4,523.78	S/.31,666.46	S/.31,666.46	S/.28,829.69
	COSTO TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL				S/.633,833.00	S/.29,655.91	S/.207,591.25	S/.207,591.25	S/.188,994.59

AVANCE TOTAL CONTRACTUAL
PROGRAMADO MENSUAL
ACUMULADO

4.68%	32.75%	32.75%	29.82%
4.68%	37.43%	70.18%	100.00%

Luis A. Gonzales Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398



VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

CRONOGRAMA DE AVANCE DE SERVICIO PROGRAMADO

Proyecto : "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA - LLATURPAMBA LONG.#8.970KM, - CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : TRAMO CUSHIPE - ARGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ)
Contratista : CONSORCIO VIAL SANTA ROSA
Inspector : VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA CIP 194012
Residente : LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO CIP 113398

Monto Contratado S/ 1,300,000.00
Plazo de ejecución 120 días calendarios

ITEM	PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04
01	OBRAS PRELIMINARES								
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	gib	1.00	40,220.52	40,220.52	2,011.03	14,077.18	14,077.18	10,055.13
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	6.30	998.09	6,287.97	314.40	2,200.79	2,200.79	1,571.99
02	PAVIMENTOS								
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	1,575.00	4.62	7,276.50	363.83	2,546.78	2,546.78	1,819.11
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	m3	4,725.00	32.06	151,483.50	7,574.18	53,019.23	53,019.23	37,870.86
03	TRANSPORTE								
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	4,882.50	5.64	27,537.30	1,376.87	9,638.06	9,638.06	6,884.31
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	22,750.88	0.84	19,110.74	955.54	6,688.76	6,688.76	4,777.68
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	2,920.00	5.64	16,468.80	823.44	5,764.08	5,764.08	4,117.20
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	7,128.50	0.84	5,987.94	299.40	2,095.78	2,095.78	1,495.98
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE								
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	6,300.00	1.84	11,592.00	579.60	4,057.20	4,057.20	2,898.00
05	SEÑALIZACION								
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	7.00	315.24	2,206.68				2,206.68
05.02	SENALES PREVENTIVAS	und	6.00	389.22	2,335.32				2,335.32
05.03	SENALES REGLAMENTARIAS	und	2.00	389.22	778.44				778.44
05.04	SENALES INFORMATIVAS	und	2.00	468.32	936.64				936.64
06	IMPACTO AMBIENTAL								
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	7,274.14	14,548.28				14,548.28
07	EMERGENCIA SANITARIA								
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gib	1.00	21,281.69	21,281.69	1,064.08	7,448.59	7,448.59	5,320.43
	COSTO DIRECTO				S/ 328,052.32	S/ 15,362.37	S/ 107,536.45	S/ 107,536.45	S/ 97,617.05
	COSTO INDIRECTO (10.00%)				S/ 32,805.23	S/ 1,536.24	S/ 10,753.64	S/ 10,753.64	S/ 9,761.71
	UTILIDAD (5%)				S/ 16,402.62	S/ 768.12	S/ 5,376.82	S/ 5,376.82	S/ 4,880.86
	SUB TOTAL				S/ 377,260.17	S/ 17,666.73	S/ 123,666.91	S/ 123,666.91	S/ 112,259.62
	IGV (18%)				S/ 67,906.83	S/ 3,180.01	S/ 22,260.04	S/ 22,260.04	S/ 20,206.74
	COSTO TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL				S/ 445,167.00	S/ 20,846.74	S/ 145,926.95	S/ 145,926.95	S/ 132,466.36

AVANCE TOTAL CONTRACTUAL
PROGRAMADO MENSUAL
ACUMULADO

Luis A. Gonzales Navarro
Luis A. Gonzales Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398



Vanessa R 28
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

4.68%	32.78%	29.76%
4.68%	37.46%	100.00%



- PANEL
FOTOGRAFICO.


Luis A. Gonzalez Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398



VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012





CONSORCIO VIAL
SANTA ROSA
PANEL FOTOGRAFICO

181

TRAMO CUSHIPE – ALGALLAMA – EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG 6.300 KM



CAPA NIVELANTE



RECONFORMACIÓN DE CUNETAS


Luis A. Gonzales Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398



VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012





TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM




RIEGO DE VIA


Luis A. Gonzales Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398



VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012





SANTA ROSA

TRAMO SANTA ROSA - SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMPA LONG 8.970 KM





TRAZO Y REPLANTEO




Luis A. Arzales Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398

MATERIAL GRANULAR DE CANTERA



VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012





RIEGO DE LA VIA Y LIMPIEZA FINAL



SEÑALIZACION EN OBRA


Luis A. Gonzales Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398



VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012





- ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.


Luis A. González Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398



VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012



“ACTA DE ENTREGA DE TERRENO”

Servicio	MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - “SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA LONG= 8.970 KM”, - “CUSHIPE – ARGALLAMA – EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM”- DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.
Tramo	“CUSHIPE – ARGALLAMA – EMP. PE-3N (LA CRUZ)” LONG= 6.300 KM.”
Provincia	SANTIAGO DE CHUCO
Distrito	SANTA CRUZ DE CHUCA
Entidad Contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)
Empresa Ejecutora	CONSORCIO VIAL SANTA ROSA (ECAN INGENIERIA S.R.L. + CORPORACION SORIANO L & C S.A.C.)
N.º de Contrato	CONTRATO DE SERVICIO N.º 017-2020-MPSCH-LOG
Fecha de Contrato	28/08/2020
Modalidad	SUMA ALZADA
Monto Presupuestado	S/. 536,999.40 soles Inc. (I.G.V.)
Monto Contractual	S/. 536,345.78 soles Inc. (I.G.V.)
Inspector de Servicio	Ing. VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
Plazo de Ejecución	PLAN DE TRABAJO: 20 D.C. MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C. MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C. INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C. TOTAL: 505 DÍAS CALENDARIOS (sujeto a fecha de contrato)
Fecha de Culminación	31/12/2021



Vanessa P. A.
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

Luis A. Gonzales Navarro
Luis A. Gonzales Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398

En la ciudad de Santa Cruz de Chuca, provincia de Santiago de Chuco – La libertad, siendo las 9:00 p.m. del 29 de agosto del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza con CIP. N° 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N° 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N° 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Ing. Vanessa Abigail Rodríguez Arteaga con CIP N° 194012 y por último, por parte del Contratista el Ing. Luis Alberto Gonzales Navarro con CIP N° 113398 como Residente de servicio y el Sr. Edgar Gómez Domínguez con DNI N° 44944779, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL SANTA ROSA (ECAN INGENIERIA S.R.L. + CORPORACION SORIANO L & C S.A.C.). A fin de realizar la **ENTREGA DE TERRENO** del tramo: **“CUSHIPE – ARGALLAMA – EMP. PE-3N (LA CRUZ)”** con una longitud de **6.300 km**.

Este acto protocolar tiene por finalidad hacer la entrega de la ruta mencionada en todo su recorrido físico para la recolección de información necesaria y de esta manera hacer la elaboración del **PLAN DE TRABAJO** de la ruta, que es parte de la FASE I del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y formatos (anexos) estipulados en los Términos de Referencia del D.U. N° 070-2020 presentados para la contratación.

Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - “SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA LONG= 8.970 KM”, - “CUSHIPE – ARGALLAMA – EMP. PE-**

3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM"- DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.

Siendo las 9:30 p.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para dar inicio a la elaboración del Plan de Trabajo y continuar con los procedimientos posteriores para dar inicio a la FASE II y III (mantenimiento periódico y rutinario) del servicio. Del mismo día, se da por concluida el acto de **ENTREGA DE TERRENO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.

AREA USUARIA

Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 190782

Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 218511

AREA RESPONSABLE

Ing. David Iván Silva Torres
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH
CIP N° 63635

EMPRESA EJECUTORA

Ing. Luis Alberto Gonzales Navarro
Residente de Servicio
CIP N° 113398


Sr. Edgar Gómez Domínguez
Representante Común de CONSORCIO VIAL SANTA ROSA
DNI N° 44944779

INSPECTOR



VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

Ing. Vanessa Abigail Rodríguez Arteaga
Inspector del Servicio
CIP N° 194012


Luis A. Gonzales Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398

“ACTA DE ENTREGA DE TERRENO”

Servicio	MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - “SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA LONG= 8.970 KM”, - “CUSHIPE – ARGALLAMA – EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM”- DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.
Tramo	“SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA” LONG= 8.970 KM.”
Provincia	SANTIAGO DE CHUCO
Distrito	SANTA CRUZ DE CHUCA
Entidad Contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)
Empresa Ejecutora	CONSORCIO VIAL SANTA ROSA (ECAN INGENIERIA S.R.L. + CORPORACION SORIANO L & C S.A.C.)
N.º de Contrato	CONTRATO DE SERVICIO N.º 017-2020-MPSCH-LOG
Fecha de Contrato	28/08/2020
Modalidad	SUMA ALZADA
Monto Presupuestado	S/. 764,584.86 soles Inc. (I.G.V.)
Monto Contractual	S/. 763,654.22 soles Inc. (I.G.V.)
Inspector de Servicio	Ing. VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
Plazo de Ejecución	PLAN DE TRABAJO: 20 D.C. MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C. MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C. INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C. TOTAL: 505 DÍAS CALENDARIOS (sujeto a fecha de contrato)
Fecha de Culminación	31/12/2021



VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012


Luis A. Gonzales Navarro
 ING. CIVIL
 R. CIP. 113398

En la ciudad de Santa Cruz de Chuca, provincia de Santiago de Chuco – La libertad, siendo las 9:00 p.m. del 29 de agosto del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza con CIP. N° 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N° 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N° 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Ing. Vanessa Abigail Rodríguez Arteaga con CIP N° 194012 y por último, por parte del Contratista el Ing. Luis Alberto Gonzales Navarro con CIP N° 113398 como Residente de servicio y el Sr. Edgar Gómez Domínguez con DNI N° 44944779, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL SANTA ROSA (ECAN INGENIERIA S.R.L. + CORPORACION SORIANO L & C S.A.C.). A fin de realizar la **ENTREGA DE TERRENO** del tramo: **“SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA”** con una longitud de **8.970 km**.

Este acto protocolar tiene por finalidad hacer la entrega de la ruta mencionada en todo su recorrido físico para la recolección de información necesaria y de esta manera hacer la elaboración del **PLAN DE TRABAJO** de la ruta, que es parte de la FASE I del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y formatos (anexos) estipulados en los Términos de Referencia del D.U. N° 070-2020 presentados para la contratación.

Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - “SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA LONG= 8.970 KM”, - “CUSHIPE – ARGALLAMA – EMP. PE-**

3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM"- DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.

Siendo las 9:30 p.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para dar inicio a la elaboración del Plan de Trabajo y continuar con los procedimientos posteriores para dar inicio a la FASE II y III (mantenimiento periódico y rutinario) del servicio. Del mismo día, se da por concluida el acto de **ENTREGA DE TERRENO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.

AREA USUARIA

Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 190782

Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 218511

AREA RESPONSABLE

Ing. David Iván Silva Torres
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH
CIP N° 63635

EMPRESA EJECUTORA

Ing. Luis Alberto Gonzales Navarro
Residente de Servicio
CIP N° 113398

Sr. Edgar Gómez Domínguez
Representante Común de CONSORCIO VIAL SANTA ROSA
DNI N° 44944779

INSPECTOR



Vanessa R.T.

VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

Ing. Vanessa Abigail Rodríguez Arteaga
Inspector del Servicio
CIP N° 194012

Luis A. Gonzales Navarro
Luis A. Gonzales Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398




- ACTA DE INICIO DE SERVICIO.



VANESSA ABIGAIL RODRÍGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012


Luis A. González Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398



“ACTA DE INICIO DE SERVICIO”

Servicio	MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - “SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA LONG= 8.970 KM”, - “CUSHIPE – ARGALLAMA – EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM”- DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.
Tramo	“CUSHIPE – ARGALLAMA – EMP. PE-3N (LA CRUZ)” LONG= 6.300 KM.”
Provincia	SANTIAGO DE CHUCO
Distrito	SANTA CRUZ DE CHUCA
Entidad Contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)
Empresa Ejecutora	CONSORCIO VIAL SANTA ROSA (ECAN INGENIERIA S.R.L. + CORPORACION SORIANO L & C S.A.C.)
N.º de Contrato	CONTRATO DE SERVICIO N.º 017-2020-MPSCH-LOG
Fecha de Contrato	28/08/2020
Modalidad	SUMA ALZADA
Monto Presupuestado	S/. 536,999.40 soles Inc. (I.G.V.)
Monto Contractual	S/. 536,345.78 soles Inc. (I.G.V.)
Inspector de Servicio	Ing. VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
Plazo de Ejecución	PLAN DE TRABAJO: 20 D.C. MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C. MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C. INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C. TOTAL: 505 DÍAS CALENDARIOS (sujeto a fecha de contrato)
Fecha de Culminación	31/12/2021



VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012


Luis Alberto Gonzales Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398

En la ciudad de Santa Cruz de Chuca, provincia de Santiago de Chuco – La libertad, siendo las 9:00 p.m. del 22 de septiembre del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza con CIP. N° 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N° 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH, el Ing. Marcial Nicolás Barrantes Parimango con CIP N° 225678 como monitor designado del servicio intervenido (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N° 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Ing. Vanessa Abigail Rodríguez Arteaga con CIP N° 194012; asimismo, representando a Provias Descentralizado está el Ing. Gabriel Omar Panta Cossio con CIP N° 192701 encargado de Monitoreo y Seguimiento y el Ing. Bach. Eduardo Rafael Príncipe León con DNI N° 46839109 como Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento; finalmente, por parte del Contratista Ing. el Ing. Luis Alberto Gonzales Navarro con CIP N° 113398 como Residente de servicio y el Sr. Edgar Gómez Domínguez con DNI N° 44944779, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL SANTA ROSA (ECAN INGENIERIA S.R.L. + CORPORACION SORIANO L & C S.A.C.). A fin de realizar el **INICIO DE SERVICIO** del tramo: **“CUSHIPE – ARGALLAMA – EMP. PE-3N (LA CRUZ)”** con una longitud de **6.300 KM.**

Este acto protocolar tiene por finalidad dar inicio a la ejecución de las actividades de **MANTENIMIENTO PERIÓDICO** de la ruta mencionada en todo su recorrido físico correspondiente a la FASE II del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y partidas estipulados en el Plan de Trabajo previamente aprobado por la Entidad.

Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - “SANTA ROSA – SANTA CRUZ DE CHUCA – LLATURPAMBA LONG= 8.970 KM”, - “CUSHIPE – ARGALLAMA**

– EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG= 6.300 KM”- DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.

Siendo las 9:30 a.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas acorde con el Plan de Trabajo, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para empezar la ejecución del Mantenimiento Periódico. Del mismo día, se da por concluido el acto de **INICIO DE SERVICIO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.

AREA USUARIA

Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 190782

Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 218511

Ing. Marcial Nicolás Barrantes Parimango
Monitor Designado del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 225678

AREA RESPONSABLE

Ing. David Iván Silva Torres
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH
CIP N° 63635



Vanessa A. R. A.
VANESSA ABIGAIL RODRIGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012

REPRESENTANTES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD

Ing. Gabriel Omar Panta Cossio
Monitoreo y Seguimiento a Mantenimiento Vial
Provincia de Santiago de Chuco
CIP N° 192701

Ing. Bach. Eduardo Rafael Príncipe León
Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento
Provincia de Santiago de Chuco
DNI N° 46839109

Luis A. Gonzales Navarro
Luis A. Gonzales Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398

EMPRESA EJECUTORA

Ing. Luis Alberto Gonzales Navarro
Residente de Servicio
CIP N° 113398

Sr. Edgar Gómez Domínguez
Representante Común de CONSORCIO VIAL SANTA ROSA
DNI N° 44944779

INSPECTOR

Ing. Vanessa Abigail Rodríguez Arteaga
Inspector del Servicio
CIP N° 194012



VANESSA ABIGAIL RODRÍGUEZ ARTEAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 194012


Luis A. Gonzales Navarro
ING. CIVIL
R. CIP. 113398
