

"Año de la universalización de la salud"

INFORME N° 202-2020-IVP-MPSCH/GG/VRRK

A : Dr. JOHN JAIRO CURAY REYES.
Director de administración y Finanzas de la MPSCH

DE : ING. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente del Instituto Vial Provincial de Santiago de Chuco

ASUNTO : APROBACIÓN DE CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N° 01 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-117 - PACCHA – CEMENTERIO, LONG. 3.150 KM; EMP. LI-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN – PADAGUANGA, LONG. 10.40 KM. Y EMP. LI-938 - CASA BLANCA BAJA- TAMBILLO, LONG. 6.89 KM.

REFERENCIA : Informe N° 117-2020-JO/IVP/SCH/LFGCH
INFORME N° 013-2020-IVP-MPSCH/CEGB/TA
Informe N° 1024-2020-MPSCH/DST/SGI
INFORME N° 001-2020-RHC/INSPECTOR DE MANTENIMIENTO PERIODICO-MPSCH
CARTA N° 015-2020-CVCCH/WCEPG-R.O
CONTRATO N° 011-2020-MPSCH-LOG
DU. N° 070-2020



FECHA : Santiago de Chuco, 10 de Noviembre del 2020

Previo cordial saludo y afecto, por medio del presente tengo a bien manifestarle con respecto al asunto de la referencia lo siguiente:

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN TÉCNICA:
Ejecución de Servicio

: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-117 - PACCHA – CEMENTERIO, LONG. 3.150 KM; EMP. LI-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN – PADAGUANGA, LONG. 10.40 KM. Y EMP. LI-938 - CASA BLANCA BAJA- TAMBILLO, LONG. 6.89 KM.

Longitud : 20.44 Km.
Superficie de Rodadura : Afirmado.
Espesor de Afirmado : 0.15 m.
Velocidad Directriz : 30 km/h.
Perfilado de Cunetas : Terreno natural
Hitos Kilométricos : 19 unidades


UBICACIÓN

Distrito : Santiago de Chuco
Provincia : Santiago de Chuco
Región : La Libertad

RESPONSABLES DEL SERVICIO

EJECUTOR:

Fuente de financiamiento : Recursos por operaciones oficios de crédito
Modalidad Contratación : a Suma Alzada



Contrato de Servicio : CONTRATO N° 011-2020-MPSCH-LOG
 Contratista : CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO
 Monto Referencial del Servicio : S/. 1, 742,264.72 inc el IGV.
 Monto del Contrato de Servicio : S/. 1, 742,264.72 inc el IGV
 Plazo de Ejecución mantenimiento Periódico : 120 DIAS CALENDARIOS
 Inicio Plazo de Servicio Contractual : 22-09-2020
 Fecha Terminó de Servicio Contractual : 31-12-2020

INSPECTOR

INSPECTOR : ING. RONAL HIDALGO CULQUI
 Contrato De Servicio : N° 032-2020-MPSCH-LOG

2. DE LA PRESENTACIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE DEL SERVICIO N° 01-SETIEMBRE 2020

Mediante INFORME N° 001-2020-RHC/INSPECTOR DE MANTENIMIENTO PERIODICO-MPSCH, del Inspector de Servicio, recepcionada por mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, el día 05/10/2020, el ING. RONAL HIDALGO CULQUI, hace llegar a la Municipalidad la Valorización N° 01 del por los trabajos ejecutados en el periodo comprendido entre el 22/09/2020 hasta el 30/09/2020, del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-117 - PACCHA – CEMENTERIO, LONG. 3.150 KM; EMP. LI-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN – PADAGUANGA, LONG. 10.40 KM. Y EMP. LI-938 - CASA BLANCA BAJA- TAMBILLO, LONG. 6.89 KM., DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD

3. ANÁLISIS DEL IVP.

Para la ejecución del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-117 - PACCHA – CEMENTERIO, LONG. 3.150 KM; EMP. LI-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN – PADAGUANGA, LONG. 10.40 KM. Y EMP. LI-938 - CASA BLANCA BAJA- TAMBILLO, LONG. 6.89 KM., DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, en el proceso especial de selección N° 16-2020-MPSCH/CS-Segunda convocatoria, la empresa contratista CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO, ha sido favorecida con la buena pro, por su monto ofertado de S/. 1, 742,264.72 inc. IGV que a continuación se detalla

- A) Elaboración del Plan de Trabajo la suma de S/. 17,422.65 inc IGV, que se desarrollara exclusivamente para tal fase.
- B) Ejecución del mantenimiento Periódico la suma de 1, 446,079.72, inc. IGV, que se desarrollara exclusivamente en la fase de Ejecución del Mantenimiento Periódico.



PRESUPUESTO OFERTADO					
Ítem	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
		METRADOS		COSTO UNITARIO	
		Unidad	Cantidad		
				COSTO PARCIAL	
01	OBRAS PRELIMINARES				

01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	3.00	5,638.41	16,915.22
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	20.44	246.28	5,033.96
02	PAVIMENTOS				
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M.	m3	3,265.23	30.40	99,248.17
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M.	m3	9,890.71	49.64	491,014.78
03	TRANSPORTE				
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM.	m3k	15,787.14	8.67	136,874.50
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM.	m3k	85,250.52	1.73	147,886.61
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM.	m3k	772.28	7.10	5,485.88
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM.	m3k	8,915.67	1.54	13,749.70
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	20,440.00	0.54	10,968.70
05	SEÑALIZACIÓN				
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und	19.00	180.74	3,434.15
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	Und	36.00	769.96	27,718.40
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	Und	20.00	706.05	14,121.00
05.11	SEÑALES INFORMATIVAS	Und	8.00	526.6800	4,213.44
06	IMPACTO AMBIENTAL				
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	1.65	1,243.1939	2,051.27
07	EMERGENCIA SANITARIA				
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	3.00	28,976.27	86,928.81
COSTO DIRECTO		CD		S/.	1,065,644.60
GASTOS GENERALES		GG	10%	S/.	106,564.46
UTILIDAD		U	5%	S/.	53,282.23
SUB TOTAL		CD+GG+U		S/.	1,225,491.29
IGV			18%	S/.	220,588.43
TOTAL PRESUPUESTO		PT		S/.	1,446,079.72
PORCENTAJE					100.00%

- C) Ejecución del Mantenimiento Rutinario, la suma de S/. 261,339.71, inc. IGV, que se desarrollara exclusivamente para tal fase.
- D) La Elaboración del Inventario de Condición Vial la Suma de S/. 17,422.65, inc. IGV, que se desarrollara exclusivamente para tal fase.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL SERVICIO DURANTE EL MES

De acuerdo a la verificación de los trabajos referidos al "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-117 - PACCHA – CEMENTERIO, LONG. 3.150 KM; EMP. LI-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN – PADAGUANGA, LONG. 10.40 KM. Y EMP. LI-938 - CASA BLANCA BAJA- TAMBILLO, LONG. 6.89 KM., DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD", se ha observado que desde la fecha 22 de Setiembre hasta 30 de Setiembre del 2020, se desarrollaron las siguientes actividades:

1.00 OBRAS PRELIMINARES:

1.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS.

1.02 TRAZO Y REPLANTEO.

2.0 Emergencia sanitaria

2.01 emergencia sanitaria COVID 19

NOTA: Toda esta información esta detallada en el informe del Ing. Inspector de Servicio mediante INFORME N° 001-2020-RHC/INSPECTOR DE MANTENIMIENTO PERIODICO-MPSCH





Instituto Vial Provincial



MPSCH

Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO : "MANTENIMIENTO OPERATIVO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VEICUALES TRAMO EMP. II - 07 (EL MIRADOR) - LE (LA VICTORIA) - SANTIAGO DE S. - SAN MARTIN - PADUJUNCA, LONG. 0,40 KM. - DISTRITO DE CACHACADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATO : N° 012020MPSCH/UC
INSPECTOR : ING. RONALD HUGO CALQUE
CONTRATISTA : CONSORCIO WALE TAMBILLO



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD

PRESUP. OFERTADO (CD-03644) S/10V 823,537.06
PRESUP. OFERTADO (CD-03644) INC/18V 735,774.43
FECHA DE PRESUPUESTO 01/08/2020
PLAZO DE EJECUCION 20 dic. (04 meses)
FECHA DE INICIO Y TERMINO CONTRACTUAL 22/09/2020 - 31/07/2020

VALORIZACION DE AVANCE DE SERVICIO N° 01, MANTENIMIENTO PERIODICO

DEL 22 AL 30 DE SETIEMBRE 2020

FORMULA 01 : SERVICIO PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	MONTO CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE VALORIZACION			ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
			P.U.	METRADO	SOLES	METRADO	SOLES	%	METRADO	SOLES	%	METRADO	SOLES	%	METRADO	SOLES	%
01	OBRAS PNEUMATICAS	kg			6,032.24	1.00	6,032.24	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6,032.24	4,992.24	83.42%	0.5000	4,992.24	83.42%
01.01	MOVILIZACION Y DESMONTAJE DE EQUIPOS	km			246.26	10.40	2,561.31	50.00%	0.50	3,016.12	50.00%	3,016.12	3,016.12	50.00%	6.40	3,016.12	50.00%
01.02	TRAZO Y REPUNTEO	km					2,561.31	38.65%	4.00	965.12	38.65%	965.12	1,576.19	61.59%		1,576.19	61.59%
02	PAVIMENTOS	m ²			562,123.02		562,123.02	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	562,123.02	100.00%	1,679.85	562,123.02	100.00%
02.01	CAPA INELASTANTE E-0.05 M	m ²			30.65	1,679.85	51,904.20	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	51,904.20	100.00%	5,038.54	51,904.20	100.00%
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E-0.15 M	m ³			48.73	5,038.54	250,516.32	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	250,516.32	100.00%		250,516.32	100.00%
03	TRANSPORTE	m ³			555,278.08		555,278.08	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	555,278.08	100.00%		555,278.08	100.00%
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m ³			8.67	8,053.27	69,988.55	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	69,988.55	100.00%	8,053.27	69,988.55	100.00%
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m ³			1.56	43,541.65	84,306.22	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	84,306.22	100.00%	43,541.65	84,306.22	100.00%
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m ³			7.65	413.00	2,852.56	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,852.56	100.00%	413.00	2,852.56	100.00%
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m ³			1.57	4,784.00	7,510.88	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	7,510.88	100.00%	4,784.00	7,510.88	100.00%
04	OBRAS DE ARTE Y DORSALE	m			5,616.00		5,616.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	5,616.00	100.00%		5,616.00	100.00%
04.01	RECONFORMACION DE COMETAS	m			0.54	10,400.00	10,400.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	10,400.00	100.00%		10,400.00	100.00%
05	SEMALEZACION	Und			24,033.92		24,033.92	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	24,033.92	100.00%		24,033.92	100.00%
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und			180.89	10.00	1,808.90	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,808.90	100.00%	10.00	1,808.90	100.00%
05.02	SEMALES PREVENTIVAS	Und			759.03	16.00	12,144.48	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	12,144.48	100.00%	16.00	12,144.48	100.00%
5.03	SEMALES REGULATIVAS	Und			688.16	12.00	8,257.92	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	8,257.92	100.00%	12.00	8,257.92	100.00%
5.04	SEMALES INFORMATIVAS	Und			556.69	4.00	2,226.76	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,226.76	100.00%	4.00	2,226.76	100.00%
06	IMPACTO AMBIENTAL	ha			1,223.56	0.84	1,027.79	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,027.79	100.00%		1,027.79	100.00%
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha			1,223.56	0.84	1,027.79	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,027.79	100.00%		1,027.79	100.00%
07	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	kg			35,132.17		35,132.17	0.00%	0.40	14,052.87	40.00%	14,052.87	14,052.87	40.00%	0.40	14,052.87	40.00%
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	kg			35,132.17	1.00	35,132.17	0.00%	0.40	14,052.87	40.00%	14,052.87	14,052.87	40.00%	0.40	14,052.87	40.00%
A-	COSTO DIRECTO				542,236.63		542,236.63			18,054.11		18,054.11	18,054.11			524,182.54	
B-	GASTOS GENERALES				54,223.87	10.00%	54,223.87			1,805.41		1,805.41	1,805.41			52,418.46	
C-	UTILIDAD				27,111.93	5.00%	27,111.93			902.71		902.71	902.71			26,209.22	
D-	SUB TOTAL				623,572.43		623,572.43			20,762.23		20,762.23	20,762.23			602,810.20	
E-	I.G.V.				112,226.76		112,226.76			3,737.20		3,737.20	3,737.20			108,489.56	
F-	TOTAL				735,774.43		735,774.43			24,499.43		24,499.43	24,499.43			711,275.00	
G-	PORCENTAJE				80.00%		80.00%			3.33%		3.33%	3.33%			96.67%	



El resumen de la valorización de Servicio N° 01 Setiembre 2020, para efectos de pago al contratista CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO, se ha determinado el importe de **SI. 24,499.42 (VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 42/100 SOLES), INC. EL IGV** cuyo detalle es el siguiente.

SERVICIO: * MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECNALES TRAMO EMP. LI-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTÍN - PADAGUANGA, LONG. 10.40 KM., DISTRITO DE CAJICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD*

CONTRATO : N°01-2020-M MPSCH/LOG
INSPECTOR : ING. RONAL HIDALGO CULQUI
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD



RESUMEN GENERAL VALORIZACION N° 01-SETIEMBRE MANTENIMIENTO PERIODICO


DESCRIPCION	MONTO CONTRATO	VALORIZACION			SALDO	% AVANCE
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUM.		
1.- VALORIZACION CONTRACTUAL						
Valorización No. 01	623,537.66	-	20,762.22	20,762.22	602,775.43	3.33%
		-	-	-	-	
	623,537.66	0.00	20,762.22	20,762.22	602,775.43	3.33%
Avance Ejecutado		0.000%	3.330%	3.330%		
Avance Programado		0.000%	3.177%	3.177%		
2.- REAJUSTES						
Reajuste de la Valorización No. 05		-	-	-		
Regularización Reajuste Valorización anteriores		-	-	-		
Retención por atraso de Obra		-	-	-		
*El reajuste no se aplica según CGC 47.1		0.00	0.00	0.00		
A.- VALORIZACION BRUTA (sin IGV) (1+2)		0.00	20,762.22	20,762.22		
3.- RETENCIÓN POR GARANTIA						
Valorización No.01		-	2,076.22	2,076.22		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
* Contratista si solicita retención de garantía		0.00	2,076.22	2,076.22	2,076.22	
4.- AMORTIZACION POR ADELANTO MATERIALES						
Valorización No.01		-	-	-		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
5.- DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE						
Por Adelanto Directo		-	-	-		
Por Adelanto de Materiales		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto Directo		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto de Materiales		-	-	-		
		0.00	0.00	0.00		
B.- VALORIZACION NETA (sin IGV) (1)		0.00	18,686.00	18,686.00		
C.- MONTO NETO		0.00	18,686.00	18,686.00		
D.- I.G.V. (18% DE B)		0.00	3,363.48	3,363.48		
E.- MONTO A CANCELAR (C+D)		0.00	22,049.48	22,049.48		
F.- MONTO A FACTURAR (A*0.18)		0.00	24,499.42	24,499.42		

Para efectos de control de avance de ejecución del servicio, se ha determinado que Como el monto de la valorización acumulado ejecutada es mayor que el monto de la valorización acumulada programada, la obra se encuentra adelantada por lo que no procede comparación por atraso según el art. 205 del RLCE. En ella se puede visualizar que el avance programado para el mes de setiembre 2020, incluyendo la situación actual del servicio y el realmente ejecutado acumulado Promedio de los dos tramos es de 3.33 %, es decir la obra está adelantada un 0.52%, frente a lo programado de 2.81%. Esto en relación al tramo: LI-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTÍN - PADAGUANGA, LONG. 10.40 KM, y en relación al contrato se tiene: lo ejecutado al mes 1.69% y lo programado al mes 1.43%



PERIODO	VALORIZACIONES DE SERVICIO PROGRAMADA					VALORIZACIONES DE SERVICIO REAL				
	CONTRATO	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)		PRINCIPAL	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)	
	ORIGINAL	PARCIAL	ACUM. (A)	PARCIAL	ACUM.	TOTAL	PARCIAL	ACUM. (B)	PARCIAL	ACUMULADO
SET. 2020	20,679.48	20,679.48	20,679.48	1.43%	1.43%	24,499.42	24,499.42	24,499.42	1.69%	1.69%
OCT. 2020	210,608.28	210,608.28	231,287.76	14.56%	15.99%					
NOV. 2020	576,259.48	576,259.48	807,547.24	39.85%	55.84%					
DIC. 2020	638,532.52	638,532.52	1,446,079.76	44.16%	100.00%					
TOTALES	1,446,079.76	1,446,079.76				24,499.42	24,499.42			

DIAGRAMA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

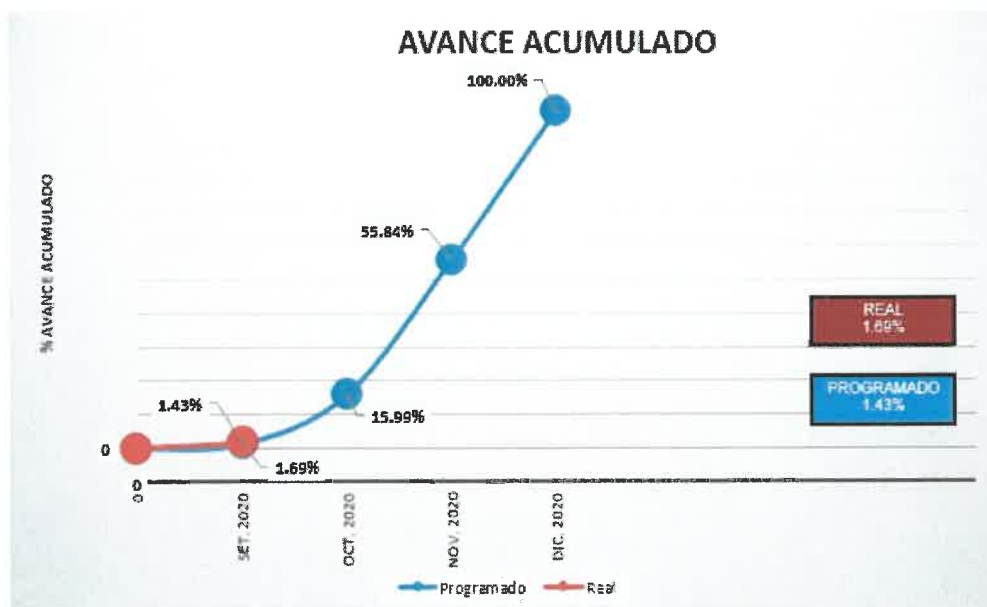

La retención de la Garantía de Fiel Cumplimiento, que tiene como responsabilidad el CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO, en dejar como garantía del trabajo a ejecutar, será descontado en las dos primeras Valorizaciones concerniente a los meses de Setiembre y Octubre del 2020, de las cuales será retenido el 10% del monto del contrato.

Dentro del contenido del informe mensual del contratista, de valorización N° 01 al mes de Setiembre del 2020, nos detalla las pólizas de seguros por la compañía de seguros PROTECTA SECURITY relacionadas a SEGURO COMPLENETARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD POLIZA SCTR N° 1000063713 y Contrato de SCTR Salud N°314404, vigente desde el 22/09/2020 hasta el 30/09/2020, seguros contra accidentes personales emitidas por la compañía aseguradora cuya fecha debe de coincidir al mes de Setiembre del 2020, Pólizas de seguros contra todo riesgo (SCTR – SALUD), FUE EMITIDA EL 22/09/2020, Que cubre la vigencia desde 22/09/2020 hasta el 30/09/2020.

CONCLUSIÓN:

Conforme al calendario de avance del SERVICIO vigente, la ejecución del servicio de SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-117 - PACCHA – CEMENTERIO, LONG. 3.150 KM; EMP. LI-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN – PADAGUANGA, LONG. 10.40 KM. Y EMP. LI-938 - CASA BLANCA BAJA-TAMBILLO, LONG. 6.89 KM., DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO –



LA LIBERTAD, ubicado en el distrito de Santiago de Chuco, Provincia de Santiago de Chuco, Departamento la Libertad, se encuentra Adelantada; por cuanto el acumulado programado para el mes de Setiembre del 2020 es el 3.33 %, es decir la obra está adelantada un 0.52%, frente a lo programado de 2.81%. Esto en relación al tramo: LI-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN – PADAGUANGA, LONG. 10.40 KM, y en relación al contrato se tiene: lo ejecutado al mes 1.69% y lo programado al mes 1.43%, de las cuales se tiene la ejecución de forma adelantada en todas las actividades programadas.

LOS METRADOS CONCILIADOS ENTRE EL INSPECTOR y el Residente del SERVICIO, han generado la VALORIZACION DEL SERVICIO N° 01, correspondiente a los trabajos ejecutados en el periodo comprendido entre el 22/09/2020 hasta el 30-09-2020 por la empresa contratista CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO, el mismo que haciende a la suma de **S/. 24,499.42 (VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 42/100 SOLES), INC. EL IGV.**

Las pólizas de seguros contra accidentes personales emitidas por la compañía aseguradora PROTECTA SECURITY relacionadas a la SEGURO COMPLENETARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD POLIZA SCTR N° 1000063713 y Contrato de SCTR Salud N°314404 y sus normas reglamentarias, a favor de la empresa **CORPORACION QUIPUZCOA ARANDA S.A.C.**, DE FECHA 22/09/2020, se encuentra ACTIVO.

La Retención de la Garantía, que garantiza el **FIEL CUMPLIMIENTO** de la ejecución del servicio por un monto a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO, se realizará en las dos primeras Valorizaciones concerniente a los meses de Setiembre Y Octubre del 2020, sumando el monto de **S/. 174,226.47 (CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS CON 47/100 SOLES)**, de las cuales se recomienda la retención a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO, la suma de **S/. 2,449.94 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 94/100 SOLES)**, considerando solamente el 10% del monto valorizado, ya que no cuenta con solvencia económica para su retención total del mes, quedando un saldo para la retención en la próxima valorización del mes de octubre la suma de **S/. 171,776.53 (CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 53/100 SOLES)**.

El Inspector del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-117 - PACCHA – CEMENTERIO, LONG. 3.150 KM; EMP. LI-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN – PADAGUANGA, LONG. 10.40 KM. Y EMP. LI-938 - CASA BLANCA BAJA- TAMBILLO, LONG. 6.89 KM., DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD”, ha presentado a esta municipalidad el informe relacionado a la valorización del servicio N° 01, el día 05/10/2020.

Después de haber evaluado el informe del Inspector con respecto a la valorización del servicio N° 01 por los trabajos ejecutados por el **CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO**, durante el periodo comprendido entre el 22/09/2020 hasta el 30/09/2020, del servicio de “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-117 - PACCHA – CEMENTERIO, LONG. 3.150 KM; EMP. LI-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN – PADAGUANGA, LONG. 10.40 KM. Y EMP. LI-938 - CASA BLANCA BAJA- TAMBILLO, LONG. 6.89 KM., DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD”, la misma que haciende a la suma de **S/. 24,499.42 (VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 42/100 SOLES), INC. EL IGV**, esta gerencia da su **CONFORMIDAD** respectiva al informe N° 117-2020-JO/IVPSCH/LFGCH.



La Retención de la Garantía, que garantiza el **FIEL CUMPLIMIENTO** de la ejecución del servicio por un monto a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO, contemplada al mes de Setiembre del 2020, se recomienda hacer el descuento respectivo la suma de **S/. 2,449.94 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 94/100 SOLES)**, del 10 % del monto de la valorización N° 01, de las cuales se recomienda la retención a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO.

Concluyendo que el monto a cancelar es de **S/. 22,049.48 (VEINTE DOS MIL CUARENTA Y NUEVE CON 48/100 SOLES)**, INC. EI IGV, haciendo un descuento de la retención de la Garantía de Fiel Cumplimiento, según su ficha resumen de la entidad, que es de **S/. 2,449.94 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 94/100 SOLES) INC. IGV**, Resumiendo esto en el cuadro resumen de Valorización N° 01 Setiembre del 2020.

RECOMENDACION


Hacer efectivo la Valorización del SERVICIO N° 01 mes de Setiembre 2020, por un monto a Pagar de **S/. 22,049.48 (VEINTE DOS MIL CUARENTA Y NUEVE CON 48/100 SOLES)**, INC. EI IGV, por el periodo comprendido entre el 22/09/2020 hasta el 30/09/2020, generado por el avance de los trabajos ejecutados en el servicio DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-117 - PACCHA – CEMENTERIO, LONG. 3.150 KM; EMP. LI-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN – PADAGUANGA, LONG. 10.40 KM. Y EMP. LI-938 - CASA BLANCA BAJA- TAMBILLO, LONG. 6.89 KM., DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, la misma que está a cargo del contratista, **CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO** e Inspeccionado por el Inspector de servicio el **ING. RONAL HIDALGO CULQUI**, para efectos consiguientes a este informe se hace llegar la siguiente documentación:

Adjunta:

- ✚ Informe N° 117-2020-JO/IVPSCH/LFGCH
- ✚ INFORME N° 013-2020-IVP-MPSCH/CEGB/TA
- ✚ Informe N° 1024-2020-MPSCH/DST/SGI
- ✚ INFORME N° 001-2020-RHC/INSPECTOR DE MANTENIMIENTO PERIODICO-MPSCH
- ✚ CARTA N° 015-2020-CVCCH/WCEPG-R.O
- ✚ CONTRATO N° 011-2020-MPSCH-LOG
- ✚ DU. N° 070-2020
- ✚ 03 folder manila Original de la valorización presentada por el contratista
- ✚ Planilla de Valorización N° 01 resumida por la entidad
- ✚ Resumen de la Valorización del servicio N° 01 por la entidad

Sin otro particular, me suscribo de Usted, no sin antes reiterar mi estima personal.

Atentamente,



INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
ING. Ronald Hidalgo Culqui
D.O. 218511
GERENTE GENERAL

RESUMEN DE VALORIZACION N° 01 SETIEMBRE 2020, POR LA EJECUCION DEL SERVICIO: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: EMP. LL-117 - PACCHA - CEMENTERIO, LONG. 3.150 KM; EMP. LL-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN - PADAGUANGA, LONG. 10.40 KM. Y EMP. LL-938 - CASA BLANCA BAJA- TAMBILLO, LONG. 6.89 KM., DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO
INSPECTOR : ING. RONAL HIDALGO CULQUI
SERVICIO : TRAMO: MP. LL-117 - PACCHA - CEMENTERIO, LONG. 3.150 KM; EMP. LL-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN - PADAGUANGA, LONG. 10.40 KM. Y EMP. LL-938 - CASA BLANCA BAJA- TAMBILLO, LONG. 6.89 KM

N° Contrato : N° 011-2020-IMPSC/LOG

Plazo de Ejecución	120 Días Calendarios
Anticipo	:S/0.00 Sin IGV
Adelanto de Materiales	:S/0.00 Sin IGV
Fecha Inicio Elec. Servicio	: 22 septiembre 2020
Fecha Término Servicio	: 31 diciembre 2020

0.00

ACTIVIDAD	COSTO DIRECTO (SI)	GASTOS GENERALES 10%	UTILIDAD 5%	SUB TOTAL	IGV 18%	TOTAL SI.
PLAN DE TRABAJO	12,839.09	1,283.91	641.95	14,764.96	2,657.69	17,422.65
MANTENIMIENTO PERIODICO	1,065,644.60	106,564.46	53,282.23	1,225,491.29	220,588.43	1,446,079.71
MANTENIMIENTO RUTINARIO	192,586.37	19,258.64	9,629.32	221,474.33	39,865.38	261,339.71
INVENTARIO DE CONDICION VIAL	12,839.09	1,283.91	641.95	14,764.96	2,657.69	17,422.65
TOTAL SI.	1,283,909.15	128,390.92	64,195.46	1,476,495.53	265,769.19	1,742,264.72

N° Valorización	Valorización Bruta	Reintegro de Valorización	Reajuste de Reintegro de Valorización	Deducción del reajuste que no corresponde	Retención Según Art. 151 DS 344-2016-EF Reglamento de la ley N° 30225		Anticipo Materiales Adelanto	Monto a Pagar		IGV	Valorización del mes
					Retención de Garantía 10%	Retención Inc. IGV		Retención SI/IGV	SI/IGV		
V. N° 01. Set. 2020	20,762.22	0.00	0.00	0.00	2,076.22	2,449.94	0.00	0.00	18,686.00	3,363.48	22,049.48
V. N° 02. Oct. 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. N° 03. Nov. 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. N° 04. Dic. 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Parcial	20,762.22	0.00	0.00	0.00	2,076.22	2,449.94	0.00	0.00	18,686.00	3,363.48	22,049.48

valorización	Avance Mensual Acumulado	
	Actual	Acumulado
1 ra. VAL	1.69%	1.69%
2 ra. VAL	0.00%	0.00%

ADICIONALES											
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General	20,762.22	0.00	0.00	0.00	2,076.22	2,449.94	0.00	0.00	18,686.00	3,363.48	22,049.48

NOTA: Conforme lo establece el Resolución de Superintendencia N° 071-2018/SUNAT, a partir del 01 de abril de 2018, los siguientes servicios, contenidos en el Anexo 3 de la R.S. 183-2004/SUNAT, cuyo nacimiento de la obligación tributaria del IGV se origine a partir de dicha fecha, estarán sujetos a la aplicación del 12%:


 GERENTE GENERAL
 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

JEFE DE OPERACIONES
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO : "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO:EMP. LI-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN - PADAGUANGA, LONG. 10.40 KM.; DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATO : N° 011-2020-MPSCH/LOG
INSPECTOR : ING. RONAL HIDALGO CULQUI
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD



RESUMEN DE PAGO N° 01 - SETIEMBRE 2020
CONTRATO N° 011-2020-MPSCH/LOG **MES DE SETIEMBRE 2020**

PAGO A CUENTA A CANCELAR AL CONTRATISTA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

CONCEPTO		MONTOS
		SI.
1.- Monto Valorizado sin Reajuste en el presente mes :		20,762.22
- Valorizacion No.01		20,762.22
2.- Reajuste de las Valorizaciones :		0.00
- Reajuste de la Valorizacion No.01		0.00
- Regularizacion Reajuste Valorización anterior		0.00
- Retención por atraso de Obra		0.00
* El reajuste no se aplica según CGC 47.1		
A.- VALORIZACION BRUTA (VB) (sin IGV) (1+2)	SI.	20,762.22
3.- Retención de Garantía :		2,076.22
- En la Valorizacion No.01		2,076.22
- Regularización Valorizaciones anteriores		0.00
* Contratista no solicito retención de Garantía		
4.- Amortizacion del Adelanto de Materiales :		0.00
- En la Valorizacion No.01		0.00
- Regularización Valorizaciones anteriores		0.00
* Contratista no solicito adelanto		
5.- Deducción del Reajuste que no corresponde :		0.00
- Por Adelanto Directo		0.00
- Por Adelanto de Materiales		0.00
- Por Regularización del Adelanto Directo		0.00
- Por Regularización del Adelanto de Materiales		0.00
B.- VALORIZACION NETA (sin IGV) (1)	SI.	18,686.00
C.- MONTO NETO	SI.	18,686.00
D.- I.G.V. (18% DE B)	SI.	3,363.48
E.- MONTO A CANCELAR (C+D)	SI.	22,049.48
F.- MONTO A FACTURAR (A*0.18)	SI.	24,499.42



ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: : "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO:EMP. LI-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN - PADAGUANGA, LONG. 1040 KM.; DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATO : N° 011-2020-MPSCH/LOG
 INSPECTOR : ING. RONAL HIDALGO CULQUI
 CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO



Instituto Vial Provincial
 PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD



RESUMEN GENERAL VALORIZACION N° 01-SETIEMBRE MANTENIMIENTO PERIODICO

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO	VALORIZACION			SALDO	% AVANCE
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUM.		
1.- VALORIZACION CONTRACTUAL						
Valorizacion No. 01	623,537.66	-	20,762.22	20,762.22	602,775.43	3.33%
	623,537.66	0.00	20,762.22	20,762.22	602,775.43	3.33%
Avance Ejecutado		0.000%	3.330%	3.330%		
Avance Programado		0.000%	1.430%	1.430%		
2.- REAJUSTES						
Reajuste de la Valorizacion No. 05		-	-	-		
Regularización Reajuste Valorización anteriores		-	-	-		
Retención por atraso de Obra		-	-	-		
*El reajuste no se aplica según CGC 47.1		0.00	0.00	0.00		
A.- VALORIZACION BRUTA (sin IGV) (1+2)		0.00	20,762.22	20,762.22		
3.- RETENCIÓN POR GARANTIA						
Valorizacion No.01		-	2,076.22	2,076.22		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
* Contratista si solicitó retención de garantía		0.00	2,076.22	2,076.22	2,076.22	
4.- AMORTIZACION POR ADELANTO MATERIALES						
Valorizacion No.01		-	-	-	-	
Regularización Valorización anteriores		-	-	-	-	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
5.- DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE						
Por Adelanto Directo		-	-	-		
Por Adelanto de Materiales		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto Directo		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto de Materiales		-	-	-		
		0.00	0.00	0.00		
B.- VALORIZACION NETA (sin IGV) (1)		0.00	18,686.00	18,686.00		
C.- MONTO NETO		0.00	18,686.00	18,686.00		
D.- I.G.V. (18% DE B)		0.00	3,363.48	3,363.48		
E.- MONTO A CANCELAR (C+D)		0.00	22,049.48	22,049.48		
F.- MONTO A FACTURAR (A*0.18)		0.00	24,499.42	24,499.42		



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHILCO

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. 14-17 (EL MIRADOR) - LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN - PODOJANGA LONGS 10,40 KM. - DISTRITO DE CACHICADA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHILCO - LA LIBERTAD

CONTRATO: N° 01-2020-MP-SCH-03
 INSPECTOR: ING. RONALD HIDALGO CHILQUI
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL EL TAMBULLO



PRESUPUESTO OFERTADO: (CD-09-U) S/15V 623.537,66
 PRESUPUESTO OFERTADO: (CD-09-U) S/15V 735.774,43
 FECHA DE PRESUPUESTO: 01/02/2020
 PLAZO DE EJECUCION: 120 d.c. (04 meses)
 FECHA DE INICIO Y TERMINO CONTRACTUAL: 22/09/2020 - 31/12/2020

VALORIZACION DE AVANCE DE SERVICIO N° 01, MANTENIMIENTO PERIODICO DEL 22 AL 30 DE SETIEMBRE 2020
 FORMULA 01 - SERVICIO PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	MONTO CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE VALORIZACION		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
			PU	METRADO	SOLES	%	METRADO	SOLES	%	METRADO	SOLES	%
01	01.01 OBRAS PRELIMINARES				6.593,55	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01.01	MOVILIZACION Y DESMOLIZACION DE EQUIPOS	m³	6.032,24	1,00	6.032,24	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	246,28	10,40	2.581,31	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02	02.01 PAVIMENTOS				302.120,32	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02.01	CAPA NIVELANTE E=0,05 M.	m³	30,66	1,679,85	51.504,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0,15 M.	m³	49,73	5,039,54	250.616,32	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
03	03.01 TRANSPORTE				185.273,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR-HASTA 1 KM.	m³	8,67	8,063,27	69.808,56	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM.	m³	1,95	43.541,65	84.906,22	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM.	m³	7,15	413,00	2.952,85	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM.	m³	1,57	4.784,00	7.510,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04	04.01 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				5.616,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	0,54	10.400,00	5.616,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05	05.01 SEÑALIZACION				24.433,02	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und	180,89	10,00	1.908,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05.02	SENALES PREVENTIVAS	Und	750,03	16,00	12.144,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.03	SENALES REGLAMENTARIAS	Und	688,16	12,00	8.377,92	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05.11	SENALES INFORMATIVAS	Und	526,98	4,00	2.108,72	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
06	06.01 IMPACTO AMBIENTAL				1.027,79	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	1.223,66	0,84	1.027,79	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
07	07.01 EMERGENCIA SANITARIA				35.132,17	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gdb	35.132,17	1,00	35.132,17	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.-	COSTO DIRECTO				542.206,66	-		18.054,11	18.054,11		524.152,54	
B.-	GASTOS GENERALES				54.220,67	0,00		1.805,41	1.805,41		52.415,26	
C.-	UTILIDAD				27.110,33	10,00%		902,71	902,71		26.207,62	
D.-	SUB TOTAL				623.537,66	5,00%		20.762,22	20.762,22		60.275,44	
E.-	I.G.V.				112.236,78	0,00		3.737,20	3.737,20		108.499,58	
F.-	TOTAL				735.774,43			24.499,42	24.499,42		711.275,01	
G.-	PORCENTAJE				100,00%		0,00%	3,33%	3,33%		96,67%	



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO:EMP. LI-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTÍN - PADAGUANGA, LONG. 10.40 KM.; DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATO: N° 011-2020-MPSC/HLOG

INSPECTOR: ING. RONAL HIDALGO CULQUI

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD



PLANILLA DE RESUMEN DE METRADOS, MANTENIMIENTO PERIODICO
DEL 22 AL 30 DE SETIEMBRE 2020

Partida	Descripción	Und	Metrado Contrato Original	Acumulado Anterior	Val N° 01	Acumulado Actual		Saldos por Valorizar	
				Metrado	Set-20	Metrado	%	Metrado	%
01	OBRAS PRELIMINARES								
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	2.00	-	1.000	1.000	50.00%	1.0000	50.00%
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	25.81	-	25.81	25.810	100.00%	-	-
02	PAVIMENTOS								
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M.	m3	6,452.50	-	-	-	-	6,452.5000	100.00%
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M.	m3	19,357.50	-	-	-	-	19,357.5000	100.00%
03	TRANSPORTE								
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM.	m3k	19,897.50	-	-	-	-	19,897.5000	100.00%
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM.	m3k	185,783.74	-	-	-	-	185,783.7400	100.00%
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM.	m3k	12,830.00	-	-	-	-	12,830.0000	100.00%
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM.	m3k	94,131.08	-	-	-	-	94,131.0800	100.00%
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE								
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	25,810.00	-	-	-	-	25,810.0000	100.00%
05	SEÑALIZACIÓN								
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und	27.00	-	-	-	-	27.0000	100.00%
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	Und	14.00	-	-	-	-	14.0000	100.00%
5.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	Und	8.00	-	-	-	-	8.0000	100.00%
05.11	SEÑALES INFORMATIVAS	Und	10.00	-	-	-	-	10.0000	100.00%
06	IMPACTO AMBIENTAL								
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.50	-	-	-	-	2.5000	100.00%
07	EMERGENCIA SANITARIA								
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	2.00	-	1.000	1.000	50.00%	1.0000	50.00%



ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO : "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMDEMP. U-117 (EL MIRADOR) - (E. LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTÍN - PADUANGA, LONG. 10.40 KM.; DISTRITO DE CARCHIDAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"



CONTRATO : N° 011-2020-MPSC/HLOG
INSPECTOR : ING. RONAL HIDALGO CULQUI
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO



CUADRO COMPARATIVO DE AVANCES : PROGRAMADO VS EJECUTADO (CURVA "S") COMPARACION EFECTUADA CON EL CSP N° 01

PERIODO	VALORIZACIONES DE SERVICIO PROGRAMADA				VALORIZACIONES DE SERVICIO REAL				SITUACION DE SERVICIO	
	CONTRATO ORIGINAL	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)	PRINCIPAL TOTAL	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)	SERVICIO	%
		PARCIAL	ACUM. (A)			PARCIAL	ACUM. (B)			
SET. 2020	20,679.48	20,679.48	20,679.48	1.43%	24,499.42	24,499.42	24,499.42	1.69%	ADELANTADA	18.47%
OCT. 2020	210,608.28	210,608.28	231,287.76	14.56%						
NOV. 2020	576,259.48	576,259.48	807,547.24	39.85%						
DIC. 2020	638,532.52	638,532.52	1,446,079.76	44.16%						
TOTALES	1,446,079.76	1,446,079.76			24,499.42	24,499.42				

NOTAS :
1 - Montos que considera costo directo + gastos generales + utilidad, montos sin incluir IGV.
2 - En el avance programado se ha considerado el Calendario de Avance Servicio que corresponde al mes de Setiembre

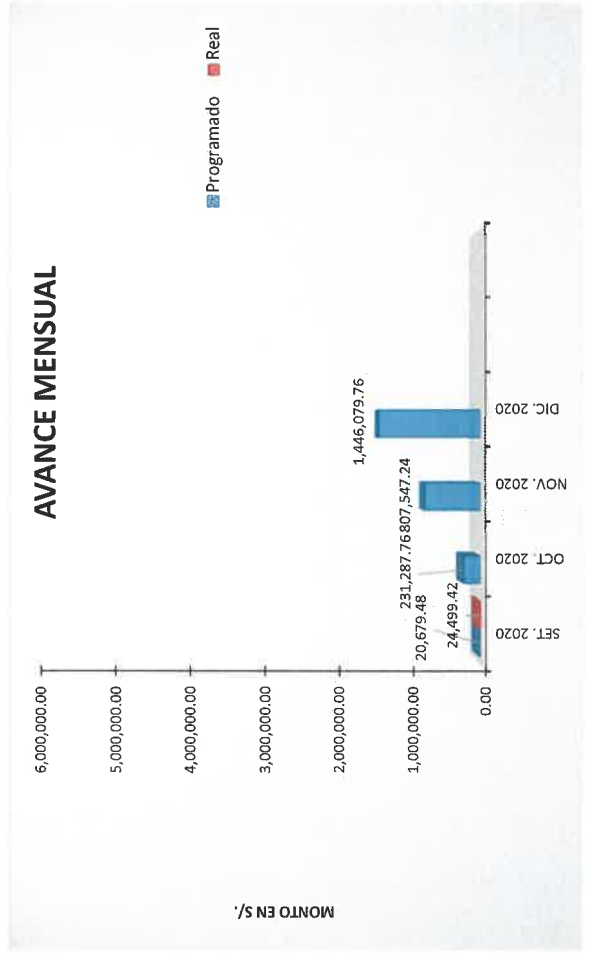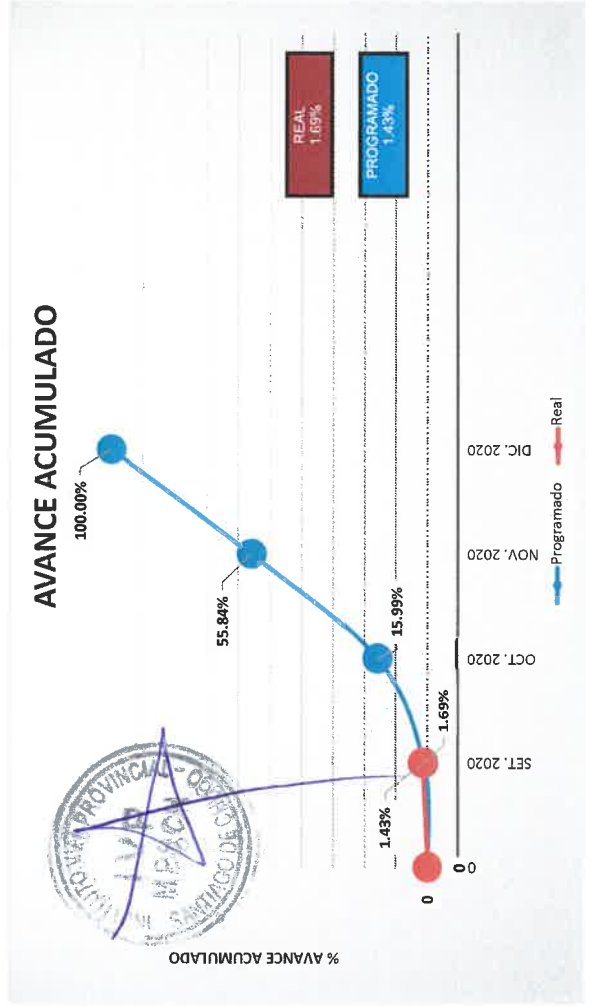

ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: : "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO:EMP. LI-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN - PADAGUANGA, LONG. 10.40 KM.; DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATO: : N° 011-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR : ING. RONAL HIDALGO CULQUI

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD



EVALUACION DEL AVANCE VALORIZADO RESPECTO AL PROGRAMADO

PRESUPUESTO	MONTO TOTAL X PRESUPUESTO	MONTO AVANCE ACUMULADO	
		VALORIZADO	PROGRAMADO
SERVICIO PRINCIPAL	1,446,079.76	24,499.42	20,679.48
TOTAL (Sin IGV)	1,446,079.76	24,499.42	20,679.48
		1.69%	1.43%

Situación de Obra	S/. 24,499.42 > S/.20,679.48 ==>	Adelantada
		18.472%

VERIFICACION SI REQUIERE CALENDARIO ACELERADO (ART. 205 DEL RLCE)

a.- Monto Valorizacion Acumulado Programado	20,679.48
b.- Porcentaje art. 205 del Reglamento.	80%
c.- Monto Tope (80% de a)	16,543.58
d.- Monto Valorizacion Acumulado Ejecutado	24,499.42

Se tiene que:
(d) > (c) => S/.24,499.42 > S/.16,543.58

Conclusion :

Como el monto de la valorizacion acumulado ejecutada es mayor que el monto de la valorizacion acumulada programada, la obra se encuentra adelantada por lo que no procede comparacion por atraso según el art. 205 del RLCE.



ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO:EMP. LI-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN – PADAGUANGA, LONG. 10.40 KM.; DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"

SERVICIO:

CONTRATO : N° 011-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR : ING. RONAL HIDALGO CULQUI

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO




Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD



RESUMEN DE METRADOS MANTENIMIENTO PERIODICO

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO
01	OBRAS PRELIMINARES		
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	25.81
02	PAVIMENTOS		
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M.	m3	-
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M.	m3	-
03	TRANSPORTE		
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM.	m3k	-
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM.	m3k	-
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM.	m3k	-
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM.	m3k	-
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE		
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	-
05	SEÑALIZACIÓN		
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und	-
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	Und	-
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	Und	-
05.11	SEÑALES INFORMATIVAS	Und	-
06	IMPACTO AMBIENTAL		
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0
07	EMERGENCIA SANITARIA		
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1



"Año de la Universalización de la Salud"

INFORME N° 117-2020-JO/IVPSCH/LFGCH

A : ING. RAFAEL K. VALENCIA REBAZA
GERENTE DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

DE : ING. LUIS F. GUTIERREZ CHÁVEZ
JEFE DE OPERACIONES DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO



ASUNTO : EVALUACIÓN Y CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: "EMP. LI-117 – PACCHA – CEMENTERIO LONG= 3.150 KM" "EMP. LI-117 (EL MIRADOR) – I.E. (LA VICTORIA) – SANTA ROSA – SAN MARTIN – PADAGUANGA LONG= 10.400 KM" Y "EMP. LI-938 – CASA BLANCA BAJA – TAMBILLO LONG= 6.890 KM" DEL DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.

REFERENCIA :

MONITOR DESIGNADO POR IVP	a)	INF. N°010-2020-IVP-MPSCH/CEGB/TA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	b)	INF. N°1024-2020-MPSCH/DIST/SGI
INSPECTOR DE SERVICIO	c)	INF. N°001-2020-ING°RHC/INSPECTOR DE MANTENIMIENTO PERIODICO-MPSCH
CONTRATISTA	d)	CARTA N°015-2020-CVCCH/WCEPG-R.O

FECHA : SANTIAGO DE CHUCO, 09 DE NOVIEMBRE DE 2020

Por medio del presente, le expreso mi cordial saludo y afecto, a su vez presento la VALORIZACIÓN N°01 del SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: "EMP. LI-117 – PACCHA – CEMENTERIO LONG= 3.150 KM" "EMP. LI-117 (EL MIRADOR) – I.E. (LA VICTORIA) – SANTA ROSA – SAN MARTIN – PADAGUANGA LONG= 10.400 KM" Y "EMP. LI-938 – CASA BLANCA BAJA – TAMBILLO LONG= 6.890 KM" DEL DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, correspondiente al mes de septiembre (del 22 al 30) de 2020, la cual fue elaborada por el CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO y alcanzada al Inspector de servicio mediante documento de referencia d); este a su vez dio su Conformidad y la ingresó a la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad) con documento de referencia c) para realizar el trámite correspondiente.

Para el pago de la VALORIZACIÓN N° 01, se debe contar con la CONFORMIDAD del área responsable (Sub Gerencia de Infraestructura) y posteriormente se dará la APROBACIÓN del área usuaria (Instituto Vial Provincial de Santiago de Chuco), según se estipula los Términos de Referencia del D.U. N° 070-2020 para los Mantenimientos Viales de los caminos vecinales de la provincia de Santiago de Chuco.

Dentro de este marco, a su vez contando con la CONFORMIDAD de VALORIZACIÓN N° 01 del área responsable (documento de referencia b); siguiendo el trámite correspondiente; esta Jefatura de Operaciones del IVP de Santiago de Chuco, como parte de sus funciones, realizó la evaluación dicha documentación por medio del Monitor designado, el Ing. Carlos Enrique Geldres Barriga, la cual se detalla en su informe respectivo (documento de referencia a); de esta manera se dará COMFORMIDAD (de no haber observaciones); a fin de dar paso a la evaluación para la APROBACIÓN por parte de su persona.

I. INFORME GENERAL:**A) INFORMACIÓN TÉCNICA:**

Según lo detallado y analizado en el Informe del Monitor designado, la Sub Gerencia de Infraestructura (área responsable) y del Inspector concerniente a la VALORIZACIÓN N° 01 (del 22 al 30 de septiembre) de la Fase II: MANTENIMIENTO PERIÓDICO del servicio en mención, presentada por el Contratista, se tiene la siguiente información resumida a considerar:

A) DEL AVANCE EJECUTADO

Los metrados ejecutados son:

PARTIDA	UND	BASE	ACTUAL	%AVANCE
TRABAJOS PRELIMINARES				
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	glb	1.00	0.50	50.00%
TRAZO Y REPLANTEO	km	10.40	4.00	38.46%
PAVIMENTOS				
CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	1679.85	-	0.00%
MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M	m3	5039.54	0.00	0.00%
TRANSPORTES				
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3-km	8063.27	0.00	0.00%
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1 KM	m3-km	43541.65	0.00	0.00%
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3-km	413.00	0.00	0.00%
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1 KM	m3-km	4784.00	0.00	0.00%
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				
RECONFORMACION DE CUNETAS	m	10400.00	0.00	0.00%
SEÑALIZACION				
INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	10.00	0.00	0.00%
SEÑALES PREVENTIVAS	und	16.00	0.00	0.00%
SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	12.00	0.00	0.00%
SEÑALES INFORMATIVAS	und	4.00	0.00	0.00%
IMPACTO AMBIENTAL				
RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0.84	-	0.00%
EMERGENCIA SANITARIA				
EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	0.40	40.00%

Las partidas que se vienen ejecutando a la fecha corresponden a las obras preliminares (movilización y desmovilización de equipos, trazo y replanteo), asimismo, se está considerando la partida de emergencia sanitaria COVID 19 a un 40%. Todo viene siendo ejecutado conforme a las normas de evaluación, dentro de los lineamientos y Especificaciones Técnicas establecidos en el Plan de Trabajo, elaborado por el Contratista y previamente aprobado por la Entidad.

En cuanto al avance acumulado ejecutado respecto al programado (curva S) tenemos el siguiente resumen:

N° VAL.	MES	PERIODO DE EJECUCIÓN	AVANCE MENSUAL ACUM.	
			EJECUTADO	PROGRAMADO

1	SEPTIEMBRE	22/09/2020	30/09/2020	3.33%	2.81%
---	------------	------------	------------	-------	-------

Se observa un porcentaje de avance negativo del **+0.52%**, lo cual significa que la ejecución va adelantada con respecto a lo programado.

B) DEL MONTO VALORIZADO

De acuerdo con las actividades ejecutadas se tiene una valorización con la siguiente configuración:

N° Valorización	Valorización Bruta	MONTO A PAGAR	IGV	Valorización del mes
		S/IGV		
N° 01. Septiembre	S/.20,762.22	S/.20,762.22	S/.3,737.20	S/.24,499.42
N° 02. Octubre	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00
N° 03. Noviembre	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00
N° 04. Diciembre	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00
Parcial	S/.20,762.22	S/.20,762.22	S/.3,737.20	S/.24,499.42
ADICIONALES				
0	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00
Total General	S/.20,762.22	S/.20,762.22	S/.3,737.20	S/.24,499.42

Se observa que la VALORIZACIÓN N° 01 del mes de septiembre corresponde a un monto de **S/. 24,499.42 (inc. IGV)**.

C) DE LA RETENCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)

Según la CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍAS del contrato de servicio, estipula una retención del 10% como garantía de FIEL CUMPLIMIENTO del monto contractual total, el cual será retenido de manera particionada de las dos primeras valorizaciones según lo estipula el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado en su artículo 149° "Garantía de fiel cumplimiento", inciso 149.5, para servicios, como se muestra en el siguiente cuadro:

MONTO CONTRACTUAL	RETENCIÓN G.F.C. (10%)	RETENCIÓN EN CADA VAL.	
		VAL. 01 (10 % DE VAL.)	VAL. 02 (SALDO)
S/. 1,742,264.72	S/. 174,226.47	S/. 2,449.94	S/. 171,776.53

Por lo cual se tiene el siguiente detalle:

➤ VALORIZACIÓN BRUTA	S/.	20,762.22
➤ IGV (18%)	S/.	3,737.20
➤ VALORIZACIÓN NETA	S/.	24,499.42
➤ RETENCIÓN G.F.V	S/.	2,449.94
➤ SALDO A COBRAR	S/.	22,049.48



El saldo a cobrar por la VALORIZACIÓN N° 01 del 19 al 30 del mes de septiembre es de **S/. 22,049.48 (VEINTIDOS MIL CUARENTA Y NUEVE CON 48/100 NUEVOS SOLES) incluido el I.G.V.** Asimismo, queda un saldo de la garantía de Fiel Cumplimiento de **S/. 171,776.53 (inc. IGV).**

D) DE PENALIDADES PRESENTADAS

No se presentó ninguna ocurrencia que suponga la aplicación de PENALIDAD según las estipulaciones del contrato de servicio de en su CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.

III. CONCLUSIONES

Tomando en cuenta todo lo analizado anteriormente, se hace las siguientes conclusiones:

- ❖ La diferencia entre el avance ejecutado respecto al programado arroja un **porcentaje positivo de +0.52%.**
- ❖ El saldo a pagar por la VALORIZACIÓN N° 01 del mes de septiembre es de **S/. 22,049.48 (VEINTIDOS MIL CUARENTA Y NUEVE CON 48/100 NUEVOS SOLES inc. IGV).**
- ❖ El saldo por cobrar de la garantía de Fiel Cumplimiento para la siguiente valorización es de **S/. 171,776.53 (inc. IGV).**
- ❖ **No se presentaron PENALIDADES.**
- ❖ Se da **CONFORMIDAD** por parte de la oficina de Jefatura de Operaciones del IVP Santiago de Chuco a la VALORIZACIÓN N° 01 del servicio en mención.

IV. RECOMENDACIONES

Se recomienda **APROBAR** la presente VALORIZACIÓN N° 01 por su persona, a fin de realizar el pago correspondiente del CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO, conforme a lo estipulado en el cronograma programado del Plan de Trabajo del servicio y a lo ejecutado en campo. De igual modo, se sugiere seguir las recomendaciones indicadas en el Informe del Monitor designado (documento de referencia a).

Es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y fines.

ATENTAMENTE

Fuente de financiamiento	: Recursos Ordinarios
Modalidad Contratación	: a Suma Alzada
Contrato de Servicio	: N° 011-2020-MPSCH/LOG
Decreto de Urgencia	: N° 070-2020
Fecha de Suscripción	: 28-08/2020
Contratista	: CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO (ECAN INGENIERIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – ECAN INGENIERIA S.R.L. y CORPORACION QUIPUZCOA ARANDA S.A.C.)
Monto Referencial del Servicio	: S/. 1,742,265.00 inc. el IGV.
Monto del Contrato de Servicio	: S/. 1,742,264.72 inc. el IGV
Adelanto Directo	: No aplica
Fecha Entrega Terreno	: 29-08-2020 (Elaboración del Plan de Trabajo)
Fecha de Conformidad de P. T	: 19-09-2020
Fecha de Inicio de Servicio M.P	: 30-08-2020
Plazo de Ejecución	: 500 DIAS CALENDARIOS
Fecha Límite de ejecución M.P	: 31 de diciembre del 2020
Inicio Plazo de Servicio Contractual	: 29-08-2020
Fecha Término de Servicio Contractual	: 31-12-2021



INSPECCIÓN

Contrato Inspección	: N° 032-2020-MPSCH-LOG
Decreto de Urgencia	: N° 070-2020
Fecha Contrato Inspección	: 24-08-2020
Plazo Prestación Inspección	: 120 días calendarios
Monto Contrato Inspección	: S/. 19,418.00 inc. el IGV

2. ANTECEDENTES.

Mediante la **CARTA N° 015-2020-CVCCH/WCEPG-/R.O.**, de fecha 30/09/2020, la empresa CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO (ECAN INGENIERIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – ECAN INGENIERIA S.R.L. y CORPORACION QUIPUZCOA ARANDA S.A.C.), como representante el **residente** del servicio Ing. Willy Chrystyam Eduardo Pacheco Grados, realizo la entrega del INFORME MENSUAL N° 01 del camino vecinal denominado: “**SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO II: EMP. LI-117 (EL MIRADOR)- I.E. (LA VICTORIA) – SANTA ROSA – SAN MARTIN – PADAGUANGA, LONG.= 10.400 KM, DEL DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD**”.

Mediante **INFORME N°001-2020-ING° RHC/INSPECTOR DE MANTENIMIENTO PERIODICO-MPSCH.**, emitido por el inspector de servicio de Mantenimiento Rutinario y Periódico del camino vecinal, el **Ing. Ronal Hidalgo Culqui**, con fecha 05/10/2020, alcanza la Valorización de Servicio N° 01 del contrato de Servicio N° 011-2020-MPSCH/LOG, que consiste en los caminos vecinales denominado: “**SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO II: EMP. LI-117 (EL MIRADOR)- I.E. (LA VICTORIA) – SANTA ROSA – SAN MARTIN – PADAGUANGA, LONG.= 10.400 KM, DEL DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD**”.

Con **INFORME N° 1024-2020-MPSCH/DIST/SGI**, el Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH, Ing. DAVIA IVAN SILVA TORRES da la CONFORMIDAD DE PAGO de la VALORIZACION N° 01, por el “**SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO II: EMP. LI-117 (EL MIRADOR)- I.E. (LA VICTORIA) – SANTA ROSA – SAN MARTIN – PADAGUANGA, LONG.= 10.400 KM, DEL DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD**”.



3. ANÁLISIS DEL TECNICO ADMINISTRATIVO.

Para la ejecución del servicio de Mantenimiento Rutinario y Periódico del Camino Vecinal TRAMO I: **EMP.LI-117 PACCHA – CEMENTERIO, LONG.= 3.150 KM, DEL DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD**, en el Procedimiento Especial de Selección N° 003-2020-MPSCH/CS, la empresa contratista CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO, ha sido favorecida con la buena pro, por su monto ofertado de **S/. 268,499.70 inc. IGV** (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 70/100 SOLES).

Para la ejecución del servicio de Mantenimiento Rutinario y Periódico del Camino Vecinal TRAMO II: **EMP. LI-117 (EL MIRADOR)- I.E. (LA VICTORIA) – SANTA ROSA – SAN MARTIN – PADAGUANGA, LONG.= 10.400 KM, DEL DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD** en el Procedimiento Especial de Selección N° 003-2020-MPSCH/CS, la empresa contratista CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO, ha sido favorecida con la buena pro, por su monto ofertado de **S/. 886.475.20 inc. IGV** (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL COATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 20/100 SOLES).

Para la ejecución del servicio de Mantenimiento Rutinario y Periódico del Camino Vecinal TRAMO III : **EMP. LI-938 – CASA BLANCA BAJA TAMBILLO, LONG.= 6.890 KM, DEL DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD** en el Procedimiento Especial de Selección N° 003-2020-MPSCH/CS, la empresa contratista CONSORCIO VIAL TAMBILLO, ha sido favorecida con la buena pro, por su monto ofertado de **S/. 587,289.82 inc. IGV** (QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 82/100 SOLES).

Por lo tanto la sumatoria de los tres tramos nos da el monto contractual que asiende a la suma de **S/. 1,742,264.72, inc. IGV**, (UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 72/100 SOLES).

Revisado la documentación se aprecia que se ha venido ejecutando los trabajos solamente en el **TRAMO II: EMP. LI-117 (EL MIRADOR)- I.E. (LA VICTORIA) – SANTA ROSA – SAN MARTIN – PADAGUANGA, LONG.= 10.400 KM, DEL DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD**, tiene un presupuesto para la Fase II: **Mantenimiento Periodico de S/. 735,774.42, inc. IGV** (SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOSSETENTA Y CUATRO CON 42/100 SOLES). En el mes de Setiembre se ejecutaron las siguientes partidas: **Movilizacion y desmovilización de equipo 0.50 gbl.** por el traslado de maquinaria a lugar del servicio, valorizando el monto de **S/. 3,016.12**; **Trazo y Replanteo** se realizo en un tramo de **4.00 Km**, dando un valor de **S/. 985.12** y en **Emergencia Sanitaria COVID 19**, se ejecuto **0.40 gbl**, haciendo un costo de **S/. 14,052.87**, obteniéndose el siguiente cuadro del total valorizado:

COSTO DIRECTO		S/. 18,054.10
COSTO INDIRECTO	10%	1,805.41
UTILIDAD	5%	902.71
SUB TOTAL		20,762.22
IGV	18%	3,737.20
TOTAL VALORIZADO		24,499.42



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco


PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

INFORME N° 1024 - 2020-MPSCH/DIST/SGI

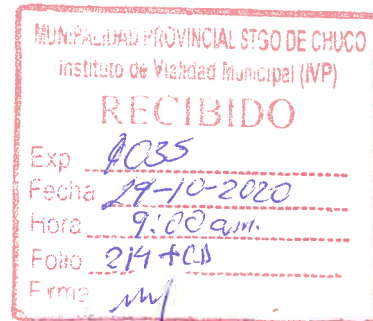

A : ING. RAFAEL K. VALENCIA REBAZA
Gerente de IVP de la MPSCH

DE : ING. DAVID IVAN SILVA TORRES
Sub Gerente de Infraestructura – MPSCH

ASUNTO : CONFORMIDAD DE VALORIZACION N° 01 CONTRATISTA – CONTRACTUAL
(TRAMO 003)

REFERENCIA : (01) INFORME N°0190-2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH
(02) PROVEIDO POR IVP EL 05 DE OCTUBRE DEL 2020
(03) CARTA N° 002-2020-LBLL-IO/MPSCH
(04) OBRA: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: TRAMO 01: EMP. LI-117 - PACCHA - CEMENTERIO - LONG. = 3.150 KM; TRAMO 02: EMP. LI-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN - PADAGUANGA - LONG. = 10.400 KM; TRAMO 03: EMP. LI-938 - CASA BLANCA BAJA- TAMBILLO - LONG. = 6.890 KM EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD." Perteneciente al paquete N°03
(05) CONTRATO DE SERVICIO N° 011-2020-MPSCH-LOG

FECHA : Santiago de Chuco, 28 de Octubre del 2020

Me es sumamente honroso dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo; por otro lado referente al asunto de la presente manifiesto lo siguiente:

I. BASE LEGAL

- Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 27972 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica
- Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
- Reglamento Nacional de Edificaciones

II. ANTECEDENTE

- ✓ Mediante el documento de la referencia, **INFORME N°0190-2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH**, el Encargado de la División de Supervisión y Liquidación de Obras, con fecha 27 de octubre del 2020, da la **CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION N° 01 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO** del contratista **"CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO"**; presentado por el Ing. **RONAL HIDALGO CULQUI** - INSPECTOR de la obra denominada: **"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: TRAMO 01: EMP. LI-117 - PACCHA - CEMENTERIO - LONG. = 3.150 KM; TRAMO 02: EMP. LI-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN - PADAGUANGA - LONG. = 10.400 KM; TRAMO 03: EMP. LI-938 - CASA BLANCA BAJA- TAMBILLO - LONG. = 6.890 KM EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO.**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. David Iván Silva Torres
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
N° 63635



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019

E-mail: mpsch@terra.com.pe



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD”; quien solicita el Pago N° 01 por servicios de ejecución de obra al CONTRATISTA “CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO.”

III. ANALISIS FINANCIERO

- ✓ En un ANALISIS DEL INFORME DE LA REF. (01); esta SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA MPSCH da la **CONFORMIDAD DE PAGO DE LA VALORIZACION N°01 – POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO** del **CONTRATISTA** según el informe de la ref. (01) se debe pagar según el cuadro adjunto en el informe (01) de la obra: **“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: TRAMO 01: EMP. LI-117 - PACCHA - CEMENTERIO - LONG. = 3.150 KM; TRAMO 02: EMP. LI-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN - PADAGUANGA - LONG. = 10.400 KM; TRAMO 03: EMP. LI-938 - CASA BLANCA BAJA- TAMBILLO - LONG. = 6.890 KM EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD”**; se detallan los montos a continuación:

CRONOGRAMA

PAQUETE N°3	PLAN DE TRABAJO		MANTENIMIENTO PERIODICO		MANTENIMIENTO RUTINARIO		INVENTARIO CONDICION VIAL		SUB TOTAL
		1%		83%		15%		1%	
TRAMO 01: EMP. LI-117 - PACCHA - CEMENTERIO - Long. = 3.150 km	S/	2,685.00	S/	222,854.75	S/	40,274.96	S/	2,685.00	S/ 268,499.70
TRAMO 02: EMP. LI-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN - PADAGUANGA - Long. = 10.400 km	S/	8,864.75	S/	735,774.42	S/	132,971.28	S/	8,864.75	S/ 886,475.20
TRAMO 03: EMP. LI-938 - CASA BLANCA BAJA- TAMBILLO - Long. = 6.890 km	S/	5,872.90	S/	487,450.55	S/	88,093.47	S/	5,872.90	S/ 587,289.82
TOTAL			S/	1,446,079.72					S/ 1,742,264.72

FUENTE: ELABORACION PROPIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 Ing. David Ven Silva T.
 SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
 837015



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019

E-mail: mpsch@terra.com.pe



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

RESUMEN DE VALORIZACIÓN			
PAQUETE N°3	MANTENIMIENTO PERIODICO	VALORIZACION 01	AVANCE (%)
TRAMO 01: EMP. LI-117 - PACCHA - CEMENTERIO - Long. = 3.150 km	S/ 222,854.75		0.00%
TRAMO 02: EMP. LI-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN - PADAGUANGA - Long. = 10.400 km	S/ 735,774.42	S/ 24,499.42	3.33%
TRAMO 03: EMP. LI-938 - CASA BLANCA BAJA - TAMBILLO - Long. = 6.890 km	S/ 487,450.55		0.00%
TOTAL	S/ 1,446,079.72	S/ 24,499.42	

FUENTE: ELABORACION PROPIA

RESUMEN VALORIZACION MENSUAL N° 01

septiembre-2020

Servicio: EJECUCION DEL ITEM PAQUETE DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EMP.LI-117-PACCHA-CEMENTERIO-LONG.=3.150KM, EMP.LI-117-(EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN - PADAGUANGA - LONG=10.400 KM, EMP.LI-928-CASA BLANCA BAJA-TAMBILLO-LONG.=6.890KM" - DISTRITO DE CACHICADAN - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

Ubicación: CACHICADAN - EL MIRADOR - I.E. LA VICTORIA - SANTA ROSA - SAN MARTIN - PADAGUANGA

Contratista: CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO

Inspector: Ing. Ronal Hidalgo Cuiqui CIP N° 78397

Residente: Ing. Wyly Chystyam Eduardo Pacheco Grados CIP N° 202858

Sistema de Contratación
Valor Referencial
Monto Contratado
Factor de Relación
Fecha Valor Referencial

CÓDIGO	Descripción	CONTRATADO				ACTUAL		%
		Unidad	Metrado	Precio	Parcial	METRADO	SI.	
TRAMO:	"EMP. LI-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN - PADAGUANGA LONG= 10.400 KM"							
01.	TRABAJOS PRELIMINARES				8,593.55		4,001.24	
01.01.	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO	GLB	1.00	6,032.24	6,032.24	0.50	3,016.12	50.00%
01.02.	TOPOGRAFÍA, TRAZO Y REPLANTEO	KM	10.40	246.28	2,561.31	4.00	985.12	38.46%
02.	PAVIMENTOS				302,120.62		0.00	
02.01.	CAPA NIVELANTE E = 0.05M	m3	1,679.85	30.66	51,504.20	0.00	0.00	0.00%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA ESTABILIZADO E=0.15M	m3	5,039.54	49.73	250,616.32	0.00	0.00	0.00%
03.	TRANSPORTE				165,278.60		0.00	
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	M3K	8,063.27	8.67	69,908.55	0.00	0.00	0.00%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM	M3K	43,541.65	1.95	84,906.22	0.00	0.00	0.00%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM	M3K	413.00	7.15	2,952.95	0.00	0.00	0.00%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	M3K	4,784.00	1.57	7,510.88	0.00	0.00	0.00%
04.	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				6,616.00		0.00	
04.01.	RECONFORMACIÓN DE CUNETAS	m	10,400.00	0.54	5,616.00	0.00	0.00	0.00%
05.	SEÑALIZACIÓN				24,459.02		0.00	
05.01.	INSTALACIÓN DE POSTES KILOMÉTRICOS	und.	10.00	180.89	1,808.90	0.00	0.00	0.00%
05.02.	SEÑALES PREVENTIVAS	und.	16.00	759.03	12,144.48	0.00	0.00	0.00%
05.03.	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und.	12.00	698.16	8,377.92	0.00	0.00	0.00%
05.04.	SEÑALES INFORMATIVAS	und.	4.00	528.68	2,106.72	0.00	0.00	0.00%
06.	IMPACTO AMBIENTAL				1,027.79		0.00	
06.01.	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ÁREAS OCUPADAS	HA	0.84	1,223.56	1,027.79	0.00	0.00	0.00%
07.	EMERGENCIA SANITARIA				35,132.17		14,052.87	
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	GLB	1.00	35,132.17	35,132.17	0.40	14,052.87	40.00%
COSTO DIRECTO					642,206.65		18,054.11	
GASTOS GENERALES		10.00%			54,220.67		1,805.41	
UTILIDAD		6.00%			27,110.33		902.71	
SUB TOTAL					623,637.65		20,762.22	3.33%
IGV		18.00%			112,236.78		3,737.20	
VALOR REFERENCIAL					735,774.42		24,499.42	
PORCENTAJE DE AVANCE					100.00%		3.33%	

FUENTE: CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 Ing. David Iván Silva Torres
 SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
 CIP N° 5366



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

RESUMEN VALORIZACION - MANTENIMIENTO PERIODICO						
DESCRIPCION	TRAMO 01		TRAMO 02		TRAMO 03	
COSTO DIRECTO	S/	-	S/	18,054.10	S/	-
COSTO INDIRECTO (10%)	S/	-	S/	1,805.41	S/	-
UTILIDAD (5%)	S/	-	S/	902.71	S/	-
SUB TOTAL	S/	-	S/	20,762.22	S/	-
IGV(18%)	S/	-	S/	3,737.20	S/	-
TOTAL VALORIZADO	S/	-	S/	24,499.42	S/	-

FUENTE: ELABORACION PROPIA

- ✓ Según el contrato de la ref. (05) la obra: **“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: TRAMO 01: EMP. LI-117 - PACCHA - CEMENTERIO - LONG. = 3.150 KM; TRAMO 02: EMP. LI-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN - PADAGUANGA - LONG. = 10.400 KM; TRAMO 03: EMP. LI-938 - CASA BLANCA BAJA-TAMBILLO - LONG. = 6.890 KM EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD”**; en su cláusula séptima nos dice que. “el contratista da la autorización para la retención del 10% de la Garantía fe fiel cumplimiento a través de una carta de autorización; adjunto cuadro de retenciones:

RETENCION PROYECTADA -MANTENIMIENTO PERIODICO				
TRAMOS	PRESUPUESTO		SEPTIEMBRE	OCTUBRE
1	S/	268,499.70	S/ 13,424.99	S/ 13,424.99
2	S/	886,475.20	S/ 44,323.76	S/ 44,323.76
3	S/	587,289.82	S/ 29,364.49	S/ 29,364.49
TOTAL CONTRATADO	S/	1,742,264.72	S/ 87,113.24	S/ 87,113.24
RETENCION 10%	S/	174,226.47		

FUENTE: ELABORACION PROPIA

CALCULO DE RETENCION PROYECTADA					
	VAL 01	RET. VAL. 10%	RET. SET.	SALDO SET	RET. OCTUBRE
TRAMO 1	S/ -	S/ -	S/ 13,424.99	S/ 13,424.99	S/ 26,849.97
TRAMO 2	S/ 24,499.42	S/ 2,449.94	S/ 44,323.76	S/ 41,873.82	S/ 86,197.58
TRAMO 3	S/ -	S/ -	S/ 29,364.49	S/ 29,364.49	S/ 58,728.98
SALDO		S/ 2,449.94		S/ 84,663.29	S/ 171,776.53

FUENTE: ELABORACION PROPIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. David Iván Silva T.
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
C.P. Nº 63525



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

La obra: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: TRAMO 01: EMP. LI-117 - PACCHA - CEMENTERIO - LONG. = 3.150 KM; TRAMO 02: EMP. LI-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN - PADAGUANGA - LONG. = 10.400 KM; TRAMO 03: EMP. LI-938 - CASA BLANCA BAJA- TAMBILLO - LONG. = 6.890 KM EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD”; tiene proyectada dos retenciones de garantía de 10% de fiel cumplimiento; la primera que se aplicara al mes de septiembre por el 10% por el monto de S/. 2,449.94 y en la del mes de octubre de aplicar la totalidad; saldo más la retención total del mes que sería el monto de S/. 171,776.53 soles


IV. ANALISIS TECNICO

- ✓ La obra: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: TRAMO 01: EMP. LI-117 - PACCHA - CEMENTERIO - LONG. = 3.150 KM; TRAMO 02: EMP. LI-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN - PADAGUANGA - LONG. = 10.400 KM; TRAMO 03: EMP. LI-938 - CASA BLANCA BAJA- TAMBILLO - LONG. = 6.890 KM EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD”; se ejecutó en tres valorizaciones, a continuación, se describe los porcentajes y montos:

RESUMEN DE VALORIZACIÓN			
PAQUETE N°3	MANTENIMIENTO PERIODICO	VALORIZACION 01	AVANCE (%)
TRAMO 01: EMP. LI-117 - PACCHA - CEMENTERIO - Long. = 3.150 km	S/ 222,854.75		0.00%
TRAMO 02: EMP. LI-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN - PADAGUANGA - Long. = 10.400 km	S/ 735,774.42	S/ 24,499.42	3.33%
TRAMO 03: EMP. LI-938 - CASA BLANCA BAJA- TAMBILLO - Long. = 6.890 km	S/ 487,450.55		0.00%
TOTAL	S/ 1,446,079.72	S/ 24,499.42	

FUENTE: ELABORACION PROPIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 Ing. David Iván Silva T...
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
 C.E.M. 53625





Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

- ✓ La obra: **“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: TRAMO 01: EMP. LI-117 - PACCHA - CEMENTERIO - LONG. = 3.150 KM; TRAMO 02: EMP. LI-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN - PADAGUANGA - LONG. = 10.400 KM; TRAMO 03: EMP. LI-938 - CASA BLANCA BAJA- TAMBILLO - LONG. = 6.890 KM EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD”**; se encuentra en el **TRAMO 01 al 0.00%** de avance, en el **TRAMO 02 al 3.33%**, en el **TRAMO 03 al 0.00%** de acuerdo a la Valorización N° 01 del periodo comprendido entre el 19 de septiembre del 2020 al 30 de septiembre del 2020. Para más detalle revisar el *anexo01/SGI* adjunto.

RESUMEN DE VALORIZACIÓN					
PAQUETE N°3	MANTENIMIENTO PERIODICO	VALORIZACION BRUTA	VALORIZACION 01	RETENCION SETIEMBRE	MONTO POR CANCELAR
TRAMO 01: EMP. LI-117 - PACCHA - CEMENTERIO - Long. = 3.150 km	S/ 222,854.75	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -
TRAMO 02: EMP. LI-117 (EL MIRADOR) - I.E. (LA VICTORIA) - SANTA ROSA - SAN MARTIN - PADAGUANGA - Long. = 10.400 km	S/ 735,774.42	S/ 20,762.22	S/ 24,499.42	S/ 2,449.94	S/ 22,049.48
TRAMO 03: EMP. LI-938 - CASA BLANCA BAJA- TAMBILLO - Long. = 6.890 km	S/ 487,450.55	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -
TOTAL	S/ 1,446,079.72	S/ 20,762.22	S/ 24,499.42	S/ 2,449.94	S/ 22,049.48

FUENTE: ELABORACION PROPIA

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ La **Valorización Bruta N° 01 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO** del contratista fue por **S/ 20,762.22 (VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 22/100 SOLES)**.


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 Ing. David Iván Soria
 SUB GERENTE DE INFERIA



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

- ✓ Se recomienda hacer el descuento por el monto de la **RETENCION DE 10 % GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO ES DE S/. S/ 2,449.94 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 94/100 SOLES INCLU IGV**; si esta recomendación ya se aplicó obviarla.
- ✓ La Amortización del Adelanto Directo: -
- ✓ La Amortización del Adelanto de Materiales: -
- ✓ Por lo tanto, el monto a cancelar al **CONTRATISTA POR CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA VALORIZACION N°01 – POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO**; asciende a **S/. S/ 22,049.48 (VEINTIDOS MIL CUARENTA Y NUEVE CON 48/100 SOLES) INCL. IGV**; se recomienda hacer la retención de fiel cumplimiento.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y acciones que estime por conveniente, salvo mejor parecer.

Atentamente,

Adjunto:

- Referencias
- Anexo 01/SGI
- Val N°01()
- Digital ()

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 SUB. GERENTE DE IN. INFRAESTRUCTURA
 CIP 112
 Torres
 15



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe

INFORME N° 190-A – 2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCCH

A : **ING° DAVID IVAN SILVA TORRES**
SUB-GERENTE DE INFRAESTRUCTURA MPSCCH

DEL : **ING. HERMES M. MELENDEZ TAMAYO**
JEFE (e) DIVISIÓN DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

ASUNTO : **VALORIZACIÓN DE SERVICIO N°01 – SETIEMBRE 2020**

REFERENCIA: a) "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. LI – 117- (EL MIRADOR) – I.E. (LA VICTORIA) – SANTA ROSA – SAN MARTIN – PADAGUADA - Long. = 10.400 Km. – DISTRITO DE CACHICADAN – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"
b) Informe N° 002-2020- ING° RHC/INSPECTOR DE MANTENIMIENTO PERIODICO- MPSCCH
c) Carta N°015-2020/CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO/RC

FECHA : **Santiago de Chuco, 25 de Octubre del 2020**



Es grato dirigirme a Usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo, vistos los documentos de la referencia, el suscrito como Jefe de la División de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco **OTORGA LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN N° 01- SETIEMBRE 2020** del Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. LI – 117- (EL MIRADOR) – I.E. (LA VICTORIA) – SANTA ROSA – SAN MARTIN – PADAGUADA - Long. = 10.400 Km. – DISTRITO DE CACHICADAN – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD" y elaborado por el Contratista **CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO** según Contrato de Servicios N° 011-2020-MPSCH-LOG y aprobado por el Inspector de Obra.

Se informa trabajos valorizados en el periodo del 22 al 30 de Setiembre 2020. Se adjunta 01 original + 01 copia +CD.

DATOS GENERALES

1.- DENOMINACION

"MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. LI – 117- (EL MIRADOR) – I.E. (LA VICTORIA) – SANTA ROSA – SAN MARTIN – PADAGUADA - Long. = 10.400 Km. – DISTRITO DE CACHICADAN – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"


2.- UBICACIÓN

- Caseríos : Santa Rosa, San Martin, Padaguada
- Distrito : Cachicadan
- Provincia : Santiago de Chuco
- Región : La Libertad

3.- DATOS DEL MANTENIMIENTO:

EJECUTOR

- Proceso de Selección : PES-PROG-004-2020-MPSCH/CS-2°
- Contratista : CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO
- Representante Legal : Julio Cesar Quipuzcoa Aranda
- Contrato de Servicios : N° 011-2020-MPSCH-LOG.
- Suscripción de Contrato : 28/08/2020
- Modalidad : A Suma Alzada
- Valor Referencial (inc. IGV) : S/ 1'742,264.72





Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019

E-mail: mpsch@terra.com.pe

- Monto Contratado (inc. IGV)	: S/ 1'742,264.72
- Monto del Tramo (inc. IGV)	: S/.
- Factor de Relación	: 1.000
- Fuente de Financiamiento	: MTC –Provias – D. U. N°070-2020
- Plazo de Ejecución Inicial	: 500 Días Calendarios
- Entrega de Terreno	: 29 de Agosto del 2020
- Inicio de Plazo Contractual	: 29 de Agosto del 2020 (Elaboración Plan de Trabajo)
- Inicio de Plazo Fase II	: 22 de Setiembre 2020
- Fecha Término Programado	: 21 de Diciembre del 2021
- Residente de Obra	: Ing. Wylylly Chrystyam Pacheco Grados CIP 225708
- Porcentaje Programado	: 2.81%
- Porcentaje Programado Acumulado	: 2.81%
- Porcentaje Ejecutado	: 3.33%
- Porcentaje Ejecutado Acumulado	: 3.33%
- Estado del Mantenimiento	: Adelantado
- Monto Valorizado	: S/ 24,499.42



INSPECTOR

- Inspector	: Ing. Ronald Hidalgo Culqui CIP 91972
- Contrato de Inspección de Obra	: N° 032-2020-MPSCH-LOG.
- Fecha de Contrato	: 28/08/2020
- Plazo de Prestación de Servicio	: 120 Días Calendario
- Monto Contratado (inc. IGV)	: S/ 19,418.00

4.- ANTECEDENTES

- Con fecha 28 de Agosto del 2020 se firma el Contrato de Servicios N°011-2019-MPSCH-LOG del Mantenimiento Periódico y Rutinario "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. LI – 117- (EL MIRADOR) – I.E. (LA VICTORIA) – SANTA ROSA – SAN MARTIN – PADAGUADA - Long. = 10.400 Km. – DISTRITO DE CACHICADAN – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD" por un monto de S/ 1'742,264.72 con un plazo de ejecución de 500 días calendario.
- El día 28 de Agosto del 2020 se firma el Contrato de Inspección de Servicio N°032-2020-MPSCH-LOG con el Consultor Ing. Ronald Hidalgo Culqui CIP 91972 por un monto de S/ 19,418.00, con un plazo de ejecución de 120 días calendario.
- Con fecha 29/08/2019 se firma el Acta de Entrega de Terreno con la participación de representantes de todos los involucrados.
- El 29/08/2019 se firma el Acta de Inicio de Obra con una fecha programada de término de servicio del 21 de Diciembre 2020.
- Con fecha 12 de Setiembre el Inspector recepciona la Carta N°015-2020/CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO/RC con la cual el Contratista CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO hace entrega del Plan de Trabajo para su revisión y tramite respectivo
- El Ingeniero Inspector del Servicio mediante Informe N° 001-2020 – ING° RHC/INSPECTOR DE MANTENIMEINTO PERIODICO - MPSCH del 15 de Setiembre del 2020 ingresa por mesa de partes de la Entidad con Expediente Administrativo N° 4440 el Plan de Trabajo aprobado para su Conformidad.
- Mediante INFORME N°123-2020-HMMT/DEYP/SGI/MPSCH, de fecha 21 de Setiembre del 2020 la División de Estudios y Proyectos otorga la Conformidad del Plan de Trabajo y sugiere su aprobación mediante la Resolución Respectiva.
- Con Resolución de Gerencia Municipal N°00312-2020-MPSCH/GM de fecha 22 de Setiembre 2020 de Aprueban el Plan de Trabajo del Mantenimiento Rutinario y Periódico.
- Mediante Informe N° 001-2020 – ING° RHC/INSPECTOR DE MANTENIMEINTO PERIODICO - MPSCH del 05 de Octubre del 2020 el Ing. Inspector hace llegar la Valorización de Servicio N°01 – Setiembre 2020 adjuntando la Carta N°015-2020/CONSORCIO VIAL EL TAMBILLO/RC para su revisión y conformidad de pago.



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019

E-mail: mpsch@terra.com.pe



5.- DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

- Movilización de Equipos y Maquinaria desde Trujillo a pie de obra. Se ha trasladado la maquinaria que se describe en el informe del Ing. Inspector.
- Ejecución de partida de Trazo y Replanteo de 4.00Km. que representa el 50.00% del tramo con el uso de equipo topográfico completo y dejando monumentados BMs y niveles.
- Implementación de protocolos Covid 19 y de seguridad en el trabajo y equipamiento con EPPs para todo el personal.

6.- DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICION:

RESUMEN VALORIZACIÓN N° 01 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (Setiembre 2020)



VALORIZACIÓN CONTRACTUAL	SIN IGV		S/. 20,762.22
	S/.	0.00	
REINTEGROS (REAJUSTES RECONOCIDOS)	SIN IGV		S/. 0.00
	S/.	0.00	
VALORIZACION BRUTA			S/.20,762.22
AMORTIZACIONES	SIN IGV		S/.0.00 (-)
ADELANTO DIRECTO	S/.	0.00	
ADELANTO PARA MATERIALES	S/.	0.00	
DEDUCCIONES (DQNC)			S/. 0.00
ADELANTO DIRECTO	S/.	0.00	
ADELANTO PARA MATERIALES	S/.	0.00	
VALORIZACION NETA			S/. 20,762.22
I. G. V. 18.00%			S/. 3,737.20
NETO VALORIZADO POR EL CONTRATISTA			S/. 24,499.42

SON : VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 42/100 SOLES

7.- ANALISIS

- Se ha revisado el trámite seguido a los documentos de la referencia generados por el Contratista y APROBADOS por el Inspector del Servicio.
- El Informe de Aprobación de la Valorización del Servicio emitido por el Inspector indica que la valorización está de acuerdo con lo ejecutado y cumple con el contenido de documentos e información técnica requerida y necesaria para el cumplimiento de las metas y objetivos del servicio contratado.
- El mantenimiento se encuentra Adelantado en su ejecución.



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019

E-mail: mpsch@terra.com.pe

8.- RECOMENDACIONES

- Se recomienda al Ing. Residente e Ing Inspector que deben presentar la documentación con el número de ejemplares originales y copias establecidos, contenido en formato digital y con el uso de separadores y la numeración requerida.
- Se recomienda al Ing. Residente e Ing Inspector que deben firmar todos los folios de la Valorización de todos los documentos que se presenten para su trámite. El Representante Legal también debe firmar todos los folios.
- Presentar todos los Análisis de Materiales y pruebas de campo requeridos (Estudio de Canteras, CBR, Densidad de Campo, etc) realizados en un laboratorio que cuente con autorización de INDECOPI.
- Presentar registro fotográfico de la ejecución de las partidas con su respectiva descripción.
- Verificar el cumplimiento de plan de trabajo, especialmente la Adecuación e Implementación de Protocolos ante la Emergencia Sanitaria por el Covid 19.

9.- CONCLUSIÓN

- Luego de su revisión, la Jefatura de la División de Supervisión y Liquidación de Obras de la Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, **OTORGA LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN N°01 - SETIEMBRE** del Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario “**MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. LI – 117- (EL MIRADOR) – I.E. (LA VICTORIA) – SANTA ROSA – SAN MARTIN – PADAGUADA - Long. = 10.400 Km. – DISTRITO DE CACHICADAN – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD**” y aprobado por el Inspector de Obra y sugiere su **CANCELACION** en cumplimiento de las cláusulas contractuales.

Es todo cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Hermes M. Meléndez Tamayo
CIP. 111401
Jefe División de Supervisión y Liquidaciones



PRO CESO 3

“Año de la universalización de la salud”

INFORME N° 001 – 2020 – ING° RHC/INSPECTOR DE MANTENIMIENTO PERIODICO-MPSCH

A : SR. JUAN ALBERTO GABRIEL ALIPIO
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

ATENCIÓN : ING° DAVID IVAN SILVA TORRES.
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA – MPSCH

ATENCIÓN : ING° RAFAEL KEVINALAN VALENCIA REBAZA
GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL - MPSCH

DE : ING° RONALD HIDALGO CULQUI
INSPECTOR DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

ASUNTO : REMISIÓN DE VALORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE SERVICIO N° 01.

FECHA : 05 DE OCTUBRE DEL 2,020.



Por intermedio de la presente, reciba Usted mis saludos y a la vez hago de su conocimiento lo siguiente:

Adjunto a la presente, le hago llegar la Valorización de Ejecución del Servicio N° 01 del Mantenimiento Periódico: “MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: “EMP.LI-117-PACCHA-CEMENTRIO-LONG. =3.150KM, EMP.LI-117-(EL MIRADOR)-I.E. (LA VICTORIA) – SANTA ROSA – SAN MARTÍN – PADAGUANGA – LONG =10.400 KM, EMP.LI-928-CASA BLANCA BAJA-TAMBILLO-LONG. =6.890KM”, correspondiente a los trabajos ejecutados del 22/09/2020 al 30/09/2020 Mes de Septiembre del 2020, por la EMPRESA CONSOCIO VIAL EL TAMBILLO; En atención al Decreto de Urgencia N° 070-2020. Asimismo se informa a su despacho que en el Servicio de Ejecución del Mantenimiento Periódico de la referencia, se ejecutaron las partidas que se indica en la presente valorización.

Cuyos cálculos elaborados por esta inspección se detallan a continuación:

A.- VALORIZACIÓN MES	S/. 20,762.22
B.- REAJUSTES	S/. 0.00
C.- DEDUCCIÓN REAJUSTE (-)	S/. 0.00
D.- VALORIZACIÓN BRUTA (VB = A + B – D)	S/. 20,762.22

*- Ing. David Silva Torres
- Ing. Rafael Valencia Rebaza
- Ing. Ronald Hidalgo Culqui*

Ronald Hidalgo Culqui
ING. CIVIL
CIP N° 91972



E.- AMORTIZACIÓN ADELANTOS (-) E		
ADELANTO DIRECTO	S/.	0.00
ADELANTO EN MATERIALES	S/.	0.00
F.- VALORIZACIÓN NETA (VN = VB - E)	S/.	20,762.22
G.- FONDO DE GARANTÍA F.G.	S/.	00.00
H.- VALORIZACIÓN LIQUIDA = VN – F.G.	S/.	20,762.22
I.- I.G.V. = 18% VN	S/.	3,737.20
FACTURA DEL CONTRATISTA = VN + IGV	S/.	24,499.42
Descuento del 10% por Garantía de Fiel Cumplimiento de acuerdo al Art. 155 de la Ley de Contrataciones del Estado (CARTA FIANZA)	S/.	2,449.94
Detracción (4%) Cuenta Detracción del Contratista Banco de la Nación:	S/.	979.98
Monto a Cancelar al Contratista - Cheque (inc. IGV)	S/.	21,069.51
Son: Veintiún Mil Sesenta y Nueve con 51/100 Soles		

Es todo cuanto debo informar, para los fines correspondientes.

Atentamente:


Ronald Hidalgo Culqui
ING. CIVIL
CIP N° 91972
