



Exp. SIAF
N° 1993

ORDEN DE SERVICIO

6009

NUMERO:	
000926	
DE FECHA:	07/12/2020

Señor(es)	CORPORACION QUIPUZCOA ARANDA SAC	RUC N°	20600528069
Direccion	JIRN SAN ROMAN N° 955-PUEBLO DE HUMACHUCO -SANCHEZ CARRION		
Referencia N°	CONTRATO DE SERVICIOS N° 012-2020-MPSCH-LOG		
Condiciones de Pago :	CCI OFICINA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA---IVP		
Objeto del Servicio :	EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO HUAYLACA-TAMBILLO-LONG 8.12 KM; ANGASMARCA-CRUZ DE CHUCA-AHIJADERO-LONG. 5.60 KM Y ANGASMARCA-EL INGENIO-CRUZ PAMPA-CATIRIN LONG, 13.03 KM DE LA PROVINCIA DE CHUCO-LA LIBERTAD.		
Destino a	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO	Pedido N° :	000926

LOS SIGUIENTES SERVICIOS :			VALOR	
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
		<p><u>PAGO DE VALORIZACION N° 02</u> : DE LA EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO HUAYLACA-TAMBILLO-LONG 8.12 KM; ANGASMARCA-CRUZ DE CHUCA-AHIJADERO-LONG. 5.60 KM Y ANGASMARCA-EL INGENIO-CRUZ PAMPA-CATIRIN LONG, 13.03 KM DE LA PROVINCIA DE CHUCO-LA LIBERTAD. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.</p> <p>SEGÚN: INFORME N° 253-2020-IVP-MPSCH/GG/VRRK INFORME N° 1146-2020-MPSCH/DIST/SGI <u>PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 04-2020-MPSCH/CS</u></p>		S/. 504,337.30
			TOTAL S/.	504,337.30

AFECTACION PRESUPUESTAL DEL SERVICIO			DISTRIBUCION CONTABLE
ACTIVIDAD/PROYECTO:	META	CLASIFICADOR:	CUENTAS POR PAGAR
0138-PROMOCION IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA	0188-MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL	23.27.16	

AUTORIZACION DEL SERVICIO		ÁREA USUARIA:		
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE STGO. DE CHUCO Yamil J. Rodríguez Marquina JEFE DE LOGISTICA UNIDAD DE LOGISTICA	 Municipalidad Provincial Santiago de Chuco Abog. John Jaime Curay Reyes ADMINISTRACION Y FINANZAS ADMINISTRACION y/o GERENCIA	DIA	MES	AÑO
		07	12	2020
		 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO Ing. David Iván Silva Torres SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA FIRMA		

Deber. 69,520
Garantía 209,578.80
Total.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO
ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROVEIDO

PASE a: **Contabilidad**

PARA: **desembolso previa revision**

FECHA: **09/12/20** Firma:

PEC = 04.

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 0000000460
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA : 10 SANTIAGO DE CHUCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO [301197]

MES : JULIO
FECHA DE DOCUMENTO : 07/07/2020
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: ANGASMARCA-CRUZ DE CHUCA-AHIJADERO

FECHA APROBACION :
ESTADO CERTIFICACION :
N° DE DOCUMENTO F01-345-2020LOG

DETALLE DEL GASTO L.L, EN EL MARCO DEL D.U 070-2020 - ART. 21.1 (ANEXO 13)

SECUENCIA	PRG	PROD	PRY	ACT	AI	OB	R	FN.	DIV	GRPF	MONEDA	IMPORTE
META	FF	RB	CGTT	G	SG	SGD	ESF	ESPD				

0001 INICIAL

0138	3000133	5006373	15	033	0066	PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA						403,412.80
0177	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: ANGASMARCA-CRUZ DE CHUCA-AHIJADERO; SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD											403,412.80
3	19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										403,412.80
5	GASTOS CORRIENTES											403,412.80
2.3	BIENES Y SERVICIOS											403,412.80
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS											403,412.80
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES											397,812.80
2.3.2.4.3	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS											397,812.80
2.3.2.4.3.1	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS											397,812.80
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS											5,600.00
2.3.2.7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS											5,600.00
2.3.2.7.1.6	ESTUDIOS											5,600.00

TOTAL												403,412.80
TOTAL CERTIFICACION												403,412.80
TOTAL NOTA												403,412.80

SANTIAGO DE CHUCO
 C.P.C. *Natividad Z. Perez Sánchez*
 OFC. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Presupuesto y Planificación
 Sello Y Firma

TR=18

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 0000000459
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA : 10 SANTIAGO DE CHUCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO [301197]

MES : JULIO
FECHA DE DOCUMENTO : 07/07/2020
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION. PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: HUAYLACA - TAMBILLO; SANTIAGO DE CHUCO - LI., EN EL MARCO DEL D.U 070-2020 - ART. 21.1 (ANEXO 13)

FECHA APROBACION : 07/07/2020
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO F01-344-2020-LOG

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG PROD/PRY ACT/IOBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESFESPD	CÓMPTO
0001 INICIAL	
0138 3000133 5006373 15 033 0066 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	584,948.56
0176 MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: HUAYLACA - TAMBILLO; SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	584,948.56
3 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	584,948.56
5 GASTOS CORRIENTES	584,948.56
2.3 BIENES Y SERVICIOS	584,948.56
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	584,948.56
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	576,828.56
2.3.2.4.3 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	576,828.56
2.3.2.4.3.1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	576,828.56
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	8,120.00
2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	8,120.00
2.3.2.7.1.6 ESTUDIOS	8,120.00
TOTAL	584,948.56
TOTAL CERTIFICACION	584,948.56
TOTAL NOTA	584,948.56

TR = 18

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
SANTIAGO DE CHUCO

C.P.C. Natividad Z. Perea Sánchez
OFC. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 0000000461
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA : 10 SANTIAGO DE CHUCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO [301197]

MES : JULIO
FECHA DE DOCUMENTO : 07/07/2020
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION. PARA MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: ANGASMARCA-EL INGENIO-CRUZ PAMPA-CATIRIN; SANTIAGO DE CHUCO - L.L, EN EL MARCO DEL D.U 070-2020 - ART. 21.1 (ANEXO 13)

FECHA APROBACION : 07/07/2020
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO F01-346-2020-LOG

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG/PROD/PRY/ACT/A/OBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESFESPD	MONTO
0001 INICIAL	
0138 3000133 5006373 15 033 0066 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	938,655.00
0178 MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: ANGASMARCA-EL INGENIO-CRUZ PAMPA-CATIRIN; SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	938,655.00
3 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	538,655.00
5 GASTOS CORRIENTES	538,655.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	830,070.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	938,655.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	525,655.00
2.3.2.4.3 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	938,655.00
2.3.2.4.3.1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	938,655.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	13,030.00
2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	13,030.00
2.3.2.7.1.6 ESTUDIOS	13,030.00
TOTAL	938,655.00
TOTAL CERTIFICACION	938,655.00
TOTAL NOTA	938,655.00

TR=18

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
SANTIAGO DE CHUCO
C. R. Natividad Z. Pereda Sánchez
OFC. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma

CORPORACION QUIPUZCOA ARANDA S.A.C.

JR. SAN ROMAN 955 PUEBLO HUAMACHUCO AL COSTADO DE IMPRENTA
VALDEZ
HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20600528069
E001-10

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **07/12/2020**
Señor(es) : **MUNICIPALIDAD PROVINC
SANTIAGO DE CHUCO**
RUC : **20187630101**
Dirección del Cliente : **JR. PACO YUNQUE 735 ---- SAN
CRISTOBAL LA LIBERTAD-
SANTIAGO DE CHUCO-
SANTIAGO DE CHUCO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N02 PARA LA EJECUCION DEL ITEM PAQUETE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: HUAYLACA-TAMBILLO LONG=8.120KM,-ANGASMARCA-CRUZ DE CHUCA-AHIJADERO LONG=5.600KM ANGASMARCA-ELINGENIO-CRUZ PAMPA-CA	427404.49	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
Gratuitas : S/ 0.00

**SON: QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE Y
30/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 427,404.49
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 427,404.49
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 76,932.81
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 504,337.30

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

"Año de la universalización de la salud"

INFORME N° 253-2020-IVP-MPSCH/GG/VRK

A : Dr. JOHN JAIRO CURAY REYES.
Director de administración y Finanzas de la MPSCH

DE : ING. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente del Instituto Vial Provincial de Santiago de Chuco

ASUNTO : APROBACIÓN DE CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N° 02 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO HUAYLACA – TAMBILLO, LONG. 8.12 KM; ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO, LONG. 5.60 KM Y ANGASMARCA-EL INGENIO-CRUZ PAMPA-CATIRIN, LONG. 13.03 KM.

REFERENCIA : Informe N° 163-2020-JO/IVPSCH/LFGCH
INFORME N° 015-2020-IVP-MPSCH/TACSMRP/FRGC
Informe N° 1146-2020-MPSCH/DST/SGI
CARTA N° 003-2020- DRPM/INSP
INFORME N° 03-2020-DRPM/INSP
CARTA N° 018-2020-JCQA/R.C.
CONTRATO N° 012-2020-MPSCH-LOG
DU. N° 070-2020

FECHA : Santiago de Chuco, 07 de diciembre del 2020

Previo cordial saludo y afecto, por medio del presente tengo a bien manifestarle con respecto al asunto de la referencia lo siguiente:

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Ejecución de Servicio : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO HUAYLACA – TAMBILLO, LONG. 8.12 KM; ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO, LONG. 5.60 KM Y ANGASMARCA-EL INGENIO-CRUZ PAMPA-CATIRIN, LONG. 13.03 KM.

Longitud : 26.75 Km.
Superficie de Rodadura : Afirmado.
Espesor de Afirmado : 0.15 m.
Velocidad Directriz : 30 km/h.
Perfilado de Cunetas : Terreno natural
Hitos Kilométricos : 26 unidades



UBICACIÓN

Distrito : ANGASMARCA
Provincia : Santiago de Chuco
Región : La Libertad

RESPONSABLES DEL SERVICIO

EJECUTOR:

Fuente de financiamiento : Recursos por operaciones oficinas de crédito
Modalidad Contratación : a Suma Alzada
Contrato de Servicio : CONTRATO N° 012-2020-MPSCH-LOG
Contratista : CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Monto Referencial del Servicio : S/. 2, 280,116.50 inc el IGV.

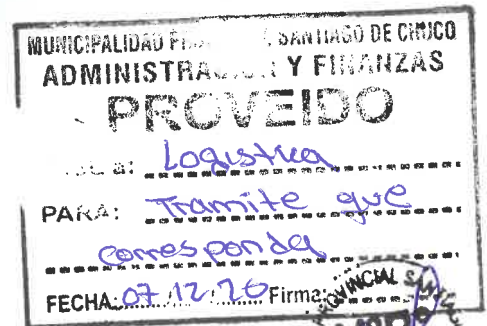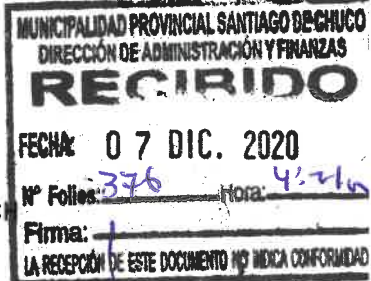

Monto del Contrato de Servicio : S/. 2, 280,100.00 inc el IGV
 Plazo de Ejecución mantenimiento Periódico : 120 DIAS CALENDARIOS
 Inicio Plazo de Servicio Contractual : 22-09-2020
 Fecha Termino de Servicio Contractual : 31-12-2020

INSPECTOR

INSPECTOR : ING. DEISY RUTH PIANTO MENDOZA
 Contrato De Servicio : N° 036-2020-MPSCH-LOG

2. DE LA PRESENTACIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE DEL SERVICIO N° 02-OCTUBRE 2020

Mediante CARTA N° 003-2020- DRPM/INSP, del Inspector de Servicio, recepcionada por mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, el día 05/11/2020, el ING. DEISY RUTH PIANTO MENDOZA, hace llegar a la Municipalidad la Valorización N° 02 del por los trabajos ejecutados en el periodo comprendido entre el 01/11/2020 hasta el 31/11/2020, del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO HUAYLACA – TAMBILLO, LONG. 8.12 KM; ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO, LONG. 5.60 KM Y ANGASMARCA-EL INGENIO-CRUZ PAMPA-CATIRIN, LONG. 13.03 KM, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.

3. ANÁLISIS DEL IVP.

Para la ejecución del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO HUAYLACA – TAMBILLO, LONG. 8.12 KM; ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO, LONG. 5.60 KM Y ANGASMARCA-EL INGENIO-CRUZ PAMPA-CATIRIN, LONG. 13.03 KM, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, en el proceso especial de selección N° 012-2020-MPSCH/CS-Segunda convocatoria, la empresa contratista CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA, ha sido favorecida con la buena pro, por su monto ofertado de S/. 2, 280,100.00 inc. IGV que a continuación se detalla:

- A) Elaboración del Plan de Trabajo la suma de S/. 22,801.00 inc IGV, que se desarrollara exclusivamente para tal fase.
- B) Ejecución del mantenimiento Periódico la suma de 1, 892,483.00, inc. IGV, que se desarrollara exclusivamente en la fase de Ejecución del Mantenimiento Periódico.

PRESUPUESTO OFERTADO

Item	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
		METRADOS		COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
		Unidad	Cantidad		
01	OBRAS PRELIMINARES				
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	3.00	6,109.81	18,329.44
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	26.75	246.28	6,587.99
02	PAVIMENTOS				
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M.	m3	4,662.88	31.82	148,364.12
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M.	m3	11,534.52	54.40	627,463.93
03	TRANSPORTE				
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM.	m3k	19,436.85	9.87	191,824.55



03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM.	m3k	99,128.45	1.75	173,940.88
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM.	m3k	1,070.00	8.04	8,607.98
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM.	m3k	12,305.00	1.75	21,574.65
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	26,750.00	0.61	16,422.60
05	SEÑALIZACIÓN				
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und	26.00	182.35	4,741.10
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	Und	60.00	781.07	46,864.00
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	Und	18.00	719.78	12,956.04
05.11	SEÑALES INFORMATIVAS	Und	10.00	526.6800	5,266.80
06	IMPACTO AMBIENTAL				
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.15	1,343.5581	2,888.65
07	EMERGENCIA SANITARIA				
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	3.00	36,258.41	108,775.23
COSTO DIRECTO		CD		SI.	1,394,607.96
GASTOS GENERALES		GG	10%	SI.	139,460.80
UTILIDAD		U	5%	SI.	69,730.40
SUB TOTAL		CD+GG+U		SI.	1,603,799.16
IGV			18%	SI.	288,683.85
TOTAL PRESUPUESTO		PT		SI.	1,892,483.00
PORCENTAJE					100.00%

- C) Ejecución del Mantenimiento Rutinario, la suma de S/. 342,015.00, inc. IGV, que se desarrollara exclusivamente para tal fase.
- D) La Elaboración del Inventario de Condición Vial la Suma de S/. 22,801.00, inc. IGV, que se desarrollara exclusivamente para tal fase.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL SERVICIO DURANTE EL MES

De acuerdo a la verificación de los trabajos referidos al "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO HUAYLACA – TAMBILLO, LONG. 8.12 KM; ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO, LONG. 5.60 KM Y ANGASMARCA-EL INGENIO-CRUZ PAMPA-CATIRIN, LONG. 13.03 KM, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD", se ha observado que desde la fecha 01 de octubre hasta 31 de octubre del 2020, se desarrollaron las siguientes actividades:

2.0 PAVIMENTOS.

2.01 CAPA NIVELANTE E=5 CM

2.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=15 CM.

3.0 MANTENIMIENTO DE CALZADA EN AFIRMADO:

3.01 Transporte de material granular hasta 1 km

3.02 Transporte de material granular mayor a 1 km

3.03 Transporte de material excedente hasta 1 km.

3.04 Transporte de material excedente mayor a 1 km





4.0 Obras de arte y drenaje

4.01 Reconformación de cunetas

5.0 Emergencia sanitaria

5.01 emergencia sanitaria COVID 19

NOTA: Toda esta información esta detallada en el informe del Ing. Inspector de Servicio mediante CARTA N° 003-2020- DRPM/INSP





Instituto Vial Provincial



MPSCH

Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDINARIO Y FERRONORTE DE LOS CAMINOS VEICULARES TRANSDIVISORIA: TAMBO, LONG. 8.2 KM, ANGA S/MARCA, CRUZ DE CHUCA, -HUARDERO, LONG. 5.0 KM Y ANGA S/MARCA EL INGENDO CRUZ PAMPA-CATRAL, LONG. 5.80 KM, DISTRITO DE ANGA S/MARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

CONTRATO: N° 02-2020-MPSCH/DG
INSPECTOR: ING. DESY RUTH PANTO MENDOZA
CONTRALISTA: CONSROG VAL CRUZ DE CHUCA



Provincia de Santiago de Chuc

PRESP. OFERTADO (CD-658-U) SI/6V 76125.07
PRESP. OFERTADO (CD-658-U) INC/6V 52103.78
FECHA DE PRESUPUESTO 01/08/2020
PLAZO DE EJECUCION 09 DIC. (04 meses)
FECHA DE INICIO Y TERMINO CONTRACTUAL 22/08/2020 - 31/02/2021

VALORIZACION DE AVANCE DE SERVICIO N° 02, MANTENIMIENTO PERIODICO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020

FORMULA 02: SERVICIO PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UNID	MONTO CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE VALORIZACION		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
			P.U.	METRADO	SOLES	%	METRADO	SOLES	%	METRADO	SOLES	%
01	OBRAS PRELIMINARES											
01.01	MOVILIZACION Y DESMONTAJE DE EQUIPOS	gp	8,198.32	1.00	8,198.32	4.55%	1,658.02	54.00%	6,005.48	59.00%	5,722.25	41.00%
01.02	TRAZO Y REPIANTEO	km	245.28	13.03	4,059.16	50.00%	1,600.82	49.85%	4,059.16	50.00%	4,059.16	50.00%
02	PAVIMENTOS				965.12	30.70%	6.50	80.50%	2,565.94	80.50%	620.09	19.42%
02.01	CAPA INELASTICA-0.05 M	m ²	31.63	2,275.91	5.00	8.00%	138,822.84	54.40%	138,822.84	54.40%	892,598.57	48.90%
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	m ³	54.64	5,765.42	1.00	1.00%	85,022.64	62.00%	85,022.64	62.00%	2,275.91	100.00%
03	TRASMISIVAS				262,255.19	82.40%	388,278.27	82.40%	388,278.27	82.40%	388,278.27	82.40%
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1.0M	m ³	10.07	9,674.79	1.00	1.00%	6,767.04	69.55%	6,767.04	69.55%	2,907.75	31.00%
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1.0M	m ³	1.82	49,341.44	88,001.42	39.55%	88,001.42	39.55%	88,001.42	39.55%	29,281.05	0.81%
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m ³	8.25	521.20	4,289.50	81.55%	3,489.26	81.55%	3,489.26	81.55%	80.94	8.85%
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m ³	1.92	5,853.80	10,938.72	51.00%	3,058.72	51.00%	5,555.67	51.00%	5,341.65	48.97%
04	OBRA DE ARBE Y VISIBLES				8,078.60	1.00%	1.00	1.00%	1.00	1.00%	8,078.60	100.00%
04.01	RECONFORMACION DE CURBETAS	m	0.02	13,000.00	8,078.60	1.00%	1.00	1.00%	1.00	1.00%	8,078.60	100.00%
05	SEÑALIZACION				41,608.72	1.00%	1.00	1.00%	1.00	1.00%	41,608.72	100.00%
05.01	INSTALACION DE POSTES INOMETRICOS	Und	82.72	13.00	1,235.36	1.00%	1.00	1.00%	1.00	1.00%	2,375.36	100.00%
05.02	SENALES PREVENTIVAS	Und	761.37	40.00	31,254.80	1.00%	1.00	1.00%	31,254.80	1.00%	31,254.80	100.00%
05.03	SENALES REGULATIVAS	Und	720.23	8.00	5,761.84	1.00%	1.00	1.00%	5,761.84	1.00%	5,761.84	100.00%
05.11	SENALES INFORMATIVAS	Und	535.80	4.00	2,143.20	1.00%	1.00	1.00%	2,143.20	1.00%	2,143.20	100.00%
06	IMPACTO AMBIENTAL				1,410.74	1.00%	1.00	1.00%	1.00	1.00%	1,410.74	100.00%
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	1,343.95	1.05	1,410.74	1.00%	1.00	1.00%	1,410.74	1.00%	1,410.74	100.00%
07	EMERGENCIA SANITARIA				25,874.65	40.00%	7,762.40	30.00%	18,112.25	70.00%	7,762.40	30.00%
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COMO D19	gp	25,874.65	1.00	25,874.65	40.00%	7,762.40	30.00%	18,112.25	70.00%	7,762.40	30.00%
A-	COSTO DIRECTO				693,317.45	15,434.14	391,658.08		391,658.08		292,227.29	
B-	GASTOS GENERALES				67,851.75	1,543.41	37,760.02		37,760.02		29,227.73	
C-	UTILIDAD				33,895.87	771.71	18,592.80		18,592.80		14,811.39	
D-	SUB TOTAL				791,255.87	17,750.26	427,000.90		427,000.90		330,861.32	
E-	I.G.V.				140,694.71	3,194.87	76,927.89		76,927.89		61,491.04	
F-	TOTAL				931,950.58	20,945.13	503,928.79		503,928.79		392,352.36	
G-	PORCENTAJE				100.00%	2.27%	54.17%		54.17%		42.00%	



37c

El resumen de la valorización de Servicio N° 01 Setiembre 2020, para efectos de pago al contratista CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA, se ha determinado el importe de **SI. 504,337.30 (QUINIENTOS CUATRO MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 30/100 SOLES), INC. EL IGV** cuyo detalle es el siguiente.

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO HUAYLACA – TAMBILLO, LONG. 8.2 KM; ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO, LONG. 5.60 KM Y ANGASMARCA-EL INGENIO-CRUZ PAMPA-CATRIN, LONG. 9.03 KM, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"

CONTRATO : N°02-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR : ING. DEBY RUTH PANTOMENDOZA

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD



RESUMEN GENERAL VALORIZACION N° 02-OCTUBRE MANTENIMIENTO PERIODICO


DESCRIPCION	MONTO CONTRATO	VALORIZACION				% AVANCE
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUM.	SALDO	
1.- VALORIZACION CONTRACTUAL						
Valorización No. 02	781,215.07	-	427,404.49	427,404.49	353,810.58	54.71%
	781,215.07	0.00	427,404.49	427,404.49	353,810.58	54.71%
Avance Ejecutado		0.000%	54.710%	54.710%		
Avance Programado		0.000%	0.958%	0.958%		
2.- REAJUSTES						
Reajuste de la Valorización No. 02		-	-	-		
Regularización Reajuste Valorización anteriores		-	-	-		
Retención por atraso de Obra		-	-	-		
*El reajuste no se aplica según CGC 47.1		0.00	0.00	0.00		
A.- VALORIZACION BRUTA (sin IGV) (1+2)		0.00	427,404.49	427,404.49		
3.- RETENCIÓN POR GARANTIA						
Valorización No.02		-	191,453.89	191,453.89		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
* Contratista al solicitar retención de garantía		0.00	191,453.89	191,453.89	191,453.89	
4.- AMORTIZACION POR ADELANTO MATERIALES						
Valorización No.02		-	-	-		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
5.- DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE						
Por Adelanto Directo		-	-	-		
Por Adelanto de Materiales		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto Directo		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto de Materiales		-	-	-		
		0.00	0.00	0.00		
B.- VALORIZACION NETA (sin IGV) (1)		0.00	235,950.60	235,950.60		
C.- MONTO NETO		0.00	235,950.60	235,950.60		
D.- I.G.V. (18% DE B)		0.00	42,471.11	42,471.11		
E.- MONTO A CANCELAR (C+D)		0.00	278,421.71	278,421.71		
F.- MONTO A FACTURAR (A*0.18)		0.00	504,337.30	504,337.30		

Para efectos de control de avance de ejecución del servicio, se ha determinado que Como el monto de la valorización acumulada ejecutada es mayor que el monto de la valorización acumulada programada, la obra se encuentra adelantada por lo que no procede comparación por atraso según el art. 205 del RLCE., en ella se puede visualizar que el avance programado para el mes de setiembre 2020, incluyendo la situación actual del servicio y el realmente ejecutado acumulado Promedio de los tres tramos es de 27.76 %, es decir la obra está atrasada un 13.15 %, frente a lo programado de 14.61 %, es decir el servicio de mantenimiento se encuentra adelantado en todas sus actividades.



PERIODO	VALORIZACIONES DE SERVICIO PROGRAMADA					VALORIZACIONES DE SERVICIO REAL				
	CONTRATO ORIGINAL	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)		PRINCIPAL TOTAL	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)	
		PARCIAL	ACUM. (A)	PARCIAL	ACUM.		PARCIAL	ACUM. (B)	PARCIAL	ACUMULADO
SET. 2020	18,137.45	18,137.45	18,137.45	0.96%	0.96%	20,944.13	20,944.13	20,944.13	1.11%	1.11%
OCT. 2020	258,446.29	258,446.29	276,583.73	13.66%	14.61%	504,337.30	504,337.30	525,281.43	26.65%	27.76%
NOV. 2020	774,409.75	774,409.75	1,050,993.48	40.92%	55.54%					
DIC. 2020	841,489.52	841,489.52	1,892,483.00	44.46%	100.00%					
TOTALES	1,892,483.00	1,892,483.00				525,281.43	525,281.43			

DIAGRAMA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

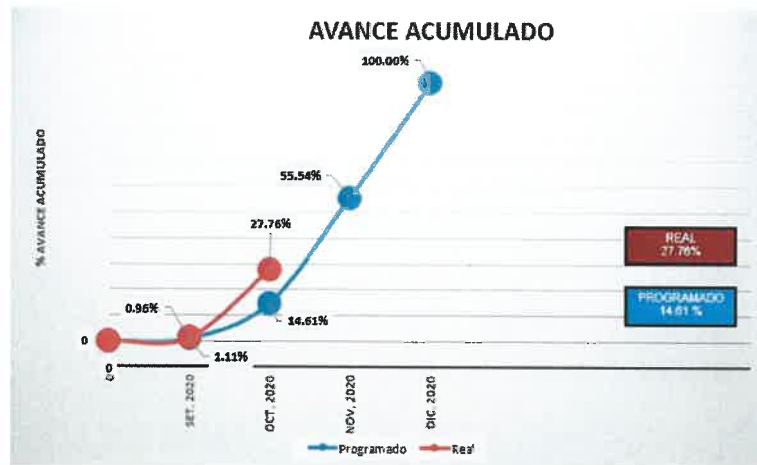

La retención de la Garantía de Fiel Cumplimiento, que tiene como responsabilidad el CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA, en dejar como garantía del trabajo a ejecutar, será descontado en las dos primeras Valorizaciones concerniente a los meses de Setiembre y Octubre del 2020, de las cuales será retenido el 10% del monto del contrato.

CONCLUSIÓN:

Conforme al calendario de avance del SERVICIO vigente, la ejecución del servicio de SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO HUAYLACA – TAMBILLO, LONG. 8.12 KM; ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO, LONG. 5.60 KM Y ANGASMARCA-EL INGENIO-CRUZ PAMPA-CATIRIN, LONG. 13.03 KM, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, ubicado en el distrito de angasmarca, Provincia de Santiago de Chuco, Departamento la Libertad, se encuentra adelantado; por cuanto el acumulado programado para el mes de Setiembre del 2020 promedio general de los tres tramos es el 27.76 % contra lo realmente ejecutado que es el 14.61%, de las cuales se tiene la ejecución de forma adelantada en todas las actividades programadas.

LOS METRADOS CONCILIADOS ENTRE EL INSPECTOR y el Residente del SERVICIO, han generado la VALORIZACION DEL SERVICIO N° 02, correspondiente a los trabajos ejecutados en el periodo comprendido entre el 01/10/2020 hasta el 31/10/2020 por la empresa contratista CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA, el mismo que haciendo a la suma de S/. **504,337.30 (QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 30/100 SOLES), INC. EL IGV.**



La Retención de la Garantía, que garantiza el FIEL CUMPLIMIENTO de la ejecución del servicio por un monto a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO, se realizará en las dos

La Retención de la Garantía, que garantiza el **FIEL CUMPLIMIENTO** de la ejecución del servicio por un monto a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO, se realizará en las dos primeras Valorizaciones concerniente a los meses de Setiembre Y Octubre del 2020, sumando el monto de **S/. 228,010.00 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DIEZ CON 00/100 SOLES)**, de las cuales se recomienda la retención a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO, la suma de **S/. 225,915.59 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 59/100 SOLES)**, considerando el 10% del monto del contrato.

El Inspector del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO HUAYLACA – TAMBILLO, LONG. 8.12 KM; ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO, LONG. 5.60 KM Y ANGASMARCA-EL INGENIO-CRUZ PAMPA-CATIRIN, LONG. 13.03 KM, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD", ha presentado a esta municipalidad el informe relacionado a la valorización del servicio N° 02, el día 05/11/2020.

Después de haber evaluado el informe del Inspector con respecto a la valorización del servicio N° 02 por los trabajos ejecutados por el **CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA**, durante el periodo comprendido entre el 22/09/2020 hasta el 30/09/2020, del servicio de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO HUAYLACA – TAMBILLO, LONG. 8.12 KM; ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO, LONG. 5.60 KM Y ANGASMARCA-EL INGENIO-CRUZ PAMPA-CATIRIN, LONG. 13.03 KM, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD", la misma que haciende a la suma de **S/. 504,337.30 (QUINIENTOS CUATRO MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 30/100 SOLES)**, INC. El IGV, esta gerencia da su **CONFORMIDAD** respectiva al informe N° 163-2020-JO/IVPSCH/LFGCH, así mismo se considera la conformidad del área responsable mediante informe N° 1146-2020MPSCH/DIST/SGI

La Retención de la Garantía, que garantiza el **FIEL CUMPLIMIENTO** de la ejecución del servicio por un monto a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO, contemplada al mes de Octubre del 2020, se recomienda hacer el descuento respectivo la suma de **S/. 225,915.59 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 59/100 SOLES)**, de las cuales se recomienda la retención a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO.












Concluyendo que el monto a cancelar es de **S/. 18,849.72 (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 72/100 SOLES)**, INC. El IGV, haciendo un descuento de la retención de la Garantía de Fiel Cumplimiento, según su ficha resumen de la entidad, que es de **S/. 278,421.71 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE UNO CON 71/100 SOLES)** INC. IGV, Resumiendo esto en el cuadro resumen de Valorización N° 02 octubre del 2020.

RECOMENDACION

Hacer efectivo la Valorización del SERVICIO N° 02 mes de octubre 2020, por un monto a Pagar de **S/. 278,421.71 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE UNO CON 71/100 SOLES)**, INC. El IGV, por el periodo comprendido entre el 01/10/2020 hasta el 31/10/2020, generado por el avance de los trabajos ejecutados en el servicio DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO HUAYLACA – TAMBILLO, LONG. 8.12 KM; ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO, LONG. 5.60 KM Y ANGASMARCA-EL INGENIO-CRUZ PAMPA-CATIRIN, LONG. 13.03 KM, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, la misma que está a cargo del contratista, **CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA**, e Inspeccionado por el Inspector de servicio el **ING. -DEISY-RUTH-PIANTO MENDOZA**, para efectos consiguientes a este informe se hace llegar la siguiente documentación:



Adjunta:

-  Informe N° 163-2020-JO/IVPSCH/LFGCH
-  INFORME N° 015-2020-IVP-MPSCH/TACSMRP/FRGC
-  Informe N° 1146-2020-MPSCH/DST/SGI
-  CARTA N° 003-2020- DRPM/INSP
-  INFORME N° 03-2020-DRPM/INSP
-  CARTA N° 018-2020-JCQA/R.C.
-  CONTRATO N° 012-2020-MPSCH-LOG
-  DU. N° 070-2020
-  01 folder manila de Original de la valorización presentada por el contratista
-  Planilla de Valorización N° 02 resumida por la entidad
-  Resumen de la Valorización del servicio N° 02 por la entidad

Sin otro particular, me suscribo de Usted, no sin antes reiterar mi estima personal.

Atentamente,


INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE
SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Valencio RIVERA RAJUEL K.
18511
DIRECTOR GENERAL





Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD



RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 02 OCTUBRE 2020, POR LA EJECUCION DEL SERVICIO: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: HUAYLACA – TAMBILLO, LONG. 8.12 KM; ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO, LONG. 5.60 KM Y ANGASMARCA-EL INGENIO-CRUZ PAMPA-CATRIN, LONG. 13.03 KM, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
INSPECTOR : ING. DEISY RUTH PIANTO MENDOZA
SERVICIO TRAMO: HUAYLACA – TAMBILLO, LONG. 8.12 KM; ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO, LONG. 5.60 KM Y ANGASMARCA-EL INGENIO-CRUZ PAMPA-CATRIN, LONG. 13.03 KM

N° Contrato	: N° 012-2020-MP/SCH/LOG
Plazo de Ejecución	120 Días Calendarios
Anticipo	-S/0.00 Sin IGV
Adelanto de Materiales	-S/0.00 Sin IGV
Fecha Inicio Elec. Servicio	: 22 septiembre 2020
Fecha Término Servicio	: 31 diciembre 2020

ACTIVIDAD	COSTO DIRECTO (\$/.)	GASTOS GENERALES 10%	UTILIDAD 5%	SUB TOTAL	IGV 18%	TOTAL \$/.
PLAN DE TRABAJO	16,802.51	1,680.25	840.13	19,322.88	3,478.12	22,801.00
MANTENIMIENTO PERIODICO	1,384,607.96	139,460.80	69,730.40	1,603,799.15	288,683.84	1,892,483.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO	252,037.58	25,203.76	12,601.88	289,843.22	52,171.78	342,015.00
INVENTARIO DE CONDICION VIAL	16,802.51	1,680.25	840.13	19,322.88	3,478.12	22,801.00
TOTAL \$/.	1,680,250.55	168,025.06	84,012.53	1,932,288.14	347,811.86	2,280,100.00

N° Valorización	Valorización Bruta	Reintegro de Valorización	Resoluto de Reintegro de Valorización	Deducción del resoluto que no corresponde	Retención Según Art. 151 DS 344-2018-EF Reglamento de la ley N° 30225		Anticipo Materiales Adelanto	Amortización	MONTOS A PAGAR		Valorización del mes	Avance Mensual	
					Retención de Garantía 10%	Retención INC. IGV			Retención IGV	Retención IGV		Actual	Acumulado
V. N° 01. Set. 2020	17,749.26	0.00	0.00	0.00	1,774.92	2,094.41	0.00	0.00	15,974.34	2,875.38	18,849.72	1.11%	1.11%
V. N° 02. Oct. 2020	427,404.49	0.00	0.00	0.00	191,453.89	225,915.59	0.00	0.00	235,950.80	42,471.11	278,421.71	26.65%	27.76%
V. N° 03. Nov. 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
V. N° 04. Dic. 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Parcial	445,153.75	0.00	0.00	0.00	193,228.81	228,010.00	0.00	0.00	251,924.94	45,346.49	297,271.43		

ADICIONALES													
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General	445,153.75	0.00	0.00	0.00	193,228.81	228,010.00	0.00	0.00	251,924.94	45,346.49	297,271.43		

NOTA: Conforme lo establece el Resolución de Superintendencia N° 071-2018/SUNAT, a partir del 01 de abril de 2018, los siguientes servicios, contenidos en el Anexo 3 de la R.S. 183-2004/SUNAT, cuyo nacimiento de la obligación tributaria del IGV se origine a partir de dicha fecha, estarán sujetos a la aplicación del 12%:



JEFE DE OPERACIONES
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

768

366

ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO : *SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO HUAYLACA – TAMBILLO, LONG. 8.12 KM; ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUJADERO, LONG. 5.60 KM Y ANGASMARCA-EL INGENIO-CRUZ PAMPA-CATIRIN, LONG. 13.03 KM, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD*

CONTRATO : N° 012-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR : ING. DEISY RUTH PIANTO MENDOZA

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD



RESUMEN DE PAGO N° 02 - OCTUBRE 2020
CONTRATO N° 012-2020-MPSCH/LOG **MES DE OCTUBRE 2020**

PAGO A CUENTA A CANCELAR AL CONTRATISTA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

CONCEPTO		MONTOS
		S/.
1.-	Monto Valorizado sin Reajuste en el presente mes :	427,404.49
	- Valorizacion No.02	427,404.49
2.-	Reajuste de las Valorizaciones :	0.00
	- Reajuste de la Valorizacion No.02	0.00
	- Regularizacion Reajuste Valorización anterior	0.00
	- Retención por atraso de Obra	0.00
	* El reajuste no se aplica según CGC 47.1	
A.-	VALORIZACION BRUTA (VB) (sin IGV) (1+2)	427,404.49
3.-	Retención de Garantía :	191,453.89
	- En la Valorizacion No.02	191,453.89
	- Regularización Valorizaciones anteriores	0.00
	* Contratista no solicito retención de Garantía	
4.-	Amortizacion del Adelanto de Materiales :	0.00
	- En la Valorizacion No.02	0.00
	- Regularización Valorizaciones anteriores	0.00
	* Contratista no solicito adelanto	
5.-	Deducción del Reajuste que no corresponde :	0.00
	- Por Adelanto Directo	0.00
	- Por Adelanto de Materiales	0.00
	- Por Regularización del Adelanto Directo	0.00
	- Por Regularización del Adelanto de Materiales	0.00
B.-	VALORIZACION NETA (sin IGV) (1)	235,950.60
C.-	MONTO NETO	235,950.60
D.-	I.G.V. (18% DE B)	42,471.11
E.-	MONTO A CANCELAR (C+D)	278,421.71
F.-	MONTO A FACTURAR (A*0.18)	504,337.30



ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

365

SERVICIO: : *SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO HUAYLACA – TAMBILLO, LONG. 8.12 KM; ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHJADERO, LONG. 5.60 KM Y ANGASMARCA- EL INGENIO-CRUZ PAMPA-CATIRIN, LONG. 13.03 KM, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD*

CONTRATO : N° 012-2020-MPSCH/LOG
 INSPECTOR : ING. DEISY RUTH PIANTO MENDOZA
 CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA



Instituto Vial Provincial
 PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD



RESUMEN GENERAL VALORIZACION N° 02-OCTUBRE MANTENIMIENTO PERIODICO

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO	VALORIZACION			% AVANCE	
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUM.		
1.- VALORIZACION CONTRACTUAL						
Valorizacion No. 02	781,215.07	-	427,404.49	427,404.49	353,810.58	54.71%
	781,215.07	0.00	427,404.49	427,404.49	353,810.58	54.71%
Avance Ejecutado		0.000%	54.710%	54.710%		
Avance Programado		0.000%	0.958%	0.958%		
2.- REAJUSTES						
Reajuste de la Valorizacion No. 02		-	-	-		
Regularizacion Reajuste Valorización anteriores		-	-	-		
Retención por atraso de Obra		-	-	-		
*El reajuste no se aplica según CGC 47.1		0.00	0.00	0.00		
A.- VALORIZACION BRUTA (sin IGV) (1+2)		0.00	427,404.49	427,404.49		
3.- RETENCIÓN POR GARANTIA						
Valorizacion No.02		-	191,453.89	191,453.89		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
* Contratista si solicitó retención de garantía		0.00	191,453.89	191,453.89	191,453.89	
4.- AMORTIZACION POR ADELANTO MATERIALES						
Valorizacion No.02		-	-	-		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
5.- DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE						
Por Adelanto Directo		-	-	-		
Por Adelanto de Materiales		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto Directo		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto de Materiales		-	-	-		
		0.00	0.00	0.00		
B.- VALORIZACION NETA (sin IGV) (1)		0.00	235,950.60	235,950.60		
C.- MONTO NETO		0.00	235,950.60	235,950.60		
D.- I.G.V. (18% DE B)		0.00	42,471.11	42,471.11		
E.- MONTO A CANCELAR (C+D)		0.00	278,421.71	278,421.71		
F.- MONTO A FACTURAR (A*0.18)		0.00	504,337.30	504,337.30		



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO HUAYLACA - TAMBILLO, LONG. 8.12 KM, ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO, LONG. 5.60 KM Y ANGASMARCA EL INGENIO CRUZ PAMPA CATIRI, LONG. 13.03 KM, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

CONTRATO: N° 02-2020-IMP-SCH-CLOS

INSPECTOR: ING. DESY RUTH PINTO MENDOZA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

PRESUP. OFERTADO (CD-054-U) S/ IGV 781,215.07

PRESUP. OFERTADO (CD-054-U) INC/IGV 921,833.78

FECHA DE PRESUPUESTO 01/09/2020

PLAZO DE EJECUCION 120 d.c. (04 meses)

FECHA DE INICIO Y TERMINO CONTRACTUAL 20/09/2020 - 31/12/2020



VALORIZACION DE AVANCE DE SERVICIO N° 02, MANTENIMIENTO PERIODICO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020

FORMULA 02 - SERVICIO PRINCIPAL

Table with columns: ITEM, DESCRIPCION, UND, P.U., MONTO CONTRATO, SOLES, METRADO, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE VALORIZACION, ACUMULADO ACTUAL, METRADO, SOLES, SALDO POR VALORIZAR, %

Summary table with columns: A.-, B.-, C.-, D.-, E.-, F.-, G.-, COSTO DIRECTO, GASTOS GENERALES, UTILIDAD, SUB TOTAL, I.G.V., TOTAL, PORCENTAJE



364

ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO HUAYLACA - TAMBILLO, LONG. 8.12 KM, ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO, LONG. 5.69 KM Y ANGASMARCA-EL INGENIO-CRUZ PAMPA-CATIRIN, LONG. 13.03 KM, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATO: : N° 012-2020-MPSC/HLOG
 INSPECTOR : ING. DEISY RUTH PIANTO MENDOZA
 CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA



Instituto Vial Provincial
 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
 PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD



**PLANILLA DE RESUMEN DE METRADOS, MANTENIMIENTO PERIODICO
 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020**

Partida	Descripción	Und	Metrado Contrato Original	Acumulado Anterior	Val N° 02	Acumulado Actual		Saldos por Valorizar	
				Metrado	Oct-20	Metrado	%	Metrado	%
01	OBRAS PRELIMINARES								
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	gib	1.00	0.5000		0.500	50.00%	0.5000	50.00%
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	13.03	4.0000	6.50	10.500	80.58%	2.5300	19.42%
02	PAVIMENTOS								
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M.	m3	2,275.91	-	-	-	-	2,275.9100	100.00%
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M.	m3	5,786.42	-	3,587.530	3,587.530	62.00%	2,198.8900	38.00%
03	TRANSPORTE								
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM.	m3k	9,674.79	-	6,767.040	6,767.040	69.95%	2,907.7500	30.05%
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM.	m3k	49,341.44	-	48,939.560	48,939.560	99.19%	401.8800	0.81%
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM.	m3k	521.20	-	422.940	422.940	81.15%	98.2600	18.85%
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM.	m3k	5,993.80	-	3,058.720	3,058.720	51.03%	2,935.0800	48.97%
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE								
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	13,030.00	-	-	-	-	13,030.0000	100.00%
05	SEÑALIZACIÓN								
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und	13.00	-	-	-	-	13.0000	100.00%
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	Und	40.00	-	-	-	-	40.0000	100.00%
5.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	Und	8.00	-	-	-	-	8.0000	100.00%
05.11	SEÑALES INFORMATIVAS	Und	4.00	-	-	-	-	4.0000	100.00%
06	IMPACTO AMBIENTAL								
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	1.05	-	-	-	-	1.0500	100.00%
07	EMERGENCIA SANITARIA								
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gib	1.00	0.4000	0.300	0.700	70.00%	0.3000	30.00%



ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO : *SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO HUAYLACA - TAMBILLO, LONG. 8.12 KM. ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO, LONG. 5.60 KM Y ANGASMARCA-EL INGENIO-CRUZ PAMPA-CATRIN, LONG. 13.03 KM, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



CONTRATO : N° 012-2020-MP-SCH/LOG
INSPECTOR : ING. DEEY RUTH PIANTO MENDOZA
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA



CUADRO COMPARATIVO DE AVANCES : PROGRAMADO VS EJECUTADO (CURVA "S") COMPARACION EFECTUADA CON EL CSP N° 01

PERIODO	VALORIZACIONES DE SERVICIO PROGRAMADA				VALORIZACIONES DE SERVICIO REAL				SITUACION DE SERVICIO	
	CONTRATO ORIGINAL	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)	PRINCIPAL TOTAL	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)	SERVICIO	%
		PARCIAL	ACUM. (A)			PARCIAL	ACUM. (B)			
SET. 2020	18,137.45	18,137.45	18,137.45	0.96%	20,944.13	20,944.13	20,944.13	1.11%	ADELANTADA	15.47%
OCT. 2020	258,446.29	258,446.29	276,583.73	13.66%	504,337.30	504,337.30	525,281.43	26.65%	ADELANTADA	89.92%
NOV. 2020	774,409.75	774,409.75	1,050,993.48	40.92%						
DIC. 2020	841,489.52	841,489.52	1,892,483.00	44.46%						
TOTALES	1,892,483.00	1,892,483.00			525,281.43	525,281.43				

NOTAS :
1.- Montos que considera costo directo + gastos generales + utilidad, montos sin incluir IGV.
2.- En el avance programado se ha considerado el Calendario de Avance Servicio que corresponde al mes de Setiembre

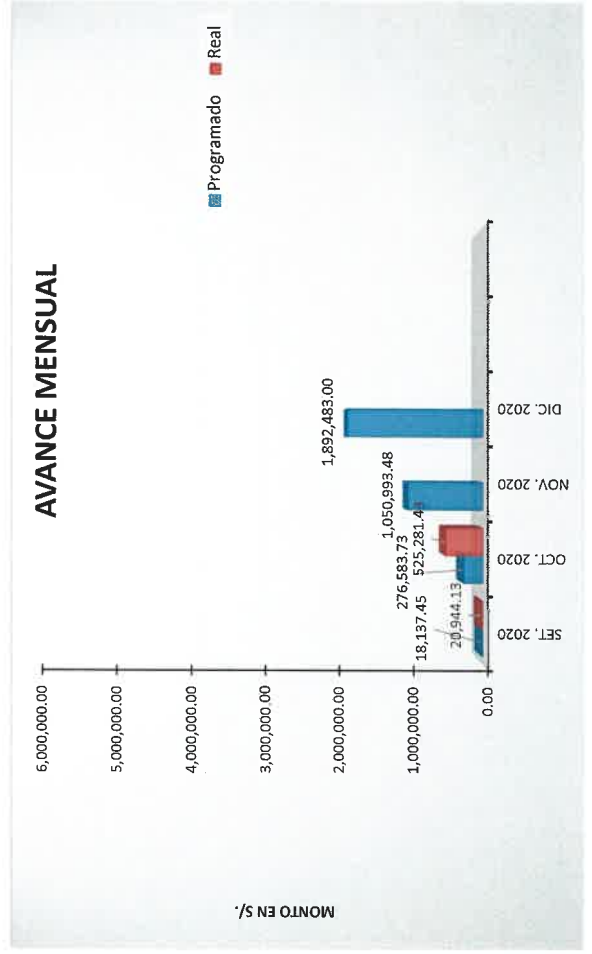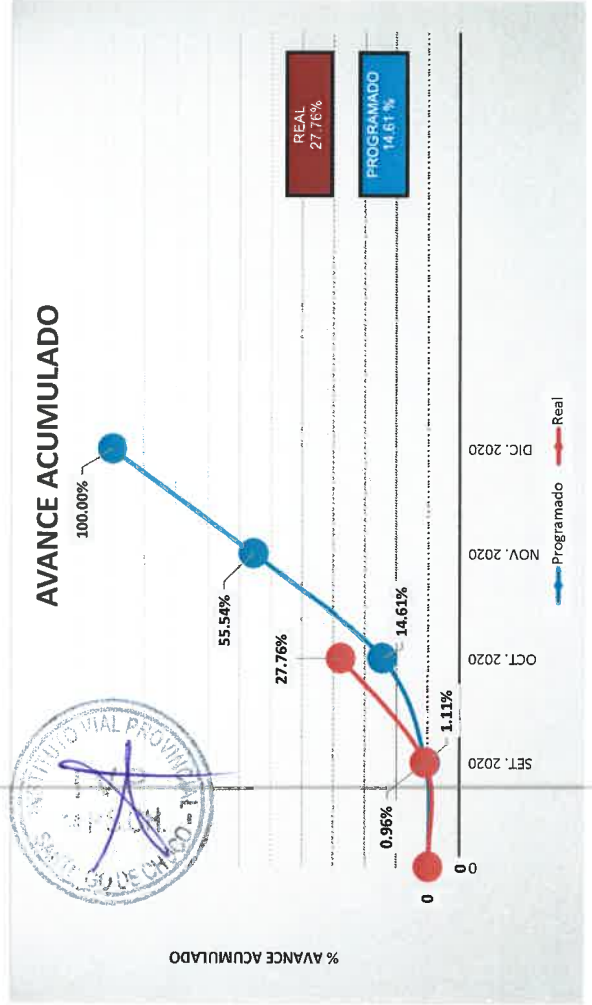

362

ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO HUAYLACA – TAMBILLO, LONG. 8.12 KM; ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUJADERO, LONG. 5.60 KM Y ANGASMARCA-EL INGENIO-CRUZ PAMPA-CATIRIN, LONG. 13.03 KM, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"

CONTRATO: : N° 012-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR : ING. DEISY RUTH PIANTO MENDOZA

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD



EVALUACION DEL AVANCE VALORIZADO RESPECTO AL PROGRAMADO

PRESUPUESTO	MONTO TOTAL X PRESUPUESTO	MONTO AVANCE ACUMULADO	
		VALORIZADO	PROGRAMADO
SERVICIO PRINCIPAL	1,892,483.00	525,281.43	276,583.73
TOTAL (Sin IGV)	1,892,483.00	525,281.43	276,583.73
		27.76%	14.61%

Situacion de Obra	$S/.525,281.43 > S/.276,583.73 \implies$	Adelantada
		89.918%

<u>VERIFICACION SI REQUIERE CALENDARIO ACELERADO (ART. 205 DEL RLCE)</u>	
a.- Monto Valorizacion Acumulado Programado	276,583.73
b.- Porcentaje art. 205 del Reglamento.	80%
c.- Monto Tope (80% de a)	221,266.98
d.- Monto Valorizacion Acumulado Ejecutado	525,281.43
Se tiene que:	
$(d) > (c) \implies$	$S/.525,281.43 > S/.221,266.98$
Conclusion :	
Como el monto de la valorizacion acumulado ejecutada es mayor que el monto de la valorizacion acumulada programada, la obra se encuentra adelantada por lo que no procede comparacion por atraso según el art. 205 del RLCE.	



ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO HUAYLACA – TAMBILLO, LONG. 8.12 KM; ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO, LONG. 5.60 KM Y ANGASMARCA-EL INGENIO-CRUZ PAMPA-CATIRIN, LONG. 13.03 KM, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"

SERVICIO:

CONTRATO : N° 012-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR : ING. DEISY RUTH PIANTO MENDOZA

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD



RESUMEN DE METRADOS MANTENIMIENTO PERIODICO

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO
01	OBRAS PRELIMINARES		
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	6.50
02	PAVIMENTOS		
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M.	m3	-
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M.	m3	3,587.53
03	TRANSPORTE		
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM.	m3k	6,767.04
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM.	m3k	48,939.56
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM.	m3k	422.94
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM.	m3k	3,058.72
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE		
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	-
05	SEÑALIZACIÓN		
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und	-
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	Und	-
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	Und	-
05.11	SEÑALES INFORMATIVAS	Und	-
06	IMPACTO AMBIENTAL		
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0
07	EMERGENCIA SANITARIA		
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	0.3



“Año de la Universalización de la Salud”

INFORME N° 163-2020-JO/IVPSCH/LFGCH

A : ING. RAFAEL K. VALENCIA REBAZA
GERENTE DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

DE : ING. LUIS F. GUTIERREZ CHÁVEZ

JEFE DE OPERACIONES DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO



ASUNTO : EVALUACIÓN Y CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N° 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: “HUAYLACA TAMBILLO LONG= 8.120 KM”, “ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHIJADERO LONG= 5.600 KM” Y “ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA CATIRÍN LONG= 13.030KM” DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.

REFERENCIA :

MONITOR DESIGNADO POR IVP	a)	INF. N°015-2020-IVP-MPSCH/TACSMRP/FRGC
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	b)	INF. N°1146-2020-MPSCH/DIST/SGI
INSPECTOR DE SERVICIO	c)	CARTA N°003-2020-DRPM/INSP
CONTRATISTA	d)	CARTA N°018-2020-JCQA/R.C

FECHA : SANTIAGO DE CHUCO, 04 DE DICIEMBRE DE 2020

Por medio del presente, le expreso mi cordial saludo y afecto, a su vez presento la VALORIZACIÓN N°02 del SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: “HUAYLACA TAMBILLO LONG= 8.120 KM”, “ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHIJADERO LONG= 5.600 KM” Y “ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA CATIRÍN LONG= 13.030KM” DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, correspondiente al mes de octubre (del 01 al 31) de 2020, la cual fue elaborada por el CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA y alcanzada al Inspector de servicio mediante documento de referencia d); este a su vez dio su Conformidad y la ingresó a la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad) con documento de referencia c) para realizar el trámite correspondiente.

Para el pago de la VALORIZACIÓN N° 02, se debe contar con la CONFORMIDAD del área responsable (Sub Gerencia de Infraestructura) y posteriormente se dará la APROBACIÓN del área usuaria (Instituto Vial Provincial de Santiago de Chuco), según se estipula los Términos de Referencia del D.U. N° 070-2020 para los Mantenimientos Viales de los caminos vecinales de la provincia de Santiago de Chuco.

Dentro de este marco, a su vez contando con la CONFORMIDAD de VALORIZACIÓN N° 02 del área responsable (documento de referencia b); siguiendo el trámite correspondiente; esta Jefatura de Operaciones del IVP de Santiago de Chuco, como parte de sus funciones, realizó la evaluación dicha documentación por medio del Monitor designado, el Ing. Frank Renato Gutiérrez Contreras, la cual se detalla en su informe respectivo (documento de referencia a); de esta manera se dará COMFORMIDAD (de no haber observaciones); a fin de dar paso a la evaluación para la APROBACIÓN por parte de su persona.

I. INFORME GENERAL:

A) INFORMACIÓN TÉCNICA:

Nombre de Servicio

SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: “HUAYLACA



TAMBILLO LONG= 8.120 KM”, “ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHIJADERO LONG= 5.600 KM” Y “ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA CATIRÍN LONG= 13.030KM” DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.

EJECUTOR:

Convocatoria del servicio	: RES-PROC-04-2020-MPSCH/CS-1
Fuente de Financiamiento	: Recursos por operaciones oficios de crédito
Modalidad Contratación	: A suma alzada
Contrato de Servicio	: N° 012-2020-MPSCH-LOG
Decreto de Urgencia	: N° 070-2020
Fecha de Suscripción	: 28-08-2020
Contratista	: CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Residente del Servicio	: Ing. Lourdes Azucena Juárez Suárez
Monto Referencial del Servicio	: S/. 2,280,116.50 (INCL. IGV)
Monto del Contrato del Servicio	: S/. 2,280,100.00 (INCL. IGV).
Adelanto Directo	: NO APLICA
Plazo de Ejecución	: MANTENIMIENTO PERIODICO - 120 DC (sujeto a firma de contrato). MANTENIMIENTO RUTINARIO – 360 DC
Fecha Entrega Terreno	: 29/08/2020 /
Resolución de Aprobación de P.T.	: RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 152-2020-MPSCH/GM
Fecha de Aprobación	: 21/09/2020
Fecha Inicio Servicio Contractual	: 22/09/2020 /
Fecha Término Servicio Contractual	: 31/12/2021

INSPECCIÓN:

Inspector de Servicio	: Ing Daysi Ruth Pianto Mendoza
Contrato de Inspección	: N° 036-2020-MPSCH-LOG
Fecha de Designación	: 21/08/2020
Monto Contractual	: S/. 17,717.50
Plazo de Designación	: 120 DC (MANTENIMIENTO PERIÓDICO)

II. ANALISIS

Según lo detallado y analizado en el Informe del Monitor designado, la Sub Gerencia de Infraestructura (área responsable) y del Inspector concerniente a la VALORIZACIÓN N° 02 (del 01 al 31 de octubre) de la Fase II: MANTENIMIENTO PERIÓDICO del servicio en

mención, presentada por el Contratista, se tiene la siguiente información resumida a considerar:

A) DEL AVANCE EJECUTADO

Los metrados ejecutados son:

TRAMO: ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA CATIRÍN

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO BASE	METRADOS EJECUTADOS			% AVANCE	SALDO METRADO
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
1 TRABAJOS PRELIMINARES								
1.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	glb	1.00	0.50	-	0.50	50.00%	0.50
1.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	13.03	4.00	6.50	10.50	80.58%	2.53
2 PAVIMENTOS								
2.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	2275.91	0.00	-	0.00	0.00%	2,275.91
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=	m3	5786.42	0.00	3,587.53	3587.53	62.00%	2,198.89
3 TRANSPORTES								
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	9674.79	0.00	6,767.04	6767.04	69.95%	2,907.75
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM	m3k	49341.44	0.00	48,939.56	48939.56	99.19%	401.88
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM	m3k	521.20	0.00	422.94	422.94	81.15%	98.26
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	5993.80	0.00	3,058.72	3058.72	51.03%	2,935.08
4 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE								
4.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	13030.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,030.00
5 SENALIZACION								
5.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13.00
5.02	SENALES PREVENTIVAS	und	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40.00
5.03	SENALES REGLAMENTARIAS	und	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8.00
5.04	SENALES INFORMATIVAS	und	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4.00
6 IMPACTO AMBIENTAL								
6.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	1.05	0.00	-	0.00	0.00%	1.05
7 EMERGENCIA SANITARIA								
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	0.40	0.30	0.70	70.00%	0.30

Las partidas que se vienen ejecutando a la fecha corresponden a las obras preliminares (movilización y desmovilización de equipos, trazo y replanteo), también se ejecutó las partidas de pavimentos y transporte de material excedente, se está considerando la partida de emergencia sanitaria COVID 19 a un 40%. Todo viene siendo ejecutado conforme a las normas de evaluación, dentro de los lineamientos y Especificaciones Técnicas establecidos en el Plan de Trabajo, elaborado por el Contratista y previamente aprobado por la Entidad.

En cuanto al avance acumulado ejecutado respecto al programado (curva S) tenemos el siguiente resumen:

TRAMO: ANGASMARCA-EL INGENIO-CRUZ PAMPA-CATIRIN

N° VAL.	MES	PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCE MENSUAL ACUM.	
				EJECUTADO	PROGRAMADO
2	OCTUBRE	01/10/2020	31/10/2020	56.98%	30.00%

Se observa un porcentaje de avance positivo del **+26.98%**, lo cual significa que la ejecución va adelantada.

B) DEL MONTO VALORIZADO

De acuerdo con las actividades ejecutadas se tiene una valorización con la siguiente configuración:

N° Valorización	Valorización Bruta	MONTO A PAGAR	IGV	Valorización del mes
		S/IGV		

N° 01. Septiembre	S/.17,749.26	S/.17,749.26	S/.3,194.87	S/.20,944.13
-------------------	--------------	--------------	-------------	--------------

376

N° 02. Octubre	S/.427,404.49	S/.427,404.49	S/.76,932.81	S/. 504,337.30
N° 03. Noviembre	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00
N° 04. Diciembre	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00

Parcial	S/.445,153.75	S/.445,153.75	S/.80,127.68	S/.525,281.43
---------	---------------	---------------	--------------	---------------

ADICIONALES

0	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00
---	---------	---------	---------	---------

Total General	S/.445,153.75	S/.445,153.75	S/.80,127.68	S/.525,281.43
----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Se observa que la VALORIZACIÓN N° 02 del mes de octubre corresponde a un monto de **S/. 504,337.30 (inc. IGV)**.

C) DE LA RETENCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)

Según la CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍAS del contrato de servicio, estipula una retención del 10% como garantía de FIEL CUMPLIMIENTO del monto contractual total, el cual será retenido de manera particionada de las dos primeras valorizaciones según lo estipula el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado en su artículo 149° "Garantía de fiel cumplimiento", inciso 149.5, para servicios, como se muestra en el siguiente cuadro:

MONTO CONTRACTUAL	RETENCIÓN G.F.C. (10%)	RETENCIÓN EN CADA VAL.	
		VAL. 01 (10% DE VAL.)	VAL. 02 (SALDO)
S/. 2,280,100.00	S/. 228,010.00	S/. 2,094.41	S/. 225,915.59

Por lo cual se tiene el siguiente detalle:

➤ VALORIZACIÓN BRUTA	S/.	427,404.49
➤ IGV (18%)	S/.	76,932.81
➤ VALORIZACIÓN NETA	S/.	504,337.30
➤ RETENCIÓN G.F.V.	S/.	225,915.59
➤ SALDO A COBRAR	S/.	278,421.71

El saldo a cobrar por la VALORIZACIÓN N° 02 del 01 al 31 del mes de octubre es de **S/. 278,421.71 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 71/100 NUEVOS SOLES) incluido el I.G.V.**

D) DE PENALIDADES PRESENTADAS

No se presentó ninguna ocurrencia que suponga la aplicación de PENALIDAD según las estipulaciones del contrato de servicio de en su CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.

III. CONCLUSIONES

Tomando en cuenta todo lo analizado anteriormente, se hace las siguientes conclusiones:

- ❖ La diferencia entre el avance ejecutado respecto al programado arroja un porcentaje positivo de **+26.98%, solo para un tramo.**

- ❖ El saldo a pagar por la VALORIZACIÓN N° 01 del mes de septiembre es de **S/. 278,421.71 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 71/100 NUEVOS SOLES inc. IGV).**
- ❖ **No se presentaron PENALIDADES.**
- ❖ Se da **CONFORMIDAD** por parte de la oficina de Jefatura de Operaciones del IVP Santiago de Chuco a la VALORIZACIÓN N° 02 del servicio en mención.

IV. RECOMENDACIONES

Se recomienda **APROBAR** la presente VALORIZACIÓN N° 02 por su persona, a fin de realizar el pago correspondiente del CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA, conforme a lo estipulado en el cronograma programado del Plan de Trabajo del servicio y a lo ejecutado en campo. De igual modo, se sugiere seguir las recomendaciones indicadas en el Informe del Monitor designado (documento de referencia a).

Es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y fines.

ATENTAMENTE



ING. GUILLERMO CHAVEZ LUIS F.
C.O. 190782
JEFE DE OPERACIONES

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

INFORME N° 015-2020-IVP-MPSCH/TACSMRP/FRGC



A

: Ing. Luis Francisco Gutierrez Chavez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Santiago Chuco

DE

: Ing. Frank Renato Gutierrez Contreras
Técnico Administrativo del Área del IVP – MPSCH – La Libertad

ASUNTO

: ALCANZO INFORME DE VALORIZACION N°02 del 01/10/2020 al 31/10/2020 PARA TRAMITE RESPECTIVO
SERVICIO: Mantenimiento Periodico y Rutinario de los Caminos Vecinales Tramos:
- HUAYLACA – TAMBILLO LONG= 8.120.
- ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHIJADERO LONG= 5.600.
- ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN LONG= 13.030 - DISTRITO DE ANGASMARCA – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD”



REFERENCIA : CARTA N° 020-2020/CVCCH/LAIS-R.S
CARTA N° 018-2020-JCQA/R.C
INFORME N° 003-2020-DRMP/INSP
CARTA N°003-2020-DRPM/INSP.
INFORME N° 0201-2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH
INFORME N°1146-2020-MPSCH/DIST/SGI
D.U.N° 070-2020

FECHA : Santiago de Chuco, 04 de Diciembre del 2020

Previo cordial saludo y afecto, por medio del presente tengo a bien manifestarle con respecto al asunto de la referencia lo siguiente:

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Ejecución de Servicio : MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO HUAYLACA – TAMBILLO DEL DISTRITO DE ANGASMARCA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD.

Longitud : 8.120 Km.
Superficie de Rodadura : Afirmado.
Ancho de Superficie : 4.00 m.
Altura Promedio : 3300 m.s.n.m.
Radio Mínimo en CH : 15.00 m.
Radio Curvas de Volteo : 10.00 m.
Peralte Máximo : 12.00%
Bombeo : 2.00%
Pendiente Máxima : 15.30%
Pendiente Mínima : 0.20%
Espesor de Afirmado : 0.15 m.
Velocidad Directriz : 25 km/h.
Perfilado de Cunetas : Terreno natural
Hitos Kilométricos : 9 unidades

UBICACIÓN DEL TRAMO : Huaylaca – Tambillo.

Distrito : Angamarca
Provincia : Santiago de Chuco
Región : La Libertad

Coordenadas Geográficas Inicio

Norte : 9102480 N
Este : 822763 E
Altitud : 3300 m.s.n.m.

Coordenadas Geográficas Final

Norte : 9106256 N
Este : 820263 E
Altitud : 3300 m.s.n.m

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Ejecución de Servicio : MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHIJADERO DEL DISTRITO DE ANGASMARCA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD.

Longitud : 5.600 Km.
Superficie de Rodadura : Afirmado.
Ancho de Superficie : 4.00 m.
Altura Promedio : 3300 m.s.n.m.
Radio Mínimo en CH : 15.00 m.
Radio Curvas de Volteo : 10.00 m.
Peralte Máximo : 12.00%
Bombeo : 2.00%
Pendiente Máxima : 15.30%
Pendiente Mínima : 0.20%
Espesor de Afirmado : 0.15 m
Velocidad Directriz : 25 km/h.
Perfilado de Cunetas : Terreno natural
Hitos Kilométricos : 6 unidades



UBICACIÓN DEL TRAMO : Angamarca – Cruz de Chuca - Ahijadero.

Distrito : Angamarca
Provincia : Santiago de Chuco
Región : La Libertad

Coordenadas Geográficas Inicio

Norte : 9100162 N
Este : 824328 E
Altitud : 3300 m.s.n.m.

Coordenadas Geográficas Final

Norte : 9104351 N
Este : 824613 E
Altitud : 3300 m.s.n.m.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Ejecución de Servicio : MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA - CATIRIN DEL DISTRITO DE ANGASMARCA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD.

Longitud : 13.030 Km.
Superficie de Rodadura : Afirmado.
Ancho de Superficie : 4.00 m.
Altura Promedio : 3300 m.s.n.m.
Radio Mínimo en CH : 15.00 m.
Radio Curvas de Volteo : 10.00 m.
Peralte Máximo : 12.00%
Bombeo : 2.00%
Pendiente Máxima : 15.30%
Pendiente Mínima : 0.20%
Espesor de Afirmado : 0.15 m.
Velocidad Directriz : 25 km/h.
Perfilado de Cunetas : Terreno natural
Hitos Kilométricos : 14 unidades

UBICACIÓN DEL TRAMO : Angasmarca – El Ingenio – Cruz Pampa - Catirin.

Distrito : Angasmarca
Provincia : Santiago de Chuco
Región : La Libertad

Coordenadas Geográficas Inicio

Norte : 9094730 N
Este : 824514 E
Altitud : 3300 m.s.n.m.

Coordenadas Geográficas Final

Norte : 9096654 N
Este : 819814 E
Altitud : 3300 m.s.n.m.



DATOS DEL MANTENIMIENTO

EJECUTOR:

Proceso de Selección : PES-PROG-004-2020-MPSCH/CS
Contratista : CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Representante Legal : Jean Herbert Eche Mostacero.
Contrato de Servicios : N°012-2020-MPSCH-LOG.
Suscripción de Contrato : 28/08/2020
Modalidad : A Suma Alzada
Valor Referencial (inc. IGV) : S/ 2.280,100.00
Montro Contratado (inc. IGV) : S/ 2.280,100.00
Fuente de Financiamiento : Recurso por Operaciones Oficio de Credito
Plazo de Ejecución Inicial : 500 Dias Calendarios
Entrega de Terreno : 05 de setiembre del 2020
Inicio de Plazo Contractual : 21 de Setiembre del 2020 (Elaboración de plan de trabajo)
Inicio de Plazo Fase II : 22 de septiembre del 2020
Fecha Término Programado : 31 de Diciembre del 2020
Residente de Obra : Ing. Lourdes Azucena Juarez Suarez CIP 202858
Porcentaje Programado : 28.04 %
Porcentaje Programado Acumulado : 30.01 %
Porcentaje Ejecutado : 54.71 %
Porcentaje Ejecutado Acumulado : 56.98 %
Monto Valorizado : S/ 504,337.30

INSPECTOR:

Inspector : Ing. Daysi Ruth Pianto Mendoza CIP 78379
Fecha de Contrato : 24/08/2020
Plazo de Prestación de Servicio : 120 Días Calendarios
Monto Contratado (inc. IGV) : S/ 25,412.50



2. ANTECEDENTES.

. Mediante Carta N° 020-2020/CVCCH/LAJS-R.S que hace referencia a la carta N° 018-2020-JCQA/R.C con fecha 31 de Octubre 2020, la Empresa CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA, con Representante Legal Jean Herbert Eche Mostacero, realizo la entrega de la Valorizacion N° 02 del SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: HUAYLACA – TAMBILLO LONG= 8.120 Km; ANFASMARCA – CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO LONG= 5.600 Km; ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG= 13.030 Km, DEL DISTRITO DE ANGASMARCA – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD.

Mediante CARTA N° 003-2020-DRPM/INSP que hace referencia al INFORME N° 03-2020-DRPM/INSP. De fecha 04 de Noviembre 2020, el Inspector del Servicio, hace pronunciamiento al informe mensual del contratista dando conformidad a la Valorización N° 02 del . SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: HUAYLACA – TAMBILLO LONG= 8.120 Km; ANFASMARCA – CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO LONG= 5.600 Km; ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG= 13.030 Km, DEL DISTRITO DE ANGASMARCA – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD.

Mediante Informe N° 0201-2020-HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH con fecha 11 de Noviembre del 2020 el Ing. Hermes Melendez Tamayo como Jefe de la Division de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco OTORGA LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACION N° 02 OCTUBRE 2020 del SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: HUAYLACA – TAMBILLO LONG= 8.120 Km; ANFASMARCA – CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO LONG= 5.600 Km; ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG= 13.030 Km, DEL DISTRITO DE ANGASMARCA – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD.

Mediante INFORME N° 1146-2020-MPSCH/DIST/SGI con fecha 19 de Noviembre del 2020 el SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA el Ing. David Ivan Silva Torres hace llegar la CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION N° 02 CONTRATISTA-CONTRACTUAL del MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: HUAYLACA – TAMBILLO LONG= 8.120 Km; ANFASMARCA – CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO LONG= 5.600 Km; ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG= 13.030 Km, DEL DISTRITO DE ANGASMARCA – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD.



3. ANÁLISIS Y ESTADO DE SITUACION DEL SERVICIO CONTRATADO – FASE II.

La Sub Gerencia de Infraestructura de la MPSCH da la CONFORMIDAD DEL PAGO de la VALORIZACION N° 02 OCTUBRE – POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO del CONTRATISTA según el informe se debe pagar según el cuadro del Servicio: : HUAYLACA – TAMBILLO LONG= 8.120 Km; ANFASMARCA – CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO LONG= 5.600 Km; ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG= 13.030 Km, DEL DISTRITO DE ANGASMARCA – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD. donde solo se valorizo el Tramo correspondiente a la ruta de ; ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG= 13.030 Km, se detallan a continuación:

RESUMEN VALORIZACION N° 02- MANTENIMIENTO PERIODICO			
DESCRIPCION	ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN		
VALORIZACION	SETIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL EJECUTADO
COSTO DIRECTO	S/ 15,434.14	S/ 371,656.08	S/ 387,090.22
COSTO INDIRECTO (10%)	S/ 1,543.41	S/ 37,165.61	S/ 38,709.02
UTILIDAD (5 %)	S/ 771.71	S/ 18,582.80	S/ 19,354.51
SUB TOTAL	S/ 17,749.26	S/ 427,404.49	S/ 445,404.75
IGV (18 %)	S/ 3,194.87	S/ 76,932.81	S/ 80,127.68
TOTAL VALORIZADO	S/ 20,944.13	S/ 504,337.30	S/ 525,281.43

VALORIZACION OCTUBRE	
ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN	S/. 504.337.30



Según el Contrato del SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: HUAYLACA – TAMBILLO LONG= 8.120 Km; ANFASMARCA – CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO LONG= 5.600 Km; ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG= 13.030 Km, DEL DISTRITO DE ANGASMARCA – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD. en su clausula decima nos dice que : El Contratista da la autorización para la retención del 10 % de la garantía de fiel cumplimiento a travez de una carta autorización, adjunto el cuadro de retención:

RETENCIONES PROYECTADAS			
PAQUETE - 4	PRESUPUESTO	SETIEMBRE	OCTUBRE
HUAYLACA - TAMBILLO	S/ 692,127.55	S/. 34,606.38	S/. 34,606.38
ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO	S/ 477,329.35	S/. 23,866.47	S/. 23,866.47
ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN	S/ 1,110,643.10	S/. 55,532.16	S/. 55,532.16
TOTAL CONTRATADO	S/. 2,280,100.00	S/. 114,005.00	S/. 114,005.00
RETENCION 10 %	S/. 228,010.00		



RETENCIONES OCTUBRE					
PAQUETE - 4	EJECUTADO VALORIZACION SETIEMBRE	RETENCION 10% VALORIZACION SETIEMBRE	SALDO G.F.C SETIEMBRE	EJECUTADO VALORIZACION OCTUBRE	RETENCION 10% VALORIZACION OCTUBRE + SALDO SETIEMBRE
HUAYLACA - TAMBILLO	-	-	S/. 34,606.38	-	S/. 69,212.76
ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO	-	-	S/. 23,866.47	-	S/. 47,732.94
ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN	S/. 20.944.13	S/. 2.094.41	S/. 53.437.75	S/. 504.337.30	S/. 108.969.91
TOTAL	S/. 20.944.13	S/. 2.094.41	S/. 108.560.59	S/. 504.337.30	S/. 225.915.61

4.- CONCLUSION

4.1.- Conforme al análisis realizado del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: HUAYLACA – TAMBILLO LONG= 8.120 Km; ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO LONG= 5.600 Km; ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG= 13.030 Km, DEL DISTRITO DE ANGASMARCA – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD. El monto facturado por la VALORIZACION N° 02 correspondiente al mes de Octubre del 2020, se hace efectivo la suma S/. 504,337.30 QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 30/100 SOLES incluido impuestos de ley, con un avance del Servicio n el TRAMO:

- ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN (56.98 %)

Se tiene un saldo por retener de S/. 225,915.61 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 61/100 SOLES del saldo de la retención proyectada de Setiembre y la retención proyectada de Octubre.

Por lo tanto el monto a cancelar al CONTRATISTA POR CONTRATO DE EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO TRAMO: HUAYLACA – TAMBILLO LONG= 8.120 Km; ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO LONG= 5.600 Km; ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG=

13.030 Km, DEL DISTRITO DE ANGASMARCA – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD, corresponde a la Valorización N° 02 del mes de Octubre del 2020 la suma de S/. 278,421.69 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTI UNO CON 69/100 SOLES.

El monto ejecutado de la Valorización N° 01 – Setiembre y la Valorización N° 02 – Octubre 2020 es un total de S/. 525,281.43 QUINIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 43/100 SOLES correspondientes al mantenimiento periódico.

4.2.- RECOMENDACIONES

Se le recomienda realizar las coordinaciones correspondientes con lo profesionales que emitieron sus respectivos informes de la Valorización N° 02

Se pide al Residente como al Inspector tener la permanencia en Obra para el control de lo trabajos que se vienen desarrollando y quede constancia de su presencia en los registros fotográficos.

Se recomienda **Aprobar la Valorización N° 02 de Octubre** y que siga el tramite correspondiente para su pago respectivo a la Empresas Contratista CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA y de esta manera continúen los trabajos de ejecución del Servicio: MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: HUAYLACA – TAMBILLO LONG= 8.120 Km; ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO LONG= 5.600 Km; ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG= 13.030 Km, DEL DISTRITO DE ANGASMARCA – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD.


Sin otro particular, me suscribo a Usted, no sin antes reiterar mi estima personal.

Atentamente;

Adjunto:

01 copia Valorización N° 02 ejecutado de Octubre Long= 13.030





Frank Renato Gutiérrez Contreras
ING. CIVIL
R. CIP. N° 225088

