



Exp. SIAF
N° 1540

6010 - 6011

ORDEN DE SERVICIO

NUMERO:
000884
DE FECHA: 30/11/2020

Señor(es) **CORPORACION QUIPUZCOA ARANDA SAC** RUC N° **20600528069**
 Direccion **JIRN SAN ROMAN N° 955-PUEBLO DE HUMACHUCO -SANCHEZ CARRION**
 Referencia N° **CONTRATO DE SERVICIOS N° 009-2020-MPSCH-LOG**
 Condiciones de Pago : **CCI OFICINA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA--IVP**
 Objeto del Servicio **EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. -LI-115 DV-CHAGAVARA-CHIRA -ANCASH -TUTUARCO, LONG7.00 KM; EMP. LI 911 SITABAMBA-UCHUCUBAMBA-QUINUAL LONG 11.65 KM ,DISTRITO DE SITABAMBA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO-LA LIBERTAD.**
 Destino a **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO** Pedido N° : **000884**

LOS SIGUIENTES SERVICIOS :			VALOR	
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
		PAGO DE VALORIZACION N° 02 : DE LA EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. -LI-115 DV-CHAGAVARA-CHIRA -ANCASH -TUTUARCO, LONG7.00 KM; EMP. LI 911 SITABAMBA-UCHUCUBAMBA-QUINUAL LONG 11.65 KM ,DISTRITO DE SITABAMBA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO-LA LIBERTAD, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. SEGÚN: INFORME N° 235-2020-IVP-MPSCH/GG/VRRK INFORME N° 1118-2020-MPSCH/DIST/SGI PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 01-2020-MPSCH/CS		S/. 469,350.10
			TOTAL S/.	469,350.10

AFECTACION PRESUPUESTAL DEL SERVICIO			DISTRIBUCION CONTABLE
ACTIVIDAD/PROYECTO:	META	CLASIFICADOR:	CUENTAS POR PAGAR
0138-PROMOCION IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA	0188-MANTENIMEINTO DE CAMINO VECINAL	23.27.16	CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO
 ING. David Ivan Silva Torres
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZACION DEL SERVICIO		ÁREA USUARIA:		
		DIA	MES	AÑO
		30	11	2020
UNIDAD DE LOGISTICA	ADMINISTRACION y/o GERENCIA	FIRMA		

Gr. 92,482.54
 Retras 56,322.00
 Total

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROVEIDO
 PASE a: **Contabilidad**
 PARA: **Devengado**
 FECHA: **30/11/20** Firma:

PEC = 01

SIAF = 1540

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA N° 0000000462
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA : 10 SANTIAGO DE CHUCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO [301197]

MES : JULIO
FECHA DE DOCUMENTO : 07/07/2020
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO); SANTIAGO DE CHUCO - L.L, EN EL MARCO DEL D.U 070-2020 - ART. 21.1 (ANEXO 13)

N° DE DOCUMENTO F01-347-2020-LOG
FECHA APROBACION : 07/07/2020
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA	MONTO
PRG PRD PRY ACTA OBR FN DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESFESPD	
0001 INICIAL	
0139 3000133 5006373 15 033 0066 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	504,266.00
0179 MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO); SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	504,266.00
3 15 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	504,266.00
5 GASTOS CORRIENTES	504,266.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	504,266.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	504,266.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	497,266.00
2.3.2.4.3 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	497,266.00
2.3.2.4.3.1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	497,266.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	7,000.00
2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	7,000.00
2.3.2.7.1.6 ESTUDIOS	7,000.00
TOTAL	504,266.00
TOTAL CERTIFICACION	504,266.00
TOTAL NOTA	504,266.00

TPE = 18

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
SANTIAGO DE CHUCO

C.P.C. Natividad Y. Pereda Sánchez
OFC. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 000000463
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD
 PROVINCIA : 10 SANTIAGO DE CHUCO
 PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO [301197]

FECHA APROBACION : 07/07/2020
 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

FECHA : JULIO
 N° DE DOCUMENTO F01-348-2020-LOG
 FECHA DE DOCUMENTO : 07/07/2020
 TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
 JUSTIFICACION : CERTIFICACION. PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL; SANTIAGO DE CHUCO - L.L, EN EL MARCO DEL D.U 070-2020 - ART. 21.1 (ANEXO 13)

SECCION	MONTO
FF.CPRCOPPYACHAMORR FN. DIVF GRPF META FF RB CC TT G SG SCD ESFESPD	

0901 LOCAL	839,242.70
0133 3000103 5005373 15 033 0066 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	839,242.70
0120 MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL; SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	839,242.70
3.2 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	839,242.70
5 GASTOS CORRIENTES	839,242.70
2.3 BIENES Y SERVICIOS	839,242.70
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	827,592.70
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	827,592.70
2.3.2.4.3 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	827,592.70
2.3.2.4.3.1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	11,650.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	11,650.00
2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	11,650.00
2.3.2.7.1.6 ESTUDIOS	839,242.70

TOTAL	839,242.70
TOTAL CERTIFICACION	839,242.70
TOTAL NOTA	839,242.70

TR = 18

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
 SANTIAGO DE CHUCO

 C.P.C. Natividad Z. Pereda Sanchez
 OFC. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

 Presupuesto y Planificación
 Sello Y Firma

“Año de la universalización de la salud”

INFORME N° 235-2020-IVP-MPSCH/GG/VRK

A : Dr. JOHN JAIRO CURAY REYES.
Director de administración y Finanzas de la

DE : ING. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente del Instituto Vial Provincial de Santiago de Chuco

ASUNTO : APROBACIÓN DE CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N° 02 DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS
CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA
CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG, 7.00 KM; EMP. LI-911
(SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG. 11.65 KM.

REFERENCIA : Informe N° 135-2020-JO/IVPSCH/LFGCH
INFORME N° 015-2020-IVP-MPSCH/CEGB/TA
Informe N° 1118-2020-MPSCH/DST/SGI
CARTA N° 003-2020/INSPECTOR DE SERVICIO/ADRO
CARTA N° 004-2020-CONSORCIO VIAL LA CHIRA/RL/JQG
CONTRATO N° 009-2020-MPSCH-LOG
DU. N° 070-2020

FECHA : Santiago de Chuco, 30 de Noviembre del 2020

Previo cordial saludo y afecto, por medio del presente tengo a bien manifestarle con respecto al asunto de la referencia lo siguiente:

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Ejecución de Servicio : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS
CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA
- L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG, 7.00 KM; EMP. LI-911 (SITABAMBA) -
UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG. 11.65 KM.

Longitud : 18.65 Km.
Superficie de Rodadura : Afirmado.
Espesor de Afirmado : 0.15 m.
Velocidad Directriz : 30 km/h.
Perfilado de Cunetas : Terreno natural
Hitos Kilométricos : 18 unidades


UBICACIÓN

Distrito : SITABAMBA
Provincia : Santiago de Chuco
Región : La Libertad

RESPONSABLES DEL SERVICIO

EJECUTOR:

Fuente de financiamiento : Recursos por operaciones oficios de crédito
Modalidad Contratación : a Suma Alzada
Contrato de Servicio : CONTRATO N° 009-2020-MPSCH-LOG
Contratista : CONSORCIO VIAL LA CHIRA
Monto Referencial del Servicio : S/. 1, 589,688.70 inc el IGV.



Monto del Contrato de Servicio : S/. 1, 581,740.26 inc el IGV
 Plazo de Ejecución mantenimiento Periódico : 120 DIAS CALENDARIOS
 Inicio Plazo de Servicio Contractual : 22-09-2020
 Fecha Termino de Servicio Contractual : 31-12-2020

INSPECTOR

INSPECTOR : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA
 Contrato De Servicio : N° 034-2020-MPSCH-LOG

2. DE LA PRESENTACIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE DEL SERVICIO N° 02-OCTUBRE 2020

Mediante CARTA N° 003-2020/INSPECTOR DE SERVICIO/ADRO, del Inspector de Servicio, recepcionada por mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, el día 05/11/2020, el ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA, hace llegar a la Municipalidad la Valorización N° 02 del por los trabajos ejecutados en el periodo comprendido entre el 01/10/2020 hasta el 31/10/2020, del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG, 7.00 KM; EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG. 11.65 KM, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.

3. ANÁLISIS DEL IVP.

Para la ejecución del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG, 7.00 KM; EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG. 11.65 KM, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, en el proceso especial de selección N° 01-2020-MPSCH/CS-Segunda convocatoria, la empresa contratista CONSORCIO VIAL LA CHIRA, ha sido favorecida con la buena pro, por su monto ofertado de S/. 1, 581,740.26 inc. IGV que a continuación se detalla:

- A) Elaboración del Plan de Trabajo la suma de S/. 15,817.40 inc IGV, que se desarrollara exclusivamente para tal fase.
- B) Ejecución del mantenimiento Periódico la suma de 1, 312,844.42, inc. IGV, que se desarrollara exclusivamente en la fase de Ejecución del Mantenimiento Periódico.

PRESUPUESTO OFERTADO

Item	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
		METRADOS		COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
		Unidad	Cantidad		
01	OBRAS PRELIMINARES				
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	2.00	20,999.33	41,998.66
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	18.65	252.45	4,708.19
02	PAVIMENTOS				
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M.	m3	2,694.57	31.41	84,644.56
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M.	m3	8,018.13	56.26	451,124.98
03	TRANSPORTE				
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM.	m3k	12,854.23	10.35	133,020.44
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM.	m3k	69,418.25	1.86	128,859.39



03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM.	m3k	693.78	8.47	5,878.71
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM.	m3k	7,978.45	1.86	14,837.77
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	18,650.00	0.67	12,519.00
05	SEÑALIZACIÓN				
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und	18.00	182.35	3,282.38
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	Und	30.00	808.58	24,257.34
5.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	Und	12.00	766.47	9,197.68
05.11	SEÑALES INFORMATIVAS	Und	8.00	526.1500	4,209.20
06	IMPACTO AMBIENTAL				
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	1.50	1,378.9688	2,068.45
07	EMERGENCIA SANITARIA				
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	2.00	23,427.07	46,854.14
COSTO DIRECTO		CD		SI.	967,460.89
GASTOS GENERALES		GG	10%	SI.	96,746.09
UTILIDAD		U	5%	SI.	48,373.04
SUB TOTAL		CD+GG+U		SI.	1,112,580.02
IGV			18%	SI.	200,264.40
TOTAL PRESUPUESTO		PT		SI.	1,312,844.42
PORCENTAJE					100.00%

- C) Ejecución del Mantenimiento Rutinario, la suma de S/. 237,261.04, inc. IGV, que se desarrollara exclusivamente para tal fase.
- D) La Elaboración del Inventario de Condición Vial la Suma de S/. 15,817.40, inc. IGV, que se desarrollara exclusivamente para tal fase.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL SERVICIO DURANTE EL MES

De acuerdo a la verificación de los trabajos referidos al "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG, 7.00 KM; EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG. 11.65 KM, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD", se ha observado que desde la fecha 01 de octubre hasta 31 de octubre del 2020, se desarrollaron las siguientes actividades:

2.0 PAVIMENTOS.

2.01 CAPA NIVELANTE E=5 CM

2.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=15 CM.

3.0 MANTENIMIENTO DE CALZADA EN AFIRMADO:

3.01 Transporte de material granular hasta 1 km

3.02 Transporte de material granular mayor a 1 km

3.03 Transporte de material excedente hasta 1 km.

3.04 Transporte de material excedente mayor a 1 km



4.0 Obras de arte y drenaje



4.01 Reconformación de cunetas

5.0 Emergencia sanitaria

5.01 emergencia sanitaria COVID 19

NOTA: Toda esta información esta detallada en el informe del Ing. Inspector de Servicio mediante CARTA N° 003-2020/INSPECTOR DE SERVICIO/ADRO





Instituto Vial Provincial



MPSCH

Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DESANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VEICULARES TRAMO EMP. LT-16 (DV. CHAGAVARRA) - LA CHERA - L.D. ANCAISHI (TUTARCO, LONG. 7,00 KM; EMP. LT-9 (ESTIABAMBIA) - UCHUCABAMBIA - QUINUA LONG. 185 KM; DISTRITO DESIABAMBIA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

CONTRATO: N° 009-2020-MPCSCH/OS

INSPECTOR: ING. SMITH JEAN CARLOS OTIMIANO OLIVA

CONTRATISTA: CONSORCIO VALLIA CHIRA



VALORIZACION DE AVANCE DE SERVICIO N° 02, MANTENIMIENTO PERIÓDICO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020
FORMULARIO : SERVICIO PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	P.U.	MONTO CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE VALORIZACION		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR		
				METRADO	SOLES	METRADO	SOLES	METRADO	SOLES	METRADO	SOLES	METRADO	SOLES	%
81	OBRA(S) PRELIMINARES													
01.01	MONTEO Y DESMONTAJE DE EQUIPOS	gp	20,990.33	2.00	41,980.66	1.00	20,990.33	48.89%	1,154.03	2.61%	24,483.14	52.42%	22,229.71	47.58%
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	252.45	18.05	4,756.15	9.30	2,377.78	49.87%	4.50	24.13%	20,990.33	50.00%	20,990.33	50.00%
82	PAVIMENTOS													
02.01	CAPA INCLINANTE E=0.05 M	m3	31.41	2,094.57	65,724.54		32,862.27	8.97%	200,100.75	30.05%	269,100.75	38.85%	526,000.79	80.87%
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	m3	59.26	8,018.13	481,124.98		0.00	9.89%	100,000.00	37.48%	180,000.00	37.48%	280,000.00	82.52%
83	TRANSPORTE													
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	10.35	12,854.23	133,020.44		0.00	9.89%	179,487.00	42.87%	159,487.00	42.86%	182,000.31	57.14%
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	1.88	89,418.25	168,098.30		0.00	0.00%	54,077.05	40.85%	54,077.05	40.85%	78,943.38	59.15%
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	8.47	693.78	5,878.71		0.00	0.00%	36,840.40	44.30%	57,000.40	44.30%	71,708.69	55.70%
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	1.88	7,298.45	14,837.77		0.00	0.00%	2,857.55	45.21%	3,150.00	45.21%	3,221.16	54.79%
84	OBRA(S) DE ARTE Y DRENAJE													
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	0.67	18,690.00	12,518.00		0.00	8.89%	8,972.00	44.89%	8,972.00	44.89%	6,165.77	55.11%
85	SEÑALIZACION													
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und	182.35	3,292.38	43,848.89		0.00	0.00%	5,100.00	27.37%	3,428.00	27.37%	9,083.00	72.63%
05.02	SENALES PREVENTIVAS	Und	368.58	24,257.34	3,292.38		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	48,148.89	100.00%
5.03	SENALES REGLAMENTARIAS	Und	789.47	9,187.88	24,257.34		0.00	0.00%	18.00	0.00%	3,292.38	18.00%	3,292.38	100.00%
05.11	SENALES INFORMATIVAS	Und	528.15	4,208.20	9,187.88		0.00	0.00%	30.00	0.00%	24,257.34	100.00%	24,257.34	100.00%
86	IMPACTO AMBIENTAL													
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	Und	1,378.07	2,088.45	2,088.45		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,088.45	100.00%
87	EMERGENCIA SANITARIA													
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gp	23,427.07	48,854.14	48,854.14	0.50	11,713.54	25.00%	11,713.54	25.00%	23,427.07	50.00%	23,427.07	50.00%
A-	COSTO DIRECTO				897,480.89		35,000.88		345,873.39		380,833.89		588,528.93	
B-	GASTOS GENERALES				93,748.09		3,508.07		34,597.33		38,095.40		58,652.89	
C-	UTILIDAD				48,373.04		1,753.03		18,048.70		19,801.70		29,328.34	
D-	SUB TOTAL				1,112,500.02		40,319.78		57,529.33		62,697.09		674,905.93	
E-	IG.V.				200,264.49		7,257.26		71,595.78		78,853.34		121,411.07	
F-	TOTAL				1,312,804.42		47,577.03		69,125.11		70,550.43		796,317.00	
G-	PORCENTAJE				100.00%		3.62%		5.27%		5.36%		61.53%	



Jr. Paco Yunque N° 735 - Ciudad de Santiago de Chucú

e-mail: ivpstgodechucuo@yahoo.com

298

El resumen de la valorización de Servicio N° 02 octubre 2020, para efectos de pago al contratista CONSORCIO VIAL LA CHIRA, se ha determinado el importe de **SI. 469,350.10 (CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CINCUENTA CON 10/100 SOLES), INC. EL IGV** cuyo detalle es el siguiente.

ENTIDAD: : M UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EM P. 11-16 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCAH (TUTUARCO). LONG. 7.00 KM.; EM P. 11-91 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG. 1165 KM., DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATO : N°009-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL LA CHIRA



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD



RESUMEN GENERAL VALORIZACION N° 02 OCTUBRE MANTENIMIENTO PERIODICO


DESCRIPCION	MONTO CONTRATO	VALORIZACION				% AVANCE
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUM.	SALDO	
1.- VALORIZACION CONTRACTUAL						
Valorización No. 02	1,112,580.02	-	397,754.33	397,754.33	714,825.70	35.75%
	1,112,580.02	0.00	397,754.33	397,754.33	714,825.70	35.75%
Avance Ejecutado		0.000%	35.751%	35.751%		
Avance Programado		0.000%	3.430%	3.430%		
2.- REAJUSTES						
Reajuste de la Valorización No. 02		-	-	-		
Regularización Reajuste Valorización anteriores		-	-	-		
Retención por atraso de Obra		-	-	-		
*El reajuste no se aplica según CGC 47.1		0.00	0.00	0.00		
A.- VALORIZACION BRUTA (sin IGV) (1+2)		0.00	397,754.33	397,754.33		
3.- RETENCIÓN POR GARANTIA						
Valorización No.02		-	130,013.81	130,013.81		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
* Contratista se solicita retención de garantía		0.00	130,013.81	130,013.81	130,013.81	
4.- AMORTIZACION POR ADELANTO MATERIALES						
Valorización No.02		-	-	-		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
5.- DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE						
Por Adelanto Directo		-	-	-		
Por Adelanto de Materiales		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto Directo		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto de Materiales		-	-	-		
		0.00	0.00	0.00		
B.- VALORIZACION NETA (sin IGV) (1)		0.00	267,740.51	267,740.51		
C.- MONTO NETO		0.00	267,740.51	267,740.51		
D.- I.G.V. (18% DE B)		0.00	48,193.29	48,193.29		
E.- MONTO A CANCELAR (C+D)		0.00	315,933.80	315,933.80		
F.- MONTO A FACTURAR (A*0.18)		0.00	469,350.10	469,350.10		

Para efectos de control de avance de ejecución del servicio, se ha determinado que Como el monto de la valorización acumulado ejecutada es mayor que el monto de la valorización acumulada programada, la obra se encuentra adelantada por lo que no procede comparación por atraso según el art. 205 del RLCE., en ella se puede visualizar que el avance programado para el mes de setiembre 2020, incluyendo la situación actual del servicio y el realmente ejecutado acumulado Promedio de los dos tramos es de 35.75 %, es decir la obra está atrasada un 9.49 %, frente a lo programado de 45.24 %, es decir el servicio de mantenimiento se encuentra adelantado en todas sus actividades.



PERIODO	CONTRATO	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)		PRINCIPAL	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)	
	ORIGINAL	PARCIAL	ACUM. (A)	PARCIAL	ACUM.	TOTAL	PARCIAL	ACUM. (B)	PARCIAL	ACUMULADO
SET. 2020	45,030.28	45,030.28	45,030.28	3.43%	3.43%	47,577.33	47,577.33	47,577.33	3.62%	3.62%
OCT. 2020	548,846.40	548,846.40	593,876.68	41.81%	45.24%	469,350.10	469,350.10	516,927.44	35.75%	39.37%
NOV. 2020	505,792.94	505,792.94	1,099,669.62	38.53%	83.76%					
DIC. 2020	213,174.80	213,174.80	1,312,844.42	16.24%	100.00%					
TOTALES	1,312,844.42	1,312,844.42				516,927.44	516,927.44			

DIAGRAMA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

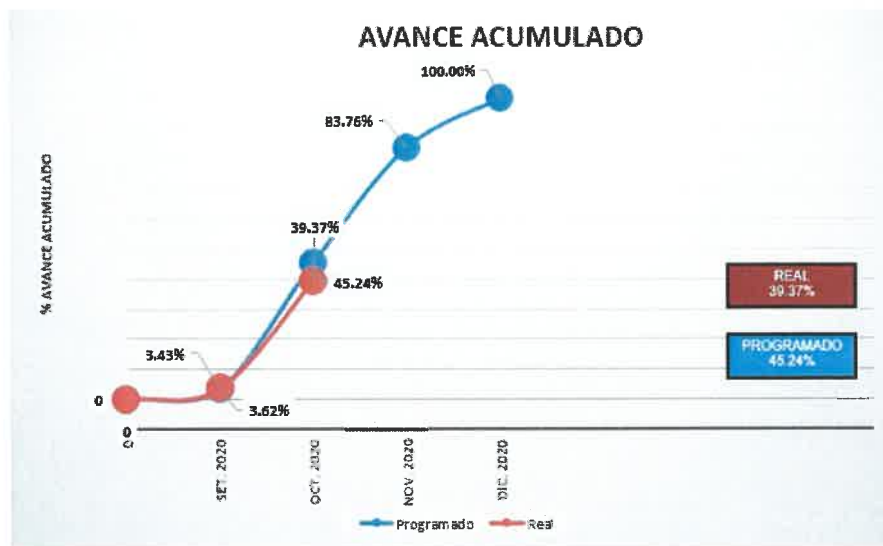

La retención de la Garantía de Fiel Cumplimiento, que tiene como responsabilidad el CONSORCIO VIAL LA CHIRA, en dejar como garantía del trabajo a ejecutar, será descontado en las dos primeras Valorizaciones concerniente a los meses de Setiembre y Octubre del 2020, de las cuales será retenido el 10% del monto del contrato.

Dentro del contenido del informe mensual del contratista, de valorización N° 02 al mes de octubre del 2020, nos detalla las pólizas de seguros por la compañía de seguros LA POSITIVA relacionadas al SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIÓN Y SALUD SCTR SALUD CONTRATO DE N° 611918, SCTR PENSIONES POLIZA 6647360, vigente desde el 22/09/2020 hasta el 22/12/2020, seguros contra accidentes personales emitidas por la compañía aseguradora cuya fecha debe de coincidir al mes de octubre del 2020, Pólizas de seguros contra todo riesgo (SCTR – SALUD), FUE EMITIDA EL 24/09/2020, Que cubre la vigencia desde 22/09/2020 hasta el 22/12/2020.

CONCLUSIÓN:

Conforme al calendario de avance del SERVICIO vigente, la ejecución del servicio de SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG. 7.00 KM; EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG. 11.65 KM, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, ubicado en el distrito de SITABAMBA, Provincia de Santiago de Chuco, Departamento la Libertad, se encuentra adelantado; por cuanto el acumulado programado para el mes de



octubre del 2020 es el 45.24 % contra lo realmente ejecutado que es el 35.75%, de las cuales se tiene la ejecución de forma atrasada en todas las actividades programadas.

LOS METRADOS CONCILIADOS ENTRE EL INSPECTOR y el Residente del SERVICIO, han generado la VALORIZACION DEL SERVICIO N° 02, correspondiente a los trabajos ejecutados en el periodo comprendido entre el 01/10/2020 hasta el 31/10/2020 por la empresa contratista CONSORCIO VIAL LA CHIRA, el mismo que asciende a la suma de **S/. 469,350.10 (CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CINCUENTA CON 10/100 SOLES), INC. EL IGV.**

Las pólizas de seguros contra accidentes personales emitidas por la compañía aseguradora LA POSITIVA relacionadas al SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIÓN Y SALUD SCTR SALUD CONTRATO DE N° 611918, SCTR PENSIONES POLIZA 6647360, vigente desde el 22/09/2020 hasta el 22/12/2020 y sus normas reglamentarias, a favor de la empresa **CORPORACION SORIANO L&C S.A.C.**, DE FECHA 24/09/2020, se encuentra vigente.

La Retención de la Garantía, que garantiza el **FIEL CUMPLIMIENTO** de la ejecución del servicio por un monto a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO, se realizará en las dos primeras Valorizaciones concerniente a los meses de Setiembre Y Octubre del 2020, sumando el monto de **S/. 158,174.03 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 03/100 SOLES)**, de las cuales se recomienda la retención a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO, la suma de **S/. 153,416.30 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS CON 30/100 SOLES)**, considerando el saldo del 10% del monto de la del contrato.

El Inspector del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG, 7.00 KM; EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG. 11.65 KM, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD", ha presentado a esta municipalidad el informe relacionado a la valorización del servicio N° 02, el día 05/11/2020.

Después de haber evaluado el informe del Inspector con respecto a la valorización del servicio N° 02 por los trabajos ejecutados por el **CONSORCIO VIAL LA CHIRA**, durante el periodo comprendido entre el 01/10/2020 hasta el 31/10/2020, del servicio de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG, 7.00 KM; EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG. 11.65 KM, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD", la misma que asciende a la suma de **S/. 469,350.10 (CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CINCUENTA CON 10/100 SOLES), INC. EL IGV**, esta gerencia da su **CONFORMIDAD** respectiva al informe N° 135-2020-JO/IVPSCH/LFGCH, así mismo al informe de la sub gerencia de infraestructura de la MPSCH. Quien vierte opinión favorable a dicha valorización.

La Retención de la Garantía, que garantiza el **FIEL CUMPLIMIENTO** de la ejecución del servicio por un monto a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO, contemplada al mes de octubre del 2020, se recomienda hacer el descuento respectivo la suma de **S/. 153,416.30 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS CON 30/100 SOLES)**, de las cuales se recomienda la retención a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO.

Concluyendo que el monto a cancelar es de **S/. 315,933.80 (TRECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 80/100 SOLES), INC. EL IGV**, haciendo un descuento de la retención de la Garantía de Fiel Cumplimiento, según su ficha resumen de la entidad, que es de **S/. 153,416.30 (CIENTO**



CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS CON 30/100 SOLES) INC. IGV, Resumiendo esto en el cuadro resumen de Valorización N° 02 octubre del 2020.

RECOMENDACION

Hacer efectivo la Valorización del SERVICIO N° 02 mes de octubre 2020, por un monto a Pagar de **S/. 315,933.80 (TRECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 80/100 SOLES), INC. EI IGV**, por el periodo comprendido entre el 01/10/2020 hasta el 31/10/2020, generado por el avance de los trabajos ejecutados en el servicio DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG, 7.00 KM; EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG. 11.65 KM, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, la misma que está a cargo del contratista, **CONSORCIO VIAL LA CHIRA**, e Inspeccionado por el Inspector de servicio el **ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA**, para efectos consiguientes a este informe se hace llegar la siguiente documentación:

Adjunta:

- ✚ Informe N° 135-2020-JO/IVPSCH/LFGCH
- ✚ INFORME N° 015-2020-IVP-MPSCH/CEGB/TA
- ✚ Informe N° 1118-2020-MPSCH/DST/SGI
- ✚ CARTA N° 003-2020/INSPECTOR DE SERVICIO/ADRO
- ✚ CARTA N° 004-2020-CONSORCIO VIAL LA CHIRA/RL/JQQ
- ✚ CONTRATO N° 009-2020-MPSCH-LOG
- ✚ DU. N° 070-2020
- ✚ 01 folder manila de Original de la valorización presentada por el contratista
- ✚ Planilla de Valorización N° 02 resumida por la entidad
- ✚ Resumen de la Valorización del servicio N° 02 por la entidad

Sin otro particular, me suscribo de Usted, no sin antes reiterar mi estima personal.

Atentamente,



Instituto Vial Provincial



RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 02 OCTUBRE 2020, POR LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG. 7,00 KM; EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG. 11,65 KM, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL LA CHIRA
INSPECTOR : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA

SERVICIO TRAMO: EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG. 7,00 KM; EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG. 11,65 KM

N° Contrato	: N° 009-2020-MPSPCHILOG
Plazo de Ejecución	120 Días Calendarios
Anticipo	:S/0.00 Sin ISV
Adelanto de Materiales	:S/0.00 Sin ISV
Fecha Inicio Elec. Servicio	: 22 septiembre 2020
Fecha Término Servicio	: 31 diciembre 2020

ACTIVIDAD	COSTO DIRECTO (S/.)	GASTOS GENERALES 10%	UTILIDAD 5%	SUB TOTAL	IGV 18%	TOTAL S/.
PLAN DE TRABAJO	11,656.16	1,165.62	582.81	13,404.58	2,412.82	15,817.40
MANTENIMIENTO PERIÓDICO	867,480.88	86,748.09	48,373.04	1,112,580.01	200,264.40	1,312,844.41
MANTENIMIENTO RUTINARIO	174,842.33	17,484.23	8,742.12	201,068.68	36,192.37	237,261.04
INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL	11,656.16	1,165.62	582.81	13,404.58	2,412.82	15,817.40
TOTAL S/.	1,165,615.52	116,561.55	58,280.78	1,340,457.85	241,282.41	1,581,740.26

N° Valorización	Valorización Bruta	Reíntegro de Valorización	Reajuste de Reíntegro de Valorización	Deducción del reajuste que no corresponde	Retención Segun Art. 151 DS 344-2018-EF Reglamento de la ley N° 30225		Anticipo Materiales Adelanto	MONTO A PAGAR		Valorización del mes	Avance Mensual	
					Retención Inc. IGV	Retención S/IGV		FGAR	SGV		Valorización	Acumulado
V. N° 01. Set. 2020	40,316.77	0.00	0.00	0.00	4,031.97	4,757.73	0.00	36,287.80	6,531.80	42,819.60	3.62%	3.62%
V. N° 02. Oct. 2020	397,754.33	0.00	0.00	0.00	130,013.81	153,416.30	0.00	267,740.52	48,193.29	315,933.80	35.75%	39.37%
V. N° 03. Nov. 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. N° 04. Dic. 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Parcial	438,074.10	0.00	0.00	0.00	134,045.78	158,174.03	0.00	304,028.31	54,725.09	358,753.40		

ADICIONALES	Valorización	Reíntegro de Valorización	Reajuste de Reíntegro de Valorización	Deducción del reajuste que no corresponde	Retención Inc. IGV	Retención S/IGV	Anticipo Materiales Adelanto	MONTO A PAGAR	Valorización del mes
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General	438,074.10	0.00	0.00	0.00	158,174.03	134,045.78	0.00	304,028.31	54,725.09

NOTA: Conforme lo establece el Resolución de Superintendencia N° 071-2018/SUNAT, a partir del 01 de abril de 2018, los siguientes servicios, contenidos en el Anexo 3 de la R.S. 183-2004/SUNAT, cuyo nacimiento de la obligación tributaria del IGV se origine a partir de dicha fecha, estarán sujetos a la aplicación del 12%:



GERENTE GENERAL
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

JEFE DE OPERACIONES
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

292

292

ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO : *SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG. 7.00 KM; EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG. 11.65 KM, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD*

CONTRATO : N° 009-2020-MPSCH/LOG
INSPECTOR : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL LA CHIRA



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD



RESUMEN DE PAGO N° 02 - OCTUBRE 2020
CONTRATO N° 009-2020-MPSCH/LOG **MES DE OCTUBRE 2020**

PAGO A CUENTA A CANCELAR AL CONTRATISTA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

CONCEPTO		MONTOS
		S/.
1.- Monto Valorizado sin Reajuste en el presente mes :		<u>397,754.33</u>
- Valorizacion No.02		397,754.33
2.- Reajuste de las Valorizaciones :		<u>0.00</u>
- Reajuste de la Valorizacion No.02		0.00
- Regularizacion Reajuste Valorización anterior		0.00
- Retención por atraso de Obra		0.00
* El reajuste no se aplica según CGC 47.1		
A.- VALORIZACION BRUTA (VB) (sin IGV) (1+2)	S/.	397,754.33
3.- Retención de Garantía :		<u>130,013.81</u>
- En la Valorizacion No.02		130,013.81
- Regularización Valorizaciones anteriores		0.00
* Contratista no solicito retención de Garantía		
4.- Amortizacion del Adelanto de Materiales :		<u>0.00</u>
- En la Valorizacion No.02		0.00
- Regularización Valorizaciones anteriores		0.00
* Contratista no solicito adelanto		
5.- Deducción del Reajuste que no corresponde :		<u>0.00</u>
- Por Adelanto Directo		0.00
- Por Adelanto de Materiales		0.00
- Por Regularización del Adelanto Directo		0.00
- Por Regularización del Adelanto de Materiales		0.00
B.- VALORIZACION NETA (sin IGV) (1)	S/.	267,740.51
C.- MONTO NETO	S/.	267,740.51
D.- I.G.V. (18% DE B)	S/.	48,193.29
E.- MONTO A CANCELAR (C+D)	S/.	315,933.80
F.- MONTO A FACTURAR (A*0.18)	S/.	469,350.10



ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

291

SERVICIO: : *SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG, 7.00 KM; EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG. 11.65 KM, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD*

CONTRATO : N° 009-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL LA CHIRA



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD



RESUMEN GENERAL VALORIZACION N° 02 OCTUBRE MANTENIMIENTO PERIODICO

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO	VALORIZACION			% AVANCE	
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUM.		
1.- VALORIZACION CONTRACTUAL						
Valorizacion No. 02	1,112,580.02	-	397,754.33	397,754.33	714,825.70	35.75%
	1,112,580.02	0.00	397,754.33	397,754.33	714,825.70	35.75%
Avance Ejecutado		0.000%	35.751%	35.751%		
Avance Programado		0.000%	3.430%	3.430%		
2.- REAJUSTES						
Reajuste de la Valorizacion No. 02		-	-	-		
Regularizacion Reajuste Valorización anteriores		-	-	-		
Retención por atraso de Obra		-	-	-		
*El reajuste no se aplica según CGC 47.1		0.00	0.00	0.00		
A.- VALORIZACION BRUTA (sin IGV) (1+2)		0.00	397,754.33	397,754.33		
3.- RETENCIÓN POR GARANTIA						
Valorizacion No.02		-	130,013.81	130,013.81		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
* Contratista si solicito retención de garantía		0.00	130,013.81	130,013.81	130,013.81	
4.- AMORTIZACION POR ADELANTO MATERIALES						
Valorizacion No.02		-	-	-	-	
Regularización Valorización anteriores		-	-	-	-	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
5.- DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE						
Por Adelanto Directo		-	-	-		
Por Adelanto de Materiales		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto Directo		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto de Materiales		-	-	-		
		0.00	0.00	0.00		
B.- VALORIZACION NETA (sin IGV) (1)		0.00	267,740.51	267,740.51		
C.- MONTO NETO		0.00	267,740.51	267,740.51		
D.- I.G.V. (18% DE B)		0.00	48,193.29	48,193.29		
E.- MONTO A CANCELAR (C+D)		0.00	315,933.80	315,933.80		
F.- MONTO A FACTURAR (A*0.18)		0.00	469,350.10	469,350.10		



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO:

CONTRATO:

INSPECTOR:

CONTRATISTA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECALES TRAMO EMP. L115 (DV CHAGANARA) - LA CHIRA - L. D. ANDASIG (TOUTURCO), LONG. 7,30 KM. EMP. LU11 (SITABAMBA) - ICHUCIBAMBA - QUINUAL LONG. 11,65 KM. DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



PRESP. OFERTADO (CD-GG-U) S/IVY 1:12.560,02

PRESP. OFERTADO (CD-GG-U) INC/IVY 1.312.844,42

FECHA DE PRESUPUESTO 01/05/2020

PLAZO DE EJECUCION 120 d.c (04 meses)

FECHA DE INICIO Y TERMINO CONTRACTUAL 22/05/2020 - 31/12/2020

VALORIZACION DE AVANCE DE SERVICIO N° 02, MANTENIMIENTO PERIODICO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020

FORMULA 01 : SERVICIO PRINCIPAL

Main table with columns: ITEM, UNID, DESCRIPCION, MONTO CONTRATO (METRADO, SOLES, %), PRESIENTE VALORIZACION (METRADO, SOLES, %), ACUMULADO ACTUAL (METRADO, SOLES), SALDO POR VALORIZAR (METRADO, SOLES, %).

Summary table with columns: A-COSTO DIRECTO, B-GASTOS GENERALES, C-UTILIDAD, D-SUB TOTAL, E-I.G.V., F-TOTAL, G-PORCENTAJE.



296

289

ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG. 7,00 KM; EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG. 11,65 KM, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATO: : N° 009-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL LA CHIRA



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD



**PLANILLA DE RESUMEN DE METRADOS, MANTENIMIENTO PERIODICO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020**

Partida	Descripción	Und	Metrado Contrato Original	Acumulado Anterior	Val N° 02	Acumulado Actual		Saldos por Valorizar	
				Metrado	Oct-20	Metrado	%	Metrado	%
01	OBRAS PRELIMINARES								
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	2.00	1.0000	-	1.000	50.00%	1.0000	50.00%
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	18.65	9.3000	4.50	13.800	73.99%	4.8500	26.01%
02	PAVIMENTOS								
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M.	m3	2,694.57	-	1,275.000	1,275.000	47.32%	1,419.5700	52.68%
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M.	m3	8,018.13	-	3,000.000	3,000.000	37.42%	5,018.1300	62.58%
03	TRANSPORTE								
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM.	m3k	12,854.23	-	5,275.000	5,275.000	41.04%	7,579.2300	58.96%
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM.	m3k	69,418.25	-	30,940.000	30,940.000	44.57%	38,478.2500	55.43%
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM.	m3k	693.78	-	315.000	315.000	45.40%	378.7800	54.60%
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM.	m3k	7,978.45	-	3,600.000	3,600.000	45.12%	4,378.4500	54.88%
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE								
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	18,650.00	-	5,100.000	5,100.000	27.35%	13,550.0000	72.65%
05	SEÑALIZACIÓN								
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und	18.00	-	-	-	-	18.0000	100.00%
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	Und	30.00	-	-	-	-	30.0000	100.00%
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	Und	12.00	-	-	-	-	12.0000	100.00%
05.11	SEÑALES INFORMATIVAS	Und	8.00	-	-	-	-	8.0000	100.00%
06	IMPACTO AMBIENTAL								
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	1.50	-	-	-	-	1.5000	100.00%
07	EMERGENCIA SANITARIA								
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	2.00	0.5000	0.500	1.000	50.00%	1.0000	50.00%



ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO :



CONTRATO : N° 009-2020-MPSC/LOG
 INSPECTOR : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA
 CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL LA CHIRA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LL-15 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO), LONG. 7.00 KM, EMP. LL-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG. 11.65 KM, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

**CUADRO COMPARATIVO DE AVANCES : PROGRAMADO VS EJECUTADO (CURVA "S")
 COMPARACION EFECTUADA CON EL CV**

PERIODO	VALORIZACIONES DE SERVICIO PROGRAMADA				VALORIZACIONES DE SERVICIO REAL				SITUACION DE SERVICIO	
	CONTRATO ORIGINAL	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)	PRINCIPAL TOTAL	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)	SERVICIO	%
		PARCIAL	ACUM. (A)			PARCIAL	ACUM. (B)			
SET. 2020	45,030.28	45,030.28	45,030.28	3.43%	47,577.33	47,577.33	47,577.33	3.62%	ADELANTADA	5.66%
OCT. 2020	548,846.40	548,846.40	593,876.68	41.81%	469,350.10	516,927.44	516,927.44	35.75%	ATRASADA	12.96%
NOV. 2020	505,792.94	505,792.94	1,099,669.62	38.53%						
DIC. 2020	213,174.80	213,174.80	1,312,844.42	16.24%						
TOTALES	1,312,844.42	1,312,844.42			516,927.44	516,927.44				

NOTAS :
 1.- Montos que considera costo directo + gastos generales + utilidad, montos sin incluir IGV.
 2.- En el avance programado se ha considerado el Calendario de Avance Servicio que corresponde al mes de Setiembre

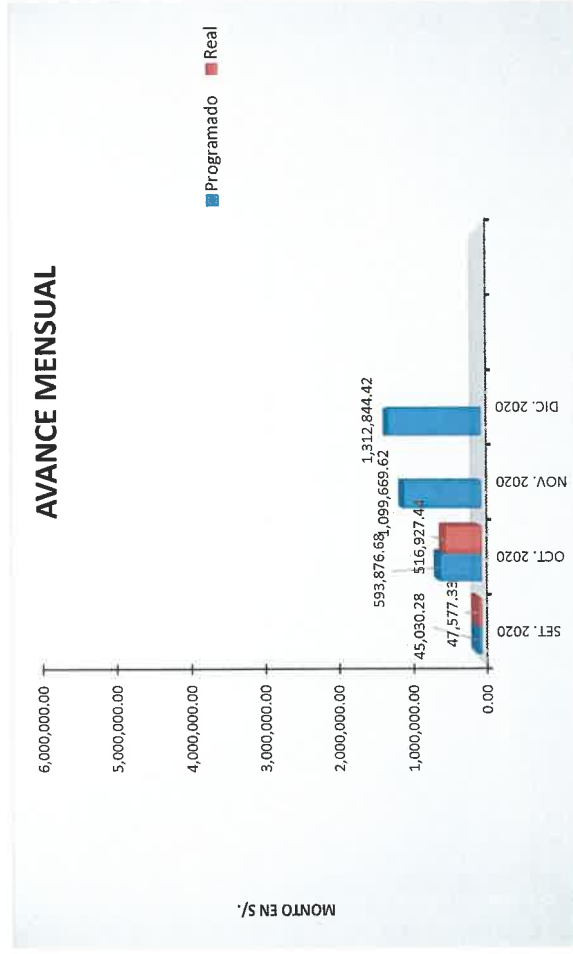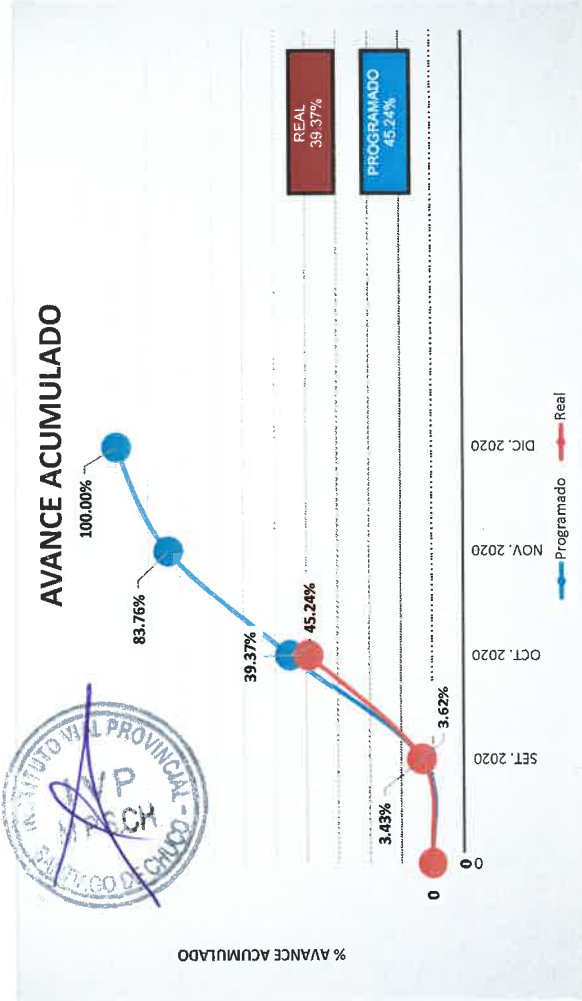

28

ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG. 7.00 KM; EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG. 11.65 KM, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"

CONTRATO: : N° 009-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL LA CHIRA



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD



EVALUACION DEL AVANCE VALORIZADO RESPECTO AL PROGRAMADO

PRESUPUESTO	MONTO TOTAL X PRESUPUESTO	MONTO AVANCE ACUMULADO	
		VALORIZADO	PROGRAMADO
SERVICIO PRINCIPAL	1,312,844.42	516,927.44	593,876.68
TOTAL (Sin IGV)	1,312,844.42	516,927.44	593,876.68
		39.37%	45.24%

Situacion de Obra	$S/.516,927.44 < S/.593,876.68 \implies$	Atrasada
		12.957%

VERIFICACION SI REQUIERE CALENDARIO ACELERADO (ART. 205 DEL RLCE)

a.- Monto Valorizacion Acumulado Programado	593,876.68
b.- Porcentaje art. 205 del Reglamento.	80%
c.- Monto Tope (80% de a)	475,101.34
d.- Monto Valorizacion Acumulado Ejecutado	516,927.44

Se tiene que:
 $(d) > (c) \implies S/.516,927.44 > S/.475,101.34$

Conclusion :

Como el monto de la valorizacion acumulado ejecutada es mayor que el 80% del monto de la valorizacion acumulada programada, la obra se encuentra dentro del atraso permisible, por lo que no es necesario que el contratista presente el calendario acelerado de avance de obra (CAAO)



286

ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG, 7.00 KM; EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG. 11.65 KM, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"

SERVICIO:

CONTRATO : N° 009-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL LA CHIRA



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD



RESUMEN DE METRADOS MANTENIMIENTO PERIODICO VALORIZACION N° 02

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO
01	OBRAS PRELIMINARES		
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	-
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	4.50
02	PAVIMENTOS		
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M.	m3	1,275.00
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M.	m3	3,000.00
03	TRANSPORTE		
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM.	m3k	5,275.00
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM.	m3k	30,940.00
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM.	m3k	315.00
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM.	m3k	3,600.00
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE		
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	5,100.00
05	SEÑALIZACIÓN		
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und	-
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	Und	-
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	Und	-
05.11	SEÑALES INFORMATIVAS	Und	-
06	IMPACTO AMBIENTAL		
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0
07	EMERGENCIA SANITARIA		
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	0.5



“Año de la Universalización de la Salud”

INFORME N° 135-2020-JO/IVPSCH/LFGCH

A : ING. RAFAEL K. VALENCIA REBAZA
GERENTE DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

DE : ING. LUIS F. GUTIERREZ CHÁVEZ
JEFE DE OPERACIONES DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

ASUNTO : EVALUACIÓN Y CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N° 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. LI-115 (DV. – CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG= 7.000 KM” Y “EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUCOBAMBA – QUINUAL LONG= 11.650 KM” DEL DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.



REFERENCIA :

MONITOR DESIGNADO POR IVP	a)	INF. N°015-2020-IVP-MPSCH/CEGB/TA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	b)	INF. N°1118-2020-MPSCH/DIST/SGI
INSPECTOR DE SERVICIO	c)	CARTA N°003-2020/INSPECTOR DE SERVICIO/SJCOO
CONTRATISTA	d)	CARTA N°004-2020/CONSORCIO VIAL LA CHIRA/RLJQQ

FECHA : SANTIAGO DE CHUCO, 27 DE NOVIEMBRE DE 2020

Por medio del presente, le expreso mi cordial saludo y afecto, a su vez presento la VALORIZACIÓN N°02 del SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. LI-115 (DV. – CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG= 7.000 KM” Y “EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUCOBAMBA – QUINUAL LONG= 11.650 KM” DEL DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, correspondiente al mes de octubre (del 01 al 31) de 2020, la cual fue elaborada por el CONSORCIO VIAL LA CHIRA y alcanzada al Inspector de servicio mediante documento de referencia d); este a su vez dio su Conformidad y la ingresó a la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad) con documento de referencia c) para realizar el trámite correspondiente.

Para el pago de la VALORIZACIÓN N° 02, se debe contar con la CONFORMIDAD del área responsable (Sub Gerencia de Infraestructura) y posteriormente se dará la APROBACIÓN del área usuaria (Instituto Vial Provincial de Santiago de Chuco), según se estipula los Términos de Referencia del D.U. N° 070-2020 para los Mantenimientos Viales de los caminos vecinales de la provincia de Santiago de Chuco.

Dentro de este marco, a su vez contando con la CONFORMIDAD de VALORIZACIÓN N° 02 del área responsable (documento de referencia b); siguiendo el trámite correspondiente; esta Jefatura de Operaciones del IVP de Santiago de Chuco, como parte de sus funciones, realizó la evaluación dicha documentación por medio del Monitor designado, el Ing. Carlos Enrique Geldres Barriga, la cual se detalla en su informe respectivo (documento de referencia a); de esta manera se dará COMFORMIDAD (de no haber observaciones); a fin de dar paso a la evaluación para la APROBACIÓN por parte de su persona.

I. INFORME GENERAL:

A) INFORMACIÓN TÉCNICA:

Según lo detallado y analizado en el Informe del Monitor designado, la Sub Gerencia de Infraestructura (área responsable) y del Inspector concerniente a la VALORIZACIÓN N° 02 (del 01 al 31 de octubre) de la Fase II: MANTENIMIENTO PERIÓDICO del servicio en mención, presentada por el Contratista, se tiene la siguiente información resumida a considerar:

A) DEL AVANCE EJECUTADO

Los metrados ejecutados son:

TRAMO: EMP. LI-115 (DV. – CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO)

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATADO	CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS				% EJECUTADO
				ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR EJECUTAR	
1.00	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	0.00	0.50	0.50	0.50	50.00%
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	7.00	0.00	3.50	3.50	3.50	50.00%
2.00	PAVIMENTOS							
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	981.77	0.00	0.00	0.00	981.77	0.00%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	2786.11	0.00	0.00	0.00	2,786.11	0.00%
3.00	TRANSPORTE							
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	4521.46	0.00	0.00	0.00	4,521.46	0.00%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	24415.87	0.00	0.00	0.00	24,415.87	0.00%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	259.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	2978.50	0.00	0.00	0.00	2,978.50	0.00%
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE							
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	7000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00%
5.00	SEÑALIZACION							
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00%
05.02.	SEÑALES PREVENTIVAS	und	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00%
05.03.	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00%
05.04.	SEÑALES INFORMATIVAS	und	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00%
6.00	IMPACTO AMBIENTAL							
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00%
7.00	EMERGENCIA SANITARIA							
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	0.00	0.25	0.25	0.75	25.00%

TRAMO: EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUCOBAMBA – QUINUAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATADO	CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS				% EJECUTADO
				ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR EJECUTAR	
1.00	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	0.00	0.50	0.50	0.50	50.00%
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	11.65	0.00	5.80	5.80	5.85	49.79%
2.00	PAVIMENTOS							
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	1712.80	0.00	0.00	0.00	1,712.80	0.00%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	5232.02	0.00	0.00	0.00	5,232.02	0.00%
3.00	TRANSPORTE							
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	8332.77	0.00	0.00	0.00	8,332.77	0.00%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	45002.38	0.00	0.00	0.00	45,002.38	0.00%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	434.78	0.00	0.00	0.00	434.78	0.00%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	4999.95	0.00	0.00	0.00	4,999.95	0.00%
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE							
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	11650.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00%
5.00	SEÑALIZACION							
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00%
05.02.	SEÑALES PREVENTIVAS	und	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00%
05.03.	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00%
05.04.	SEÑALES INFORMATIVAS	und	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00%
6.00	IMPACTO AMBIENTAL							
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0.94	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00%
7.00	EMERGENCIA SANITARIA							
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	0.00	0.25	0.25	0.75	25.00%

Las partidas que se vienen ejecutando a la fecha corresponden a las obras preliminares (movilización y desmovilización de equipos, trazo y replanteo), asimismo, se está ejecutando las partidas de colocación de pavimento (capa nivelante y afirmado) por lo cual se ejecuta a su vez las partidas de transporte de material excedente; también se realizó parte de la partida reconformación de cunetas; finalmente la partida de emergencia

sanitaria COVID 19 se ejecutó a un 25%. Todo viene siendo ejecutado conforme a las normas de evaluación, dentro de los lineamientos y Especificaciones Técnicas establecidos en el Plan de Trabajo, elaborado por el Contratista y previamente aprobado por la Entidad.

En cuanto al avance acumulado ejecutado respecto al programado (curva S) tenemos el siguiente resumen:

N° VAL.	MES	PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCE MENSUAL ACUM.	
				EJECUTADO	PROGRAMADO
2	OCTUBRE	01/10/2020	31/10/2020	39.37%	45.24%

Se observa un porcentaje de avance NEGATIVO del **-5.87%**, lo cual significa que la ejecución está atrasada, sin embargo, dicho porcentaje es mayor al 80% de lo programado (87.02%) por lo que no supone la elaboración de cronograma acelerado.

B) DEL MONTO VALORIZADO

De acuerdo con las actividades ejecutadas se tiene una valorización con la siguiente configuración:

N° Valorización	Valorización Bruta	MONTO A PAGAR	IGV	Valorización del mes
		S/IGV		

N° 01. Septiembre	S/.40,319.77	S/.40,319.77	S/.7,257.56	S/.47,577.33
N° 02. Octubre	S/.397,754.32	S/.397,754.32	S/.71,595.78	S/.469,350.10
N° 03. Noviembre	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00
N° 04. Diciembre	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00

Parcial	S/.438,074.09	S/.438,074.09	S/.78,853.34	S/.516,927.43
---------	---------------	---------------	--------------	---------------

ADICIONALES

0	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00
---	---------	---------	---------	---------

Total General	S/.438,074.09	S/.438,074.09	S/.78,853.34	S/.516,927.43
----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Se observa que la VALORIZACIÓN N° 02 del mes de octubre corresponde a un monto de **S/. 469,350.10 (inc. IGV)**.

C) DE LA RETENCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)

Según la CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍAS del contrato de servicio, estipula una retención del 10% como garantía de FIEL CUMPLIMIENTO del monto contractual total, el cual será retenido de manera particionada de las dos primeras valorizaciones según lo estipula el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado en su artículo 149° "Garantía de fiel cumplimiento", inciso 149.5, para servicios, como se muestra en el siguiente cuadro:

MONTO CONTRACTUAL	RETENCIÓN G.F.C. (10%)	RETENCIÓN EN CADA VAL.	
		VAL. 01 (10% DE VAL.)	VAL. 02 (SALDO)
S/. 1,581,740.26	S/. 158,174.03	S/. 4,757.73	S/. 153,416.30

Por lo cual se tiene el siguiente detalle:



➤ VALORIZACIÓN BRUTA	S/.	397,754.32
➤ IGV (18%)	S/.	71,595.78
➤ <u>VALORIZACIÓN NETA</u>	<u>S/.</u>	<u>469,350.10</u>
➤ <u>RETENCIÓN G.F.V.</u>	<u>S/.</u>	<u>153,416.30</u>
➤ SALDO A COBRAR	S/.	315,933.80

El saldo a cobrar por la VALORIZACIÓN N° 02 del 01 al 31 del mes de octubre es de **S/. 315,933.80 (TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 80/100 NUEVOS SOLES) incluido el I.G.V.**

D) DE PENALIDADES PRESENTADAS

No se presentó ninguna ocurrencia que suponga la aplicación de PENALIDAD según las estipulaciones del contrato de servicio de en su CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.

III. CONCLUSIONES

Tomando en cuenta todo lo analizado anteriormente, se hace las siguientes conclusiones:

- ❖ La diferencia entre el avance ejecutado respecto al programado arroja un **porcentaje negativo de -5.87%, pero supera el 80% de lo programado.**
- ❖ El saldo a pagar por la VALORIZACIÓN N° 02 del mes de octubre es de **S/. 315,933.80 (TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 80/100 NUEVOS SOLES inc. IGV).**
- ❖ **No se presentaron PENALIDADES.**
- ❖ Se da **CONFORMIDAD** por parte de la oficina de Jefatura de Operaciones del IVP Santiago de Chuco a la VALORIZACIÓN N° 02 del servicio en mención.

IV. RECOMENDACIONES

Se recomienda **APROBAR** la presente VALORIZACIÓN N° 02 por su persona, a fin de realizar el pago correspondiente del CONSORCIO VIAL LA CHIRA, conforme a lo estipulado en el cronograma programado del Plan de Trabajo del servicio y a lo ejecutado en campo. De igual modo, se sugiere seguir las recomendaciones indicadas en el Informe del Monitor designado (documento de referencia a).

Es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y fines.

ATENTAMENTE


“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

INFORME N° 015-2020-IVP-MPSCH/CEGB/TA

A : Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Santiago Chuco

DE : Ing. Carlos Enrique Geldres Barriga
Técnico Administrativo del Área del IVP – MSCH – La Libertad

ASUNTO : INFORME DE VALORIZACION N° 02 - OCTUBRE


2020
H: 8:30 p.m.

REFERENCIA :-(1) Servicio: “MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: EMP.LI-115 (CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.=7.000 KM. Y EMP.911(SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL, LONG.=11.650 KM DEL DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD.

- CARTA N° 003-2020-CONSORCIO VIAL LA CHIRA/RL/JQQ
- CARTA N° 001-2020/INSPECTOR DE SERVICIO/ADRO
- INFORME N° 175 – 2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH
- INFORME N° 1004-2020-MPSCH/DIST/SGI
- CONTRATO N°009-2020-MPSCH-LOG.
- D.U.N° 070-2020

FECHA : Santiago de Chuco, 24 de Noviembre del 2020

Previo cordial saludo y afecto, por medio del presente tengo a bien manifestarle con respecto al asunto de la referencia lo siguiente:
En el **Contrato de Servicio N° 009-2020-MPSCH/LOG**, se tiene tres tramos a los cuales se les denominara a cada uno por un numero romano: **Tramo I** y **Tramo II**, que corresponde a cada una de las tres rutas como veremos seguidamente:

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Ejecución de Servicio Tramo I: MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: EMP.LI-115 (CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO), LONG. =7.000 KM. DEL DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD

UBICACIÓN DEL TRAMO I : 7.000 Km

Localidades : Dv. Chagavara – La Chira – LD.Ancash (Tutuarco)
Distrito : Sitabamba
Provincia : Santiago de Chuco
Región : La Libertad

Coordenadas Geográficas Inicio

Latitud : 9111420 N
Longitud : 193095 E
Altitud : 3,657.00 m.s.n.m.

Coordenadas Geográficas Final

Latitud : 9105975.49 N
Longitud : 196473.54 E
Altitud : 4,197.08 m.s.n.m.

Ejecución de Servicio II : MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: EMP.911(SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL, LONG. =11.650 KM, DEL DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD.

UBICACIÓN DEL TRAMO II : 11.650 Km

Localidades : (Sitabamba) – Uchucubamba - Quinual
Distrito : Sitabamba
Provincia : Santiago de Chuco
Región : La Libertad

Coordenadas Geográficas Inicio

Latitud : 9111712 N
Longitud : 199344 E
Altitud : 3,071 m.s.n.m.

Coordenadas Geográficas Final

Latitud : 9108076 N
Longitud : 200335 E
Altitud : 3,672 m.s.n.m.



RESPONSABLES DEL SERVICIO

EJECUTOR:

Convocatoria del servicio : PES N° 001-2020-MPSCH/CS-2da
Fuente de financiamiento : Recursos por Operaciones Oficio de Credito
Modalidad Contratación : a Suma Alzada
Contrato de Servicio : N° 009-2020-MPSCH/LOG
Decreto de Urgencia : N° 070-2020
Fecha de Suscripción : 28-08/2020
Contratista : CONSORCIO VIAL LA CHIRA
(ECAN INGENIERIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – ECAN INGENIERIA S.R.L. y CORPORACION QUIPUZCOA ARANDA S.A.C.)

Monto Referencial del Servicio : S/. 1,589,688.70 inc. el IGV.
Monto del Contrato de Servicio : S/. 1,581,740.26 inc. el IGV
Adelanto Directo : No aplica
Fecha Entrega Terreno : 29-08-2020 (Elaboración del Plan de Trabajo)
Fecha de Conformidad de P. T : 21-09-2020
Fecha de Inicio de Servicio M.P. : 22-09-2020
Plazo de Ejecución : 500 DIAS CALENDARIOS
Fecha Límite de ejecución M.P : 31 de Diciembre del 2020
Inicio Plazo de Servicio Contractual : 29-08-2020
Fecha Término de Servicio Contractual : 31-12-2021

INSPECCIÓN

Contrato Inspección : N° 034-2020-MPSCH-LOG
Decreto de Urgencia : N° 070-2020
Fecha Contrato Inspección : 24-08-2020
Plazo Prestación Inspección : 120 días calendarios
Monto Contrato Inspección : S/. 17,717.50 inc. el IGV

2. ANTECEDENTES.

Mediante la CARTA N° 004-2020/CONSORCIO VIAL LA CHIRA/RL/JQQ, con fecha 31/10/2020, la empresa CONSORCIO VIAL LA CHIRA (ECAN INGENIERIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – ECAN INGENIERIA S.R.L. y CORPORACION QUIPUZCOA ARANDA S.A.C.), con su representante común el Sr. Julio Cesar Quipezcoa Quezada, alcanza la VALORIZACION DE SERVICIO N° 02, correspondiente al mes de Octubre del 2020, del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: EMP.LI-115 (CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO), LONG. =7.000 KM; EMP.911(SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL, LONG. =11.650 KM, DEL DISTRITO DE SITABAMBA DEL DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD”.

Mediante CARTA N 003-2020/INSPECTOR DE SERVICIO/SJCOO, con fecha 05/11/2020, emitido por el inspector Ing. **Smith Jean Carlos Otiniano Oliva**, alcanza INFORME DE INSPECTOR DE SERVICIO N° 02, solicitando PAGO N° 02 del Contrato de Servicio N° 009-2020-MPSC-LOG, que consiste en los caminos vecinales denominado:” SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: EMP.LI-115 (CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO), LONG. =7.000 KM; EMP.911(SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL, LONG. =11.650 KM, DEL DISTRITO DE SITABAMBA DEL DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD”.

Mediante INFORME N° 203-2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH, con fecha 23 de Octubre del 2020, el Ing. **Hermes Martin Meléndez Tamayo**, Jefe (e) División de Supervisión y Liquidación de Obras – MPSCH, OTORGA LA CONFORMIDAD a la VALORIZACION DE SERVICIO N° 02, del mes de Octubre del 2020, del Contrato de Servicio N° 009-2020-MPSC-LOG, que consiste en los caminos vecinales denominado:” SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: EMP.LI-115 (CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO), LONG. =7.000 KM; EMP.911(SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL, LONG. =11.650 KM, DEL DISTRITO DE SITABAMBA DEL DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD”.

Mediante INFORME N° 1118-2020-MPSCH/DIST/SGI, de fecha 17/11/2020, el Ing. DAVID IVAN SILVA TORRES, Sub Gerente de Infraestructura-MPSC, evalúa y revisa dando la CONFORMIDAD DE PAGO de la VALORIZACION DE SERVICIO N° 02+ de la empresa contratista CONSORCIO VIAL LA CHIRA, por los trabajos realizados en el Servicio de MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: EMP.LI-115 (CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO)LONG. =7.000 KM. Y EMP.911(SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL, LONG. =11.650 KM, DEL DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD.

3. **ANÁLISIS DEL TECNICO ADMINISTRATIVO.**

Para la ejecución del servicio de Mantenimiento Rutinario y Periódico del Camino Vecinal TRAMO I: EMP.LI-115 (CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO)LONG. =7.000 KM, DEL DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD en el proceso de la licitación pública N° 001-2020-MPSC/CS, la empresa contratista CONSORCIO VIAL LA CHIRA, ha sido favorecida con la buena pro, por su monto ofertado de S/. 593,682.67 inc. IG.V.

Para la ejecución del servicio de Mantenimiento Rutinario y Periódico del Camino Vecinal TRAMO II: EMP.911(SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL, LONG. =11.650 KM DEL DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD en el Proceso Especial de Selección N° 001-2020-MPSC/CS, la empresa contratista CONSORCIO VIAL LA CHIRA, ha sido favorecida con la buena pro, por su monto ofertado de S/. 988,057.59 inc. IG.V.

Por lo tanto, la sumatoria de los dos tramos nos da el monto contractual que asciende a la suma de S/. 1,581,740.26, inc. IGV, son: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 26/100 SOLES.

Evaluando la documentación adjunta de la VALORIZACION DE SERVICIO N° 02, se obtiene el resumen siguiente como podemos apreciar en los cuadros siguientes para el TRAMO I: EMP.LI-115 (CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG. =7.000 KM, DEL DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD, tiene un presupuesto para la Fase II: Mantenimiento Periódico de S/. 492,756.62, (CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 62/100 SOLES).

En el mes de Octubre se ejecutaron las siguientes partidas:

Trazo y Replanteo se realizó en el tramo los 1.50 Km, dando un valor de S/. 378.68;

Capa nivelante e=0.05m, se ejecutó 500 m3, con un costo de S/. 15,430.00;

Material Granular de Cantera e= 0.15m, se ejecutó 1,125.00 m3, por un valor de S/. 65,880.00;

Transporte de Material Granular hasta 1 Km, se ejecutó 1,480.00 m3k, dando un valor de S/. 16,620.40;

Transporte de Material Granular mayor a 1 Km, se ejecutó 8,740 m3k, dando un valor de S/. 17,130.40;

Transporte de Material Excedente hasta 1 Km, se ejecutó 105.00 m3k, dando un valor de S/.950.25;

Transporte de Material Excedente mayor a 1 Km, se ejecutó 1,200 m3k, dando un valor de S/. 2,352.00;

Reconformación de Cunetas, se ejecutó 2,000.00 ml, por un valor de S/. 1,380.00 y

Emergencia Sanitaria COVID 19, se ejecutó 0.25 gbl, haciendo un costo de S/. 5,856.77, obteniéndose el siguiente cuadro del total valorizado:

COSTO DIRECTO		S/. 125,978.50
COSTO INDIRECTO	10%	12,597.85
UTILIDAD	5%	6,298.93
SUB TOTAL		144,875.28
IGV	18%	26,077.55
TOTAL VALORIZADO		170,952.83



Descripción	PRESUPUESTO GENERAL				AVANCE ACTUAL		
	Und	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.	METRADO	VALORIZAD	%
1.00 OBRAS PROVISIONALES							
01.01. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	19,672.13	19,672.13	0.00	0.00	0.00%
01.02. TRAZO Y REPLANTEO	km	7.00	252.45	1,767.15	1.50	378.68	21.43%
2.00 PAVIMENTOS							
02.01. CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	981.77	30.86	30,297.42	500.00	15,430.00	50.93%
02.02. MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	2,786.11	58.56	163,154.60	1,125.00	65,880.00	40.38%
3.00 TRANSPORTE							
03.01. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	4,521.46	11.23	50,776.00	1,480.00	16,620.40	32.73%
03.02. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	24,415.87	1.96	47,855.11	8,740.00	17,130.40	35.80%
03.03. TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	259.00	9.05	2,343.95	105.00	950.25	40.54%
03.04. TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	2,978.50	1.96	5,837.86	1,200.00	2,352.00	40.29%
4.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE							
04.01. RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	7,000.00	0.69	4,830.00	2,000.00	1,380.00	28.57%
5.00 SEÑALIZACION							
05.01. INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	7.00	182.33	1,276.31	0.00	0.00	0.00%
05.02. SEÑALES PREVENTIVAS	und	6.00	918.37	5,510.22	0.00	0.00	0.00%
05.03. SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	4.00	859.68	3,438.72	0.00	0.00	0.00%
05.04. SEÑALES INFORMATIVAS	und	4.00	525.62	2,102.48	0.00	0.00	0.00%
6.00 IMPACTO AMBIENTAL							
06.01. RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0.56	866.95	833.03	0.00	0.00	0.00%
7.00 EMERGENCIA SANITARIA							
07.01. EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	23,427.07	23,427.07	0.25	5,856.77	25.00%
Costo Directo				363,122.05		125,978.50	
GASTOS GENERALES (10%) C.D.		10.00%		36,312.21		12,597.85	
UTILIDAD (5%) C.D.		5.00%		18,156.10		6,298.93	
SUB TOTAL				417,590.36		144,875.28	
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (IGV 18%)		18.00%		75,166.26		26,077.55	
VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO				492,756.62		170,952.83	
PORCENTAJE AVANCE DEL SERVICIO				100.00%		34.69%	

776

Revisando la documentación adjunta de la VALORIZACION DE SERVICIO N° 02, se obtiene el resumen siguiente: Como podemos apreciar en los cuadros siguientes para el TRAMO II: EMP.911(SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL, LONG. =11.650 KM DEL DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD, tiene un presupuesto para la Fase II: Mantenimiento Periódico de S/. 820,087.80, (OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHENTA Y SIETE CON 80/100 SOLES).

En el mes de Octubre se ejecutaron las siguientes partidas: Trazo y Replanteo se realizó en el tramo los 3.00 Km, dando un valor de S/. 757.35; Capa nivelante e=0.05m, se ejecutó 775 m³, con un costo de S/. 24,590.75; Material Granular de Cantera e= 015m, se ejecutó 1,875.00 m³, por un valor de S/. 103,200.00; Transporte de Material Granular hasta 1 Km, se ejecutó 3,795.00 m³k, dando un valor de S/. 37,456.65; Transporte de Material Granular mayor a 1 Km, se ejecutó 22,200.00 m³k, dando un valor de S/. 39,960.00; Transporte de Material Excedente hasta 1 Km, se ejecutó 210 m³k, dando un valor de S/. 1,707.30; Transporte de Material Excedente mayor a 1 Km, se ejecutó 2,400.00 m³k, dando un valor de S/. 4,320.00; Reconformación de Cunetas, se ejecutó 3,100.00 ml, por un valor de S/. 2,046.00 y en Emergencia Sanitaria COVID 19, se ejecutó 0.25 gbl, haciendo un costo de S/. 5,856.77, obteniéndose el siguiente cuadro del total valorizado:

COSTO DIRECTO		S/. 219,894.82
COSTO INDIRECTO	10%	21,989.48
UTILIDAD	5%	10,994.74
SUB TOTAL		252,879.04
IGV	18%	45,518.23
TOTAL VALORIZADO		298,397.27



Descripción	PRESUPUESTO GENERAL				AVANCE ACTUAL		
	Und	METRADO	PRECIO S/.	PARCIALES/.	METRADO	VALORIZAD	%
1.00 OBRAS PROVISIONALES							
01.01. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	g/lb	1.00	22,326.53	22,326.53	0.00	0.00	0.00%
01.02. TRAZO Y REPLANTEO	km	11.65	252.45	2,941.04	3.00	757.35	25.75%
2.00 PAVIMENTOS							
02.01. CAPA NIVELANTE E=0.05M	m ³	1,712.80	31.73	54,347.14	775.00	24,590.75	45.25%
02.02. MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m ³	5,232.02	55.04	287,970.38	1,875.00	103,200.00	35.84%
3.00 TRANSPORTE							
03.01. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m ³ k	8,332.77	9.87	82,244.44	3,795.00	37,456.65	45.54%
03.02. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m ³ k	45,002.38	1.80	81,004.28	22,200.00	39,960.00	49.33%
03.03. TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m ³ k	434.78	8.13	3,534.76	210.00	1,707.30	48.30%
03.04. TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m ³ k	4,999.95	1.80	8,999.91	2,400.00	4,320.00	48.00%
4.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE							
04.01. RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	11,650.00	0.66	7,689.00	3,100.00	2,046.00	26.61%
5.00 SEÑALIZACION							
05.01. INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	11.00	182.37	2,006.07	0.00	0.00	0.00%
05.02. SEÑALES PREVENTIVAS	und	24.00	781.13	18,747.12	0.00	0.00	0.00%
05.03. SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	8.00	719.87	5,758.96	0.00	0.00	0.00%
05.04. SEÑALES INFORMATIVAS	und	4.00	526.68	2,106.72	0.00	0.00	0.00%
6.00 IMPACTO AMBIENTAL							
06.01. RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0.94	1,314.28	1,235.42	0.00	0.00	0.00%
7.00 EMERGENCIA SANITARIA							
07.01. EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	g/lb	1.00	23,427.07	23,427.07	0.25	5,856.77	25.00%
Costo Directo				604,338.84		219,894.82	
GASTOS GENERALES (10%) C.D.		10.00%		60,433.88		21,989.48	
UTILIDAD (5%) C.D.		5.00%		30,216.94		10,994.74	
SUB TOTAL				694,989.66		252,879.04	
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (IGV 18%)		18.00%		125,098.14		45,518.23	
VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO				820,087.80		298,397.27	
PORCENTAJE AVANCE DEL SERVICIO				100.00%		36.39%	

Visto la documentación adjunta de la VALORIZACION DE SERVICIO N° 02, se observa el presupuesto contratado para el Mantenimiento Periódico de la Fase II, obteniéndose un monto de **S/. 1,312,844.42**, son (UN MILLON TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 42/100 SOLES).

Se tiene un monto total valorizado en Octubre que suma **S/. 469,350.10** (CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 10/100 SOLES). Y un porcentaje promedio de todo el mantenimiento periódico valorizado en octubre es de **35.75%**.

MANTENIMIENTO PERIODICO			
PAQUETE 1	PRESUP. PERIODICO	VOLORIZ. N° 02	% AVANCE
TRAMO I	492,756.62	170,952.83	34.69
TRAMO II	820,087.80	298,397.27	36.39
TOTAL	1,312,844.42	469,350.10	35.75

Según Contrato de Servicio de la referencia, en la cláusula séptima se da la autorización para la retención del 10% por Garantía de Fiel Cumplimiento, la que se detalla a continuación:

RETENCION DEL CONTRATO EN DOS ARMADAS				
PAQUETE 1	PRESUPUESTO	10%	SETIEMBRE	OCTUBRE
TRAMO I	593,682.67	59,368.27	29,684.13	29,684.13
TRAMO II	988,057.59	98,805.76	49,402.88	49,402.88
TOTAL	1,581,740.26	158,174.03	79,087.01	79,087.01

En el cuadro anterior se dividió en dos armadas para hacer la retención del 10% de acuerdo a contrato. Por lo que la retención que se realizó en la Valorización N° 01- Setiembre debe de restarse de la retención total que haciende a **S/. 158,174.03** (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILCIENTO SETENTA Y CUATRO CON 03/100 SOLES), para obtener el monto a descontar en la Valorización N° 02 – Octubre.

4. CONCLUSIÓN:

Como se ha podido apreciar en la Valorización N° 02 – Octubre, se ha obtenido un monto total valorizado de **S/. 469,350.10** (CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 10/100 SOLES).

Se obtuvo un porcentaje de avance promedio de **35.75 %** en la Valorización N° 02 – Octubre, por lo que se encuentra **atrasada en 6.06%**.

A continuación, se realiza el cuadro de detalle de los avances realizados durante el mes de Octubre, por la cual vemos que en el Tramo I: **EMP.LI-115 (CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG. =7.000 KM, DEL DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD**, esta **atrasada en 6.63%**, y en el Tramo II: **EMP.911(SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL, LONG. =11.650 KM DEL DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD**, esta **atrasada en 5.71%**.

AVANCES SEGUNDA VALORIZACION				
PAQUETE 1	PROGRAMADOS		EJECUTADOS	
	FISICO S/.	%	FISICO S/.	%
TRAMO I	203,622.24	41.32%	170,952.83	34.69%
TRAMO II	345,224.16	42.10%	298,397.27	36.39%
TOTAL	548,846.40	41.81%	469,350.10	35.75%

El monto a cancelar a la empresa contratista CONSORCIO VIAL LA CHIRA asciende a S/. **469,350.10** (CATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 10/00 SOLES). De la cual se debe realizar la retención de 10% Garantía de Fiel Cumplimiento.

Esta Valorización de Servicio N° 02, se está alcanzando al Jefe de Operaciones del IVP-SCHP, Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez, para el trámite respectivo.

5. **RECOMENDACIÓN:**

Se pide al residente como al inspector que tengan permanencia en obra, para el control de los trabajos a realizarse y que en el panel fotográfico estén presentes todos los profesionales que participan en este servicio. En todo informe deben colocar la información digital CD (con el contenido de la información). El formato digital debe contener toda la información presentada en físico tanto de la Empresa Constructora como de la Inspección.

La empresa contratista debe presentar los informes en los plazos establecidos. Cumplir con mayor celo y responsabilidad sus obligaciones contractuales. Presentar los resultados con su análisis respectivo, de los Controles de Calidad ejecutados de los materiales usados en el periodo informado. Se debe adjuntar los análisis de compactación realizados de los tramos ejecutados. Las fichas de Covid 19, deben estar llenados con la información respectiva.

El Inspector debe **revisar** el Informe de la Residencia en el contenido y orden establecido de manera estricta **antes de presentar la valorización a la Entidad**. El Informe del Inspector debe también, ser ordenado mediante separadores y completo de acuerdo al contenido solicitado.

De no cumplir con la información anterior en la siguiente valorización **esta no podrá ser aprobada**.

Se recomienda **Aprobar La Valorización N° 02** y que siga el trámite correspondiente para su pago respectivo a la Empresa Contratista CONSORCIO VIAL LA CHIRA y de esta manera continúen los trabajos de ejecución del Servicio: **MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: EMP.LI-115 (CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO), LONG. =7.000 KM. Y EMP.911 (SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL, LONG. = 11.650 KM DEL DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD** por el periodo comprendido para las diferentes fases de ejecución es entre el 20/09/2020 hasta el 31/12/2020 para la fase I y II, como desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021 para la fase III.

Se sugiere su CANCELACION respectiva en cumplimiento de las cláusulas contractuales, realizando la retención 10%, si ya se aplicó obviarla.

Sin otro particular, me suscribo de Usted, no sin antes reiterar mi estima personal.

Atentamente,


Carlos E. Geldres Barriga
INGENIERO CIVIL
R. CIP 70737





Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



772

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

INFORME N° 1118 - 2020-MPSCH/DIST/SGI


A : ING. RAFAEL K. VALENCIA REBAZA
Gerente de IVP de la MPSCH

DE : ING. DAVID IVAN SILVA TORRES
Sub Gerente de Infraestructura – MPSCH

ASUNTO : CONFORMIDAD DE VALORIZACION N° 02 CONTRATISTA – CONTRACTUAL
(TRAMO 1.1 Y 1.2)

REFERENCIA : (01) INFORME N°0203-2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH
(02) CARTA N° 001-2020/INSPECTOR DE SERVICIO/ADRO
(03) “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: EMP LI – 115 (DV – CHAGAVARA) – LA CHIRA – L. D. ANCASH (TUTUARCO) EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.” (1.1)
(04) “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: EMP LI – 911 (SITABAMBA) – UCHUBAMBA – QUINUAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.” (1.2)
(05) CONTRATO DE SERVICIO N° 009-2020-MPSCH-LOG

FECHA : Santiago de Chuco, 17 de Noviembre del 2020




Me es sumamente honroso dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo; por otro lado referente al asunto de la presente manifiesto lo siguiente:

I. BASE LEGAL

- Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 27972 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica
- Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
- Reglamento Nacional de Edificaciones

II. ANTECEDENTE

✓ Mediante el documento de la referencia (01), **INFORME N°0203-2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH**, el Encargada de la División de Supervisión y Liquidación de Obras, con fecha 16 de Noviembre del 2020, da la **CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION N° 02 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO** del contratista **“CONSORCIO VIAL LA CHIRA”**; presentado por el INSPECTOR DE OBRA el Ing. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA INSPECTOR de las obras denominadas: **“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: EMP LI – 115 (DV – CHAGAVARA) – LA CHIRA – L. D. ANCASH (TUTUARCO) EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.” (1.1); “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO**





Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



272

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”
VECINA: EMP LI - 911 (SITABAMBA) - UCHUBAMBA - QUINUAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.” (1.2); quien solicita el **Pago N° 02** por servicios de ejecución de obra al CONTRATISTA **“CONSORCIO VIAL LA CHIRA.”**

III. ANALISIS FINANCIERO

- ✓ En un ANALISIS DEL INFORME DE LA REF. (01); esta SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA MPSCH da la **CONFORMIDAD DE PAGO DE LA VALORIZACION N°02 - POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO** del **CONTRATISTA** según el informe de la ref. (01) se debe pagar según el cuadro adjunto en el informe (01) de la obra: **“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: EMP LI - 115 (DV - CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO) EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.” (1.1); “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: EMP LI - 911 (SITABAMBA) - UCHUBAMBA - QUINUAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.” (1.2);** se detallan los montos a continuación:

EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO								
TRAMO 01: EMP LI - 115 (DV - CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO)								
DESCRIPCION		PRESUPUESTO	VAL N°01 - SEPTIEMBRE	VAL N°02 - OCTUBRE	VAL N°03 - NOVIEMBRE	VAL N°04 - DICIEMBRE	VAL N°05 - DICIEMBRE	TOTAL EJEJECUTADO
COSTO DIRECTO	:	S/ 363,122.05	S/ 16,576.42	S/ 125,978.50				
GASTOS GENERALES (10%)	:	S/ 36,312.21	S/ 1,657.64	S/ 12,597.85				
UTILIDAD (5%)	:	S/ 18,156.10	S/ 826.82	S/ 6,298.93				
SUB TOTAL	:	S/ 417,590.36	S/ 19,062.88	S/ 144,875.28				
IGV (18%)	:	S/ 75,166.26	S/ 3,431.32	S/ 26,077.55				
TOTAL VALORIZADO	:	S/ 492,756.62	S/ 22,494.20	S/ 170,952.83				S/ 193,447.04
TRAMO 02: EMP LI - 911 (SITABAMBA) - UCHUBAMBA - QUINUAL								
DESCRIPCION		PRESUPUESTO	VAL N°01 - SEPTIEMBRE	VAL N°02 - OCTUBRE	VAL N°03 - NOVIEMBRE	VAL N°04 - DICIEMBRE	VAL N°05 - DICIEMBRE	TOTAL EJEJECUTADO
COSTO DIRECTO	:	S/ 604,338.84	S/ 18,484.25	S/ 219,894.82				
GASTOS GENERALES (10%)	:	S/ 60,433.88	S/ 1,848.43	S/ 21,989.48				
UTILIDAD (5%)	:	S/ 30,216.94	S/ 924.21	S/ 10,994.74				
SUB TOTAL	:	S/ 694,989.67	S/ 21,256.89	S/ 252,879.04				
IGV (18%)	:	S/ 125,098.14	S/ 3,828.24	S/ 45,518.23				
TOTAL VALORIZADO	:	S/ 820,087.80	S/ 25,085.13	S/ 298,397.27				S/ 323,496.40
RESUMEN DE PAGO								
		VAL N°01	VAL N°02					
COSTO DIRECTO	S/	35,060.67	S/ 345,873.32					
GASTOS GENERALES (10%)	S/	3,506.07	S/ 34,587.33					
UTILIDAD (5%)	S/	1,753.03	S/ 17,293.67					
SUB TOTAL	S/	40,319.77	S/ 397,754.32					
IGV (18%)	S/	7,257.56	S/ 71,595.78					
TOTAL VALORIZADO	S/	47,577.33	S/ 469,350.10					

FUENTE: ELABORACION PROPIA

[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 SUB GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
 Calle Sivia Torres



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019

E-mail: mpsch@terra.com.pe

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

- ✓ Según el contrato de la ref. (05) la obra: **“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: EMP LI – 115 (DV – CHAGAVARA) – LA CHIRA – L D. ANCASH (TUTUARCO) EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.” (1.1); “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: EMP LI – 911 (SITABAMBA) – UCHUBAMBA – QUINUAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.” (1.2)”; en su cláusula setima nos dice que. “el contratista da la autorización para la retención del 10% de la Garantía fe fiel cumplimiento a través de una carta de autorización; adjunto cuadro de retenciones:**

TRAMOS	RETENCIONES PROYECTADAS				RETENCIONES REALIZADAS			
	PRESUPUESTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE		VAL N°01	VAL N°02	VAL N°03	VAL N°04
1.01	S/ 593,682.67	S/ 29,684.13	S/ 29,684.13	SEPTIEMBRE	S/ 4,757.73			
1.02	S/ 988,057.59	S/ 49,402.88	S/ 49,402.88	OCTUBRE		S/ 46,935.01		
TOTAL CONTRATADO	S/ 1,581,740.26	S/ 79,087.01	S/ 79,087.01	NOVIEMBRE				
RETENCION 10%	S/ 1,581,740.26	S/ 158,174.03		DICIEMBRE				

FUENTE: ELABORACION PROPIA

- ✓ El **“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: EMP LI – 115 (DV – CHAGAVARA) – LA CHIRA – L D. ANCASH (TUTUARCO) EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.” (1.1); “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: EMP LI – 911 (SITABAMBA) – UCHUBAMBA – QUINUAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.” (1.2)”; tiene proyectada la retención de garantía de 10% de fiel cumplimiento por el monto de S/. 46,935.01 (CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 01/100 SOLES) monto que abarca la cantidad de retención de los dos tramos 01.01 y 01.02.**

IV. ANALISIS TECNICO

- ✓ La obra: **“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: EMP LI – 115 (DV – CHAGAVARA) – LA CHIRA – L D. ANCASH (TUTUARCO) EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.” (1.1); “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: EMP LI – 911 (SITABAMBA) – UCHUBAMBA – QUINUAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.” (1.2)”; se ejecutó en dos valorizaciones, a continuación se describe los porcentajes y montos:**


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 Dpto. de Infraestructura y Obras Públicas
 Torres



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019

E-mail: mpsch@terra.com.pe

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

CALCULO DE % DE AVANCE EJECUTADO Y PROGRAMADO								
TRAMO 1.01	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	PROGRAMADO	ACUMULADO	%	% ACUM	PROGRAMADO	ACUMULADO	%	MONTO
22/09/2020								
30/09/2020	S/ 21,534.99	S/ 21,534.99	4.37%	4.37%	S/ 22,494.20	S/ 22,494.20	4.56%	4.56%
31/10/2020	S/ 203,622.24	S/ 225,157.23	41.32%	45.69%	S/ 170,852.83	S/ 193,447.03	34.69%	39.26%
30/11/2020	S/ 188,081.13	S/ 413,238.36	38.17%	83.86%				
31/12/2020	S/ 79,518.26	S/ 492,756.62	16.14%	100.00%				
TOTAL	S/ 492,756.62		100.00%		S/ 193,447.03		39.26%	
TRAMO 1.02	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	PROGRAMADO	ACUMULADO	%	% ACUM	PROGRAMADO	ACUMULADO	%	MONTO
22/09/2020								
30/09/2020	S/ 23,495.29	S/ 23,495.29	2.86%	2.86%	S/ 25,083.13	S/ 25,083.13	3.06%	3.08%
31/10/2020	S/ 345,224.16	S/ 368,719.45	42.10%	44.96%	S/ 296,397.27	S/ 323,460.40	36.39%	39.44%
30/11/2020	S/ 317,711.81	S/ 686,431.26	38.74%	83.70%				
31/12/2020	S/ 133,656.54	S/ 820,087.80	18.30%	100.00%				
TOTAL	S/ 820,087.80		100.00%		S/ 323,460.40		39.44%	

FUENTE: ELABORACION PROPIA

- ✓ El "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: **EMP LI - 115 (DV - CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO)** EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD." (1.1); se encuentra al **39.26%** en sus Valorización N° 02 del periodo **01** de Octubre del 2020 al **31** de Octubre del 2020.
- ✓ El "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: **EMP LI - 911 (SITABAMBA) - UCHUBAMBA - QUINUAL** EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD." (1.2); se encuentra al **39.44%** en sus Valorización N° 02 del periodo **01** de Octubre del 2020 al **31** de Octubre del 2020.
- ✓ El "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: **EMP LI - 115 (DV - CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO)** EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD." (1.1); "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: **EMP LI - 911 (SITABAMBA) - UCHUBAMBA - QUINUAL** EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD." (1.2); total valorizado respecto al presupuesto base por el monto de S/. 469,350.10 con una retención de garantía de 10% de garantía de fiel cumplimiento de S/. 46,935.01; SE A VALORIZADO el 3.37% en relación al monto total del contrato.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 OFICINA DE INGENIERIA DE OBRAS
 INGENIERO EN OBRAS DE SANEAMIENTO
 Y AGUAS
 [Firma manuscrita]



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ La **Valorización Bruta N° 02 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: EMP LI – 115 (DV – CHAGAVARA) – LA CHIRA – L D. ANCASH (TUTUARCO) EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.” (1.1); del contratista fue por S/. 125,978.50 (CIENTO VEINTI CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 50/100 SOLES).**
- ✓ La **Valorización Bruta N° 02 POR SERVICIO DE “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: EMP LI – 911 (SITABAMBA) – UCHUBAMBA – QUINUAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.” (1.2) del contratista fue por S/. 219,894.82 (DOSCIENTOS DIEZSINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 82/100 SOLES).**
- ✓ Se recomienda hacer el descuento por el monto de la **RETENCION DE 10 % GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO ES DE S/. 46,935.01 (CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 01/100 SOLES) INCLU IGV;** si esta recomendación ya se aplicó obviarla.
- ✓ La Amortización del Adelanto Directo: -
- ✓ La Amortización del Adelanto de Materiales: -
- ✓ Por lo tanto el monto a cancelar al **CONTRATISTA POR CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA VALORIZACION N°02 – POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO;** asciende a S/. 469,350.10 **(CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CINCUENTA CON 10/100 SOLES) INCL. IGV;** se recomienda hacer la retención de fiel cumplimiento.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y acciones que estime por conveniente, salvo mejor parecer.

Atentamente,

Adjunto:

- Referencias
- Val N°02 ()
- Digital ()


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe
Gerente de Infraestructura
Jorge Silva Torres



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



INFORME N° 203 – 2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH



A : ING° DAVID IVAN SILVA TORRES
SUB-GERENTE DE INFRAESTRUCTURA MPSCH

DEL : ING. HERMES M. MELENDEZ TAMAYO
JEFE (e) DIVISIÓN DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

ASUNTO : VALORIZACIÓN DE SERVICIO N°02 – OCTUBRE 2020

REFERENCIA: a) “MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: EMP. LI-115 (DV, CHAGAVARA) – LA CHIRA – LD. ANCASH (TUTUARCO)” Long. 7.000 Km “EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUBAMBA – QUINUAL. Long.11.650 Km., DEL DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD”

b) Carta N°003-2020/INSPECTOR DE SERVICIO/SJCOO
c) Carta N°004-2020/ CONSORCIO VIAL LA CHIRA/RL/JQQ

FECHA : Santiago de Chuco, 13 de Noviembre del 2020

Es grato dirigirme a Usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo, vistos los documentos de la referencia, el suscrito como Jefe de la División de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco **OTORGA LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN N° 02- OCTUBRE 2020** del Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario “MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: EMP. LI-115 (DV, CHAGAVARA) – LA CHIRA – LD. ANCASH (TUTUARCO)” Long. 7.000 Km “EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUBAMBA – QUINUAL. Long.11.650 Km, DEL DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD” y elaborado por el Contratista **CONSORCIO VIAL LA CHIRA** según Contrato de Servicios N° 009-2020-MPSCH-LOG y aprobado por el Inspector de Obra.

Se informa trabajos valorizados en el periodo del 01 al 31 de Octubre 2020. Se adjunta 01 original + 01 copia +CD.

DATOS GENERALES

1.- DENOMINACION

“MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: EMP. LI-115 (DV, CHAGAVARA) – LA CHIRA – LD. ANCASH (TUTUARCO)” Long. 7.000 Km “EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUBAMBA – QUINUAL. Long.11.650 Km, DEL DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD”

2.- UBICACIÓN

- Caseríos : Chagavara, La Chira, Uchubamba, Quinual
- Distrito : Sitabamba
- Provincia : Santiago de Chuco
- Región : La Libertad

3.- DATOS DEL MANTENIMIENTO:

EJECUTOR

- Proceso de Selección : PES-PROG-01-2020-MPSCH/CS
- Contratista : CONSORCIO VIAL LA CHIRA
- Representante Legal : Julio Cesar Quipuzcoa Quezada
- Contrato de Servicios : N° 009-2020-MPSCH-LOG.
- Suscripción de Contrato : 28/08/2020
- Modalidad : A Suma Alzada



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe

- Monto Contratado (inc. IGV)	: S/ 1'581,740.26
- Monto del Tramo (inc. IGV)	: S/ 492,285.01 - S/ 820,559.41
- Factor de Relación	: 1.000
- Plazo de Ejecución Inicial	: 500 Días Calendarios
- Entrega de Terreno	: 29 de Agosto del 2020
- Inicio de Plazo Contractual	: 29 de Agosto del 2020 (Elaboración Plan de Trabajo)
- Inicio de Plazo Fase II	: 22 de Setiembre 2020
- Fecha Término Programado	: 31 de Diciembre del 2020
- Residente de Obra	: Ing. Jean H. Eche Mostacero CIP 92633
- Porcentaje Programado	: 41.81%
- Porcentaje Programado Acumulado	: 45.24%
- Porcentaje Ejecutado	: 35.75%
- Porcentaje Ejecutado Acumulado	: 39.37%
- Estado del Mantenimiento	: Atrasado en un 5.87%
- Monto Valorizado	: S/ 469,350.10



INSPECTOR

- Inspector	: Ing. Smith Jean Carlos Otiniano Oliva CIP 209150
- Contrato de Inspección de Obra	: N° 034-2020-MPSCH-LOG.
- Fecha de Contrato	: 21/08/2020
- Plazo de Prestación de Servicio	: 120 Días Calendario
- Monto Contratado (inc. IGV)	: S/ 17,717.50

4.- ANTECEDENTES

- Con fecha 21 de Agosto del 2020 se firma el Contrato de Servicios N°009-2020-MPSCH-LOG del Mantenimiento Periódico y Rutinario "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: EMP. LI-115 (DV, CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO)" Long. 7.000 Km "EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUBAMBA – QUINUAL Long.11.650 Km., DEL DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD" con la Empresa Contratista CONSORCIO VIAL LA CHIRA por un monto de S/ 1'581,740.26 con un plazo de ejecución de 500 días calendario.
- El día 28 de Agosto del 2020 se firma el Contrato de Inspección de Servicio N°034-2020-MPSCH-LOG con el Consultor Ing. Smith Jean Carlos Otiniano Oliva CIP 209150 por un monto de S/ 17,717.50, con un plazo de ejecución de 120 días calendario.
- Con fecha 29/09/2019 se firma el Acta de Entrega de Terreno con la participación de representantes de todos los involucrados.
- El 22/09/2020 se firma el Acta de Inicio de Obra con una fecha programada de término de servicio del 31 de Diciembre 2020.
- Con fecha 12 de Setiembre el Inspector recepciona la Carta N°002-2020- CONSORCIOS VIAL LA CHIRA/RL/JQQ con la cual el Contratista CONSORCIO VIAL LA CHIRA hace entrega del Plan de Trabajo para su revisión y tramite respectivo
- El Ingeniero Inspector del Servicio mediante Informe N°001-2020/INSPECTOR DE SERVICIO/ADRO MPSCH del 15 de Setiembre del 2020 ingresa por mesa de partes de la Entidad con Expediente Administrativo N° 4428 el Plan de Trabajo aprobado para su Conformidad.
- Mediante INFORME N°119-2020-HMMT/DEYP/SGI/MPSCH, de fecha 18 de Setiembre del 2020 la División de Estudios y Proyectos otorga la Conformidad del Plan de Trabajo y sugiere su aprobación mediante la Resolución Respectiva.
- Con Resolución de Gerencia Municipal N°00312-2020-MPSCH/GM de fecha 28 de Setiembre 2020 de Aprueban el Plan de Trabajo del Mantenimiento Rutinario y Periódico.
- Mediante Carta N°001-2020/INSPECTOR DE SERVICIO/ADRO el Ing. Inspector hace llegar la Valorización de Servicio N°01 – Setiembre 2020 incluyendo la Carta N°003-2020-CONSORCIO VIAL LA CHIRA/RL/JQQ para su revisión y conformidad de pago.



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



267

- Mediante Carta N°003-2020/INSPECTOR DE SERVICIO/SJCOO el Ing. Inspector hace llegar la Valorización de Servicio N°02 – Octubre 2020 adjuntando la Carta N°004-2020-CONSORCIO VIAL LA CHIRA/RL/JQQ para su revisión y conformidad de pago.

5.- DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

- Movilización de Equipos y Maquinaria desde Trujillo a pie de obra. Se ha trasladado la maquinaria que se describe en el informe del Ing. Inspector.
- Ejecución de partida de Trazo y Replanteo de un tramo de 1.50Km. acumulando el 71.43% del tramo con el uso de equipo topográfico completo y dejando monumentados BMs y niveles.
- Colocación de una Capa Nivelante de e=5 cm en un volumen de 500 m3 que representa aproximadamente el 51% % del Metrado total.
- Colocación, conformación, nivelación y compactado de afirmado con material granular en un volumen de 1,480.00 m3 que representa aproximadamente el 33 %
- Extracción, selección, carguío y acumulación o apilamiento en zonas estratégicas, de material granular de cantera en un aproximado de 11,000.00 m3 que representa aproximadamente el 36% del metrado total.
- Implementación de protocolos de seguridad y equipamiento con EPPs para todo el personal.



6.-DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICION:

RESUMEN VALORIZACIÓN N° 02 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (Octubre 2020)

VALORIZACIÓN CONTRACTUAL	SIN IGV		S/. 397,754.32
REINTEGROS (REAJUSTES RECONOCIDOS)	S/. IGV	0.00	S/. 0.00
VALORIZACION BRUTA			S/.397,754.32
AMORTIZACIONES	SIN IGV		S/.0.00 (-)
ADELANTO DIRECTO	S/.	0.00	
ADELANTO PARA MATERIALES	S/.	0.00	
DEDUCCIONES (DQNC)			S/. 0.00
ADELANTO DIRECTO	S/.	0.00	
ADELANTO PARA MATERIALES	S/.	0.00	
VALORIZACION NETA			S/. 397,754.32
I. G. V. 18.00%			S/. 71,595.78
NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA			S/. 469,350.10

SON : CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 10/100 SOLES




Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019

E-mail: mpsch@terra.com.pe



6.- ANALISIS

- Se ha revisado el trámite seguido a los documentos de la referencia generados por el Contratista y el Inspector del Servicio.
- El Ing. Inspector del Servicio, en las conclusiones de su informe, debe ser claro y específico respecto a la aprobación de la Valorización de Servicio correspondiente.
- El Informe de Aprobación de la Valorización del Servicio emitido por el Inspector indica que la valorización está de acuerdo con lo ejecutado y cumple con el contenido de documentos e información técnica requerida y necesaria para el cumplimiento de las metas y objetivos del servicio contratado.
- El mantenimiento se encuentra ATRASADO en 5.87% su ejecución programada.

7.- RECOMENDACIONES


- Se recomienda al Ing. Residente e Ing Inspector que deben presentar la documentación con el número de ejemplares originales y copias establecidos, contenido en formato digital y con el uso de separadores y la numeración requerida.
- Se recomienda al Ing. Residente e Ing Inspector que deben firmar todos los folios de la Valorización de todos los documentos que se presenten para su trámite. El Representante Legal también debe firmar todos los folios
- Presentar registro fotográfico de la ejecución de las partidas con su respectiva descripción.
- Verificar el cumplimiento de plan de trabajo, especialmente la Adecuación e Implementación de Protocolos ante la Emergencia Sanitaria por el Covid 19.

8.- CONCLUSIÓN

- El Ing. Inspector del Servicio, en su informe, APRUEBA la Valorización de Servicio N°02 - Octubre 2020.
- Luego de su revisión, la Jefatura de la División de Supervisión y Liquidación de Obras de la Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, **OTORGA LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN N°02 - OCTUBRE** del Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: EMP. LI-115 (DV, CHAGAVARA) – LA CHIRA – LD. ANCASH (TUTUARCO) " Long. 7.000 Km "EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUBAMBA – QUINUAL Long.11.650 Km., DEL DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD" y elaborado por el Contratista **CONSORCIO VIAL LA CHIRA** y aprobado por el Inspector de Obra y sugiere su **CANCELACION** en cumplimiento de las cláusulas contractuales.

Es todo cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

Ing. Hermes M. Meléndez Tamayo
CIP. 111401
Infa División de Supervisión y Liquidaciones

000265

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO
MESA DE PARTES
 N° Exp. 6216
05 NOV. 2020
 N° Folios: 1 original
 Hora 4:45 Firma [Signature]

CARTA N°003-2020/INSPECTOR DE SERVICIO /SICOO

A : SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA MPSCH

DE : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA - CIP N° 209150
Inspector de Obra.

ASUNTO : ALCANZA INFORME DE INSPECTOR DE SERVICIO VALORIZACION N° 02- PROCESO 1

REFERENCIA : "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM", "EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG.= 11.650 KM", DEL DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

FECHA : 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Inf. 203

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted en calidad de Inspector del Servicio a fin de hacerle llegar la VALORIZACION N° 02 del Consorcio Vial La Chira (CORPORACION QUIPUZCOA ARANDA S.A.C. y ECAN INGENIERIA S.C.R.L.) la cual es aprobada con Informe de Inspector de Servicio N° 02-Octubre 2020, para el Servicio:"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM", "EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG.= 11.650 KM", DEL DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

La presente Valorización corresponde al periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre del 2020 en el cual se tiene un avance de ejecutado del 35.75% y un avance acumulado ejecutado del 39.37%. Frente a un 41.81% de avance programado para el mes de octubre y un avance acumulado programado del 45.24% con lo que se puede concluir que el servicio se encuentra ATRASADO en 5.87%.

CUADRO DE RESUMEN:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO
 GERENCIA MUNICIPAL
PROVEIDO
 PASE a: INFRAESTRUCTURA
 PARA: SU ATENCIÓN POR REVISIÓN
 FECHA: 05.11.20
 GERENCIA MUNICIPAL

[Signature]
 Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
 ING. CIVIL
 CIP. 209150

I-175

Inspector de Mantenimiento Periódico

Proyecto	SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM", - "EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG.= 11.650 KM"
Cliente	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación	SITABAMBA
Contratista	CONSORCIO VIAL LA CHIRA
Inspector	ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA - CIP: 209150
Residente	ING. JEAN HERBERT ECHE MOSTACERO - CIP: 92633

MONTO REFERENCIAL	1,589,688.70
MONTO CONTRATADO	1,581,740.26
MONTO CONTRATADO MANTENIMIENTO PERIODICO	1,312,844.42

ITEM	DESCRIPCION	MONTO VALORIZADO
1.00.00	SUB TOTALES COSTO DIRECTO	S/. 345,873.32
	LA CHIRA (7.00 KM)	S/. 125,978.50
	UCHUCUBAMBA (11.650 KM)	S/. 219,894.82
	GASTOS GENERALES 10%	S/. 34,587.33
	UTILIDAD 5%	S/. 17,293.67
2.00.00	SUBTOTAL	S/. 397,754.32
	REAJUSTES	0.00
3.00.00	SUBTOTAL CON REAJUSTES	S/. 397,754.32
	AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO 10%	S/. 0.00
	AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES 20%	S/. 0.00
4.00.00	SUBTOTAL CON AMORTIZACIONES	S/. 397,754.32
5.00.00	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)	S/. 71,595.78
6.00.00	TOTAL NETO A RECIBIR	S/. 469,350.10
	Porcentaje de avance ejecutado en el mes (%)	35.75%

POR LO TANTO:

Corresponde el pago a favor del CONSORCIO VIAL LA CHIRA, correspondiente a la Valorización N°02 (de 01 al 31 de octubre) por un monto de S/ 469,350.10 (CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 10/100 SOLES).

Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente

Oct
 Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
 ING. CIVIL
 CIP. 209150

Inspector de Mantenimiento Periódico

263

INFORME DE INSPECTOR DE SERVICIO N° 02

(OCTUBRE- 2020)

EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO

FASE: II

1. GENERALIDADES

Conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local.

La Ley Orgánica de Municipalidades señala que las municipalidades provinciales y distritales, dentro del marco de las competencias y funciones específicas, son competentes para promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales.

Mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprobó la reanudación de las actividades: "Mantenimientos, Mejoramiento y Conservación Rutinarios y Periódicos de Vías Nacionales, Departamentales y Locales" y de acuerdo a lo señalado en el numeral 1.2 del Artículo 1 del mencionado decreto supremo, las referidas actividades se encuentran autorizadas para su reanudación de forma automática, una vez que las personas jurídicas que realizan dichas labores registren su "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.

Con Decreto de Urgencia N° 070-2020 se dictó medidas destinadas a generar empleo para la ejecución de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional, departamental y vecinal a efectos de establecer medidas necesarias, en materia económica y financiera, que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco de sus competencias, la ejecución de acciones oportunas para la reactivación de la actividad económica, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento periódico y rutinario de las vías nacionales, departamentales y vecinales. Los trabajos de mantenimiento proyectado facilitan el traslado de los productos agropecuarios de las zonas a intervenir, hasta los centros de consumo, permitiendo garantizar el abastecimiento de los productos a consecuencia de la Emergencia Sanitaria generada por el brote del Coronavirus (COVID-19).

Informe de Inspector N° 02 -Octubre del 2020


Smith Jean Carlos Ciriaco Oliva
ING. CIVIL
CIP. 209150

Inspector de Mantenimiento Periódico

262

Asimismo, en consistencia con las estrategias de desarrollo económico territorial de los gobiernos locales y en armonía y complementariedad con la política del sector para el desarrollo del transporte, es primordial la intervención en vías vecinales a nivel de mantenimiento vial, con la finalidad de mejorar los niveles de integración a través del transporte, priorizando los niveles de seguridad de los usuarios y del transporte terrestre en general.

2. DATOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL SERVICIO:

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM", "EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG.= 11.650 KM", DEL DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.

2.2. N° DE CONTRATO:

Contrato De Sevicio: N° 009-2020-MPSCH-LOG.

2.3. ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

2.4. CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL LA CHIRA

2.5. INSPECTOR:

ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA – CIP N° 209150

2.6. INGENIERO RESIDENTE:

ING. JEAN HERBERT ECHE MOSTACERO – CIP N° 92633

2.7. MONTO DE CONTRATO:

S/. 1,581,740.26

2.8. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO:

S/. 1,312,844.42


Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
ING. CIVIL
CIP. 209150

Inspector de Mantenimiento Periódico

2.9. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:

S/. 237,261.04

2.10. PLAZO DE EJECUCIÓN:

120 DIAS CALENDARIOS

2.11. FECHA DE INICIO:

22 DE SETIEMBRE DEL 2020

2.12. FECHA DE CULMINACIÓN:

31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

3. SITUACION DEL SERVICIO

3.1. PRESENTACION DE VALORIZACION DE EJECUCION DE SERVICIO


Smith Jean Carlos Olindano Oliva
ING. CIVIL
CIP. 209150

Inspector de Mantenimiento Periódico

260

3.2. PRESUPUESTO OFERTADO

EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO)

ITEM	PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL
01	OBRAS PRELIMINARES				21,439.28
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	glb	1.00	S/. 19,672.13	S/. 19,672.13
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	7.00	S/. 252.45	S/. 1,767.15
02	PAVIMENTOS				193,452.02
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	981.77	S/. 30.86	S/. 30,297.42
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	m3	2786.11	S/. 58.56	S/. 163,154.60
03	TRANSPORTE				S/. 106,812.92
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	4521.46	S/. 11.23	S/. 50,776.00
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	24415.87	S/. 1.96	S/. 47,855.11
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	259.00	S/. 9.05	S/. 2,343.95
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	2978.50	S/. 1.96	S/. 5,837.86
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				S/. 4,830.00
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	7000.00	S/. 0.69	S/. 4,830.00
05	SEÑALIZACION				S/. 12,327.73
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	7.00	S/. 182.33	S/. 1,276.31
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	6.00	S/. 918.37	S/. 5,510.22
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	4.00	S/. 859.68	S/. 3,438.72
05.04	SEÑALES INFORMATIVAS	und	4.00	S/. 525.62	S/. 2,102.48
06	IMPACTO AMBIENTAL				S/. 833.03
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0.56	S/. 1,487.56	S/. 833.03
07	EMERGENCIA SANITARIA				S/. 23,427.07
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	S/. 23,427.07	S/. 23,427.07
	COSTO DIRECTO				363,122.05
	COSTO INDIRECTO (10.00%)				S/ 36,312.21
	UTILIDAD (5%)				S/ 18,156.10
	SUB TOTAL				S/ 417,590.36
	IGV (18%)				S/ 75,166.26
	COSTO TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL				S/ 492,756.62


 Smith Jean Carlos Oliniano Oliva
 ING. CIVIL
 CIP. 209150

Informe de Inspector N° 02 -Octubre del 2020

Inspector de Mantenimiento Periódico

259

SITABAMBA - UCHUCUBAMBA - QUINUAL

ITEM	PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL
01	OBRAS PRELIMINARES				25,267.57
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	glb	1.00	S/. 22,326.53	S/. 22,326.53
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	11.65	S/. 252.45	S/. 2,941.04
02	PAVIMENTOS				342,317.52
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	1712.80	S/. 31.73	S/. 54,347.14
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	m3	5232.02	S/. 55.04	S/. 287,970.38
03	TRANSPORTE				S/. 175,783.39
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	8332.77	S/. 9.87	S/. 82,244.44
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	45002.38	S/. 1.80	S/. 81,004.28
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	434.78	S/. 8.13	S/. 3,534.76
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	4999.95	S/. 1.80	S/. 8,999.91
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				S/. 7,689.00
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	11650.00	S/. 0.66	S/. 7,689.00
05	SEÑALIZACION				S/. 28,618.87
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	11.00	S/. 182.37	S/. 2,006.07
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	24.00	S/. 781.13	S/. 18,747.12
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	8.00	S/. 719.87	S/. 5,758.96
05.04	SEÑALES INFORMATIVAS	und	4.00	S/. 526.68	S/. 2,106.72
06	IMPACTO AMBIENTAL				S/. 1,235.42
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0.94	S/. 1,314.28	S/. 1,235.42
07	EMERGENCIA SANITARIA				S/. 23,427.07
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	S/. 23,427.07	S/. 23,427.07
COSTO DIRECTO					604,338.84
COSTO INDIRECTO (10.00%)					S/ 60,433.88
UTILIDAD (5%)					S/ 30,216.94
SUB TOTAL					S/ 694,989.66
IGV (18%)					S/ 125,098.14
COSTO TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL					S/ 820,087.80


 Smith Jean Carlos Olinario Olinario
 ING. CIVIL
 CIP. 200150

Informe de Inspector N° 02 -Octubre del 2020

Inspector de Mantenimiento Periódico

3.3. ASPECTOS TECNICOS DEL SERVICIO

3.3.1. Descripción del Servicio

A continuación, se describirá de manera detallada los trabajos correspondientes al Informe de Inspector N° 02 del mes de octubre:

- Se realizaron trabajos de recorrido y reconocimiento de los tramos: EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG. = 7.00 KM y EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG. = 11.650 KM.
- Se realizó la movilización de equipos y maquinaria a los tramos antes mencionados, entre los cuales hubo: Excavadora, Motoniveladora, Rodillo, Cisterna y Volquetes.
- Se realizaron trabajos de trazo y replanteo, así como pintado de progresivas, corte y acopio de material a cantera en las progresivas ya mencionadas en el cuaderno de obra, en los tramos: EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG. = 7.00 KM y EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG. = 11.650 KM.
- Así como también se verificaron los trabajos de la partida de Emergencia Sanitaria.
- Todo esto se ejecutó verificándose que se cumpla todo lo indicado en el expediente técnico, así como el correcto proceso constructivo.

3.3.2. Aspectos Económicos

- El monto valorizado en el tramo: EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG. = 7.00 KM, es de S/. 170,952.83.
- El monto valorizado en el tramo: EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG. = 11.650 KM, es de S/. 298,397.27.
- El monto a cancelar al contratista asciende a S/. 469,350.10.


Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
ING. CIVIL
CIP. 209150

CONTROL Y SUSTENTO DE METRADOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Proyecto : SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
Tramo: "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM", - "EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG.= 11.650 KM"

Monto Contratado S/. 1,581,740.26
Plazo de ejecucion 120 dias calendarios

Cliete : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO)
Contratista : CONSORCIO VIAL LA CHIRA
Inspector : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA - CIP: 209150
Residente : ING. JEAN HERBERT ECHE MOSTACERO - CIP: 92633

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATADO	CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS			% EJECUTADO
				ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	
1.00	OBRAS PROVISIONALES						
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	0.50	0.00	0.50	50.00%
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	7.00	3.50	1.50	5.00	71.43%
2.00	PAVIMENTOS						
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	981.77	0.00	500.00	500.00	50.93%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	2786.11	0.00	1,125.00	1,661.11	40.38%
3.00	TRANSPORTE						
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	4521.46	0.00	1,480.00	3,041.46	32.73%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	24415.87	0.00	8,740.00	15,675.87	35.80%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	259.00	0.00	105.00	154.00	40.54%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	2978.50	0.00	1,200.00	1,778.50	40.29%
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE						
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	7000.00	0.00	2,000.00	5,000.00	28.57%
5.00	SEÑALIZACION						
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00%
05.02.	SEÑALES PREVENTIVAS	und	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%
05.03.	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00%
05.04.	SEÑALES INFORMATIVAS	und	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00%
6.00	IMPACTO AMBIENTAL						
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0.56	0.00	0.00	0.56	0.00%
7.00	EMERGENCIA SANITARIA						
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	0.25	0.25	0.50	50.00%

257


Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
 ING. CIVIL
 CIP. 209150

CONTROL Y SUSTENTO DE METRADOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Proyecto : SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
Tramo: "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM" , - "EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG.= 11.650 KM"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : SITABAMBA - UCHUCUBAMBA - QUINUAL
Contratista : CONSORCIO VIAL LA CHIRA
Inspector : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA - CIP: 209150
Residente : ING. JEAN HERBERT ECHE MOSTACERO - CIP: 92633

Monto Contratado : S/. 1,581,740.26
Plazo de ejecución : 120 días calendario

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATADO	CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS				% EJECUTADO
				ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR EJECUTAR	
1.00	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	0.50	0.00	0.50	0.50	50.00%
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	11.65	5.80	3.00	8.80	2.85	75.54%
2.00	PAVIMENTOS							
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	1712.80	0.00	775.00	775.00	937.80	45.25%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	5232.02	0.00	1,875.00	1,875.00	3,357.02	35.84%
3.00	TRANSPORTE							
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	8332.77	0.00	3,795.00	3,795.00	4,537.77	45.54%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	45002.38	0.00	22,200.00	22,200.00	22,802.38	49.33%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	434.78	0.00	210.00	210.00	224.78	48.30%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	4999.95	0.00	2,400.00	2,400.00	2,599.95	48.00%
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE							
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	11650.00	0.00	3,100.00	3,100.00	8,550.00	26.61%
5.00	SEÑALIZACION							
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00%
05.02.	SEÑALES PREVENTIVAS	und	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00%
05.03.	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00%
05.04.	SEÑALES INFORMATIVAS	und	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00%
6.00	IMPACTO AMBIENTAL							
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0.94	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00%
7.00	EMERGENCIA SANITARIA							
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	0.25	0.25	0.50	0.50	50.00%


Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
 ING. CIVIL
 CIP. 209150

RESUMEN DE VALORIZACION N° 02

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Obra : TRAMO: "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM", - "EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG.= 11.650 KM"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 Ubicación : SITABAMBA
 Contratista : CONSORCIO VIAL LA CHIRA
 Supervisor : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA - CIP: 209150
 Residente : ING. JEAN HERBERT ECHE MOSTACERO - CIP: 92633

SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

Item	PRESUPUESTADO		VALORIZADO ANTERIOR		VALORIZADO DEL MES		ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
	Descripción	MONTO EXPEDIENTE	EJECUTADO ANT. ACUM.	%	EJECUTADO EN EL MES	%	EJECUTADO ACT. ACUM	%	Parcial EJECUCION	%
1.00	COSTO DIRECTO LA CHIRA (7.00 KM)	S/. 363,122.05	S/. 16,576.42		S/. 125,978.50		S/. 142,554.92		S/. 220,567.13	
2.00	COSTO DIRECTO UCHUCUBAMBA (11.650 KM)	S/. 604,338.84	S/. 18,484.25		S/. 219,894.82		S/. 238,379.07		S/. 365,959.77	
3.00	SUB TOTALES COSTO DIRECTO	S/. 967,460.89	S/. 35,060.67		S/. 345,873.32		S/. 380,933.99		S/. 586,526.90	
4.00	GASTOS GENERALES (10%)	S/. 96,746.09	S/. 3,506.07		S/. 34,587.33		S/. 36,093.40		S/. 58,652.69	
5.00	UTILIDAD (5%)	S/. 48,373.04	S/. 1,753.03		S/. 17,293.67		S/. 19,046.70		S/. 29,326.34	
6.00	SUB TOTAL	S/. 1,112,580.02	S/. 40,319.77		S/. 397,754.32		S/. 438,074.09		S/. 674,505.93	
7.00	I.G.V. (18 %)	S/. 200,264.40	S/. 7,257.56		S/. 71,595.78		S/. 78,853.34		S/. 121,411.06	
8.00	TOTAL	S/. 1,312,844.42	S/. 47,577.33	3.62%	S/. 469,350.10	35.75%	S/. 516,927.43	39.37%	S/. 795,916.99	60.63%

Otin
 Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
 ING. CIVIL
 CIP. 209150

ANALISIS DE VALORIZACION MENSUAL Nº 02

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Proyecto: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
Tramo: EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM". - "EMP. LI-911 (STABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUORNAL LONG.= 11.650 KM"
Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación: EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO)
Contratista: CONSORCIO VIAL LA CHIRA
Inspector: ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO O.IVA - CIP: 209150
Residente: ING. JEAN HERBERT ECHE MOSTACERO - CIP: 92633

Monto Contratado: S/ 1,581,740.26
Plazo de ejecución: 120 días calendario

Código	Descripción	PRESUPUESTO GENERAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		METRADO	PRECIO S/	PARCIAL S/	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%
1.00	OBRAS PROVISIONALES															
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	1.00	19,672.13	19,672.13	0.50	9,836.07	50.00%	0.00	0.00	0.00%	0.50	9,836.07	50.00%	0.50	9,836.06	50.00%
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	7.00	252.45	1,767.15	3.50	883.58	50.00%	1.50	378.68	21.43%	5.00	1,262.25	71.43%	2.00	504.90	28.57%
2.00	PAVIMENTOS															
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05M	981.77	30,297.42	30,297.42	0.00	0.00	0.00%	500.00	15,430.00	50.93%	500.00	15,430.00	50.93%	481.77	14,867.42	49.07%
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	2,786.11	58.56	163,154.60	0.00	0.00	0.00%	1,125.00	65,880.00	40.38%	1,125.00	65,880.00	40.38%	1,661.11	97,274.60	59.62%
3.00	TRANSPORTE															
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	4,521.46	11.23	50,776.00	0.00	0.00	0.00%	1,480.00	16,620.40	32.73%	1,480.00	16,620.40	32.73%	3,041.46	34,155.60	67.27%
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	24,415.87	1.96	47,855.11	0.00	0.00	0.00%	8,740.00	17,130.40	35.80%	8,740.00	17,130.40	35.80%	15,675.87	30,774.71	64.20%
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	259.00	9.05	2,345.95	0.00	0.00	0.00%	105.00	950.25	40.54%	105.00	950.25	40.54%	154.00	1,393.70	59.46%
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	2,978.50	1.96	5,837.86	0.00	0.00	0.00%	1,200.00	2,352.00	40.29%	1,200.00	2,352.00	40.29%	1,778.50	3,485.86	59.71%
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE															
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	7,000.00	0.69	4,830.00	0.00	0.00	0.00%	2,000.00	1,380.00	28.57%	2,000.00	1,380.00	28.57%	5,000.00	3,450.00	71.43%
5.00	SEÑALIZACION															
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	7.00	182.33	1,276.31	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	7.00	1,276.31	100.00%
05.02	SENALES PREVENTIVAS	5.00	918.37	5,510.22	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.00	5,510.22	100.00%
05.03	SENALES REGLAMENTARIAS	4.00	859.68	3,438.72	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	3,438.72	100.00%
05.04	SENALES INFORMATIVAS	4.00	526.62	2,102.48	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	2,102.48	100.00%
6.00	IMPACTO AMBIENTAL															
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	0.56	866.95	833.03	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.56	833.03	100.00%
7.00	EMERGENCIA SANITARIA															
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	1.00	23,427.07	23,427.07	0.25	5,856.77	25.00%	0.25	5,856.77	25.00%	0.25	5,856.77	25.00%	0.50	11,713.53	50.00%
	Costo Directo			363,122.05		16,576.42			125,978.50			142,554.92			220,567.13	
	GASTOS GENERALES (10%) C.D.			36,312.21		1,657.64			12,597.85			14,255.49			22,056.72	
	UTILIDAD (5%) C.D.			18,156.10		826.82			6,298.93			7,127.75			11,028.35	
	SUB TOTAL			417,590.36		19,062.88			144,875.28			165,938.16			253,652.20	
	IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (IGV 18%)			75,166.26		3,431.32			26,077.55			29,508.87			45,657.39	
	VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO			492,756.62		22,494.20			170,952.83			195,447.03			299,309.59	
	PORCENTAJE AVANCE DEL SERVICIO			100.00%		4.56%			34.89%			39.25%			60.75%	

258


Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
 ING. CIVIL
 CIP. 209150

ANALISIS DE VALORIZACION MENSUAL N° 02

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Proyecto: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

Tramo: "EMP. U-135 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM", "EMP. U-191 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUIRUJAL LONG. = 11.650 KM"

Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

Ubicación: SITABAMBA - UCHUCUBAMBA - QUINUAL

Contratista: CONSORCIO VIAL LA CHIRA

Inspector: ING. SMITH JEAN CARLOS OTIMIANO OLIVA - CIP: 209150

Residente: ING. JEAN HERBERT ECHE MOSTACERO - CIP: 92633

Monto Contratado: S/ 4,581,740.26

Plazo de ejecución: 120 días calendario

Código	Descripción	PRESUPUESTO GENERAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
		U.-d.	METRADO	PRECIO S/.	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	
1.00	OBRAS PROVISIONALES																
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	gib	1.00	22,326.53	0.50	11,163.27	50.00%	0.00	0.00	0.00%	0.50	11,163.27	50.00%	0.50	11,163.26	50.00%	
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	11.65	252.45	5.80	1,464.21	49.79%	3.00	757.35	25.75%	8.80	2,221.56	75.54%	7.85	719.48	24.46%	
2.00	PAVIMENTOS	m3	1,712.80	31.73	54,347.14	0.00	0.00	0.00%	775.00	24,590.75	45.25%	775.00	24,590.75	45.25%	997.80	29,756.39	54.75%
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	5,232.02	55.04	287,970.38	0.00	0.00	0.00%	1,875.00	103,200.00	35.84%	1,875.00	103,200.00	35.84%	3,357.02	184,770.38	64.16%
3.00	TRANSPORTE	m3k	8,332.77	9.87	82,244.44	0.00	0.00	0.00%	3,795.00	37,456.65	45.54%	3,795.00	37,456.65	45.54%	4,537.77	44,787.79	54.46%
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	45,022.38	1.80	81,004.28	0.00	0.00	0.00%	22,200.00	39,360.00	49.33%	22,200.00	39,360.00	49.33%	22,802.38	41,044.28	50.67%
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL MAYOR A 1 KM	m3k	434.78	8.13	3,534.76	0.00	0.00	0.00%	210.00	1,707.30	48.30%	210.00	1,707.30	48.30%	224.78	1,827.46	51.79%
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	4,989.95	1.80	8,999.91	0.00	0.00	0.00%	2,400.00	4,320.00	48.00%	2,400.00	4,320.00	48.00%	2,599.95	4,679.91	52.00%
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k				0.00	0.00	0.00%									
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	m	11,650.00	0.66	7,689.00	0.00	0.00	0.00%	3,100.00	2,046.00	26.61%	3,100.00	2,046.00	26.61%	8,550.00	5,643.00	73.39%
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m				0.00	0.00	0.00%									
5.00	SEÑALIZACION	und	11.00	182.37	2,006.07	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	11.00	2,006.07	100.00%
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	24.00	781.13	18,747.12	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	24.00	18,747.12	100.00%
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	8.00	719.87	5,758.96	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	5,758.96	100.00%
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	4.00	526.68	2,106.72	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	2,106.72	100.00%
05.04	SEÑALES INFORMATIVAS	und	0.94	1,314.28	1,235.42	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.94	1,235.42	100.00%
6.00	IMPACTO AMBIENTAL	ha	1.00	23,427.07	23,427.07	0.25	5,856.77	25.00%	0.25	5,856.77	25.00%	0.50	11,713.54	50.00%	0.50	11,713.53	50.00%
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	gib				0.25	5,856.77	25.00%	0.25	5,856.77	25.00%	0.50	11,713.54	50.00%	0.50	11,713.53	50.00%
7.00	EMERGENCIA SANITARIA																
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19																
	Costo Directo				604,336.84		18,484.25			219,894.82			238,379.07			365,959.77	
	GASTOS GENERALES (10%) C.D.	10.00%			60,433.68		1,848.43			21,989.48			23,837.91			36,595.97	
	UTILIDAD (5%) C.D.	5.00%			30,216.84		924.21			10,994.74			11,918.95			18,297.99	
	SUB TOTAL				694,987.36		21,256.89			252,879.04			274,135.93			420,853.73	
	IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (IGV 18%)	18.00%			125,098.14		3,826.24			45,518.23			49,344.47			75,753.67	
	VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO				820,085.50		25,083.13			298,397.27			323,480.40			496,607.40	
	PORCENTAJE AVANCE DEL SERVICIO				100.00%		3.06%			36.39%			38.45%			60.55%	

259

Smith Jean Carlos Otimiano Oliva
ING. CIVIL
CIP: 209150

CUADRO COMPRATIVO DE AVANCE - PROGRAMADO - EJECUTADO - PAGADO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Proyecto : SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
TRAMO: "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - I.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM", - "EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG.= 11.650 KM"

Ciente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO)
Contratista : CONSORCIO VIAL LA CHIRA
Inspector : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA - CIP: 209150
Residente : ING. JEAN HERBERT ECHE MOSTACERO - CIP: 92633

AVANCE DE SERVICIO PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Inc/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	21,534.99	21,534.99	4.37%	4.37%
31-Oct-20	203,622.24	225,157.23	41.32%	45.69%
30-Nov-20	188,081.13	413,238.36	38.17%	83.86%
31-Dic-20	79,518.26	492,756.62	16.14%	100.00%
TOTAL	492,756.62		100.00%	

AVANCE DE SERVICIO EJECUTADOS

MES	MONTOS (Inc/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	22,494.20	22,494.20	4.56%	4.56%
31-Oct-20	170,952.83	193,447.03	34.69%	39.25%
30-Nov-20	0.00	0.00	0.00%	
31-Dic-20	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	193,447.03		39.26%	

AVANCE DE SERVICIO PAGADOS

MES	MONTOS (Inc/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-Oct-20	0.00	0.00	0.00%	
30-Nov-20	0.00	0.00	0.00%	
31-Dic-20	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00		0.00%	

CUADRO COMPRATIVO DE AVANCE - PROGRAMADO - EJECUTADO - PAGADO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Proyecto : **SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL
TRAMO: "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - I.D. ANCASH
(TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM", - "EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA -
QUINUAL LONG.= 11.650 KM"**

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : SITABAMBA - UCHUCUBAMBA - QUINUAL
Contratista : CONSORCIO VIAL LA CHIRA
Inspector : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA - CIP: 209150
Residente : ING. JEAN HERBERT ECHE MOSTACERO - CIP: 92633

AVANCE DE SERVICIO PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Inc/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	23,495.29	23,495.29	2.86%	2.86%
31-Oct-20	345,224.16	368,719.45	42.10%	44.96%
30-Nov-20	317,711.81	686,431.26	38.74%	83.70%
31-Dic-20	133,656.54	820,087.80	16.30%	100.00%
TOTAL	820,087.80		100.00%	

AVANCE DE SERVICIO EJECUTADOS

MES	MONTOS (Inc/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	25,083.13	25,083.13	3.06%	3.06%
31-Oct-20	298,397.27	323,480.40	36.39%	39.45%
30-Nov-20	0.00	0.00	0.00%	
31-Dic-20	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	323,480.40		39.44%	

AVANCE DE SERVICIO PAGADOS

MES	MONTOS (Inc/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-Oct-20	0.00	0.00	0.00%	
30-Nov-20	0.00	0.00	0.00%	
31-Dic-20	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00		0.00%	


 Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
 ING. CIVIL
 CIP. 209150

CUADRO DE BARRAS Y CURVAS

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020


Proyecto : SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
Tramo : "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM", - "EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG.= 11.650 KM"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO)
Contratista : CONSORCIO VIAL LA CHIRA
Inspector : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA - CIP: 209150
Residente : ING. JEAN HERBERT ECHE MOSTACERO - CIP: 92633

Monto Contratado
 S/. 1.581.740,26
Plazo de ejecución
 120 días calendario

GRAFICO DEL PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO ACUMULADO

AVANCE MENSUAL ACUMULADO (%)

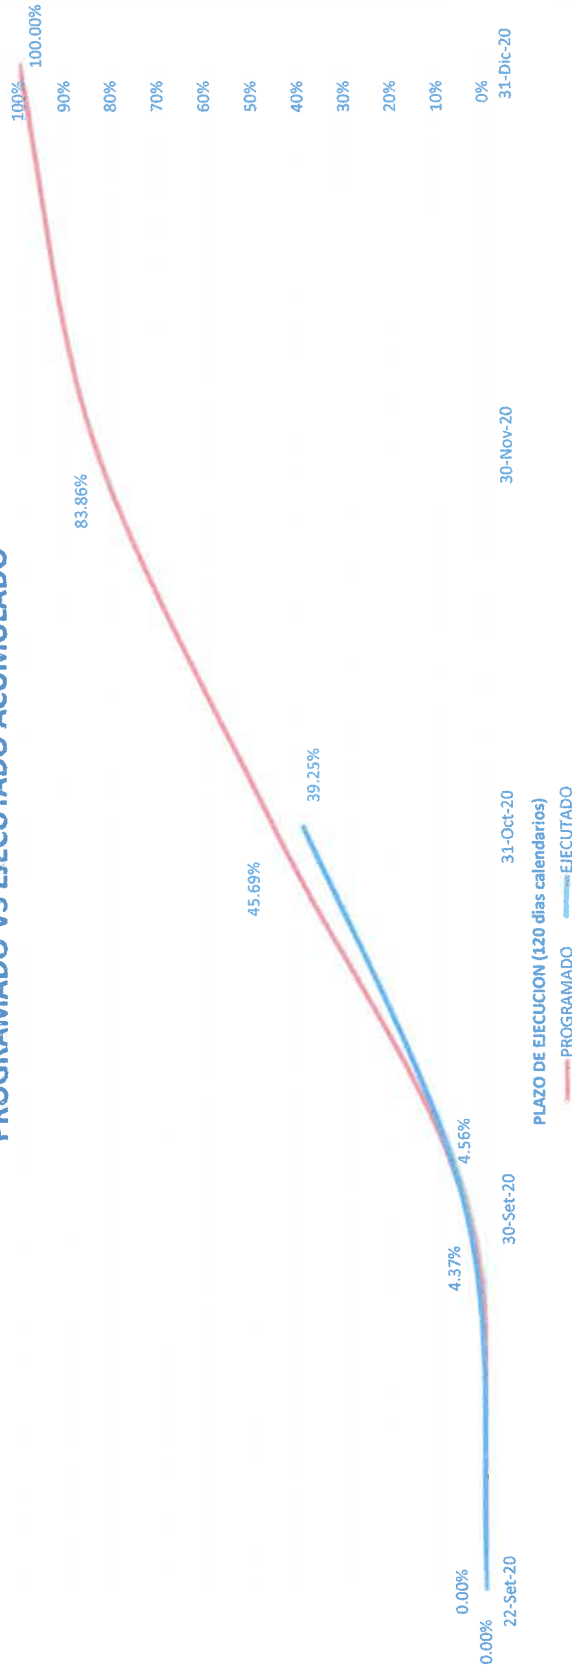

MONITOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Inc/IGV) PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	PORCENTAJES ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	21,534.99	21,534.99	4.37%	4.37%
31-Oct-20	203,622.24	225,157.23	41.32%	45.69%
30-Nov-20	188,081.13	413,238.36	38.17%	83.86%
31-Dic-20	79,518.26	492,756.62	16.14%	100.00%
TOTAL	492,756.62		100.00%	

MONITOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (Inc/IGV) PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	PORCENTAJES ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	22,494.20	22,494.20	4.56%	4.56%
31-Oct-20	170,952.83	193,447.03	34.69%	39.25%
30-Nov-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-Dic-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	193,447.03		39.26%	

Smith
 Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
 ING. CIVIL
 CIP. 209150


CUADRO DE BARRAS Y CURVAS

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Proyecto : TRAMO: "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM", - "EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG.= 11.650 KM"
Cilente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : SITABAMBA - UCHUCUBAMBA - QUINUAL
Contratista : CONSORCIO VIAL LA CHIRA
Inspector : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA - CIP: 209150
Residente : ING. JEAN HERBERT ECHE MOSTACERO - CIP: 92633

Monito Contratado S/. 1,581,740.26
Plazo de ejecución 120 días calendario

GRAFICO DEL PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO ACUMULADO

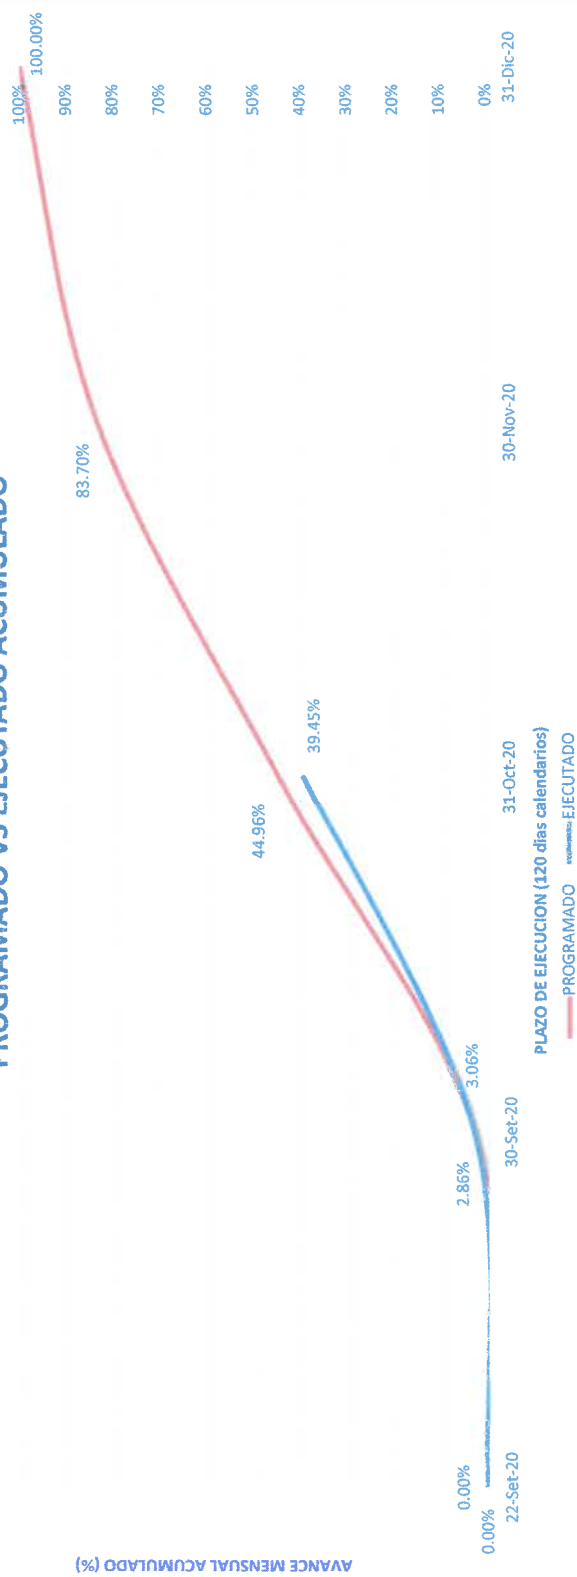

MONITOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (inc/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	23,495.29	23,495.29	2.86%	2.86%
31-Oct-20	345,224.16	368,719.45	42.10%	44.96%
30-Nov-20	317,711.81	686,431.26	38.74%	83.70%
31-Dic-20	133,656.54	820,087.80	16.30%	100.00%
TOTAL	820,087.80		100.00%	

MONITOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (inc/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	25,083.13	25,083.13	3.06%	3.06%
31-Oct-20	298,397.27	323,480.40	36.39%	39.45%
30-Nov-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-Dic-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	323,480.40		39.44%	

Smith
Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
 ING. CIVIL
 CIP. 209150

CUADRO DE BARRAS Y CURVAS

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020


SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
 TRAMO: "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM", - "EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG.= 11.650 KM"

Proyecto :
 Cliente :
 Ubicación :
 Contratista :
 Inspector :
 Residente :

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM", - "EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG.= 11.650 KM"
 CONSORCIO VIAL LA CHIRA
 ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA - CIP: 209150
 ING. JEAN HERBERT ECHE MOSTACERO - CIP: 92633

Monito Contratado
 Plazo de ejeccion
 S/. 1,581,740.26
 120 dias calendarios

GRAFICO DEL PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO ACUMULADO

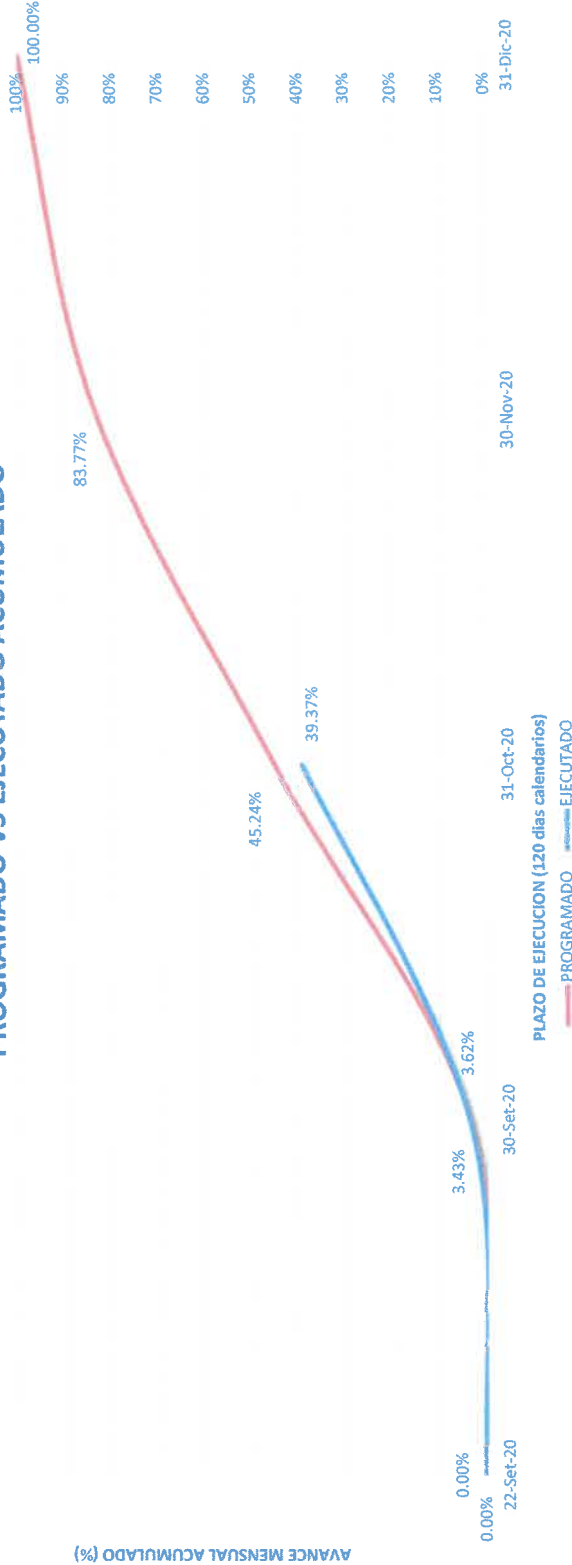

MONITOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (inc/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	47,577.33	47,577.33	3.62%	3.62%
31-Oct-20	469,350.10	516,927.43	35.75%	39.37%
30-Nov-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-Dic-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	516,927.43	516,927.43	39.37%	39.37%

MONITOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (inc/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	45,030.28	45,030.28	3.43%	3.43%
31-Oct-20	548,846.40	593,876.68	41.81%	45.24%
30-Nov-20	505,792.94	1,099,669.62	38.53%	83.77%
31-Dic-20	213,174.80	1,312,844.42	16.23%	100.00%
TOTAL	1,312,844.42	1,312,844.42	100.00%	100.00%

Out
 Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
 ING. CIVIL
 CIP. 209150

Inspector de Mantenimiento Periódico

PANEL FOTOGRAFICO

Foto N°01: Se verifica la conformación del tramo Tramo: DV. CHAGAVARA-LA CHIRA-TUTUARCO (km + 002.50)



Foto N°02: Se verifica el transporte de material granular para su conformación: SITABAMBA-UCHUCUBAMBA-QUINUAL



Fuente: Propia

Inspector de Mantenimiento Periódico

Foto N°03: Se verifica el trazo y replanteo en el Tramo: DV. CHAGAVARA-LA CHIRA-TUTUARCO

Fuente: Propia

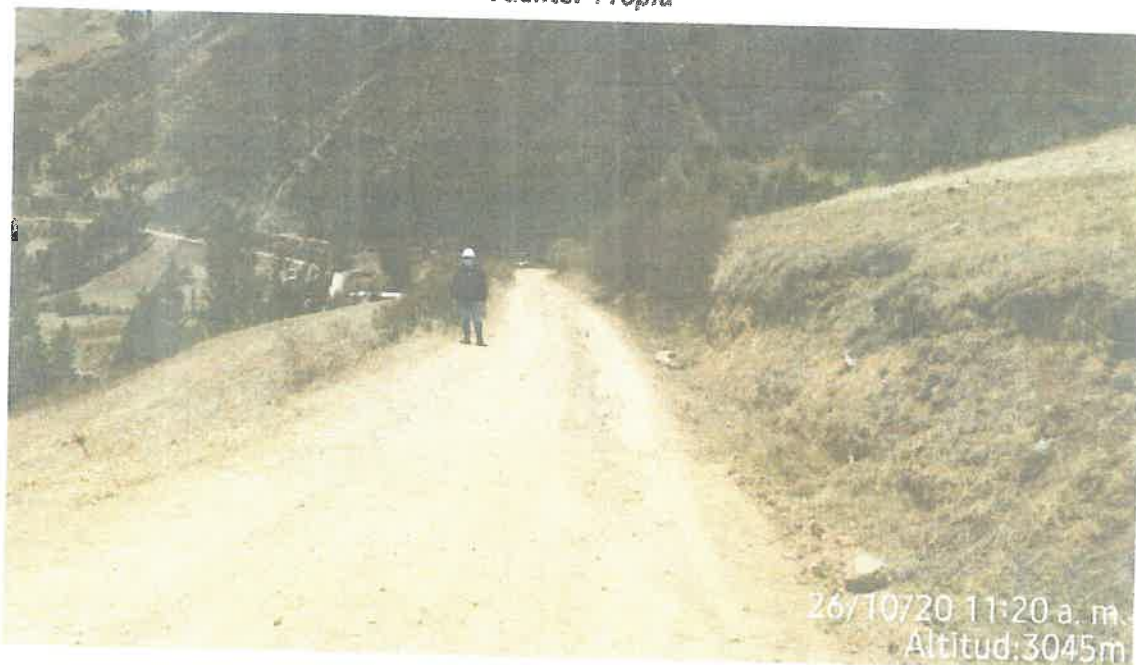


Foto N°04: Se verifica el trazo y el reconociendo de avances en el Tramo: SITABAMBA-UCHUCUBAMBA-QUINUAL



Fuente: Propia

Inspector de Mantenimiento Periódico

8. PLAN DE TRABAJO

Este Servicio tiene como finalidad mantener las condiciones de infraestructura vial de los tramos: EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG. = 7.00 KM y EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG. = 11.650 KM, los cuales se ejecutarán para recuperar la transitabilidad de los caminos, así como reponer las zonas afectadas de la vía y restablecer las características superficiales.

Cabe resaltar que cada actividad debe cumplir con cada uno de los criterios de control y calidad, todo esto se ejecutara según la normatividad técnica que corresponda.

Para elaborar este plan de trabajo, previamente se identificó cada una de las actividades que se debe desarrollar en la ejecución del Servicio, las cuales se dividieron en Fase I, Fase II y Fase III.

9. DESARROLLO DEL SERVICIO

Durante el periodo de 01 de octubre del 2020 al 31 de octubre del 2020 Se realizaron los trabajos en las siguientes partidas.

1. EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG. = 7.00 KM:

01.00 OBRAS PROVISIONALES

01.01 Movilización y desmovilización de equipos con un avance del 50.00%.

01.02 Trazo y replanteo con un avance del 71.43%.

2.00 PAVIMENTOS

02.01 Capa Nivelante E=0.15M con un avance del 50.93%

02.02 Material Granular de Cantera E=0.15M con un avance del 40.38%

3.00 TRANSPORTE

3.01 Transporte de material granular hasta 1 KM con un avance del 32.73%

3.02 Transporte de material granular mayor a 1 KM con un avance del 35.80%

3.03 Transporte de material excedente hasta 1 KM con un avance del 40.54%

3.04 Transporte de material excedente mayor a 1 KM con un avance del 40.29%

4.00 OBRAS DE ARTE

3.01 Reconformación de cunetas con un avance del 28.57%

07.00 EMERGENCIA SANITARIA

07.01 Emergencia sanitaria COVID-19 con un avance del 50.00%.

2. EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG. = 11.650 KM:

01.00 OBRAS PROVISIONALES

01.01 Movilización y desmovilización de equipos con un avance del 50.00%.

01.02 Trazo y replanteo con un avance del 75.54%.

Inspector de Mantenimiento Periódico

244

2.00 PAVIMENTOS

- 02.01 Capa Nivelante E=0.15M con un avance del 45.25%
- 02.02 Material Granular de Cantera E=0.15M con un avance del 35.84%

3.00 TRANSPORTE

- 3.01 Transporte de material granular hasta 1 KM con un avance del 45.54%
- 3.02 Transporte de material granular mayor a 1 KM con un avance del 49.33%
- 3.03 Transporte de material excedente hasta 1 KM con un avance del 48.30%
- 3.04 Transporte de material excedente mayor a 1 KM con un avance del 48.00%

4.00 OBRAS DE ARTE

- 3.01 Reconformación de cunetas con un avance del 26.61%

07.00 EMERGENCIA SANITARIA

- 07.01 Emergencia sanitaria COVID-19 con un avance del 50.00%.

10. CONDICIONES METEOROLOGICAS

Durante el periodo de 01 de octubre del 2020 al 31 de octubre del 2020, no hubo presencia de precipitaciones de mayor consideración, ni otro fenómeno climatológico que pueda interrumpir la ejecución del Servicio.

11. RESULTADOS DE LA INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD EN EL TRABAJO

Durante el periodo de 01 de octubre del 2020 al 31 de octubre del 2020 no se realizaron actividades que ameriten controles de calidad.

12. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS QUE ESTAN SIENDO UTILIZADAS POR EL CONTRATISTA

- 01 excavadora
- 01 motoniveladora
- 01 rodillo liso vibratorio
- 01 cisterna para agua
- 04 camión volquete
- CAMIONETA PICK UP

13. PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO EMPLEADO POR EL CONTRATISTA

- **Ingeniero Residente:** ING. JEAN HERBERT ECHE MOSTACERO


Smith Jean Carlos Otiliano Oliva
ING. CIVIL
CIP. 209150

Inspector de Mantenimiento Periódico

PERSONAL ASEGURADO					
SEDE: CONSTRUCCIÓN					
Nro	NOMBRES	PATERNO	MATERNO	TIPODOC	NRODOC
1	WALDIR YON	BACILIO	BURGOS	DNI	71666699
2	DENNIS EDINSON	CABANILLAS	DEZA	DNI	75362900
3	SEM	CASTANEDA	CHICLAYO	DNI	75670272
4	JOSE FRANCISCO	CRUZ	SANCHEZ	DNI	47091860
5	ERICK RUBEN	DIAZ	HOYOS	DNI	42985469
6	DAVID	GALVEZ	DELGADO	DNI	80629089
7	JOSE LUIS	GARCIA	DEZA	DNI	40613937
8	CARLOS GEANPIER	GARCIA	SALAZAR	DNI	76983345
9	GILMAN HEBER	GARCIA	URBINA	DNI	43154668
10	JHONY JHONATAN	GONZALES	PINEDO	DNI	44758556
11	ISMAEL ANTONIO	GONZALEZ	GOMEZ	PAS	133697610
12	FIRMO ALEXANDER	HORNA	SOLANO	DNI	47871863
13	EDGUER	HUAMURO	GALVEZ	DNI	47522871
14	RAUL GUILLERMO	LEZAMA	ACON	DNI	18160028
15	LUIS IVAN	LEZAMA	ESQUIVEL	DNI	41028200
16	MEIDER ALBERTO	LLIQUE	VASQUEZ	DNI	44331477
17	JUSTO JAVIER	LOZANO	LUCAS	DNI	42456926
18	JOSE	MIRANDA	ALAYA	DNI	26618552
19	NESTOR JOSE	PADILLA	GONZALES	CE	17943813
20	ANTONELLA MARILIN	PALOMINO	BARRERA	DNI	60455306
21	LUIS WILLIAM	PASAPERA	TERRONES	DNI	19210322
22	ERICK JONATHAN	RUIZ	RIOS	DNI	70513192
23	VICTOR MANUEL	TERRONES	CRUZ	DNI	19251873
24	RICHARD	VALDERRAMA	GOMEZ	DNI	44671002
25	JOSELITO RUBEN	VALENCIA	LEZAMA	DNI	45676493

14. ORGANIZACION DEL CONTRATISTA Y RECURSOS EMPLEADOS EN LA EJECUCION DEL SERVICIO

Durante el periodo de 01 de octubre del 2020 al 31 de octubre del 2020 el contratista utilizo:

- 01 excavadora
- 01 motoniveladora
- 01 rodillo liso vibratorio
- 01 cisterna para agua
- 04 camión volquete
- 01 camioneta Pick Up

Out
 Smith Jean Carlos Olintano Oliva
 ING. CIVIL
 CIP. 209150

Para poder desarrollar los trabajos según las partidas que se ejecutaron este mes, las cuales fueron trazo y replanteo, todo esto en conjunto con el personal técnico correspondiente:

Inspector de Mantenimiento Periódico

- Maestro
- Controlador
- Topógrafo

15. ORGANIZACION DE LA SUPERVISION Y RECURSOS EMPLEADOS EN LA EJECUCION DEL SERVICIO

Durante el periodo de 01 de octubre del 2020 al 31 de octubre del 2020 el inspector utilizo:

- 01 camioneta
- Nivel de Ingeniero
- Equipo de protección personal
- Mascarillas, etc.
- Laptop
- Impresora
- Planos

16. VISITAS AL SERVICIO DE PARTE DE PROVIAS DESCENTRALIZADO

Durante el periodo de 01 de octubre del 2020 al 31 de octubre del 2020 no hubo visitas al Servicio por parte de Provias Descentralizado.

17. CONCLUSIONES


- **El informe de Inspector N°02**, obedece a los trabajos realizados desde el 01 de octubre del 2020 al 31 de octubre del 2020, dichos trabajos se realizaron respetando todas las especificaciones mencionadas en el expediente técnico.
- El porcentaje de avance físico en el **informe mensual de Valorización N°02** es del 35.75% llegando al **39.37%** ejecutado acumulado, frente a un **41.81%** programado del mes y un acumulado programado de **45.24%**; estando el Servicio atrasado un **5.87%**.
- El monto correspondiente al informe mensual de Valorización N°02 es de **S/.469,350.10** (cuatrocientos sesenta y nueve mil trecientos cincuenta con 10/100 soles).

Inspector de Mantenimiento Periódico

241

18. RECOMENDACIONES

- Se recomienda frecuentar el uso de la Cisterna en los trabajos correspondientes.
- Se recomienda la colocación de niveles con estacas de madera.
- Se recomienda rotular bien las progresivas.
- Se recomienda identificar las progresivas.
- Se recomienda el uso de Equipos de protección personal para todo el personal en obra.
- Se recomienda el uso correcto de mascarillas y equipos de protección respetando todos los parámetros de emergencia sanitaria COVID -19, según el plan de trabajo.



Smith Jean Carlos Olivares
ING. CIVIL
CIP. 209150

- CARTA DE LA
EMPRESA
DIRIGIDA AL
SUPERVISOR.


CONSORCIO VIAL LA CHIRA
.....
JULIO CESAR QUIPUZCOA QUEZADA
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN


.....
Smith Jean Carlos Olintano Oliva
ING. CIVIL
CIP. 209150

CARTA N°004-2020/CONSORCIO VIAL LA CHIRA /RL/JQQ.

SR. : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA
Inspector de Servicio.

ASUNTO : ALCANZA VALORIZACIÓN DE SERVICIO N° 02

REFERENCIA : "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM", "EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG.= 11.650 KM", DEL DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

FECHA : 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Me es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo y al mismo tiempo alcanzarle el INFORME DE VALORIZACIÓN N° 02 correspondiente al mes de octubre del 2020 (periodo de 01 de octubre del 2020 al 31 de octubre del 2020). Para su respectiva revisión y aprobación.

Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente:


CONSORCIO VIAL LA CHIRA

JULIO CESAR QUIROZCO QUEZADA
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN


CONSORCIO VIAL LA CHIRA

JULIO CESAR QUIROZCO QUEZADA
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN


Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
ING. CIVIL
CIP. 209150

Cc:

- Archivo

- FICHA
TECNICA.


CONSORCIO VIAL LA CHIRA

.....
JULIO CESAR QUIPUZCOA QUEZADA
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN


.....
Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
ING. CIVIL
CIP. 209150

1-A: FICHA TECNICA DEL CAMINO VECINAL1. **Municipalidad** 2. **Datos Responsable:** Fecha: Cargo: 3. **Ubicación Política Administrativa:** **Cod. Ubigeo:** Distrito(s): Provincia(s): Departamento: 4. **Datos del SINAC: Clasificador de Rutas Vigente**Jerarquía Vial: Código de Ruta: Código de Ruta Provisional (Rutas sin Clasificar): Trayectoria: 5. **Ubicación Geográfica:****De la Ruta:****Inicio:** Descripción Progresiva: Cota: msnm ZONA: Coordenada (UTM - WGS84): **Fin:** Descripción Progresiva: Cota: msnm ZONA: Coordenada (UTM - WGS84):

Sello y Firma de Responsable de elaboración del ICV

CONSORCIO VIAL LA CHIRA

JULIO CESAR GUEZARDA GUEZADA
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN**Nota:** La Información de la Ficha debe tener el respaldo de la Información digital respectiva. Archivos GPS (Puntos=Waypoints y Eje Vial=Tracks), Fotografías (jpg), Video de la Obra (formato Avi), Deberá entregar en DVD.Jean Herbert Eche Mostacero
ING. CIVIL
R. CIP. 92633Smith Jean Carlos Olivino Oliva
ING. CIVIL
CIP. 208150


1-A: FICHA TECNICA DEL CAMINO VECINAL1. **Municipalidad** 2. **Datos Responsable:** Fecha: Cargo: 3. **Ubicación Política Administrativa:** **Cod. Ubigeo:** Distrito(s): Provincia(s): Departamento: 4. **Datos del SINAC: Clasificador de Rutas Vigente**Jerarquía Vial: Código de Ruta: Código de Ruta Provisional (Rutas sin Clasificar): Trayectoria: 5. **Ubicación Geográfica:****De la Ruta:****Inicio:** Descripción Progresiva: Cota: msnm ZONA: Coordenada (UTM - WGS84): **Fin:** Descripción Progresiva: Cota: msnm ZONA: Coordenada (UTM - WGS84):

Sello y Firma de Responsable de elaboración del ICV

CONSORCIO VIAL LA CHIRA

 JULIO CÉSAR QUIÑOZCO QUEZADA
 D.M. N° 19531091
 REPRESENTANTE COMUN

Nota: La Información de la Ficha debe tener el respaldo de la Información digital respectiva: Archivos GPS (Puntos=Waypoints y Eje Vial=Tracks), Fotografías (jpg), Video de la Obra (formato Avi). Deberá entregar en DVD.


 Jean H. Eche Mostacero
 ING. CIVIL
 R. D.P. 92633


 Smith Jean Carlos Otiliano Oliva
 ING. CIVIL
 CIP. 253130

- FACTURA DEL CONTRATISTA.


CONSORCIO VIAL LA CHIRA

JULIO CESAR QUIPUZCOA QUEZADA
C.I. N° 18531081
REPRESENTANTE COMUN



Smith Jean Carlos Otinlano Oliva
ING. CIVIL
CIP. 209150

CORPORACION QUIPUZCOA ARANDA S.A.C.

JR. SAN ROMAN 955 PUEBLO HUAMACHUCO AL COSTADO DE IMPRENTA VALDEZ

HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20600528069****E001-9**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **01/12/2020**
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD PROVINC
SANTIAGO DE CHUCO**
 RUC : **20187630101**
 Establecimiento del Emisor : **JR. SAN ROMAN 955 ----
PUEBLO HUAMACHUCO AL
COSTADO DE IMPRENTA VALDEZ
LA LIBERTAD-SANCHEZ
CARRION-HUAMACHUCO**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL ITEM PAQUETE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIOY PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - EMP. LI - 115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG =7.00KM, EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA	397754.32	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 10/100 SOLES

Sub Total :	S/ 397,754.32
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 397,754.32
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 71,595.78
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 469,350.10

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.


CONSORCIO VIAL LA CHIRA

JULIO CÉSAR QUIROZCO QUEZADA
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN



Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
ING. CIVIL
CIP. 209150

- INFORME DE RESIDENTE.


CONSORCIO VIAL LA CHIRA

JULIO CESAR QUIPUZCOA QUEZADA
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN



Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
ING. CIVIL
CIP. 209150

INFORME DE RESIDENTE N° 02 – OCTUBRE 2020

PROYECTO : SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: “EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM”, “EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG.= 11.650 KM”, DEL DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL LA CHIRA

INSPECTOR : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA – CIP: 209150

RESIDENTE : ING. JEAN HERBERT ECHE MOSTACERO – CIP: 92633

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

PERIODO : DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2,020



[Signature]
CONSORCIO VIAL LA CHIRA
JULIO CESAR QUIPUZCOA QUEZADA
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMÚN

OCTUBRE 2020

[Signature]
Jean H. Eche Mostacero
ING. CIVIL
R. CIP. 92633

INFORME MENSUAL 02

(OCTUBRE – 2020)

EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO

FASE: II

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

1.1. NOMBRE DEL SERVICIO:

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM", "EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG.= 11.650 KM", DEL DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.

1.2. N° DE CONTRATO:

Contrato De Sevicio: N° 009-2020-MPSCH-LOG.

1.3. ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

1.4. CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL LA CHIRA

1.5. INSPECTOR:

ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA – CIP: 209150

1.6. INGENIERO RESIDENTE:

ING. JEAN HERBERT ECHE MOSTACERO – CIP: 92633

1.7. MONTO DE CONTRATO:

S/. 1,581,740.26 INC. IGV

1.8. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO:

S/. 1,312,844.42 INC. IGV


Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
ING. CIVIL
CIP. 209150


CONSORCIO VIAL LA CHIRA
JULIO CESAR QUIROZCO QUEZADA
CNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN


Jean Herbert Eche Mostacero
ING. CIVIL
R. CIP. 92633

1.9. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:

S/. 237,261.04 INC. IGV

1.10. PLAZO DE EJECUCIÓN:

120 DIAS CALENDARIOS

1.11. FECHA DE INICIO:

22 DE SETIEMBRE DEL 2020

1.12. FECHA DE CULMINACIÓN:

31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS – FASE II:

2.1. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Durante el periodo del 01 de octubre del 2020 al 31 de octubre del 2020
Se trabajó en las siguientes partidas.

01.00 OBRAS PROVISIONALES

01.02 Trazo y replanteo.

02.00 PAVIMENTOS

02.01 Capa nivelante E= 0.05 m.

02.02 Material granular de cantera E= 0.15 m.

03.00 TRANSPORTE

03.01 Transporte de material granular hasta 1 km.

03.02 Transporte de material granular mayor a 1 km.

03.03 Transporte de material excedente hasta 1 km.

03.04 Transporte de material excedente mayor a 1 km.

04.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01 Reconformación de cunetas.

07.00 EMERGENCIA SANITARIA

07.01 Emergencia sanitaria COVID-19 NSC.

Dest
Smith Jean Carlos Pinedero Oliva
ING. CIVIL
CIP. 209150

JCR
JULIO CESAR QUIPUZCOA GONZALEZ
DM N° 19531093
REPRESENTANTE COMÚN

Jean H. ...
ING. CIVIL
R. CIP. 209150

2.2. DETALLE DE CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADOS Y ANEXAR LOS CERTIFICADOS DE LABORATORIO.

Durante el periodo del 01 de octubre del 2020 al 31 de octubre del 2020, se vienen realizando los trabajos de densidad de campo correspondientes, los cuales se adjuntarán en los anexos de la presente valorización.

3. ESTADO DE SITUACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO – FASE II:

3.1. SITUACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

3.1.1. DETALLAR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y LOS PORCENTAJES DE AVANCE.

Durante el periodo del 01 de octubre del 2020 al 31 de octubre del 2020 Se realizaron los trabajos en las siguientes partidas.

TRAMO: "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTTUARCO) LONG. =7.00 KM"

01.00 OBRAS PROVISIONALES

01.02 Trazo y replanteo.

Esta partida cuenta con un avance del 21.43%.

02.00 PAVIMENTOS

02.01 Capa nivelante E= 0.05 m.

Esta partida cuenta con un avance del 50.93%

02.02 Material granular de cantera E= 0.15 m.

Esta partida cuenta con un avance del 40.38%.

03.00 TRANSPORTE

03.01 Transporte de material granular hasta 1 km.

Esta partida cuenta con un avance del 32.73%

03.02 Transporte de material granular mayor a 1 km.

Esta partida cuenta con un avance del 35.80%.

03.03 Transporte de material excedente hasta 1 km.

Esta partida cuenta con un avance del 40.54%.

03.04 Transporte de material excedente mayor a 1 km.

Esta partida cuenta con un avance del 40.29%.

04.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01 Reconformación de cunetas.

Esta partida cuenta con un avance del 28.57%.

Out
Smith Jean Carlos Otiliano Otila
ING. CIVIL
CIP. 209150

CONSORCIO VIAL LA CHIRA
JULIO CESAR QUIPUZCOA QUEZADA
C.M. N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN

[Signature]
Jean H. Pineda Castañero
ING. CIVIL
R. CIP. 92633

07.00 EMERGENCIA SANITARIA

07.01 Emergencia sanitaria COVID-19

Esta partida cuenta con un avance del 25.00%.

**TRAMO: "EMP. LI-911 (SITABAMBA) –UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG.
=11.650 KM"**

01.00 OBRAS PROVISIONALES

01.02 Trazo y replanteo.

Esta partida cuenta con un avance del 25.75%.

02.00 PAVIMENTOS

02.01 Capa nivelante E= 0.05 m.

Esta partida cuenta con un avance del 42.25%

02.02 Material granular de cantera E= 0.15 m.

Esta partida cuenta con un avance del 35.84%.

03.00 TRANSPORTE

03.01 Transporte de material granular hasta 1 km.

Esta partida cuenta con un avance del 45.54%

03.02 Transporte de material granular mayor a 1 km.

Esta partida cuenta con un avance del 49.33%.

03.03 Transporte de material excedente hasta 1 km.

Esta partida cuenta con un avance del 48.30%.

03.04 Transporte de material excedente mayor a 1 km.

Esta partida cuenta con un avance del 48.00%.

04.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01 Reconformación de cunetas.

Esta partida cuenta con un avance del 26.61%.

07.00 EMERGENCIA SANITARIA

07.01 Emergencia sanitaria COVID-19

Esta partida cuenta con un avance del 25.00%.

3.1.2. DETALLAR LOS CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADAS Y ANEXAR LOS CERTIFICADOS DE LABORATORIO.

Durante el periodo de 01 de octubre del 2020 al 31 de octubre del 2020, se vienen realizando los trabajos de densidad de campo correspondientes, los cuales se adjuntaran en los anexos de la presente valorización.

Out
Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
ING. CIVIL
CIP. 209150

J.P.P.
CONSORCIO VIAL LA CHIRA
JULIO CESAR QUINTACCO QUEZADA
CIP. 10931891
REPRESENTANTE COMUN

Jean Carlos Estacero
ING. CIVIL
R. CIP. 32633

3.2 SITUACIÓN DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA

3.2.1 RETENCIÓN DE GARANTÍAS.

Retención del 10.00 % de garantía de fiel cumplimiento del contrato.

3.2.2 VIGENCIA DE LAS CARTAS FIANZAS.

No aplica.

3.2.3 VIGENCIA DE LOS SEGUROS (SCTR, SOAT) Y ANEXAR COPIAS.


22/12/2020.

3.2.4 PENALIDADES (APLICADAS Y COBRADAS).

No aplica.

3.2.5 RELACIÓN DE PERSONAL QUE TRABAJÓ (PROFESIONAL, TÉCNICOS Y OBREROS).

PERSONAL ASEGURADO					
SEDE: CONSTRUCCIÓN					
Nro	NOMBRES	PATERNO	MATERNO	TIPODOC	NRODOC
1	WALDIR YON	BACILIO	BURGOS	DNI	71666699
2	DENNIS EDINSON	CABANILLAS	DEZA	DNI	75362900
3	SEM	CASTAÑEDA	CHICLAYO	DNI	75670272
4	JOSE FRANCISCO	CRUZ	SANCHEZ	DNI	47091860
5	ERICK RUBEN	DIAZ	HOYOS	DNI	42985469
6	DAVID	GALVEZ	DELGADO	DNI	80628089
7	JOSE LUIS	GARCIA	DEZA	DNI	40613937
8	CARLOS GEANPIER	GARCIA	SALAZAR	DNI	76983345
9	GILMAN HEBER	GARCIA	URBINA	DNI	43154668
10	JHONY JHONATAN	GONZALES	PINEDO	DNI	44758556
11	ISMAEL ANTONIO	GONZALEZ	GOMEZ	PAS	133697610
12	FIRMO ALEXANDER	HORNA	SOLANO	DNI	47871863
13	EDGUER	HUAMURO	GALVEZ	DNI	47522871
14	RAUL GUILLERMO	LEZAMA	ACON	DNI	18160028
15	LUIS IVAN	LEZAMA	ESQUIVEL	DNI	41028200
16	MEIDER ALBERTO	LLIQUE	VASQUEZ	DNI	44331477
17	JUSTO JAVIER	LOZANO	LUCAS	DNI	42458826
18	JOSE	MIRANDA	ALAYA	DNI	26618552
19	NESTOR JOSE	PADILLA	GONZALES	CE	17943813
20	ANTONELLA MARILIN	PALOMINO	BARRERA	DNI	60455306
21	LUIS WILLIAM	PASAPERA	TERRONES	DNI	19210322
22	ERICK JONATHAN	RUIZ	RIOS	DNI	70513192
23	VICTOR MANUEL	TERRONES	CRUZ	DNI	19251873
24	RICHARD	VALDERRAMA	GOMEZ	DNI	44671002
25	JOSELITO RUBEN	VALENCIA	LEZAMA	DNI	45876493


CONSORCIO VIAL LA CHIRA
 JULIO CESAR QUIPUZCOA QUEZADA
 DNI N° 19531691
 REPRESENTANTE COMUN


 Jean Carlos Olintano Oliva
 ING. CIVIL
 R. CIP. 92633


 Smith Jean Carlos Olintano Oliva
 ING. CIVIL
 CIP. 203150

3.2.6 RELACIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS.

- 01 excavadora
- 01 motoniveladora
- 01 rodillo liso vibratorio
- 01 cisterna para agua
- 04 camión volquete
- CAMIONETA PICK UP

3.2.7 SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIA SANITARIA.

Se viene realizando todos los trabajos respetando todos los parámetros de Emergencia Sanitaria COVID-19 según plan de trabajo.

4. CONCLUSIONES

- El informe mensual de Valorización N°02, obedece a los trabajos realizados desde el 01 de octubre del 2020 al 31 de octubre del 2020, dichos trabajos aprobados por el inspector designado por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.
- El porcentaje de avance físico en el informe mensual de Valorización N°02 es del 35.75% *(Promo)* llegando al 39.37% ejecutado acumulado, frente a un 41.81 % programado del mes y un acumulado programado de 45.24%; estando el Servicio atrasado en un 87.04%.
- El monto correspondiente al informe mensual de Valorización N°02 es de S/.469,350.10 (cuatrocientos sesenta y nueve mil trescientos cincuenta con 10/100 soles).
- Recomendamos a la entidad contratante la Municipalidad Provincial de Provincial de Santiago De Chuco, revisar, aprobar y tramitar el informe mensual de Valorización N°02 correspondiente al mes de Octubre del 2020.


CONSORCIO VIAL LA CHIRA
JULIO CESAR QUIROZ QUEZADA
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN


Jean Inez Mostacero
ING. CIVIL
R. CIP. 92633


Smith Jean Carlos Otiniano Olica
ING. CIVIL
CIP. 209150

- RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL.

Out
Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
ING. CIVIL
CIP. 209150

JCG
CONSORCIO VIAL LA CHIRA
JULIO CESAR OLIVERA GUEZADA
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN


Out
Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
ING. CIVIL
CIP. 209150

RESUMEN DE VALORIZACION N° 02

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Obra : TRAMO: "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM", - "EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG.= 11.650 KM"
Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : SITABAMBA
Contratista : CONSORCIO VIAL LA CHIRA
Supervisor : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA - CIP: 209150
Residente : ING. JEAN HERBERT ECHE MOSTACERO - CIP: 92633


Item	PRESUPUESTADO		VALORIZADO ANTERIOR		VALORIZADO DEL MES		ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
	Descripción	MONTO EXPEDIENTE	EJECUTADO ANT. ACUM.	%	EJECUTADO EN EL MES	%	EJECUTADO ACT. ACUM	%	Parcial	EJECUCION
	COSTO DIRECTO LA CHIRA (7.00 KM)	S/. 363,122.05	S/. 16,576.42		S/. 125,578.50		S/. 142,554.92		S/. 220,567.13	
	COSTO DIRECTO UCHUCUBAMBA (11.650 KM)	S/. 604,338.84	S/. 18,484.25		S/. 219,894.82		S/. 238,379.07		S/. 365,959.77	
1.00	SUB TOTALES COSTO DIRECTO	S/. 967,460.89	S/. 35,060.67		S/. 345,873.32		S/. 380,933.99		S/. 586,526.90	
2.00	GASTOS GENERALES (10%)	S/. 96,746.09	S/. 3,506.07		S/. 34,587.33		S/. 38,093.40		S/. 58,652.69	
3.00	UTILIDAD (5%)	S/. 48,373.04	S/. 1,753.03		S/. 17,293.67		S/. 19,046.70		S/. 29,326.34	
4.00	SUB TOTAL	S/. 1,112,580.02	S/. 48,319.77		S/. 397,754.32		S/. 438,074.09		S/. 674,505.93	
5.00	I.G.V. (18 %)	S/. 200,264.40	S/. 7,257.56		S/. 71,595.78		S/. 78,853.34		S/. 121,411.06	
6.00	TOTAL	S/. 1,312,844.42	S/. 47,577.33	3.62%	S/. 469,350.10	35.75%	S/. 516,927.43	39.37%	S/. 795,916.99	60.63%


 Jean Herbert Eche Mostacero
 ING. CIVIL
 CIP: 92633


 CONSORCIO VIAL LA CHIRA
 JULIO QUESADA
 DNI N° 19537893
 REPRESENTANTE COMUN

neu

- CONTROL Y
SUSTENTO DE
METRADOS Y
ACTIVIDADES
EJECUTADAS.


CONSORCIO VIAL LA CHIRA
JULIO CÉSAR CIMPUZCO QUEZADA
CMI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN


Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
ING. CIVIL
CIP. 200150

CONTROL Y SUSTENTO DE METRADOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Proyecto : SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
Tramo: "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM", - "EMP. LJ-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG.= 11.650 KM"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO)
Contratista : CONSORCIO VIAL LA CHIRA
Inspector : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA - CIP: 209150
Residente : ING. JEAN HERBERT ECHE MOSTACERO - CIP: 92633

Monto Contratado S/. 1.581,740.26
Plazo de ejecución 120 días calendario

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATADO	CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS			% EJECUTADO
				ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	
1.00	OBRAS PROVISIONALES						
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	0.50	0.00	0.50	50.00%
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	7.00	3.50	1.50	5.00	71.43%
2.00	PAVIMENTOS						
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	981.77	0.00	500.00	500.00	50.93%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	2786.11	0.00	1,125.00	1,125.00	40.38%
3.00	TRANSPORTE						
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	4521.46	0.00	1,480.00	1,480.00	32.73%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	24415.87	0.00	8,740.00	8,740.00	35.80%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	259.00	0.00	105.00	105.00	40.54%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	2978.50	0.00	1,200.00	1,200.00	40.29%
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE						
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	7000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	28.57%
5.00	SEÑALIZACION						
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
05.02.	SEÑALES PREVENTIVAS	und	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
05.03.	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
05.04.	SEÑALES INFORMATIVAS	und	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6.00	IMPACTO AMBIENTAL						
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00%
7.00	EMERGENCIA SANITARIA						
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	0.25	0.25	0.50	50.00%


Jean H. Eche Mostacero
 ING. CIVIL
 R. CIP: 92633


CONSORCIO VIAL LA CHIRA
 JULIO CESAR QUIROZ COA QUEZADA
 DNI N° 19631091
 REPRESENTANTE COMUN

222

CONTROL Y SUSTENTO DE METRADOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Proyecto : SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
Tramo: "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM", - "EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG.= 11.650 KM"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : SITABAMBA - UCHUCUBAMBA - QUINUAL
Contratista : CONSORCIO VIAL LA CHIRA
Inspector : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA - CIP: 209150
Residente : ING. JEAN HERBERT ECHE MOSTACERO - CIP: 92633

Monto Contratado S/. 1.581.740.26
Plazo de ejecución 120 días calendario

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATADO	CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS				% EJECUTADO
				ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR EJECUTAR	
1.00	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	0.50	0.00	0.50	0.50	50.00%
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	11.65	5.80	3.00	8.80	2.85	75.54%
2.00	PAVIMENTOS							
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	1712.80	0.00	775.00	775.00	937.80	45.25%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	5232.02	0.00	1,875.00	1,875.00	3,357.02	35.84%
3.00	TRANSPORTE							
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	8332.77	0.00	3,795.00	3,795.00	4,537.77	45.54%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	45002.38	0.00	22,200.00	22,200.00	22,802.38	49.33%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	434.78	0.00	210.00	210.00	224.78	48.30%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	4999.95	0.00	2,400.00	2,400.00	2,599.95	48.00%
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE							
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	11650.00	0.00	3,100.00	3,100.00	8,550.00	26.61%
5.00	SEÑALIZACION							
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00%
05.02.	SEÑALES PREVENTIVAS	und	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00%
05.03.	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00%
05.04.	SEÑALES INFORMATIVAS	und	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00%
6.00	IMPACTO AMBIENTAL							
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0.94	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00%
7.00	EMERGENCIA SANITARIA							
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	0.25	0.25	0.50	0.50	50.00%


CONSORCIO VIAL LA CHIRA
 JULIO / SEÑALIZACION QUEZADA
 DMI N° 10537091
 REPRESENTANTE COMUN


Juan Mostacero
 ING. CIVIL
 R. CIP: 92633

121

- ANALISIS DE VALORIZACION MENSUAL.

CONSORCIO VIAL LA CHIRA
JULIO CESAR CUPUZCOA GUEZADA
DNI 17 19831091
REPRESENTANTE COMUN


Smith Jean Carlos Oliniano Oliva
ING. CIVIL
CIP. 299150

ANALISIS DE VALORIZACION MENSUAL N° 02

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Proyecto: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
 TRAMO: "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM", - "EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBANABA - QUINUAL LONG.= 11.650 KM"

Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 Ubicacion: EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO)
 Contratista: CONSORCIO VIAL LA CHIRA

Inspector: ING. SMITH JEAN CARLOS OTIMIANO OLIVA - CIP: 209150
 Residente: ING. JEAN HERBERT ECHE MOSTACERO - CIP: 92633

Monto Contratado: S/. 1.581,740.26
 Plazo de ejecucion: 120 dias calendarios

Código	Descripción	PRESUPUESTO GENERAL				AVANCE ACUMULADO ANTERIOR				AVANCE ACTUAL				AVANCE ACUMULADO ACTUAL				SALDO POR VALORIZAR			
		Unid.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	
																					METRADO
1.00	OBRAS PROVISIONALES																				
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	gib	1.00	19,672.13	19,672.13	0.50	9,836.07	50.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.50	9,836.07	50.00%	0.50	9,836.06	50.00%		
01.02.	TRAZO Y REPLANTIO	km	7.00	252.45	1,767.15	3.50	883.58	50.00%	1.50	378.68	21.43%	1.50	1,262.25	71.43%	5.00	1,262.25	71.43%	2.00	504.90	28.57%	
2.00	PAVIMENTOS																				
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	981.77	30.86	30,297.42	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	500.00	15,430.00	50.93%	500.00	15,430.00	50.93%	481.77	14,867.42	49.07%	
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	2,786.11	58.56	163,154.60	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,125.00	65,880.00	40.38%	1,125.00	65,880.00	40.38%	1,661.11	97,274.60	59.62%	
3.00	TRANSPORTE																				
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	4,521.46	11.23	50,776.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,480.00	16,620.40	32.73%	1,480.00	16,620.40	32.73%	3,041.46	34,155.60	67.27%	
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	24,415.87	1.96	47,855.11	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8,740.00	17,130.40	35.80%	8,740.00	17,130.40	35.80%	15,675.87	30,724.71	64.20%	
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	259.00	9.05	2,343.95	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	105.00	950.25	40.54%	105.00	950.25	40.54%	154.00	1,393.70	59.46%	
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	2,978.50	1.96	5,837.86	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,200.00	2,352.00	40.29%	1,200.00	2,352.00	40.29%	1,778.50	3,486.86	59.71%	
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE																				
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	7,000.00	0.69	4,830.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,000.00	1,380.00	28.57%	2,000.00	1,380.00	28.57%	5,000.00	3,450.00	71.43%	
5.00	SEÑALIZACION																				
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	7.00	182.33	1,276.31	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	7.00	1,276.31	100.00%	
05.02.	SEÑALES PREVENTIVAS	und	6.00	918.37	5,510.22	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6.00	5,510.22	100.00%	
05.03.	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	4.00	859.68	3,438.72	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	3,438.72	100.00%	
05.04.	SEÑALES INFORMATIVAS	und	4.00	525.62	2,102.48	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	2,102.48	100.00%	
6.00	IMPACTO AMBIENTAL																				
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0.56	866.95	833.03	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.56	833.03	100.00%	
7.00	EMERGENCIA SANITARIA																				
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gib	1.00	23,427.07	23,427.07	0.25	5,856.77	25.00%	0.25	5,856.77	25.00%	0.25	5,856.77	25.00%	0.25	5,856.77	25.00%	0.50	11,713.54	50.00%	
	Costo Directo				363,122.05		16,576.42			125,978.50					142,554.92					220,567.13	
	GASTOS GENERALES (10%) C.D.				36,312.21		1,657.64			12,597.85					14,255.49					22,056.72	
	UTILIDAD (5%) C.D.				18,156.10		828.82			6,298.93					7,127.75					11,028.35	
	SUB TOTAL				417,590.36		19,062.88			144,875.28					163,938.16					253,652.20	
	IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (IGV 18%)				75,166.26		3,431.32			26,077.55					29,508.87					45,657.39	
	VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO				492,756.62		22,494.20			170,952.83					193,447.03					299,309.59	
	PORCENTAJE AVANCE DEL SERVICIO				100.00%		4.56%			34.69%					39.25%					60.75%	


Jean Herberth Eche Mostacero
 INGENIERO CIVIL
 R. CIP 92633


CONSORCIO VIAL LA CHIRA
 JULIO CESAR RUIZCOZA QUEZADA
 CIP N° 19531391
 REPRESENTANTE COMUN

219

ANÁLISIS DE VALORIZACION MENSUAL Nº 02

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Proyecto SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

Tramo: "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM" - "EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG.= 11.650 KM"

Ubicación : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

Contratista: SITABAMBA - UCHUCUBAMBA - QUINUAL

Inspector: CONSORCIO VIAL LA CHIRA

Residente: ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA - CIP: 209150

ING. JEAN HERBERT ECHE MOSTACERO - CIP: 92633

Monto Contratado: S/ 1,581,740.26

Plazo de ejecución: 120 días calendario

Código	Descripción	PRESUPUESTO GENERAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
		Unidad	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%
1.00	OBRAS PROVISIONALES																
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	22,326.53	22,326.53	0.50	11,163.27	50.00%	0.00	0.00	0.00%	0.50	11,163.27	50.00%	0.50	11,163.26	50.00%
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	11.65	252.45	2,941.04	5.80	1,464.21	49.79%	3.00	757.35	25.75%	8.80	2,221.56	75.54%	2.85	719.48	24.46%
2.00	PAVIMENTOS																
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	1,712.80	31.73	54,347.14	0.00	0.00	0.00%	775.00	24,590.75	45.25%	775.00	24,590.75	45.25%	937.80	29,756.39	54.75%
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	5,232.02	55.04	287,970.38	0.00	0.00	0.00%	1,875.00	103,200.00	35.84%	1,875.00	103,200.00	35.84%	3,357.02	184,770.38	64.16%
3.00	TRANSPORTE																
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	8,332.77	9.87	82,244.44	0.00	0.00	0.00%	3,795.00	37,456.65	45.54%	3,795.00	37,456.65	45.54%	4,537.77	44,787.79	54.46%
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	45,002.38	1.80	81,004.28	0.00	0.00	0.00%	22,200.00	39,960.00	49.33%	22,200.00	39,960.00	49.33%	22,802.38	41,044.28	50.67%
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	434.78	8.13	3,534.76	0.00	0.00	0.00%	210.00	1,707.30	48.30%	210.00	1,707.30	48.30%	224.78	1,827.46	51.70%
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	4,999.95	1.80	8,999.91	0.00	0.00	0.00%	2,400.00	4,320.00	48.00%	2,400.00	4,320.00	48.00%	2,599.95	4,679.91	52.00%
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE																
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	11,650.00	0.66	7,689.00	0.00	0.00	0.00%	3,100.00	2,046.00	26.61%	3,100.00	2,046.00	26.61%	8,550.00	5,643.00	73.39%
5.00	SEÑALIZACION																
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	11.00	182.37	2,006.07	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	11.00	2,006.07	100.00%
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	24.00	781.13	18,747.12	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	24.00	18,747.12	100.00%
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	8.00	719.87	5,758.96	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	5,758.96	100.00%
05.04	SEÑALES INFORMATIVAS	und	4.00	526.68	2,106.72	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	2,106.72	100.00%
6.00	IMPACTO AMBIENTAL																
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0.94	1,314.28	1,235.42	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.94	1,235.42	100.00%
7.00	EMERGENCIA SANITARIA																
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	23,427.07	23,427.07	0.25	5,856.77	25.00%	0.25	5,856.77	25.00%	0.50	11,713.54	50.00%	0.50	11,713.53	50.00%
Costo Directo					604,338.84		18,484.25			219,894.82			238,379.07			365,959.77	
GASTOS GENERALES (10%) C.D.			10.00%		60,433.88		1,848.43			21,989.48			23,837.91			36,595.97	
UTILIDAD (5%) C.D.			5.00%		30,216.94		924.21			10,994.74			11,918.95			18,297.99	
SUB TOTAL					694,989.66		21,256.89			252,879.04			274,135.93			420,853.73	
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (IGV 18%)			18.00%		125,098.14		3,826.24			45,518.23			49,344.47			75,753.67	
VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO					820,087.80		25,083.13			298,397.27			323,480.40			496,607.40	
PORCENTAJE AVANCE DEL SERVICIO					100.00%		3.06%			36.39%			39.45%			60.55%	

CONSORCIO VIAL LA CHIRA
 JULIO CESAR QUISPE GARCIA QUEZADA
 DAN. N° 19531084
 REPRESENTANTE COMUN

JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA
 ING. CIVIL
 R. CIP. 209150

218

- HOJA DE CANCELACION.


CONSORCIO VIAL LA CHIRA

JULIO ALFONSO PIZCOA QUEZADA
CIP. N° 12631851
REPRESENTANTE COMUN


Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
ING. CIVIL
CIP. 209150

216

HOJA DE CANCELACION

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Proyecto	SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM", - "EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG.= 11.650 KM"
Cliente	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación	SITABAMBA
Contratista	CONSORCIO VIAL LA CHIRA
Inspector	ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA - CIP: 209150
Residente	ING. JEAN HERBERT ECHE MOSTACERO - CIP: 92633

MONTO REFERENCIAL	1,589,688.70
MONTO CONTRATADO	1,581,740.26
MONTO CONTRATADO MANTENIMIENTO PERIODICO	1,312,844.42


ITEM	DESCRIPCION	MONTO VALORIZADO
1.00.00	SUB TOTALES COSTO DIRECTO	S/. 345,873.32
	LA CHIRA (7.00 KM)	S/. 125,978.50
	UCHUCUBAMBA (11.650 KM)	S/. 219,894.82
	GASTOS GENERALES 10%	S/. 34,587.33
	UTILIDAD 5%	S/. 17,293.67
2.00.00	SUBTOTAL	S/. 397,754.32
	REAJUSTES	0.00
3.00.00	SUBTOTAL CON REAJUSTES	S/. 397,754.32
	AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO 10%	S/. 0.00
	AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES 20%	S/. 0.00
4.00.00	SUBTOTAL CON AMORTIZACIONES	S/. 397,754.32
5.00.00	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)	S/. 71,595.78
6.00.00	TOTAL NETO A RECIBIR	S/. 469,350.10
	Porcentaje de avance ejecutado en el mes (%)	35.75%

Jean Herbert Eche Mostacero
 INGENIERO CIVIL
 R. CIP. 92633

CONSORCIO VIAL LA CHIRA
Julio Cesar Cuzcoza Quezada
 JULIO CESAR CUZCOZA QUEZADA
 DNI N° 19531091
 REPRESENTANTE COMUN

- CUADRO
COMPARATIVO
DE AVANCE DE
SERVICIO
(PROGRAMADO –
EJECUTADO -
PAGADO).


Smith Jean Carlos Oitniano Oliva
ING. CIVIL
CIP. 209150


CONSORCIO VIAL LA CHIRA
JULIO CESAR QUIROZCO QUEZADA
C.I. N° 19831091
REPRESENTANTE COMUM

CUADRO COMPRATIVO DE AVANCE - PROGRAMADO - EJECUTADO - PAGADO

214

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Proyecto : SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL
TRAMO: "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH
(TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM", - "EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA -
QUINUAL LONG.= 11.650 KM"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO)
Contratista : CONSORCIO VIAL LA CHIRA
Inspector : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA - CIP: 209150
Residente : ING. JEAN HERBERT ECHE MOSTACERO - CIP: 92633

AVANCE DE SERVICIO PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Inc/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	21,534.99	21,534.99	4.37%	4.37%
31-Oct-20	203,622.24	225,157.23	41.32%	45.69%
30-Nov-20	188,081.13	413,238.36	38.17%	83.86%
31-Dic-20	79,518.26	492,756.62	16.14%	100.00%
TOTAL	492,756.62		100.00%	

AVANCE DE SERVICIO EJECUTADOS

MES	MONTOS (Inc/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	22,494.20	22,494.20	4.56%	4.56%
31-Oct-20	170,952.83	193,447.03	34.69%	39.25%
30-Nov-20	0.00	0.00	0.00%	
31-Dic-20	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	193,447.03		39.26%	

AVANCE DE SERVICIO PAGADOS

MES	MONTOS (Inc/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-Oct-20	0.00	0.00	0.00%	
30-Nov-20	0.00	0.00	0.00%	
31-Dic-20	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00		0.00%	


 Jean H. Eche Mostacero
 ING. CIVIL
 R. CIP. 92633


 CONSORCIO VIAL LA CHIRA
 JULIO CESAR QUIROZCA QUEZADA
 DNI N° 19631091
 REPRESENTANTE COMUN

CUADRO COMPRATIVO DE AVANCE - PROGRAMADO - EJECUTADO - PAGADO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Proyecto : SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
TRAMO: "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM", - "EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG.= 11.650 KM"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : SITABAMBA - UCHUCUBAMBA - QUINUAL
Contratista : CONSORCIO VIAL LA CHIRA
Inspector : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA - CIP: 209150
Residente : ING. JEAN HERBERT ECHE MOSTACERO - CIP: 92633

AVANCE DE SERVICIO PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Inc/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	23,495.29	23,495.29	2.86%	2.86%
31-Oct-20	345,224.16	368,719.45	42.10%	44.96%
30-Nov-20	317,711.81	686,431.26	38.74%	83.70%
31-Dic-20	133,656.54	820,087.80	16.30%	100.00%
TOTAL	820,087.80		100.00%	

AVANCE DE SERVICIO EJECUTADOS

MES	MONTOS (Inc/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	25,083.13	25,083.13	3.06%	3.06%
31-Oct-20	298,397.27	323,480.40	36.39%	39.45%
30-Nov-20	0.00	0.00	0.00%	
31-Dic-20	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	323,480.40		39.44%	

AVANCE DE SERVICIO PAGADOS


MES	MONTOS (Inc/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-Oct-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Nov-20	0.00	0.00	0.00%	
31-Dic-20	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00		0.00%	


 Jean H. Eche Mostacero
 ING. CIVIL
 R. CIP: 92633


 CONSORCIO VIAL LA CHIRA
 JULIO CESAR QUIROZ COA QUEZADA
 DNI N° 19531031
 REPRESENTANTE COMUN

- CUADRO DE BARRAS Y CURVAS.


Smith Jean Carlos Otinlano Ochoa
ING. CIVIL
CIP. 209150



CONSORCIO VIAL LA CHIRA
JULIO CESAR QUIPUZCOA QUEZADA
DMI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN

CUADRO DE BARRAS Y CURVA S

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Proyecto : TRAMO: "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM", - "EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG.= 11.650 KM"
Cliente : SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
Ubicación : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Contratista : EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO)
Inspector : CONSORCIO VIAL LA CHIRA
Residente : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA - CIP: 209150
 ING. JEAN HERBERT ECHE MOSTACERO - CIP: 92633
Monto Contratado S/. 1,581,740.26
Plazo de ejecucion 120 dias calendarios

GRAFICO DEL PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO ACUMULADO

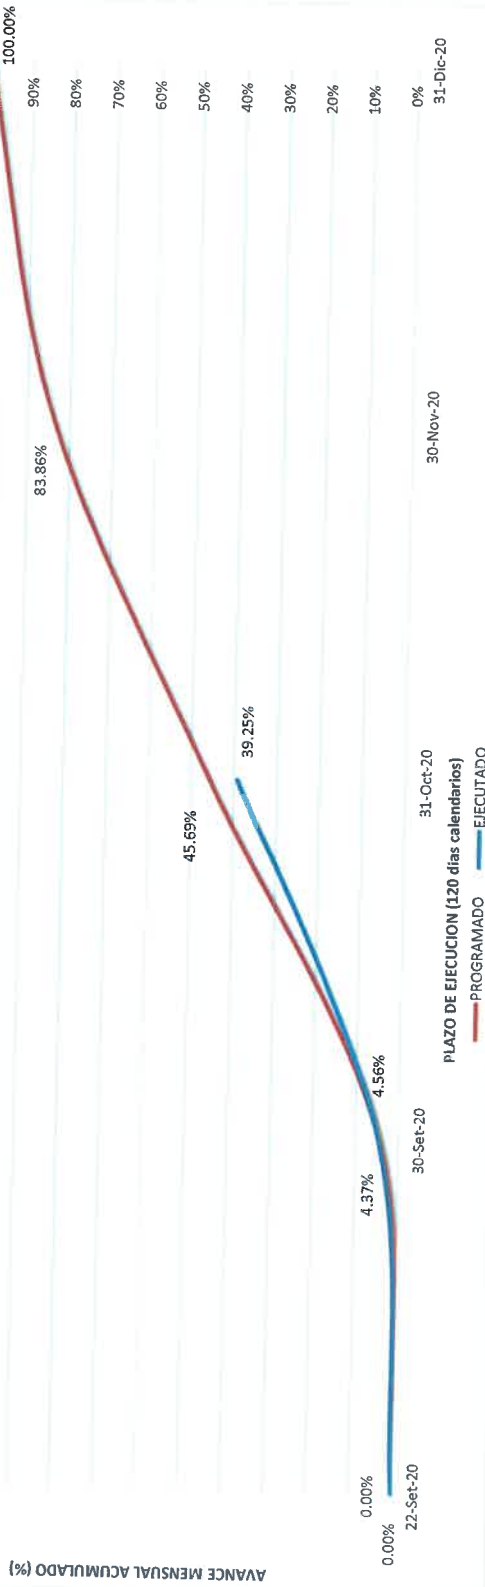

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV) ACUMUL.		PORCENTAJES ACUMUL.	
	PARCIAL S/.	S/.	PARCIAL %	%
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	21,534.99	21,534.99	4.37%	4.37%
31-Oct-20	203,622.24	225,157.23	41.32%	45.69%
30-Nov-20	188,081.13	413,238.36	38.17%	83.86%
31-Dic-20	79,518.26	492,756.62	16.14%	100.00%
TOTAL	492,756.62		100.00%	

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV) ACUMUL.		PORCENTAJES ACUMUL.	
	PARCIAL S/.	S/.	PARCIAL %	%
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	22,494.20	22,494.20	4.56%	4.56%
31-Oct-20	170,952.83	193,447.03	34.69%	39.25%
30-Nov-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-Dic-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	193,447.03		39.26%	

JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 209150

CONSORCIO VIAL LA CHIRA
 JULIO SANCHEZ FUZCOA QUEZADA
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 19531091

211


CUADRO DE BARRAS Y CURVAS

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Proyecto : SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
Ubicación : SITABAMBA - UCHUCUBAMBA - QUINUAL
Contratista : CONSORCIO VIAL LA CHIRA
Inspector : ING. SMITH JEAN CARLOS OTTINIANO OLIVA - CIP: 209150
Residente : ING. JEAN HERBERT ECHE MOSTACERO - CIP: 92633

Tramo: "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM", - "EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG.= 11.650 KM"
Monto Contratado S/. 1,581,740.26
Plazo de ejecucion 120 días calendarios

GRAFICO DEL PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO ACUMULADO

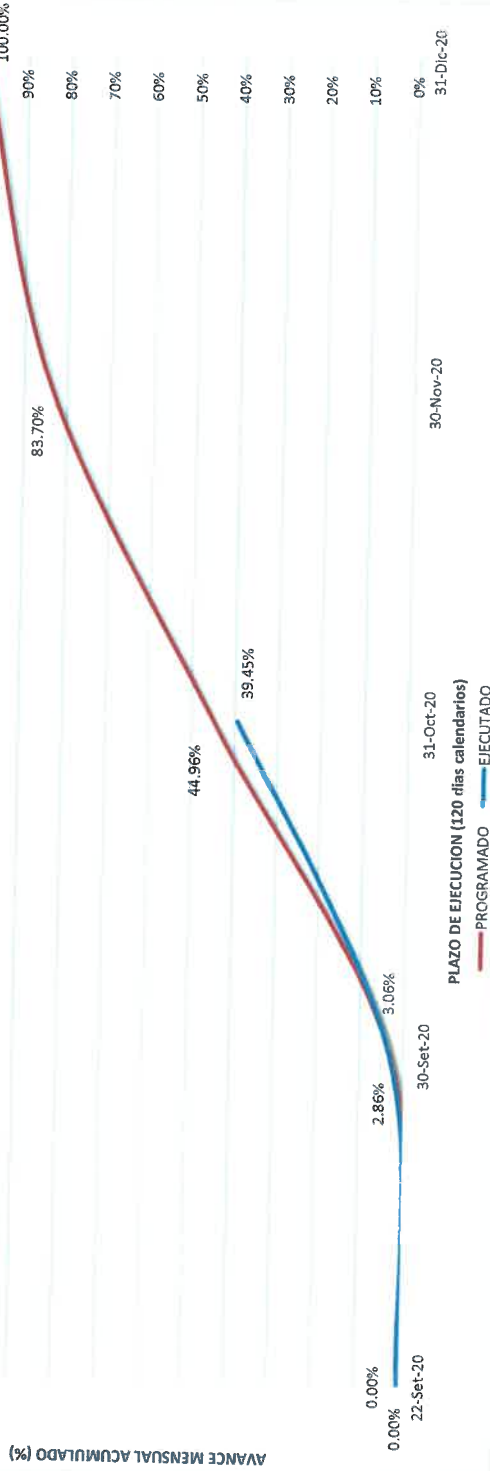

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	23,495.29	23,495.29	2.86%	2.86%
31-Oct-20	345,224.16	368,719.45	42.10%	44.96%
30-Nov-20	317,711.81	686,431.26	38.74%	83.70%
31-Dic-20	133,656.54	820,087.80	16.30%	100.00%
TOTAL	820,087.80		100.00%	

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	25,083.13	25,083.13	3.06%	3.06%
31-Oct-20	298,397.27	323,480.40	36.39%	39.45%
30-Nov-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-Dic-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	323,480.40		39.44%	

Ing. Jean Herbert Eche Mostacero
 Representante Común

Consorcio Vial La Chira
 Julio Cesar Quiroz Coa Quezada
 DIN N° 19531091
 Representante Común

210


CUADRO DE BARRAS Y CURVAS

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Proyecto: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
Cliente: TRAMO: "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM", - "EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG.= 11.650 KM"
Ubicación: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Contratista: "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM", - "EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG.= 11.650 KM"
Inspector: ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA - CIP: 209150
Residente: ING. JEAN HERBERT ECHE MOSTACERO - CIP: 92633

Monto Contratado
 S/. 1.581,740.26
 Plazo de ejecucion
 120 dias calendarios

GRAFICO DEL PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO ACUMULADO

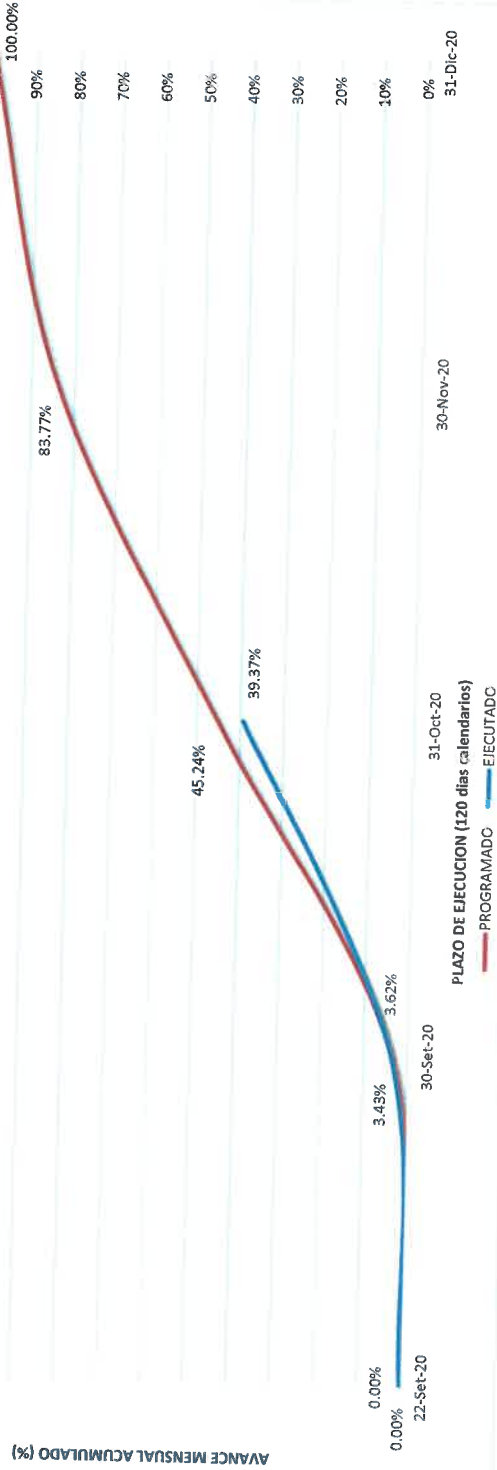

MONITOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Incl/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	45,030.28	45,030.28	3.43%	3.43%
31-Oct-20	548,846.40	593,876.68	41.81%	45.24%
30-Nov-20	505,792.94	1,099,669.62	38.53%	83.77%
31-Dic-20	213,174.80	1,312,844.42	16.23%	100.00%
TOTAL	1,312,844.42		100.00%	

Jean Herbert Eche Mostacero
 ING. CIVIL
 CIP: 92633

MONITOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (Incl/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	47,577.33	47,577.33	3.62%	3.62%
31-Oct-20	469,350.10	516,927.43	35.75%	39.37%
30-Nov-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-Dic-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	516,927.43		39.37%	

Jean Carlos Otiniano Oliva
 CONSORCIO VIAL LA CHIRA
 JULIO CESAR RUBINZCOA QUEZADA
 DNI N° 10331091
 REPRESENTANTE COMUN

- **CRONOGRAMA
DE AVANCE DE
SERVICIO
PROGRAMADO.**

Out
Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
ING. CIVIL
CIP. 209150

JC
CONSORCIO VIAL LA CHIRA
JULIO CESAR QUIPUZCOA QUEZADA
DNI N° 18831891
REPRESENTANTE COMUN

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO

SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG.= 7.00 KM", - "EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG.= 11.650 KM"

Proyecto :

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 Ubicación : SITABAMBA - UCHUCUBAMBA - QUINUAL
 Contratista : CONSORCIO VIAL LA CHIRA
 Inspector : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA - CIP: 209150
 Residente : ING. JEAN HERBERT ECHE MOSTACERO - CIP: 92633

ITEM	PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL	Mes 01 PROGRAMADO	Mes 02 PROGRAMADO	Mes 03 PROGRAMADO	Mes 04 PROGRAMADO
01	OBRAS PRELIMINARES								
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	glb	1.00	S/. 22,326.53	25,267.57	11,457.37	1,176.42	735.26	11,898.53
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	11.65	S/. 252.45	S/. 2,941.04	294.10			11,163.27
02	PAVIMENTOS								
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	1712.80	S/. 31.73	342,317.52	-	1,176.42	735.26	735.26
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	m3	5232.02	S/. 55.04	S/. 54,347.14	-	159,477.60	139,644.37	43,195.56
03	TRANSPORTE								
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	8332.77	S/. 9.87	S/. 175,783.39	-	87,891.70	87,891.70	43,195.56
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	45002.38	S/. 1.80	S/. 82,244.44	-	41,122.22	41,122.22	-
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	434.78	S/. 8.13	S/. 81,004.28	-	40,502.14	40,502.14	-
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	4999.95	S/. 1.80	S/. 3,534.76	-	1,767.38	1,767.38	-
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE								
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	11650.00	S/. 1.80	S/. 8,999.91	-	4,499.96	4,499.96	-
05	SEÑALIZACION								
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	11.00	S/. 0.66	S/. 7,689.00	-	-	-	7,689.00
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	24.00	S/. 182.37	S/. 28,618.87	-	-	-	28,618.87
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	8.00	S/. 781.13	S/. 2,006.07	-	-	-	2,006.07
05.04	SEÑALES INFORMATIVAS	und	4.00	S/. 719.87	S/. 18,747.12	-	-	-	18,747.12
06	IMPACTO AMBIENTAL								
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0.94	S/. 526.68	S/. 5,758.96	-	-	-	5,758.96
07	EMERGENCIA SANITARIA								
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	S/. 1,235.42	S/. 1,235.42	5,856.77	5,856.77	5,856.77	5,856.77
	COSTO DIRECTO				S/. 23,427.07	5,856.77	5,856.77	5,856.77	5,856.77
	COSTO INDIRECTO (10.00%)				S/. 23,427.07	5,856.77	5,856.77	5,856.77	5,856.77
	UTILIDAD (5%)				604,338.84	17,314.14	254,402.48	234,128.09	98,494.13
	SUB TOTAL				S/ 604,338.84	17,314.14	254,402.48	234,128.09	98,494.13
	IGV (18%)				S/ 60,433.88	1,731.41	25,440.25	23,412.81	9,849.41
	COSTO TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL				S/ 30,216.94	865.71	12,720.12	11,706.40	4,924.71
					S/ 694,989.66	19,911.26	292,562.85	269,247.30	113,268.25
					S/ 125,098.14	3,584.03	52,661.31	48,464.51	20,388.29
					S/ 820,087.80	23,495.29	345,224.16	317,711.81	133,656.54

PROGRAMADO MENSUAL	ACUMULADO	PROGRAMADO MENSUAL	ACUMULADO
2.86%	2.86%	42.10%	38.74%
		44.96%	83.70%
			100.00%


CONSORCIO VIAL LA CHIRA
 JULIO CESAR BARRALDO QUEZADA
 R. CIP. 10033
 REPRESENTANTE COMÚN


 Jean H. Eche Mostacero
 ING. CIVIL
 R. CIP. 10033

G2

- PANEL
FOTOGRAFICO.


Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
ING. CIVIL
CIP. 200150


CONSORCIO VIAL LA CHIRA
FRANCISCO QUEZADA
CIP. 10891
INTE. COMUN

TRAMO: EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG.= 11.650



CHARLAS DE SEGURIDAD Y COVID 19



TOMA DE TEMPERATURA - COVID 19

Oliv
Smith Jean Carlos Oliviano Olive
ING. CIVIL
CIP. 209150

J.P.R.
CONSORCIO VIAL LA CHIRA
JULIO CESAR QUIPUZCOA QUEZADA
CNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN

J.P.R.
Jean P. Espinoza
ING. CIVIL
R. CIP. 92633



TOMA DE TEMPERATURA - COVID 19



LAVADO DE MANOS - ROMPER LA CADENA DE CONTAGIOS

CONSORCIO VIAL LA CHIRA
JULIO CESAR QUIPUZCOA QUE
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUNITARIO

Smith
Smith Jean Carlos Oliniano Oliva
ING. CIVIL
CIP. 209150

Jeon
Jeon Elio Mastacero
ING. CIVIL
CIP. 92633



RECONFORMACIÓN DE CUENTAS Y CAPA NIVELANTE - KM 10+900



CAPA NIVELANTE – KM 9+800


Jean Carlos Quiroz
ING. CIVIL
R. CIP. 02033


Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
ING. CIVIL
CIP. 208150


CONSORCIO VIAL LA CHIRA
JULIO CESAR QUIROZ QUEZADA
DMI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN




CANTERA KM 9+900



ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE – KM 11+100


Jean Francisco Hostalero
ING. CIVIL
R. CIP. 32033


Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
ING. CIVIL
CIP. 209150


CONSORCIO VIAL LA CHIRA
JULIO CESAR QUIROZ GUEZADA
DNI N° 19531081
REPRESENTANTE COMUN



CONFORMACIÓN DE CAPA NIVELANTE – KM 9+100



MATERIAL GRANULAR KM 10+500


Jean Carlos Olvera
ING. CIVIL
R. CIP. 92633


Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
ING. CIVIL
CIP. 209150


CONSORCIO VIAL LA CHIRA
ING. CAROLINA GUEZADA
CIP. 231981
ESTADO COMUN

TRAMO: "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO)
LONG.= 7.00 KM"



CHARLAS DE SEGURIDAD Y COVID 19



TOMA DE TEMPERATURA - COVID 19

Out
Smith Jean Carlos Olintano Oliva
ING. CIVIL
CIP. 209180
CONSORCIO VIAL LA CHIRA
JR
JULIO CESAR QUIMBUZUA GUEZADA
DNI N° 78531891
REPRESENTANTE COMUN

Jean Carlos Oliva
Jean Carlos Oliva
ING. CIVIL
R. CIP. 92633



CHARLA DE SEGURIDAD DE 5 MINUTOS



LAVADO DE MANOS - ROMPIENDO LA CADENA DE CONTAGIOS

Out
Jean Carlos Oliviano Oliva
ING. CIVIL
CIP. 209150

CONSORCIO VIAL LA CHIRA
COMITÉ DE CALIDAD Y SEGURIDAD
REPRESENTANTE COMUN

[Signature]
Jean Carlos Oliviano Oliva
ING. CIVIL
R. CIP. 209150



RECONFORMACIÓN DE CUNETAS KM 1+260



CAPA NIVELANTE KM 2+400


Jean Carlos Rodríguez
ING. CIVIL
R. CIP. 22633


Smith Jean Carlos Otiruno Oliva
ING. CIVIL
CIP. 209150


CONSORCIO VIAL LA CHIRA
S. R. L.
CALLE 1000A QUILANDA
CANTÓN LA CHIRA
P. O. BOX 1000



CAPA NIVELANTE KM 0+500



MATERIAL GRANULAR KM 0+500



Jesus Esteban Rosado
ING. CIVIL
R. CIP. 92933


CONSORCIO VIAL LA CHIRA

JULIO CESAR CHIPUZCOA QUEZADA
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN



Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
ING. CIVIL
CIP. 209150

- ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.


CONSORCIO VIAL LA CHIRA

JULIO CESAR QUIROZ GUEZADA
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN


Smith Jean Carlos Olinario Oliva
ING. CIVIL
CIP. 209150

“ACTA DE ENTREGA DE TERRENO”

Servicio	MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG= 7.00KM”, -“EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG = 11.650 KM”, DEL DISTRITO DE SITAMABA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.
Tramo	“EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL” LONG. = 11.650 KM
Provincia	SANTIAGO DE CHUCO
Distrito	SITABAMBA
Entidad Contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)
Empresa Ejecutora	CONSORCIO VIAL LA CHIRA (ECAN INGENIERIA S.R.L. + CORPORACION QUIPUSCOA ARANDA S.A.C.)
N.º de Contrato	CONTRATO DE SERVICIO N.º 009-2020-MPSCH-LOG
Fecha de Contrato	28/08/2020
Modalidad	SUMA ALZADA
Monto Presupuestado	S/. 993,022.70 soles Inc. (I.G.V.)
Monto Contractual	S/. 988,059.00 soles Inc. (I.G.V.)
Inspector de Servicio	Ing. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA
Plazo de Ejecución	PLAN DE TRABAJO: 20 D.C. MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C. MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C. INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C. TOTAL: 505 DÍAS CALENDARIOS (sujeto a fecha de contrato)
Fecha de Culminación	31/12/2021



Gabriel Omar Palma Cossio
INGENIERO CIVIL
Reg.CIP. N° 192701

Ing. David Iván Silva Torres
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
N° 63635

CONSORCIO VIAL LA CHIRA
JULIO CÉSAR QUIPUSCOA QUEZADA
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMÚN

Jean Eche Mostacero
ING. CIVIL
R. CIP. 92633

En el caserío de Chagavara (Dv. Emp. LI-115), distrito de Sitabamba, provincia de Santiago de Chuco – La libertad, siendo las 8:00 a.m. del 29 de agosto del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza con CIP. N° 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N° 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N° 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Ing. Smith Jean Carlos Otiniano Oliva con CIP N° 209150; y por último, por parte del Contratista el Ing. Jean Herbert Eche Mostacero con CIP N° 92633 como Residente de servicio y el Sr. Julio César Quipuscoa Quezada con DNI N° 19531091, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL LA CHIRA (ECAN INGENIERIA S.R.L. + CORPORACION QUIPUSCOA ARANDA S.A.C.). A fin de realizar la ENTREGA DE TERRENO del tramo: **“EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL”** con una longitud de **11.650 km**.

Este acto protocolar tiene por finalidad hacer la entrega de la ruta mencionada en todo su recorrido físico para la recolección de información necesaria y de esta manera hacer la elaboración del **PLAN DE TRABAJO** de la ruta, que es parte de la FASE I del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y formatos (anexos) estipulados en los Términos de Referencia del D.U. N° 070-2020 presentados para la contratación.

Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG=7.00KM”, -“EMP. LI-911**

(SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG = 11.650 KM”, DEL DISTRITO DE SITAMABA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.

Siendo las 8:30 p.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para dar inicio a la elaboración del Plan de Trabajo y continuar con los procedimientos posteriores para dar inicio a la FASE II y III (mantenimiento periódico y rutinario) del servicio. Del mismo día, se da por concluida el acto de **ENTREGA DE TERRENO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.

AREA USUARIA



INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez Luis F.
CIP N° 190782
JEFE DE OPERACIONES


Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 190782



INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza Rafael K.
CIP N° 218511
GERENTE GENERAL

Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 218511

AREA RESPONSABLE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. David Iván Silva Torres
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
CIP N° 63635


Ing. David Iván Silva Torres
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH
CIP N° 63635

EMPRESA EJECUTORA



Jean H. Eche Mostacero
ING. CIVIL
R. CIP. 92633

Ing. Jean Herbert Eche Mostacero
Residente de Servicio
CIP N° 92633



CONSORCIO VIAL LA CHIRA
Sr. Julio César Quipuscoa Quezada
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN

Sr. Julio César Quipuscoa Quezada
Representante Común de CONSORCIO VIAL LA CHIRA
DNI N° 19531091



INSPECTOR



Gabriel Omar Aguirre Cossio
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 192701

Ing. Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
Inspector del Servicio
CIP N° 209150

“ACTA DE ENTREGA DE TERRENO”

  <p>Gabriel Oñativia Pania Cossio INGENIERO CIVIL Reg. CIP. N° 192701</p>	<p>Servicio MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG= 7.00KM”, -“EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG = 11.650 KM”, DEL DISTRITO DE SITAMABA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.</p> <p>Tramo “EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO)” LONG. = 7.000 KM</p> <p>Provincia SANTIAGO DE CHUCO</p> <p>Distrito SITABAMBA</p> <p>Entidad Contratante MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)</p> <p>Empresa Ejecutora CONSORCIO VIAL LA CHIRA (ECAN INGENIERIA S.R.L. + CORPORACION QUIPUSCOA ARANDA S.A.C.)</p> <p>N.º de Contrato CONTRATO DE SERVICIO N.º 009-2020-MPSCH-LOG</p> <p>Fecha de Contrato 28/08/2020</p> <p>Modalidad SUMA ALZADA</p> <p>Monto Presupuestado S/. 596,666.00 soles Inc. (I.G.V.)</p> <p>Monto Contractual S/. 593,683.00 soles Inc. (I.G.V.)</p> <p>Inspector de Servicio Ing. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA</p> <p>Plazo de Ejecución PLAN DE TRABAJO: 20 D.C. MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C. MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C. INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C. TOTAL: 505 DÍAS CALENDARIOS (sujeto a fecha de contrato)</p> <p>Fecha de Culminación 31/12/2021</p>
--	---



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. David Iván Silva Torres
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
CIP N° 63635

En el caserío de Chagavara (Dv. Emp. LI-115), distrito de Sitabamba, provincia de Santiago de Chucó – La libertad, siendo las 8:00 a.m. del 29 de agosto del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chucó (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza con CIP. N° 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N° 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N° 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Ing. Smith Jean Carlos Otiniano Oliva con CIP N° 209150; y por último, por parte del Contratista el Ing. Jean Herbert Eche Mostacero con CIP N° 92633 como Residente de servicio y el Sr. Julio César Quipuscoa Quezada con DNI N° 19531091, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL LA CHIRA (ECAN INGENIERIA S.R.L. + CORPORACION QUIPUSCOA ARANDA S.A.C.). A fin de realizar la **ENTREGA DE TERRENO** del tramo: “EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO)” con una longitud de 7.000 km.

Este acto protocolar tiene por finalidad hacer la entrega de la ruta mencionada en todo su recorrido físico para la recolección de información necesaria y de esta manera hacer la elaboración del **PLAN DE TRABAJO** de la ruta, que es parte de la FASE I del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y formatos (anexos) estipulados en los Términos de Referencia del D.U. N° 070-2020 presentados para la contratación.

Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG=7.00KM”, -“EMP. LI-911**

CONSORCIO VIAL LA CHIRA

 Ing. Jean Herbert Eche Mostacero
 R. CIP. 92633
 REPRESENTANTE COMUN
 JULIO CESAR QUIPUSCOA QUEZADA
 DNI N° 19531091

(SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG = 11.650 KM”, DEL DISTRITO DE SITAMABA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.

Siendo las 8:30 p.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para dar inicio a la elaboración del Plan de Trabajo y continuar con los procedimientos posteriores para dar inicio a la FASE II y III (mantenimiento periódico y rutinario) del servicio. Del mismo día, se da por concluida el acto de **ENTREGA DE TERRENO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.

AREA USUARIA

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
JEFE DE OPERACIONES

Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 190782

INGENIERO CIVIL
Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza

Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 218511

AREA RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. David Iván Silva Torres
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
CIP N° 63635

Ing. David Iván Silva Torres
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH
CIP N° 63635

EMPRESA EJECUTORA

Jean H. Eche Mostacero
ING. CIVIL
R. CIP 92633

Ing. Jean Herbert Eche Mostacero
Residente de Servicio
CIP N° 92633

CONSORCIO VIAL LA CHIRA

JULIO CÉSAR QUIPUZCOA QUEZADA
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMÚN

Sr. Julio César Quipuscoa Quezada
Representante Común de CONSORCIO VIAL LA CHIRA
DNI N° 19531091

INSPECTOR

Gabriel Omar Santa Cossio
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 192701

Ing. Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
Inspector del Servicio
CIP N° 209150

- ACTA DE INICIO DE SERVICIO.

Out
Smith Jean Carlos Otréano Oliva
ING. CIVIL
CIP. 209150

JCS
CONSORCIO VIAL LA CHIRA
.....
JULIO CÉSAR QUIPUZCOA QUEZADA
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN

“ACTA DE INICIO DE SERVICIO”

Servicio

MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG= 7.00KM”, -“EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG = 11.650 KM”, DEL DISTRITO DE SITAMABA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.

Tramo

“EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO)” LONG. = 7.000 KM

Provincia

SANTIAGO DE CHUCO

Distrito

SITABAMBA

Entidad Contratante

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)

Empresa Ejecutora

CONSORCIO VIAL LA CHIRA (ECAN INGENIERIA S.R.L. + CORPORACION QUIPUSCOA ARANDA S.A.C.)

N.º de Contrato

CONTRATO DE SERVICIO N.º 009-2020-MPSCH-LOG

Fecha de Contrato

28/08/2020

Modalidad

SUMA ALZADA

Monto Presupuestado

S/. 596,666.00 soles Inc. (I.G.V.)

Monto Contractual

S/. 593,683.00 soles Inc. (I.G.V.)

Inspector de Servicio

Ing. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA

Aprobación Plan de Trabajo

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 154-2020-MPSCH/GM

Fecha de Aprobación

21/09/2020

Fecha de Inicio

22/09/2020

Plazo de Ejecución

MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C. (sujeto a fecha de contrato)

MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C.

INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C.

Fecha de Culminación

31/12/2021

En el caserío de Chagavara (Dv. Emp. LI-115), distrito de Sitabamba, provincia de Santiago de Chuco – La libertad, siendo las 8:00 a.m. del 22 de septiembre del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza con CIP. N° 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N° 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH, el Ing. Carlos Enrique Geldres Barriga con CIP N° 70737 como monitor designado del servicio intervenido (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N° 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Smith Jean Carlos Otiniano Oliva con CIP N° 209150; asimismo, representando a Provias Descentralizado está el Ing. Gabriel Omar Panta Cossio con CIP N° 192701 encargado de Monitoreo y Seguimiento y el Ing. Bach. Eduardo Rafael Príncipe León con DNI N° 46839109 como Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento; finalmente, por parte del Contratista Ing. Jean Herbert Eche Mostacero con CIP N° 92633 como Residente de servicio y el Sr. Julio César Quipuscoa Quezada con DNI N° 19531091, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL LA CHIRA (ECAN INGENIERIA S.R.L. + CORPORACION QUIPUSCOA ARANDA S.A.C.). A fin de realizar el **INICIO DE SERVICIO** del tramo: **“EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO)”** con una longitud de **7.000 km.**

Este acto protocolar tiene por finalidad dar inicio a la ejecución de las actividades de **MANTENIMIENTO PERIÓDICO** de la ruta mencionada en todo su recorrido físico correspondiente a la FASE II del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y partidas estipulados en el Plan de Trabajo previamente aprobado por la Entidad.



Carlos E. Geldres Barriga
INGENIERO CIVIL
CIP 70737

CONSORCIO VIAL LA CHIRA
REPRESENTANTE COMÚN
JULIO CÉSAR QUIPUSCOA QUEZADA
DNI N° 19531091

Jean H. Eche Mostacero
ING. CIVIL
CIP. 92633

Gabriel Omar Panta Cossio
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 192701

Ing. David Iván Silva Torres
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
CIP N° 63635

Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG= 7.00KM", -"EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG = 11.650 KM", DEL DISTRITO DE SITAMABA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.**

Siendo las 10:30 a.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas acorde con el Plan de Trabajo, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para empezar la ejecución del Mantenimiento Periódico. Del mismo día, se da por concluido el acto de **INICIO DE SERVICIO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.

AREA USUARIA

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez Luis F
CIP N° 190782
JEFE DE OPERACIONES

Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 190782

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
CIP N° 218511
GERENTE GENERAL

Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 218511

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Carlos E. Geldres Barriga
INGENIERO CIVIL
R. CIP 70737

Ing. Carlos Enrique Geldres Barriga
Monitor Designado del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 70737

AREA RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. David Iván Silva Torres
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
CIP N° 63635

Ing. David Iván Silva Torres
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH
CIP N° 63635

REPRESENTANTES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD

INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 192701

Ing. Gabriel Omar Panta Cossio
Monitoreo y Seguimiento a Mantenimiento Vial
Provincia de Santiago de Chucuito
CIP N° 192701

ANALISTA Y REGISTRADOR DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO VIAL
PROV. SANTIAGO DE CHUCO

Ing. Bach. Eduardo Rafael Príncipe León
Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento
Provincia de Santiago de Chucuito
DNI N° 46839109

EMPRESA EJECUTORA

Jean H. Eche Mostacero
ING. CIVIL
R. CIP. 92633

Ing. Jean Herbert Eche Mostacero
Residente de Servicio
CIP N° 92633

CONSORCIO VIAL LA CHIRA

Julio César Quipuscoa Quezada
JULIO CÉSAR QUIPUZCOA QUEZADA
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN

Sr. Julio César Quipuscoa Quezada
Representante Común de CONSORCIO VIAL LA CHIRA
DNI N° 19531091

INSPECTOR

Ing. Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
Inspector del Servicio
CIP N° 209150

“ACTA DE INICIO DE SERVICIO”

Servicio

MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG= 7.00KM”, -“EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG = 11.650 KM”, DEL DISTRITO DE SITAMABA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.

Tramo

“EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL” LONG. = 11.650 KM

Provincia

SANTIAGO DE CHUCO

Distrito

SITABAMBA

Entidad Contratante

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)

Empresa Ejecutora

CONSORCIO VIAL LA CHIRA (ECAN INGENIERIA S.R.L. + CORPORACION QUIPUSCOA ARANDA S.A.C.)

N.º de Contrato

CONTRATO DE SERVICIO N.º 009-2020-MPSCH-LOG

Fecha de Contrato

28/08/2020

Modalidad

SUMA ALZADA

Monto Presupuestado

S/. 993,022.70 soles Inc. (I.G.V.)

Monto Contractual

S/. 988,059.00 soles Inc. (I.G.V.)

Inspector de Servicio

Ing. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA

Aprobación Plan de Trabajo

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 154-2020-MPSCH/GM

Fecha de Aprobación

21/09/2020

Fecha de Inicio

22/09/2020

Plazo de Ejecución

MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C. (sujeto a fecha de contrato)

MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C.

INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C.

Fecha de Culminación

31/12/2021



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

Ing. David Iván Silva Torres
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA



Carlos E. Celdres Barriga
INGENIERO CIVIL
R. CIP 70737

CONSORCIO VIAL LA CHIRA
ECAN INGENIERIA S.R.L. + CORPORACION QUIPUSCOA ARANDA S.A.C.
JULIO CÉSAR QUIPUSCOA QUEZADA
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMÚN

Jean Herbert Eche Mostacero
ING. CIVIL
R. CIP. 92633

Gabriel Omar Panta Cossio
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 192701

Eduardo Rafael Príncipe León
ANALISTA Y REGISTRADOR DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
REG. CIP. N° 92633

En el caserío de Chagavara (Dv. Emp. LI-115), distrito de Sitabamba, provincia de Santiago de Chuco – La libertad, siendo las 8:00 a.m. del 22 de septiembre del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza con CIP. N° 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N° 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH, el Ing. Carlos Enrique Geldres Barriga con CIP N° 70737 como monitor designado del servicio intervenido (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N° 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Smith Jean Carlos Otiniano Oliva con CIP N° 209150; asimismo, representando a Provias Descentralizado está el Ing. Gabriel Omar Panta Cossio con CIP N° 192701 encargado de Monitoreo y Seguimiento y el Ing. Bach. Eduardo Rafael Príncipe León con DNI N° 46839109 como Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento; finalmente, por parte del Contratista Ing. Jean Herbert Eche Mostacero con CIP N° 92633 como Residente de servicio y el Sr. Julio César Quipuscoa Quezada con DNI N° 19531091, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL LA CHIRA (ECAN INGENIERIA S.R.L. + CORPORACION QUIPUSCOA ARANDA S.A.C.). A fin de realizar el **INICIO DE SERVICIO** del tramo: **“EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL”** con una longitud de **11.650 km.**

Este acto protocolar tiene por finalidad dar inicio a la ejecución de las actividades de **MANTENIMIENTO PERIÓDICO** de la ruta mencionada en todo su recorrido físico correspondiente a la FASE II del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y partidas estipulados en el Plan de Trabajo previamente aprobado por la Entidad.

Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: "EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG= 7.00KM", "EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG = 11.650 KM", DEL DISTRITO DE SITAMABA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.**

Siendo las 10:30 a.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas acorde con el Plan de Trabajo, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para empezar la ejecución del Mantenimiento Periódico. Del mismo día, se da por concluido el acto de **INICIO DE SERVICIO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.

AREA USUARIA

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez Luis F
JEFE DE OPERACIONES
CIP N° 190782

Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 190782

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
GERENTE GENERAL
CIP N° 218511

Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 218511

.....
Carlos E. Geldres Barriga
INGENIERO CIVIL
R. CIP 70737

Ing. Carlos Enrique Geldres Barriga
Monitor Designado del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 70737

AREA RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. David Iván Silva Torres
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
CIP N° 63635

Ing. David Iván Silva Torres
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH
CIP N° 63635

REPRESENTANTES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD

.....
Gabriel Omar Panta Cossio
INGENIERO CIVIL
Reg.CIP N° 192701

Ing. Gabriel Omar Panta Cossio
Monitoreo y Seguimiento a Mantenimiento Vial
Provincia de Santiago de Chuco
CIP N° 192701

.....
Bach. Eduardo Rafael Príncipe León
ANALISTA Y REGISTRADOR DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO
DNI N° 46839109

Ing. Bach. Eduardo Rafael Príncipe León
Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento
Provincia de Santiago de Chuco
DNI N° 46839109

CONSORCIO VIAL LA CHI.
.....
JULIO CESAR QUIPUZCOA QUEZADA
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN

.....
Jean Carlos Mestacero
ING. CIVIL
R. CIP. 92633



EMPRESA EJECUTORA


Jean H. Eche Mostacero
ING. CIVIL
R. CIP. 92633

Ing. Jean Herbert Eche Mostacero
Residente de Servicio
CIP N° 92633

CONSORCIO VIAL LA CHIRA


JULIO CÉSAR QUIPUZCOA QUEZADA
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMÚN

Sr. Julio César Quipuzcoa Quezada
Representante Común de CONSORCIO VIAL LA CHIRA
DNI N° 19531091

INSPECTOR

Ing. Smith Jean Carlos Otiniano Oliva
Inspector del Servicio
CIP N° 209150
