



ORDEN DE SERVICIO

6219-6220

NUMERO:

001075

DE FECHA: 21/12/2020

Señor(es)	CORPORACION SORIANO L & C SAC	RUC Nº	20600813715
Dirección	MZA. T LOTE 17 URB SAN ANDRES 5TA VISTOR LARCO HERRERA -TRUJILLO-LA LIBERTAD		
Referencia N°	CONTRATO DE SERVICIOS N° 016-2020-MPSCH-LOG		
Condiciones de Pago :	CCI	OFICINA	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA---IVP
Objeto del Servicio :	EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALTRAMO EMP.PE -3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA, LONG 4.33 KM CALIFORNIA-LOS ANGELES-LA CRUZ DE ASHIQUINO-MAL PASO-TIERRA NEGRA LONG 15.906 KM DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHUCO-LA LIBERTAD.		
Destino a	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO	Pedido N° :	001075

LOS SIGUIENTES SERVICIOS :			V A L O R	
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
		PAGO DE VALORIZACION N° 03: DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES VECINALTRAMO EMP.PE -3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA, LONG 4.33 KM CALIFORNIA-LOS ANGELES-LA CRUZ DE ASHIQUINO-MAL PASO-TIERRA NEGRA LONG 15.906 KM DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHUCO-LA LIBERTAD.PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. SEGÚN: INFORME N° 314-2020-IVP-MPSCH/GG/VRRK INFORME N°1314-2020-MPSCH/DIST/SGI PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 008-2020-MPSCH/CS		S/. 377,795.23
			TOTAL S/.	377,795.23

AFECTACION PRESUPUESTAL DEL SERVICIO			DISTRIBUCION CONTABLE
ACTIVIDAD/PROYECTO:	META	CLASIFICADOR:	CUENTAS POR PAGAR
0138-PROMOCION IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA	0188-MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL	23.27.16	

AUTORIZACION DEL SERVICIO		ÁREA USUARIA:	
 Lic. Yanir J. Rodríguez Marquina JEFE DE LOGISTICA	 Abog. John Lito Curay Reyes ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIA	MES
UNIDAD DE LOGISTICA	ADMINISTRACION y/o GERENCIA	18	12
		AÑO	2020
			FIRMA

Debitado 121.717,81
Total 306,04,23

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO
ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROVEIDO
PASE a: contabilidad
PARA: Devengado
FECHA: 21.12.2020 Firma:

PEC 3 08

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 0000000489
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA : 10 SANTIAGO DE CHUCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO [301197]

MES : JULIO
FECHA DE DOCUMENTO : 07/07/2020
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION. PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA;
DETALLE DEL GASTO : SANTIAGO DE CHUCO - L.L, EN EL MARCO DEL D.U 070-2020 - ART. 21.1 (ANEXO 13)

FECHA APROBACION : 07/07/2020

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO F01-374-2020-LOG

SECUENCIA	MONTO
PRG PROD/PRY ACT/IOBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESFESPD	

0001 INICIAL

0138 3000133 5006373 15 033 0066 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	311,924.54
0206 MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA.; SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	311,924.54
3 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	311,924.54
5 GASTOS CORRIENTES	311,924.54
2.3 BIENES Y SERVICIOS	311,924.54
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	311,924.54
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	307,594.54
2.3.2.4.3 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	307,594.54
2.3.2.4.3.1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	307,594.54
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,330.00
2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	4,330.00
2.3.2.7.1.6 ESTUDIOS	4,330.00

TOTAL	311,924.54
TOTAL CERTIFICACION	311,924.54
TOTAL NOTA	311,924.54

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
SANTIAGO DE CHUCO
Presupuesto y Planificación
Sello y Firma

TRM 8

PEC N° 08

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 0000000490
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA : 10 SANTIAGO DE CHUCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO [301197]
MES : JULIO
FECHA DE DOCUMENTO : 07/07/2020
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION. PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA; SANTIAGO DE CHUCO - L.L, EN EL MARCO DEL D.U 070-2020 - ART. 21.1 (ANEXO 13)
N° DE DOCUMENTO F01-375-2020-LOG
FECHA APROBACION : 07/07/2020
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

SECUENCIA	MONTOS
PRG PROD/PRY ACT/IN OBR FN. DIVF GRPF	
META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	

0001 INICIAL		
0138 3000133 5006373 15 033 0066	PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	1,145,836.00
0207	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA; SANTIAGO DE CHUCO -	1,145,836.00
3 19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,145,836.00
5	GASTOS CORRIENTES	1,145,836.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,145,836.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,145,836.00
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	1,129,930.00
2.3.2.4.3	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	1,129,930.00
2.3.2.4.3.1	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	1,129,930.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	15,906.00
2.3.2.7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	15,906.00
2.3.2.7.1.6	ESTUDIOS	15,906.00
TOTAL		1,145,836.00
TOTAL CERTIFICACION		1,145,836.00
TOTAL NOTA		1,145,836.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
SANTIAGO DE CHUCO
C.P.C. Natividad Z. Pereda Sánchez
OFC. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma

TR: 18

"Año de la universalización de la salud"

INFORME N° 314-2020-IVP-MPSCH/GG/VRRK

A : Dr. JOHN JAIRO CURAY REYES.
Director de administración y Finanzas de la MPSCH

DE : ING. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente del Instituto Vial Provincial de Santiago de Chucuito

ASUNTO : APROBACIÓN DE CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N° 03 DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS
CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE-3N - VILLA CRUZ DE
ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA, LONG. 4.33 KM; CALIFORNIA -
LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA
LONG. 15.906 KM.

REFERENCIA : Informe N° 183-2020-JO/IVPSCH/LFGCH
INFORME N° 021-2020-IVP-MPSCH/TACSMRP/NBP
Informe N° 1314-2020-MPSCH/DST/SGI
CARTA N° 013-2020-AJDL-C
Informe N° 006-2020-AJDL/INSP
CARTA N° 007-2020/CONSORCIO VIAL CALIFORNIA/RL/EGD
CONTRATO N° 016-2020-MPSCH-LOG
DU. N° 070-2020

FECHA : Santiago de Chucuito, 18 de diciembre del 2020

Previo cordial saludo y afecto, por medio del presente tengo a bien manifestarle con respecto al asunto de la referencia lo siguiente:

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Ejecución de Servicio : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS
CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA
- PACCHA PARTE ALTA, LONG. 4.33 KM; CALIFORNIA - LOS ANGELES -
LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG. 15.906 KM

Longitud : 20.236 Km.
Superficie de Rodadura : Afirmado.
Espesor de Afirmado : 0.15 m.
Velocidad Directriz : 30 km/h.
Perfilado de Cunetas : Terreno natural
Hitos Kilométricos : 21 unidades

UBICACIÓN

Distrito : Santiago de Chucuito
Provincia : Santiago de Chucuito
Región : La Libertad

RESPONSABLES DEL SERVICIO

EJECUTOR:

Fuente de financiamiento : Recursos por operaciones oficios de crédito
Modalidad Contratación : a Suma Alzada
Contrato de Servicio : CONTRATO N° 016-2020-MPSCH-LOG
Contratista : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA

EXP N°: 1380

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCUITO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



RECIBIDO

FECHA: 21 DIC. 2020

N° Folios: 332 Hora: 9:50

Firma: _____

LA RECEPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO INDICA CONFORMIDAD



Monto Referencial del Servicio : S/. 1, 724,876.21 inc el IGV.
Monto del Contrato de Servicio : S/. 1,724,000.00 inc el IGV
Plazo de Ejecución mantenimiento Periódico : 120 DIAS CALENDARIOS
Inicio Plazo de Servicio Contractual : 22-09-2020
Fecha Terminó de Servicio Contractual : 31-12-2020

INSPECTOR

INSPECTOR : ING. ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN
Contrato De Servicio : N° 028-2020-MPSCH-LOG

2. DE LA PRESENTACIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE DEL SERVICIO N° 03-NOVIEMBRE 2020

Mediante Carta N° 013-2020-AJDL-C, del Inspector de Servicio, recepcionada por mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, el día 04/12/2020, el ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON, hace llegar a la Municipalidad la Valorización N° 03 del por los trabajos ejecutados en el periodo comprendido entre el 01/11/2020 hasta el 30/11/2020, del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA, LONG. 4.33 KM; CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG. 15.906 KM, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD

3. ANÁLISIS DEL IVP.

Para la ejecución del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA, LONG. 4.33 KM; CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG. 15.906 KM, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, en el proceso especial de selección N° 16-2020-MPSCH/CS-Segunda convocatoria, la empresa contratista CONSORCIO VIAL CALIFORNIA, ha sido favorecida con la buena pro, por su monto ofertado de S/. 1, 724,000.00 inc. IGV que a continuación se detalla:

- A) Elaboración del Plan de Trabajo la suma de S/. 17,240.00 inc IGV, que se desarrollara exclusivamente para tal fase.
B) Ejecución del mantenimiento Periódico la suma de 1, 430,920.00, inc. IGV, que se desarrollara exclusivamente en la fase de Ejecución del Mantenimiento Periódico.



PRESUPUESTO OFERTADO

Item	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
		METRADOS		COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
		Unidad	Cantidad		
01	OBRAS PRELIMINARES				
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	2.00	40,220.52	80,441.04
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	20.24	998.09	20,201.34
02	PAVIMENTOS				

02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M.	m3	5,051.50	4.62	23,337.93
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M.	m3	15,177.00	32.06	486,574.62
03	TRANSPORTE				
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM.	m3k	15,649.50	4.58	71,641.64
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM.	m3k	128,533.06	1.05	134,545.99
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM.	m3k	9,658.00	4.51	43,511.74
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM.	m3k	58,684.16	1.07	62,688.26
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	20,236.00	1.84	37,234.24
05	SEÑALIZACIÓN				
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und	21.00	315.24	6,620.04
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	Und	24.00	389.22	9,341.28
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	Und	7.00	389.22	2,724.54
05.11	SEÑALES INFORMATIVAS	Und	7.00	468.3200	3,278.24
06	IMPACTO AMBIENTAL				
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	3.50	7,274.1400	25,459.49
07	EMERGENCIA SANITARIA				
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gib	2.00	23,436.36	46,872.71
COSTO DIRECTO		CD		SI.	1,054,473.10
GASTOS GENERALES		GG	10%	SI.	105,447.31
UTILIDAD		U	5%	SI.	52,723.66
SUB TOTAL		CD+GG+U		SI.	1,212,644.07
IGV			18%	SI.	218,275.93
TOTAL PRESUPUESTO		PT		SI.	1,430,920.00
PORCENTAJE					100.00%

- C) Ejecución del Mantenimiento Rutinario, la suma de S/. 258,600.00, inc. IGV, que se desarrollara exclusivamente para tal fase.
- D) La Elaboración del Inventario de Condición Vial la Suma de S/. 17,240.00, inc. IGV, que se desarrollara exclusivamente para tal fase.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL SERVICIO DURANTE EL MES

De acuerdo a la verificación de los trabajos referidos al "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA, LONG. 4.33 KM; CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG. 15.906 KM, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD", se ha observado que desde la fecha 01/11/2020 hasta el 30/11/2020, se desarrollaron las siguientes actividades:

2.0 PAVIMENTOS.

2.01 CAPA NIVELANTE E=5 CM

2.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=15 CM.

3.0 MANTENIMIENTO DE CALZADA EN AFIRMADO:

3.01 Transporte de material granular hasta 1 km



- 3.02 Transporte de material granular mayor a 1 km
- 3.03 Transporte de material excedente hasta 1 km.
- 3.04 Transporte de material excedente mayor a 1 km

4.0 Obras de arte y drenaje

4.01 Reconformación de cunetas

5.0 Emergencia sanitaria

5.01 emergencia sanitaria COVID 19

NOTA: Toda esta información esta detallada en el informe del Ing. Inspector de Servicio mediante CARTA N° 013-2020-AJDL-C





Instituto Vial Provincial



MPSC

Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTARIO Y PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VERBALES TRANSMISOR, P.E.M. VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA LONG 4.33 KM. CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHOLINO - MAL PASO - TERRANESGA LONG 6.360 KM. DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

CONTRATO : F.P.O.B. 2020-MPSC/LOG

INSPECTOR : ING. ALEXANDER DIAZ LEÓN

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA



PRESUP. OFERTADO (CD-05-4) S/ EV 120.944.07
PRESUP. OFERTADO (CD-05-4) INC/ EV 1.430.920.00
FECHA DE PRESUPUESTO 07/05/2020
PLAZO DE EJECUCIÓN 180 d.c. (6 meses)
FECHA DE INICIO Y TÉRMINO CONTRACTUAL 27/09/2020 - 31/05/2021

VALORIZACIÓN DE AVANCE DE SERVICIO N° 03, MANTENIMIENTO PERIÓDICO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

FORMULARIO : SERVICIO PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	P.U.	MONTO CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE VALORIZACIÓN		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
				METRAO	SOLES	METRAO	SOLES	METRAO	%	METRAO	%	METRAO	%
01	OBRAS PRELIMINARES												
01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	gp	40.220.52	2.00	80.441.04	1.00	40.220.52	4.231.30	4.70%	44.451.84	54.70%	40.220.52	54.70%
01.02	TRAZO Y REPINTADO	km	988.09	20.24	20.201.24	15.00	15.361.44	4.231.30	20.95%	20.201.34	100.00%	0.10	50.00%
02	PAVIMENTOS												
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	4.62	5.651.50	23.337.93	2.450.00	9.333.00	157.447.55	30.90%	30.791.35	30.30%	207.784.00	40.74%
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	m3	32.05	15.177.00	485.574.62	4.200.00	134.620.00	150.746.12	30.98%	265.386.12	54.65%	201.185.50	28.21%
03	TRANSPORTE												
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3	4.58	15.049.50	71.641.04	4.330.00	19.965.70	97.632.77	23.61%	97.632.77	57.35%	534.141.88	42.85%
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3	1.05	128.533.05	134.545.59	35.000.00	36.800.00	19.787.05	27.62%	39.772.76	55.50%	6.464.27	44.48%
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3	4.51	9.558.00	43.511.74	2.680.00	12.194.80	41.346.40	30.37%	77.652.53	57.72%	55.883.46	42.28%
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3	1.07	58.894.16	62.689.36	17.772.60	17.772.60	3.055.15	26.99%	23.925.59	54.95%	19.585.15	45.01%
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE												
04.01	RECONFORMACIÓN DE CUNETAS	m	1.84	20.226.00	37.224.24	8.700.00	16.006.00	22.324.24	33.27%	25.627.24	71.27%	2.400.00	23.77%
05	SERIALIZACIÓN												
05.01	INSTALACIÓN DE POSTES KILOMÉTRICOS	Und	315.24	21.00	6.620.04			0.00	0.00%	6.620.04	8.67%	21.004.18	100.00%
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	Und	389.22	24.00	9.341.28							6.500.04	100.00%
06	SEÑALES REGULATORIAS	Und	389.22	7.00	2.724.54							9.341.28	100.00%
06.11	SEÑALES INFORMATIVAS	Und	468.32	7.00	3.278.24							2.724.54	100.00%
06	IMPACTO AMBIENTAL												
06.01	RI GUERRACIÓN AMBIENTAL DE ÁREAS OCUPADAS	ha	7.74.14	3.50	26.459.60			0.00	0.00%	0.00	0.00%	26.459.60	100.00%
07	EMERGENCIA SANITARIA												
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gp	23.556.36	2.00	46.872.71	1.00	23.438.36	41.718.18	25.00%	35.154.54	74.88%	11.718.17	25.00%

A-	COSTO DIRECTO	1,054,473.10											
B-	GASTOS GENERALES	105,447.31	10.00%										
C-	UTILIDAD	52,723.65	5.00%										
D-	SUB TOTAL	1,212,644.07											
E-	I.G.V.	210,275.93											
F-	TOTAL	1,422,920.00											
G-	PORCENTAJE	98.00%											

El resumen de la valorización de Servicio N° 03 NOVIEMBRE 2020, para efectos de pago al contratista CONSORCIO VIAL CALIFORNIA, se ha determinado el importe de **SI. 377,795.23 (TRECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 23/100 SOLES), INC. El IGV** cuyo detalle es el siguiente.

ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EM P. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA, LONG. 4.33 KM.; CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHUQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG. 15.905 KM, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATO : N°06-2020-MPSCCH/LOG
INSPECTOR : ING. ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA

RESUMEN GENERAL VALORIZACION N° 03 - NOVIEMBRE MANTENIMIENTO PERIODICO

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO	VALORIZACION			SALDO	% AVANCE
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUM.		
1.- VALORIZACION CONTRACTUAL						
Valorización No. 03	1,212,644.07	376,018.28	320,165.45	696,183.73	516,460.34	57.41%
	1,212,644.07	376,018.28	320,165.45	696,183.73	516,460.34	57.41%
Avance Ejecutado		31.01%	26.40%	57.41%		
Avance Programado		0.00%	4.78%	4.78%		
2.- REAJUSTES						
Reajuste de la Valorización No. 03		-	-	-		
Regularización Reajuste Valorización anteriores		-	-	-		
Retención por atraso de Obra		-	-	-		
*El reajuste no se aplica según CGC 47.1		0.00	0.00	0.00		
A.- VALORIZACION BRUTA (sin IGV) (1+2)		376,018.28	320,165.45	696,183.73		
3.- RETENCIÓN POR GARANTIA						
Valorización No.03		-	-	-		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
* Contratista al solicitar retención de garantía		0.00	0.00	0.00	0.00	
4.- AMORTIZACION POR ADELANTO MATERIALES						
Valorización No.03		-	-	-	-	
Regularización Valorización anteriores		-	-	-	-	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
5.- DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE						
Por Adelanto Directo		-	-	-		
Por Adelanto de Materiales		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto Directo		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto de Materiales		-	-	-		
		0.00	0.00	0.00		
B.- VALORIZACION NETA (sin IGV) (1)		376,018.28	320,165.45	696,183.73		
C.- MONTO NETO		376,018.28	320,165.45	696,183.73		
D.- I.G.V. (18% DE B)		67,683.29	57,629.78	125,313.07		
E.- MONTO A CANCELAR (C+D)		443,701.57	377,795.23	821,496.80		
F.- MONTO A FACTURAR (A*0.18)		443,701.57	377,795.23	821,496.80		

Para efectos de control de avance de ejecución del servicio, se ha determinado que Como el monto de la valorización acumulada ejecutada es mayor que el 80% del monto de la valorización acumulada programada, la obra se encuentra dentro del atraso permisible, por lo que no es necesario que el contratista presente el calendario acelerado de avance de obra (CAAO), en ella se puede visualizar que el avance programado para el mes de NOVIEMBRE 2020, incluyendo la situación actual del servicio y el realmente ejecutado acumulado Promedio de los dos tramos es de 57.41 %, es decir la obra está atrasada un 14.22 %, frente a lo programado de 71.63 %.



PERIODO	VALORIZACIONES DE SERVICIO PROGRAMADA					VALORIZACIONES DE SERVICIO REAL				
	CONTRATO		TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)		PRINCIPAL		TOTALES (S/.)	
	ORIGINAL	PARCIAL	ACUM. (A)	PARCIAL	ACUM.	TOTAL	PARCIAL	ACUM. (B)	PARCIAL	ACUMULADO
SET. 2020	68,328.31	68,328.31	68,328.31	4.78%	4.78%	92,151.34	92,151.34	92,151.34	6.44%	6.44%
OCT. 2020	478,298.17	478,298.17	546,626.48	33.43%	38.20%	351,550.23	351,550.23	443,701.57	24.57%	31.01%
NOV. 2020	478,298.17	478,298.17	1,024,924.65	33.43%	71.63%	377,795.23	377,795.23	821,496.80	26.40%	57.41%
DIC. 2020	405,995.35	405,995.35	1,430,920.00	28.37%	100.00%					
TOTALES	1,430,920.00	1,430,920.00				821,496.80	821,496.80			

DIAGRAMA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO



La retención de la Garantía de Fiel Cumplimiento, que tiene como responsabilidad el CONSORCIO VIAL CALIFORNIA, en dejar como garantía del trabajo a ejecutar, se descontó en las dos primeras Valorizaciones concerniente a los meses de Setiembre y Octubre del 2020, de las cuales será retenido el 10% del monto del contrato.

Dentro del contenido del informe mensual del contratista, de valorización N° 03 al mes de NOVIEMBRE del 2020, nos detalla las pólizas de seguros por la compañía de seguros LA POSITIVA relacionadas al SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD, vigente desde el 23/11/2020 hasta el 23/12/2020, seguros contra accidentes personales emitidas por la compañía aseguradora cuya fecha debe de coincidir al mes de NOVIEMBRE del 2020, Pólizas de seguros contra todo riesgo (SCTR – SALUD), FUE EMITIDA EL 02/12/2020, Que cubre la vigencia desde 23/11/2020 hasta el 23/12/2020.

CONCLUSIÓN:

Conforme al calendario de avance del SERVICIO vigente, la ejecución del servicio de SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA, LONG. 4.33 KM; CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG. 15.906 KM, CUSHIPE - ALGALLAMA - EMP. PE-3N (LA CRUZ) LONG. 6.300 KM, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, ubicado en el distrito de Santa Cruz de Chuca, Provincia de Santiago de Chuco, Departamento la Libertad, Como el monto de la valorización acumulada ejecutada es



mayor que el 80% del monto de la valorización acumulada programada, la obra se encuentra dentro del atraso permisible, por lo que no es necesario que el contratista presente el calendario acelerado de avance de obra (CAAO), en ella se puede visualizar que el avance programado para el mes de NOVIEMBRE 2020, incluyendo la situación actual del servicio y el realmente ejecutado acumulado Promedio de los dos tramos es de 57.41 %, es decir la obra está atrasada un 14.22%, frente a lo programado de 71.62 %..

LOS METRADOS CONCILIADOS ENTRE EL INSPECTOR y el Residente del SERVICIO, han generado la VALORIZACION DEL SERVICIO N° 03, correspondiente a los trabajos ejecutados en el periodo comprendido entre el 01/11/2020 hasta el 30/11/2020, por la empresa contratista CONSORCIO VIAL CALIFORNIA, el mismo que asciende a la suma de **S/. 377,795.23 (TRECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 23/100 SOLES)**

Las pólizas de seguros contra accidentes personales emitidas por la compañía aseguradora LA POSITIVA relacionadas al SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD, con SCTR PENSIONES PÓLIZA 6647360, mas SCTR SALUD Contrato 611918 y sus normas reglamentarias, a favor de la empresa CORPORACIÓN SORIANO L & C S.A.C., DE FECHA 02/12/2020, se encuentra vigente.

La Retención de la Garantía, que garantiza el **FIEL CUMPLIMIENTO** de la ejecución del servicio por un monto a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO, se realizó en las dos primeras Valorizaciones concerniente a los meses de Setiembre Y Octubre del 2020, sumando el monto de **S/. 172,400.00 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES)**, del total del 10% del monto contractual.

Después de haber evaluado el informe del Inspector con respecto a la valorización del servicio N° 03 por los trabajos ejecutados por el **CONSORCIO VIAL CALIFORNIA**, durante el periodo comprendido entre el 01/11/2020 hasta el 30/11/2020, del servicio de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA, LONG. 4.33 KM; CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG. 15.906 KM, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD", la misma que asciende a la suma de **S/. 377,795.23 (TRECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 23/100 SOLES)**, INC. El IGV, esta gerencia da su **CONFORMIDAD** respectiva al informe N° 183-2020-JO/IVPSCH/LFGCH, así mismo viendo la opinión favorable del área responsable mediante informe N° 1314-2020MPSCH/DIST/SGI, de la sub Gerencia de Infraestructura de la MPSCH.

Concluyendo que el monto a cancelar es de **S/. 377,795.23 (TRECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 23/100 SOLES)**, INC. El IGV, Resumiendo esto en el cuadro resumen de Valorización N° 03 NOVIEMBRE del 2020.

RECOMENDACION

Hacer efectivo la Valorización del SERVICIO N° 03 mes de NOVIEMBRE 2020, por un monto a Pagar de **S/. 377,795.23 (TRECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 23/100 SOLES)**, INC. El IGV, por el periodo comprendido entre el 01/11/2020 hasta el 30/11/2020, generado por el avance de los trabajos ejecutados en el servicio DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA, LONG. 4.33 KM; CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG. 15.906 KM, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, la misma que está a cargo del contratista, **CONSORCIO VIAL CALIFORNIA** e




Inspeccionado por el Inspector de servicio el ING. ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN, para efectos consiguientes a este informe se hace llegar la siguiente documentación:

Adjunta:

-  Informe N° 183-2020-JO/IVPSCH/LFGCH
-  INFORME N° 021-2020-IVP-MPSCH/TACSMRP/NBP
-  Informe N° 1314-2020-MPSCH/DST/SGI
-  CARTA N° 013-2020-AJDL-C
-  Informe N° 006-2020-AJDL/INSP
-  CARTA N° 007-2020/CONSORCIO VIAL CALIFORNIA/RL/EGD
-  CONTRATO N° 016-2020-MPSCH-LOG
-  DU. N° 070-2020.
-  01 archivador del Original de la valorización presentada por el contratista
-  Planilla de Valorización N° 03 resumida por la entidad
-  Resumen de la Valorización del servicio N° 03 por la entidad

Sin otro particular, me suscribo de Usted, no sin antes reiterar mi estima personal.

Atentamente,



Ing. Valente 218511
GERENTE GENERAL



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD



RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 03 NOVIEMBRE 2020, POR LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA, LONG. 4.33 KM; CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG. 15.906 KM, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
INSPECTOR : ING. ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN
SERVICIO TRAMO: MP. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA, LONG. 4.33 KM; CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG. 15.906 KM

N° Contrato : N° 016-2020-MPSPCH/LOG	
Plazo de Ejecución	120 Días Calendarios
Anticipo	: S/ 0.00 Sin IGV
Adelanto de Materiales	: S/ 0.00 Sin IGV
Fecha Inicio Elec. Servicio	: 22 septiembre 2020
Fecha Termina Servicio	: 31 diciembre 2020

ACTIVIDAD	COSTO DIRECTO (S/.)	GASTOS GENERALES 10%	UTILIDAD 5%	SUB TOTAL	IGV 18%	TOTAL S/.
PLAN DE TRABAJO	12,704.50	1,270.45	635.22	14,610.17	2,629.83	17,240.00
MANTENIMIENTO PERIÓDICO	1,054,473.10	105,447.31	52,723.66	1,212,644.07	218,275.93	1,430,920.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO	190,567.43	19,056.74	9,528.37	219,152.54	39,447.46	258,600.00
INVENTARIO DE CONDICION VIAL	12,704.50	1,270.45	635.22	14,610.17	2,629.83	17,240.00
	1,270,449.52	127,044.95	63,522.48	1,461,016.95	262,983.05	1,724,000.00
	TOTAL S/.					
						1,724,000.00

N° Valorización	Valorización Bruta	Reintegro de Valorización	Reajuste de Reintegro de Valorización	Deducción del reajuste que no corresponde	Retención Según Art. 151 DS 344-2018-EF Reglamento de la ley N° 30225		Anticipo Materiales Adelanto	Monto a Pagar S/IGV	IGV	Valorización del mes
					Retención de Garantía 10%	Retención Inc. IGV				
V. N° 01. Set. 2020	78,094.36	0.00	0.00	0.00	172,400.00	81,093.34	0.00	9,371.19	1,886.81	11,068.00
V. N° 02. Oct. 2020	287,923.92	0.00	0.00	0.00	77,378.53	91,306.66	0.00	220,545.39	39,698.17	260,243.57
V. N° 03. Nov. 2020	320,165.45	0.00	0.00	0.00			0.00	320,165.45	57,629.78	377,795.23
V. N° 04. Dic. 2020	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Parcial	686,183.73	0.00	0.00	0.00	148,101.69	172,400.00	0.00	550,082.04	99,014.77	649,096.80

ADICIONALES										
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General	686,183.73	0.00			0.00	148,101.69	0.00	550,082.04	99,014.77	649,096.80

NOTA: Conforme lo establece el Resolución de Superintendencia N° 071-2018/SUNAT, a partir del 01 de abril de 2018, los siguientes servicios, contenidos en el Anexo 3 de la R.S. 183-2004/SUNAT, cuyo nacimiento de la obligación tributaria del IGV se origine a partir de dicha fecha, estarán sujetos a la aplicación del 12%:

CIP 218511
GERENTE GENERAL
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

JEFE DE OPERACIONES
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

GERENTE GENERAL
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO : *SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA, LONG. 4.33 KM; CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG. 15.906 KM, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD*

CONTRATO : N° 016-2020-MPSCH/LOG
INSPECTOR : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEÓN
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD



RESUMEN DE PAGO N° 03 - NOVIEMBRE 2020

CONTRATO N° 016-2020-MPSCH/LOG

MES DE NOVIEMBRE 2020

PAGO A CUENTA A CANCELAR AL CONTRATISTA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

CONCEPTO		MONTOS
		S/.
1.- Monto Valorizado sin Reajuste en el presente mes :		320,165.45
- Valorizacion No.03		320,165.45
2.- Reajuste de las Valorizaciones :		0.00
- Reajuste de la Valorizacion No.03		0.00
- Regularizacion Reajuste Valorización anterior		0.00
- Retención por atraso de Obra		0.00
* El reajuste no se aplica según CGC 47.1		
A.- VALORIZACION BRUTA (VB) (sin IGV) (1+2)	S/.	320,165.45
3.- Retención de Garantía :		0.00
- En la Valorizacion No.03		0.00
- Regularización Valorizaciones anteriores		0.00
* Contratista no solicito retención de Garantía		
4.- Amortizacion del Adelanto de Materiales :		0.00
- En la Valorizacion No.03		0.00
- Regularización Valorizaciones anteriores		0.00
* Contratista no solicito adelanto		
5.- Deducción del Reajuste que no corresponde :		0.00
- Por Adelanto Directo		0.00
- Por Adelanto de Materiales		0.00
- Por Regularización del Adelanto Directo		0.00
- Por Regularización del Adelanto de Materiales		0.00
B.- VALORIZACION NETA (sin IGV) (1)	S/.	320,165.45
C.- MONTO NETO	S/.	320,165.45
D.- I.G.V. (18% DE B)	S/.	57,629.78
E.- MONTO A CANCELAR (C+D)	S/.	377,795.23
F.- MONTO A FACTURAR (A*0.18)	S/.	377,795.23

ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA, LONG. 4.33 KM; CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG. 15.906 KM, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATO : N° 016-2020-MPSCH/LOG
INSPECTOR : ING. ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD



RESUMEN GENERAL VALORIZACION N° 03 - NOVIEMBRE MANTENIMIENTO PERIODICO

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO	VALORIZACION				% AVANCE
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUM.	SALDO	
1.- VALORIZACION CONTRACTUAL						
Valorización No. 03	1,212,644.07	376,018.28	320,165.45	696,183.73	516,460.34	57.41%
	1,212,644.07	376,018.28	320,165.45	696,183.73	516,460.34	57.41%
Avance Ejecutado		31.01%	26.40%	57.41%		
Avance Programado		0.00%	4.78%	4.78%		
2.- REAJUSTES						
Reajuste de la Valorización No. 03		-	-	-		
Regularización Reajuste Valorización anteriores		-	-	-		
Retención por atraso de Obra		-	-	-		
*El reajuste no se aplica según CGC 47.1		0.00	0.00	0.00		
A.- VALORIZACION BRUTA (sin IGV) (1+2)		376,018.28	320,165.45	696,183.73		
3.- RETENCIÓN POR GARANTIA						
Valorización No.03		-	-	-		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
* Contratista si solicito retención de garantía		0.00	0.00	0.00	0.00	
4.- AMORTIZACION POR ADELANTO MATERIALES						
Valorización No.03		-	-	-	-	
Regularización Valorización anteriores		-	-	-	-	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
5.- DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE						
Por Adelanto Directo		-	-	-		
Por Adelanto de Materiales		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto Directo		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto de Materiales		-	-	-		
		0.00	0.00	0.00		
B.- VALORIZACION NETA (sin IGV) (1)		376,018.28	320,165.45	696,183.73		
C.- MONTO NETO		376,018.28	320,165.45	696,183.73		
D.- I.G.V. (18% DE B)		67,683.29	57,629.78	125,313.07		
E.- MONTO A CANCELAR (C+D)		443,701.57	377,795.23	821,496.80		
F.- MONTO A FACTURAR (A*0.18)		443,701.57	377,795.23	821,496.80		



ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE 3IN - VILLA CRUZ DE ALGALAMA - PACHA PARTE ALTA, LONG. 433 KM, CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHUQUINGO - MAL PASO - TERRA NEGRA LONG. 15.906 KM, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

CONTRATO : : N° 016-2020-MPSC/ALGOS
INSPECTOR : : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEÓN
CONTRATISTA : : CONSORCIO VAL CALIFORNIA



PRESUP. OFERTADO (CD-05-J) S/IGV 1,212,944.07
PRESUP. OFERTADO (CD-05-J) INC/IGV 1,430,920.00
FECHA DE PRESUPUESTO 01/08/2020
PLAZO DE EJECUCION 120 da. (04 meses)
FECHA DE INICIO Y TERMINO CONTRACTUAL 22/06/2020 - 31/12/2020

VALORIZACION DE AVANCE DE SERVICIO N° 03, MANTENIMIENTO PERIODICO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020
FORMULA 01 : SERVICIO PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	MONTO CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE VALORIZACION		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
			P.U.	METRADO	SOLES	METRADO	%	SOLES	METRADO	%	SOLES	%
01	OBRAS PRELIMINARES											
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	40,220.52	2.00	100,642.38	1.00	55.83%	4,231.90	1.00	60,421.86	40,220.52	39.96%
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	988.09	20.24	80,441.04	16.00	50.00%	-	-	40,220.52	40,220.52	50.00%
02	PAVIMENTOS											
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M.	m3	4.62	5,051.50	23,337.93	2,150.00	42.35%	157,627.55	3,026.50	302,152.15	207,760.00	40.74%
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M.	m3	32.06	15,177.00	486,574.62	4,200.00	27.67%	6,821.43	8,902.00	16,754.43	5,933.50	28.21%
03	TRANSPORTE											
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM.	m3k	4.58	15,649.50	71,641.64	4,330.00	27.90%	92,492.87	9,185.23	179,245.97	133,141.66	42.62%
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM.	m3k	1.05	128,533.06	134,545.99	35,000.00	27.35%	19,787.06	76,346.40	77,662.53	31,868.88	44.48%
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM.	m3k	4.51	9,658.00	43,511.74	2,680.00	28.03%	40,862.53	5,885.15	23,925.59	56,883.46	42.28%
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM.	m3k	1.07	58,684.16	62,688.26	16,580.00	28.35%	11,730.79	36,069.83	37,895.09	19,586.15	45.01%
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE											
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	1.84	20,236.00	37,234.24	8,700.00	42.99%	12,394.24	15,336.00	28,402.24	8,832.00	23.72%
05	SERIALIZACION											
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und	315.24	21.00	21,964.10	-	0.00%	0.00	-	0.00	21,964.10	100.00%
05.02	SENALES PREVENTIVAS	Und	389.22	24.00	9,341.28	-	-	-	-	-	6,820.04	100.00%
5.03	SENALES REGLAMENTARIAS	Und	389.22	7.00	2,724.54	-	-	-	-	-	9,341.28	100.00%
05.11	SENALES INFORMATIVAS	Und	468.32	7.00	3,278.24	-	-	-	-	-	2,724.54	100.00%
06	IMPACTO AMBIENTAL											
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	7,274.14	3.50	25,459.49	-	0.00%	0.00	-	0.00	25,459.49	100.00%
07	EMERGENCIA SANITARIA											
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	23,436.36	2.00	46,872.71	1.00	50.00%	11,718.18	1.50	35,154.54	11,718.17	25.00%

A-	COSTO DIRECTO	1,054,473.10	325,972.42	278,404.74	605,377.15	449,095.94
B-	GASTOS GENERALES	10.00%	32,697.24	27,940.47	60,537.72	44,909.59
C-	UTILIDAD	5.00%	16,348.62	13,920.24	30,268.86	22,454.80
D-	SUB TOTAL		1,212,644.07	330,165.45	696,183.73	516,460.34
E-	IG V		218,275.93	57,629.29	125,313.07	92,962.86
F-	TOTAL		1,430,920.00	377,795.23	821,496.80	609,423.20
G-	PORCENTAJE	100.00%	31.01%	26.40%	57.41%	42.59%



38

ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA, LONG. 4.33 KM. CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG. 15.906 KM. DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATO: : N° 016-2020-MPSC-HLOG

INSPECTOR : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD



PLANILLA DE RESUMEN DE METRADOS, MANTENIMIENTO PERIODICO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

Partida	Descripción	Und	Metrado Contrato Original	Acumulado Anterior	Val N° 03	Acumulado Actual		Saldos por Valorizar	
				Metrado	Nov-20	Metrado	%	Metrado	%
01	OBRAS PRELIMINARES								
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	2.00	1.000	-	1.000	50.00%	1.0000	50.00%
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	20.24	16.00	4.140	20.140	99.51%	0.1000	0.49%
02	PAVIMENTOS								
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M.	m3	5,051.50	2,150.000	1,476.500	3,626.500	71.79%	1,425.0000	28.21%
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M.	m3	15,177.00	4,200.000	4,702.000	8,902.000	58.65%	6,275.0000	41.35%
03	TRANSPORTE								
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM.	m3k	15,649.50	4,330.000	4,855.230	9,185.230	58.69%	6,464.2700	41.31%
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM.	m3k	128,533.06	35,000.000	41,346.400	76,346.400	59.40%	52,186.6600	40.60%
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM.	m3k	9,658.00	2,680.000	3,005.150	5,685.150	58.86%	3,972.8500	41.14%
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM.	m3k	58,684.16	16,590.000	19,479.830	36,069.830	61.46%	22,614.3300	38.54%
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE								
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	20,236.00	8,700.000	6,736.000	15,436.000	76.28%	4,800.0000	23.72%
05	SEÑALIZACIÓN								
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und	21.00	-	-	-	-	21.0000	100.00%
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	Und	24.00	-	-	-	-	24.0000	100.00%
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	Und	7.00	-	-	-	-	7.0000	100.00%
05.11	SEÑALES INFORMATIVAS	Und	7.00	-	-	-	-	7.0000	100.00%
06	IMPACTO AMBIENTAL								
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	3.50	-	-	-	-	3.5000	100.00%
07	EMERGENCIA SANITARIA								
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	2.00	1.000	0.500	1.500	75.00%	0.5000	25.00%



ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO :

CONTRATO : N° 016-2020-MPSC/LOG
INSPECTOR : ING. ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA





Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD

CUADRO COMPARATIVO DE AVANCES : PROGRAMADO VS EJECUTADO (CURVA "S") COMPARACION EFECTUADA CON EL CAOA N° 01

PERIODO	VALORIZACIONES DE SERVICIO PROGRAMADA				VALORIZACIONES DE SERVICIO REAL				SITUACION DE SERVICIO	
	CONTRATO ORIGINAL	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)	PRINCIPAL TOTAL	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)	SERVICIO	%
		PARCIAL	ACUM. (A)			PARCIAL	ACUM. (B)			
SET. 2020	68,328.31	68,328.31	68,328.31	4.78%	92,151.34	92,151.34	92,151.34	6.44%	ADELANTADA	34.87%
OCT. 2020	478,298.17	478,298.17	546,626.48	38.20%	351,550.23	443,701.57	443,701.57	24.57%	ATRASADA	18.83%
NOV. 2020	478,298.17	478,298.17	1,024,924.65	71.63%	377,795.23	821,496.80	821,496.80	57.41%	ATRASADA	19.85%
DIC. 2020	405,995.35	405,995.35	1,430,920.00	100.00%						
TOTALES	1,430,920.00	1,430,920.00			821,496.80	821,496.80				

- NOTAS :
1.- Montos que considera costo directo + gastos generales + utilidad, montos sin incluir IGV.
2.- En el avance programado se ha considerado el Calendario de Avance Servicio que corresponde al mes de setiembre

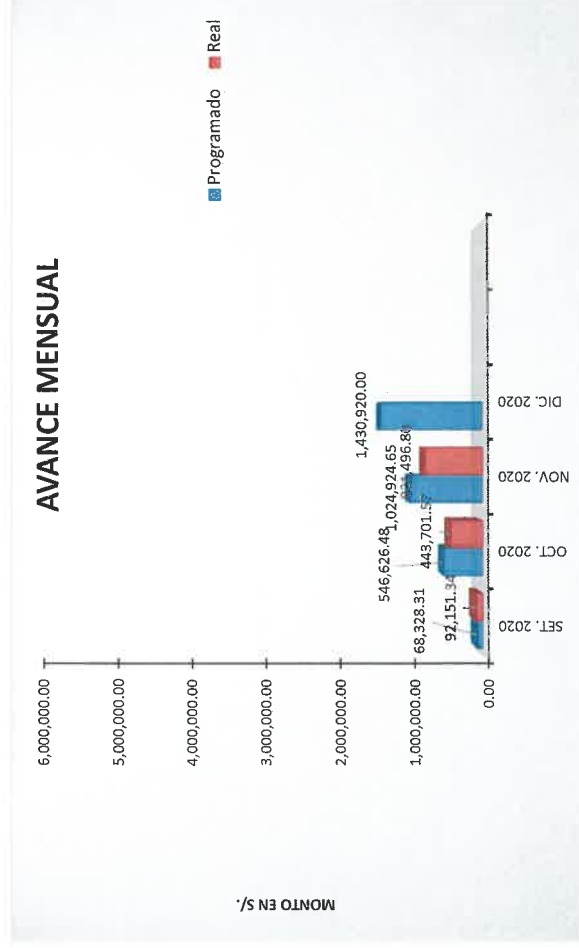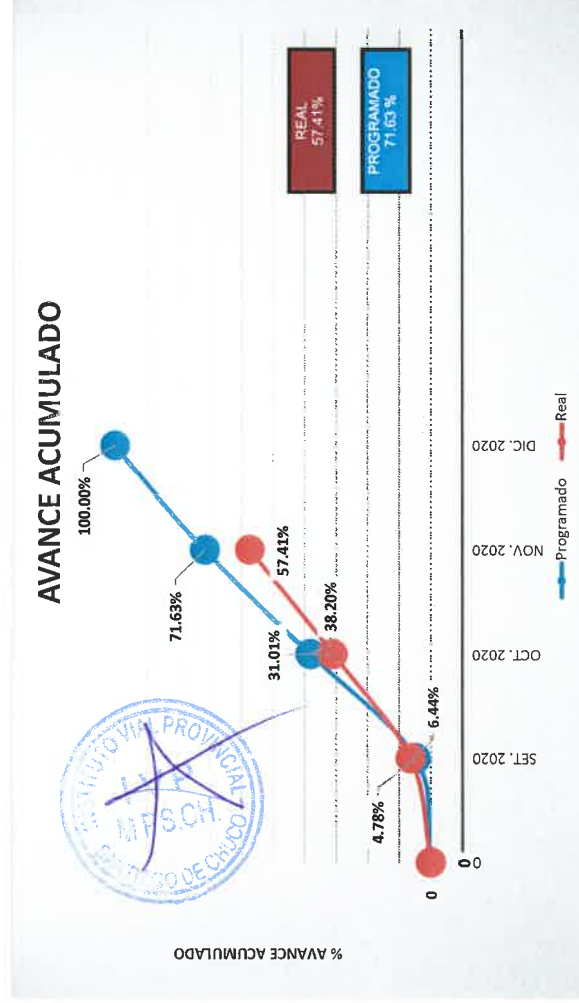

37

ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA, LONG. 4.33 KM; CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG. 15.906 KM, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATO: : N° 016-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR : ING. ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD



EVALUACION DEL AVANCE VALORIZADO RESPECTO AL PROGRAMADO

PRESUPUESTO	MONTO TOTAL X PRESUPUESTO	MONTO AVANCE ACUMULADO	
		VALORIZADO	PROGRAMADO
SERVICIO PRINCIPAL	1,430,920.00	821,496.80	1,024,924.65
TOTAL (Sin IGV)	1,430,920.00	821,496.80	1,024,924.65
		57.41%	71.63%

Situacion de Obra	$S/.821,496.80 < S/.1,024,924.65 \implies$	Atrasada
		19.848%

VERIFICACION SI REQUIERE CALENDARIO ACELERADO (ART. 205 DEL RLCE)

a.- Monto Valorizacion Acumulado Programado	1,024,924.65
b.- Porcentaje art. 205 del Reglamento.	80%
c.- Monto Tope (80% de a)	819,939.72
d.- Monto Valorizacion Acumulado Ejecutado	821,496.80

Se tiene que:
(d) > (c) $\implies S/.821,496.80 > S/.819,939.72$

Conclusion :

Como el monto de la valorizacion acumulado ejecutada es mayor que el 80% del monto de la valorizacion acumulada programada, la obra se encuentra dentro del atraso permisible, por lo que no es necesario que el contratista presente el calendario acelerado de avance de obra (CAAO)



319

ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA, LONG. 4.33 KM; CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG. 15.906 KM, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATO : N° 016-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR : ING. ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD



RESUMEN DE METRADOS MANTENIMIENTO PERIODICO VALORIZACIÓN N° 03

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO
01	OBRAS PRELIMINARES		
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	-
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	4.14
02	PAVIMENTOS		
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M.	m3	1,476.50
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M.	m3	4,702.00
03	TRANSPORTE		
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM.	m3k	4,855.23
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM.	m3k	41,346.40
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM.	m3k	3,005.15
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM.	m3k	19,479.83
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE		
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	6,736.00
05	SEÑALIZACIÓN		
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und	-
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	Und	-
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	Und	-
05.11	SEÑALES INFORMATIVAS	Und	-
06	IMPACTO AMBIENTAL		
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	-
07	EMERGENCIA SANITARIA		
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	0.5



INFORME N° 183-2020-JO/IVPSCH/LFGCH

A : ING. RAFAEL K. VALENCIA REBAZA
GERENTE DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

DE : ING. LUIS F. GUTIERREZ CHÁVEZ
JEFE DE OPERACIONES DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

ASUNTO : EVALUACIÓN Y CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N° 03 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA LONG= 4.330 KM” Y “CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO – TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM” DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.

REFERENCIA :

MONITOR DESIGNADO POR IVP	a)	INF. N°021-2020-IVP-MPSCH/TACSMRP/NBP
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	b)	INF. N°1314-2020-MPSCH/DIST/SGI
INSPECTOR DE SERVICIO	c)	CARTA N°013-2020-AJDL-C
CONTRATISTA	d)	CARTA N°007-CONSORCIO VIAL CALIFORNIA/RL/EGD

FECHA : SANTIAGO DE CHUCO, 17 DE NOVIEMBRE DE 2020

Por medio del presente, le expreso mi cordial saludo y afecto, a su vez presento la VALORIZACIÓN N°03 del SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA LONG= 4.330 KM” Y “CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO – TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM” DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, correspondiente al mes de noviembre (del 01 al 30) de 2020, la cual fue elaborada por el CONSORCIO VIAL CALIFORNIA y alcanzada al Inspector de servicio mediante documento de referencia d); este a su vez dio su Conformidad y la ingresó a la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad) con documento de referencia c) para realizar el trámite correspondiente.

Para el pago de la VALORIZACIÓN N° 03, se debe contar con la CONFORMIDAD del área responsable (Sub Gerencia de Infraestructura) y posteriormente se dará la APROBACIÓN del área usuaria (Instituto Vial Provincial de Santiago de Chuco), según se estipula los Términos de Referencia del D.U. N° 070-2020 para los Mantenimientos Viales de los caminos vecinales de la provincia de Santiago de Chuco.

Dentro de este marco, a su vez contando con la CONFORMIDAD de VALORIZACIÓN N° 03 del área responsable (documento de referencia b); siguiendo el trámite correspondiente; esta Jefatura de Operaciones del IVP de Santiago de Chuco, como parte de sus funciones, realizó la evaluación dicha documentación por medio del Monitor designado, el Ing. Marcial Nicolás Barrantes Parimango, la cual se detalla en su informe respectivo (documento de referencia a); de esta manera se dará CONFORMIDAD (de no haber observaciones); a fin de dar paso a la evaluación para la APROBACIÓN por parte de su persona.

I. INFORME GENERAL:

A) INFORMACIÓN TÉCNICA:

Nombre de Servicio **SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. PE-3N –**

VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA LONG= 4.330 KM” Y “CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO – TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM” DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.

EJECUTOR:

Convocatoria del servicio	: RES-PROC-16-2020-MPSCH/CS-1
Fuente de Financiamiento	: Recursos por operaciones oficios de crédito
Modalidad Contratación	: A suma alzada
Contrato de Servicio	: N° 017-2020-MPSCH-LOG
Decreto de Urgencia	: N° 070-2020
Fecha de Suscripción	: 28-08-2020
Contratista	: CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
Residente del Servicio	: Ing. Quelvin Julio Gonzales Navarro
Monto Referencial del Servicio	: S/. 1,724,876.17 (INCL. IGV)
Monto del Contrato del Servicio	: S/. 1,724,000.00 (INCL. IGV).
Adelanto Directo	: NO APLICA
Plazo de Ejecución	: MANTENIMIENTO PERIODICO - 120 DC (sujeto a firma de contrato).
	MANTENIMIENTO RUTINARIO – 360 DC
Fecha Entrega Terreno	: 29/08/2020
Resolución de Aprobación de P.T.	: RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 150-2020-MPSCH/GM
Fecha de Aprobación	: 21/09/2020
Fecha Inicio Servicio Contractual	: 22/09/2020
Fecha Término Servicio Contractual	: 31/12/2021

INSPECCIÓN:

Inspector de Servicio	: Ing. Alex Javier Díaz León
Contrato de Inspección	: N° 028-2020-MPSCH-LOG
Fecha de Designación	: 24/08/2020
Monto Contractual	: S/. 19,224.20
Plazo de Designación	: 120 DC (MANTENIMIENTO PERIÓDICO)

II. ANALISIS

Según lo detallado y analizado en el Informe del Monitor designado, la Sub Gerencia de Infraestructura (área responsable) y del Inspector concerniente a la VALORIZACIÓN N° 03 (del 01 al 30 de noviembre) de la Fase II: MANTENIMIENTO PERIÓDICO del servicio en mención, presentada por el Contratista, se tiene la siguiente información resumida a considerar:

A) DEL AVANCE EJECUTADO

Los metros ejecutados por tramos son:

CONTROL Y SUSTENTO DE METRADOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS

256

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Proyecto : "SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : TRAMO CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA
Contratista : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
Inspector : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547
Residente : ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

Monto Contratado S/. 1,724,000.00
Plazo de ejecucion 120 días calendario

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATADO	CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS				% EJECUTADO
				ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR EJECUTAR	
1.00	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	0.50	0.00	0.50	0.50	50.00%
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	15.91	14.00	1.91	15.91	0.00	100.00%
2.00	PAVIMENTOS							
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	3,976.50	1,800.00	751.50	2,551.50	1,425.00	64.16%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	11,929.50	3,400.00	2,254.50	5,654.50	6,275.00	47.40%
3.00	TRANSPORTE							
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	12,289.50	3,500.00	2,325.23	5,825.23	6,464.28	47.40%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	116,188.51	32,000.00	32,001.85	64,001.85	52,186.66	55.08%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	7,723.00	2,200.00	1,550.15	3,750.15	3,972.85	48.56%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	55,845.33	15,900.00	17,190.13	33,090.13	22,755.20	59.25%
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE							
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	15,906.00	7,200.00	3,906.00	11,106.00	4,800.00	69.82%
5.00	SEÑALIZACION							
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00%
05.02.	SENALES PREVENTIVAS	und	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00%
05.03.	SENALES REGLAMENTARIAS	und	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00%
05.04.	SENALES INFORMATIVAS	und	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00%
6.00	IMPACTO AMBIENTAL							
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%
7.00	EMERGENCIA SANITARIA		0.00	0.00				
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	0.50	0.25	0.75	0.25	75.00%

CONTROL Y SUSTENTO DE METRADOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Servicio : "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : TRAMO EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA
Contratista : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
Inspector : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547
Residente : ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

Monto Contratado S/. 1,724,000.00
Plazo de ejecucion 120 días calendario

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATADO	CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS				% EJECUTADO
				ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR EJECUTAR	
1.00	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	0.50	0.00	0.50	0.50	50.00%
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	4.33	2.00	2.33	4.33	0.00	100.00%
2.00	PAVIMENTOS							
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	1,075.00	350.00	725.00	1,075.00	0.00	100.00%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	3,247.50	800.00	2,447.50	3,247.50	0.00	100.00%
3.00	TRANSPORTE							
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	3,360.00	830.00	2,530.00	3,360.00	0.00	100.00%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	12,344.55	3,000.00	9,344.55	12,344.55	0.00	100.00%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	1,935.00	480.00	1,455.00	1,935.00	0.00	100.00%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	2,838.83	690.00	2,148.83	2,838.83	0.00	100.00%
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE							
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	4,330.00	1,500.00	2,830.00	4,330.00	0.00	100.00%
5.00	SEÑALIZACION							
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00%
05.02.	SENALES PREVENTIVAS	und	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00%
05.03.	SENALES REGLAMENTARIAS	und	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%
05.04.	SENALES INFORMATIVAS	und	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%
6.00	IMPACTO AMBIENTAL							
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00%
7.00	EMERGENCIA SANITARIA							
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	0.50	0.25	0.75	0.25	75.00%

Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
ING CIVIL
R. CIP: 110887

ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

Las partidas que se vienen ejecutando a la fecha corresponden a las obras preliminares (movilización y desmovilización de equipos, trazo y replanteo), asimismo, se está ejecutando las partidas de colocación de pavimento (capa nivelante y afirmado) por lo cual se ejecuta a su vez las partidas de transporte de material excedente; también se realizó parte de la partida reconformación de cunetas; finalmente la partida de emergencia sanitaria COVID 19 se ejecutó a un 50%. Todo viene siendo ejecutado conforme a las normas de evaluación, dentro de los lineamientos y Especificaciones Técnicas establecidos en el Plan de Trabajo, elaborado por el Contratista y previamente aprobado por la Entidad.

En cuanto al avance acumulado ejecutado respecto al programado (curva S) tenemos el siguiente resumen:

N° VAL.	MES	PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCE MENSUAL ACUM.	
				EJECUTADO	PROGRAMADO
3	NOVIEMBRE	01/11/2020	30/11/2020	57.41%	71.64%

Se observa un porcentaje de avance NEGATIVO del **-14.23%**, lo cual significa que la ejecución está atrasada, sin embargo, dicho porcentaje es mayor al 80% de lo programado (80.13%) por lo que no supone la elaboración de cronograma acelerado.

B) DEL MONTO VALORIZADO

De acuerdo con las actividades ejecutadas se tiene una valorización con la siguiente configuración:

N° Valorización	Valorización Bruta	MONTO A PAGAR	IGV	Valorización del mes
		S/IGV		

N° 01. Septiembre	S/.78,094.36	S/.78,094.36	S/.14,056.98	S/.92,151.34
N° 02. Octubre	S/.297,923.93	S/.297,923.93	S/.53,626.31	S/.351,550.24
N° 03. Noviembre	S/.320,165.45	S/.320,165.45	S/.57,629.78	S/.377,795.23
N° 04. Diciembre	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00

Parcial	S/.696,183.74	S/.696,183.74	S/.125,313.07	S/.821,496.81
---------	---------------	---------------	---------------	---------------

ADICIONALES

0	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00
---	---------	---------	---------	---------

Total General	S/.696,183.74	S/.696,183.74	S/.125,313.07	S/.821,496.81
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Se observa que la VALORIZACIÓN N° 03 del mes de noviembre corresponde a un monto de **S/. 377,795.23 (inc. IGV)**.

Por lo cual se tiene el siguiente detalle:

➤ VALORIZACIÓN BRUTA	S/.	320,165.45
➤ IGV (18%)	S/.	57,629.78
➤ VALORIZACIÓN NETA	S/.	377,795.23
➤ RETENCIÓN G.F.V (5%)	S/.	0.00
➤ SALDO A COBRAR	S/.	377,795.23

El saldo a cobrar por la VALORIZACIÓN N° 03 del 01 al 30 del mes de noviembre es de **S/. 377,795.23 (TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 23/100 NUEVOS SOLES) incluido el I.G.V.**

C) DE PENALIDADES PRESENTADAS

No se presentó ninguna ocurrencia que suponga la aplicación de PENALIDAD según las estipulaciones del contrato de servicio de en su CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.

III. CONCLUSIONES

Tomando en cuenta todo lo analizado anteriormente, se hace las siguientes conclusiones:

- ❖ La diferencia entre el avance ejecutado respecto al programado arroja un **porcentaje negativo de -14.23%, pero supera el 80% de lo programado.**
- ❖ El saldo a pagar por la VALORIZACIÓN N° 03 del mes de noviembre es de **S/. 377,795.23 (TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 23/100 NUEVOS SOLES inc. IGV).**
- ❖ **No se presentaron PENALIDADES.**
- ❖ Se da **CONFORMIDAD** por parte de la oficina de Jefatura de Operaciones del IVP Santiago de Chuco a la VALORIZACIÓN N° 03 del servicio en mención.

IV. RECOMENDACIONES

Se recomienda **APROBAR** la presente VALORIZACIÓN N° 03 por su persona, a fin de realizar el pago correspondiente al CONSORCIO VIAL CALIFORNIA, conforme a lo estipulado en el cronograma programado del Plan de Trabajo del servicio y a lo ejecutado en campo. De igual modo, se sugiere seguir las recomendaciones indicadas en el Informe del Monitor designado (documento de referencia a). Por último, se recomienda agregar las copias de los cuadernos de ocurrencias de los dos tramos que componen el paquete contractual.

Es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y fines.

ATENTAMENTE



INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE
SANTIAGO DE CHUCO
Luis F. Chaves
C.P. 190782
JEFE DE OPERACIONES



Instituto Vial Provincial

Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD



MPSCH

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

INFORME N° 021-2020-IVP-MPSCH/TACSMRP/NBP

A : **Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez**
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Santiago Chuco

DE : **Ing. Nicolás Barrantes Parimango**
Técnico Administrativo del Área del IVP – MSCH – La Libertad

ASUNTO : **ALCANZO INFORME DE VALORIZACION N° 03 del 01/11/2020 al 30/11/2020 PARA TRAMITE RESPECTIVO**
Servicio: Mantenimiento Periódico y Rutinario de los Caminos Vecinales Tramos:
1. - EMP. PE 3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA LONG. = 4.330 KM
2. - CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO – TIERRA NEGRA - LONG. = 15.906 KM – DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD

REFERENCIA : **INFORME N° 1314-2020-MPSCH/DIST/SGI, de fecha 15/12/2020**
INFORME N° 241-2020-HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH, de fecha 09/12/2020
Carta N° 013-2020-AJDL-C
INFORME N° 006-2020-AJDL/INSP
CARTA N° 007-CONSORCIO VIAL CALIFORNIA/RL/EGD
CONTRATO N°016-2020-MPSCH-LOG, de fecha 28/08/2020
D.U.N° 070-2020

FECHA : Santiago de Chuco, 15 de Diciembre del 2020

I.- ANTECEDENTES:

1. DEL CONTRATISTA

Con fecha 13 de agosto de 2020 el Comité de Selección, adjudico la Buena Pro del **PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 008-2020-MPSCH/CS – SEGUNDA CONVOCATORIA**, para la ejecución del **SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: EMP. PE – 3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA LONG. = 4.330 KM – CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO – TIERRA NEGRA LONG. = 15.906 KM – DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD** al **CONSORCIO VIAL CALIFORNIA**.

Mediante **CONTRATO DE SERVICIO N° 016-2020-MPSCH-LOG**, que celebra de una parte la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, en adelante la ENTIDAD, con RUC N° 20187630101, con domicilio legal en calle Paco Yunque N° 735 – Santiago de Chuco, representada por su Gerente Municipal **Abog. Felipe Wilmer Angulo Zavaleta**, identificado con D.N.I. N° 18185361, con delegación de facultades mediante Resolución de Alcaldía N° 219-2020-



Instituto Vial Provincial

Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD



MPSCH

MPSCH de fecha 10 de agosto de 2020, y de otra parte el **CONSORCIO VIAL CALIFORNIA**, conformado por **ECAN INGENIERIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – ECAN INGENIERIA S.R.L.** (20% de participación), con RUC N° 20568073658, con domicilio legal en Pro Huancabamba N° 211-Urb. Oxapampa (Sum 72875055 A 1 CDA COLEGIO JEAN PIAGET) – OXAPAMPA – PISCO inscrita en la Partida Electrónica N° 11057473, en la Oficina Registral La Merced, debidamente representado por su Representante Legal Sr. Jean Herbert Eche Mostacero, con DNI N° 42736265 y **CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.**, (80% de participación), con RUC N° 20600813715, con domicilio legal en Mz. A T LOTE 17 Urb. San Andres La Libertad – Trujillo- Victor Larco Herrera, inscrita en la Partida Electrónica N° 11277775, del Registro de Personas Jurídicas en la Oficina Registral de Trujillo, debidamente representado por su Representante Legal Sr. Edgar Gomez Dominguez, con DNI N° 44944779, consignado como representante común del Consorcio al Sr. Edgar Gomez Dominguez, con DNI N° 44944779, con domicilio legal en Mz. T Lote 17 Urb. San Andres V Etapa – Victor Lerco – Trujillo – La Libertad, a quien en adelante se le denominara **EL CONTRATISTA**.

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE SERVICIO DEL **MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: EMP. PE – 3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA LONG. = 4.330 KM – CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO – TIERRA NEGRA LONG. = 15.906 KM – DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.**

El monto total para la ejecución del servicio asciende a S/. 1,724,000.00 (Un millón Setecientos Veinticuatro Mil con 00/100 Soles), que incluyen todos los impuestos de ley.

2.- DEL INSPECTOR

Mediante CONTRATO DE SERVICIO N° 028-2020-MPSCH-LOG, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO, en adelante la ENTIDAD, con RUC N° 20187630101, con domicilio legal en Calle Paco Yunque N° 735 – Santiago de Chuco, representada por su Gerente Municipal, **Abg. FELIPE WILMER ANGULO ZAVALETA**, identificado con D.N.I. N° 18185361, con delegación de facultades mediante Resolución de Alcaldía N° 219-2020-MPSCH de fecha 10 de Agosto de 2020, y de otra parte el **ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON**, con RUC N° 10444464301, con domicilio legal en Mz E lte. 23 Urb. San Miguel – Trujillo – La Libertad a quien en adelante se le denominara **EL CONTRATISTA**.

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE SERVICIO DE **INSPECCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: EMP. PE – 3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA LONG. = 4.330 KM – CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO – TIERRA NEGRA LONG. = 15.906 KM – DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.**



Instituto Vial Provincial

Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD



MPSCH

El monto total para la Inspección del Mantenimiento Periódico asciende a la suma de S/. 19,224.20 (Diesinueve Mil Doscientos veinticuatro con 20/100 soles).

1.- INFORMACION CONTRACTUAL

- 1.1. NOMBRE DEL SERVICIO : Mantenimiento Periódico y Rutinario de los Caminos Vecinales Tramo Emp. PE-3N – Villa Cruz de Algallama – Paccha Parte Alta Long. = 4.330 Km – California – Los Angeles – La Cruz de Ashiquino – Mal Paso – Tierra Negra Long. = 15.906 Km - Distrito de Santa Cruz de Chuca – Provincia de Santiago de Chuco – La Libertad
- 1.2. N° DE CONTRATO : CONTRATO N° 016-2020-MPSCH-LOG
- 1.3. ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
- 1.4. CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA (ECAN INGENIERIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – ECAN INGENIERIA S.R.L)
- 1.5. INSPECTOR : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON (CONTRATO N° 028-2020-MPSCH-LOG), fecha 24/08/2020.
- 1.6. PLAZO DE EJECUCION : 120 Días Calendarios. (Mantenimiento Periódico)
- 1.7. MONTO DE CONTRATO : S/. 1,724,000.00
- 1.8. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO : S/. 1,430,920.00
- 1.9. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO : S/. 258,600.00
- 1.10. PLAZO DE EJECUCION : 120 Días Calendario
- 1.11. FECHA DE INICIO : 22/09/2020
- 1.12. FECHA DE CULMINACION : 31/12/2020

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS – FASE II

Las actividades ejecutadas desde el 01/11/2020 al 30/11/2020 son las siguientes:

1.- EMP. PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA LONG. = 4.330 KM

2.- CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO – TIERRA NEGRA LONG. = 15.906 KM

FASE II

02.01 MANTENIMIENTO PERIODICO

1.00 OBRAS PROVISIOANALES

01.02 TRAZO Y REPLANTEO

DESCRIPCION:

11
303



Instituto Vial Provincial

Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD



MPSCH

Se realizó la Partida de Trazo y Replanteo, así como el nivelado del mismo (plataforma), estos trabajos han sido aprobados por el Ingeniero Inspector del Servicio.

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Se utilizó el Equipo Topográfico necesario para la ejecución del servicio de mantenimiento.

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION

1. Instalación de Trípode y equipo de georeferenciación, e instalación de mira, para proceder a lectura de alturas (niveles y desniveles), en el proceso de ejecución del servicio del mantenimiento periódico.

MEDICION

Para la medición de esta partida se utilizara la unidad de medida (km) kilometro.

PAGO

El pago se realiza de acuerdo al avance ejecutado, el pago constituirá compensación total por los trabajos prescritos en esta partida, el cual dará V°B° el Inspector de Servicio.

02.00 PAVIMENTOS

02.01 CAPA NIVELANTE E= 0.05 M

DESCRIPCION:

Se ejecutó la nivelación de la plataforma que se encuentren desniveladas respecto del borde del pavimento, que estén deformadas o cuya geometría no se ajuste a un plano liso con una pendiente uniforme y adecuada.

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Afirmado, materiales con características de Subbase Granular.

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION

1. Se procedió a Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad, con las que se garantizó, la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito para evitar accidentes.
2. El personal cuenta con los uniformes, y todo el equipo de protección personal de acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia.
3. Se identificaron las zonas de las bermas que presentan desniveles respecto del borde del pavimento o que se encuentren deterioradas y proceder a delimitarlas para el trabajo diario.

MEDICION

La unidad de medida es el metro cubico (m3) metro cubico.

PAGO

El pago se realiza de acuerdo al avance ejecutado, el pago constituirá compensación total por los trabajos prescritos en esta partida, el cual dará V°B° el Inspector de Servicio.

02.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E= 0.15 M

DESCRIPCION:

Handwritten signature in blue ink.



Instituto Vial Provincial

Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD



MPSCH

Se ejecutó la nivelación de la plataforma que se encuentren desniveladas respecto del borde del pavimento, que estén deformadas o cuya geometría no se ajuste a un plano liso con una pendiente uniforme y adecuada..

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Afirmado, materiales con características de Subbase Granular.

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION

1. Se procedió a Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad, con las que se garantizo, la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito para evitar accidentes.
2. El personal cuenta con los uniformes, y todo el equipo de protección personal de acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia.
3. Se identificaron las zonas de las bermas que presentan desniveles respecto del borde del pavimento o que se encuentren deterioradas y proceder a delimitarlas para el trabajo diario.

MEDICION

La unidad de medida es el metro cubico (m3) metro cubico.

PAGO

El pago se realiza de acuerdo al avance ejecutado, el pago constituirá compensación total por los trabajos prescritos en esta partida, el cual dará V°B° el Inspector de Servicio.

03.00 TRANSPORTE

03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM

DESCRIPCION:

Se realizó la actividad de extracción, apilamiento, carguío y transporte de material seleccionado de cantera. El material deberá tener características similares a los del camino.

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

1. Zaranda manual
2. lampas, picos y otros.

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION

1. Se realizo la extracción y apilamiento del material seleccionado.
2. Se procedió a cargar al vehículo el material.
3. Se Transporte el material de cantera al lugar de trabajo.

MEDICION

La unidad de medida es el metro cúbico (m3).

PAGO

El pago se realiza de acuerdo al avance ejecutado, el pago constituirá compensación total por los trabajos prescritos en esta partida, el cual dará V°B° el Inspector de Servicio.

03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM



Instituto Vial Provincial

Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD



MPSCH

DESCRIPCION:

Se realizó la actividad de extracción, apilamiento, carguío y transporte de material seleccionado de cantera. El material deberá tener características similares a los del camino.

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

1. Zaranda manual
2. lampas, picos y otros.

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION

1. Se realizó la extracción y apilamiento del material seleccionado.
2. Se procedió a cargar al vehículo el material.
3. se Transporte el material de cantera al lugar de trabajo.

MEDICION

La unidad de medida es el metro cúbico (m³).

PAGO

El pago se realiza de acuerdo al avance ejecutado, el pago constituirá compensación total por los trabajos prescritos en esta partida, el cual dará V°B° el Inspector de Servicio.

03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM

DESCRIPCION:

Consiste en Transportar el material excedente, después de haber ejecutado los trabajos del Mantenimiento Periódico.

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

1. Cargador Frontal, Lampas, picos y otros.

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION

1. Eliminar el material excedente.
2. Cargar al vehículo el material.
3. Transportar el material Excedente a los DME autorizados.

MEDICION

La unidad de medida es el metro cúbico (m³).

PAGO

El pago se realiza de acuerdo al avance ejecutado, el pago constituirá compensación total por los trabajos prescritos en esta partida, el cual dará V°B° el Inspector de Servicio.

03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM

DESCRIPCION:

Consiste en Transportar el material excedente, después de haber ejecutado los trabajos del Mantenimiento Periódico.



Instituto Vial Provincial

Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD



MPSCH

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

1. Cargador Frontal, Lampas, picos y otros.

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION

1. Eliminar el material excedente.
2. Cargar al vehículo el material.
3. Transportar el material Excedente a los DME autorizados.

MEDICION

La unidad de medida es el metro cúbico (m3).

PAGO

El pago se realiza de acuerdo al avance ejecutado, el pago constituirá compensación total por los trabajos prescritos en esta partida, el cual dará V°B° el Inspector de Servicio.

04.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS

DESCRIPCION:

Se realizó la reconformación de la sección transversal y la pendiente longitudinal de las cunetas las cuales no son revestidas, para que no dificulten o impidan el libre flujo del agua.

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

lampas, picos y otros.

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION

1. Se realizó la colocación de señales preventivas y dispositivos de seguridad, con lo cual garanticen la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes durante el tiempo requerido.
2. El personal tiene uniformes, y todo el equipo de protección personal de acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia.
4. Conformación de la cuneta y se procedió a retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetación, depositándolos en los DME autorizados.
5. Se verificó que la pendiente del fondo de la cuneta garantice el flujo libre de agua y que no haya depresiones que produzcan estancamientos.
6. Al término de los trabajos se retiraron las señales y dispositivos de seguridad.

MEDICION

La unidad de medida es el metro lineal (m).

PAGO

El pago se realiza de acuerdo al avance ejecutado, el pago constituirá compensación total por los trabajos prescritos en esta partida, el cual dará V°B° el Inspector de Servicio.

27
300



Instituto Vial Provincial



Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD

MPSCH

07.00 EMERGENCIA SANITARIA

07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

DESCRIPCION:

Se practicaron los protocolos en la implementación de herramientas y equipos de salud para la seguridad y protección del personal de trabajo en obra.

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

EPP COVID-19 (mascarillas, guantes, bandejas, alcohol, protector facial, etc)

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION

1. Tomar pruebas a los trabajadores.
2. Ingresar a centro de trabajo con mascarilla.
3. Rociar alcohol al momento de ingreso y salida.
4. Mantener el distanciamiento social permitido.
5. Manipulación de objetos personales sin compartirlos, obligatoriamente.

MEDICION

La medida es Global (Glb).

PAGO

El pago se realiza de acuerdo al avance ejecutado, el pago constituirá compensación total por los trabajos prescritos en esta partida, el cual dará V°B° el Inspector de Servicio.

3. ESTADO DE SITUACION DEL SERVICIO CONTRATADO – FASE II

3.1. SITUACION DE EJECUCION FISICA DE ACTIVIDADES

EMP. PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA LONG. = 4.330 KM

MANTENIMIENTO PERIODICO

TRAZO Y REPLANTEO.

%	%	%	%
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
46.19	53.81	100.00	0.00

CAPA NIVELANTE E= 0.05 M.

%	%	%	%
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
32.56	67.44	100.00	0.00

06
299



Instituto Vial Provincial



Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD

MPSCH

MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E= 0.15 M

% ANTERIOR	% ACTUAL	% ACUMULADO	% SALDO
24.63	75.37	100.00	0.00

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM

% ANTERIOR	% ACTUAL	% ACUMULADO	% SALDO
24.70	75.30	100.00	0.00

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM

% ANTERIOR	% ACTUAL	% ACUMULADO	% SALDO
24.30	75.70	100.00	0.00

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM

% ANTERIOR	% ACTUAL	% ACUMULADO	% SALDO
24.81	75.19	100.00	0.00

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM

% ANTERIOR	% ACTUAL	% ACUMULADO	% SALDO
24.31	75.69	100.00	0.00

[Handwritten signature]

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

RECONFORMACION DE CUNETAS

% ANTERIOR	% ACTUAL	% ACUMULADO	% SALDO
34.64	65.36	100.00	0.00

298



Instituto Vial Provincial



Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD

MPSCH

EMERGENCIA SANITARIA

EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

%	%	%	%
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
50.00	25.00	75.00	25.00

3.2. SITUACION DE EJECUCION ADMINISTRATIVA

3.2.1. Retención de Garantías

Se realizara la retención de garantía de

CONTRATO	G.F.C	SE REALIZO EN LAS VALORIZ. N° 01,02
SI.	10%	
1,724,000.00	172,400.00	

:

CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO – TIERRA NEGRA LONG. = 15.906

KM

MANTENIMIENTO PERIODICO

TRAZO Y REPLANTEO.

%	%	%	%
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
87.99	12.01	100.00	0.00

CAPA NIVELANTE E= 0.05 M.

%	%	%	%
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
45.27	18.90	64.17	35.83

MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E= 0.15 M

%	%	%	%
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
28.50	18.90	47.40	52.60

[Handwritten signature]



Instituto Vial Provincial

Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD



MPSCH

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM

%	%	%	%
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
28.48	18.92	47.40	52.60

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM

%	%	%	%
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
27.54	27.54	55.08	44.92

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM

%	%	%	%
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
28.49	20.07	48.56	51.44

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM

%	%	%	%
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
28.47	30.78	59.25	40.75

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

RECONFORMACION DE CUNETAS

%	%	%	%
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
45.27	24.56	- 69.83	- 30.17

EMERGENCIA SANITARIA

EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

%	%	%	%
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
50.00	25.00	75.00	25.00

3.3. SITUACION DE EJECUCION ADMINISTRATIVA

3.3.1. Retención de Garantías

Se realizara la retención de garantía de

CONTRATO	G.F.C	SE REALIZO EN LAS VALORIZ. N° 01, 02
SI.	10%	
1,724,000.00	172,400.00	

3.3.2. Vigencia de los seguros (SCTR,SOAT) y anexar copias

Presento la CONSTANCIA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD SCTR PENSIONES POLIZA 6648509, en la Compañía de seguros LA POSITIVA, la cual se tiene vigencia desde el 23/11/2020 hasta el 23/12/2020. (Folio N° 69)

3.3.3. Penalidades (aplicadas y cobradas)

En los informes emitidos por el Inspector del Servicio y el Sub Gerente de Infraestructura – MPSCH, no aplican penalidades.

3.3.4. Relación de personal que trabajo (profesional)

Datos Personales	Cargo	CIP
Quelvin Julio Quipuzcoa Alayo	Residente de Servicio	110887

4. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO (% AVANCE MENSUAL)

Del Informe N° 1314-2020-MPSCH/DIST/SGI: Se tiene:

PAQUETE N° 08	VALORIZACION N° 03	A CANCELAR
EMP. PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA LONG. = 4.330 KM	155,559.68	377,795.23
CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO –MAL PASO – TIERRA NEGRA –LONG = 15.906 KM	222,235.55	



Instituto Vial Provincial

Instituto Vial Provincial



PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD

MPSCH

De Informe N° 241-2020-HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH:

TRAMO	VALORIZACION N° 03	TOTAL VALORIZ.
EMP. PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA LONG. = 4.330 KM	155,559.68	377,795.23
CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO –MAL PASO – TIERRA NEGRA –LONG = 15.906 KM	222,235.55	

POR TANTO:

EMP. PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA LONG. = 4.330 KM

CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO – TIERRA NEGRA LONG. = 15.906

KM

MONTO CONTRATO	RETENCION CONTRATO 10%	VALORIZACION N° 03	RETENCION VALORIZ. N° 03 10%.	MONTO A CANCELAR	CORRESPONDE
1,724,000.00	172,400.00	155,559.68	0.00	155,559.68	CORRESPONDE
		222,235.55	0.00	222,235.55	CORRESPONDE
TOTAL		377,795.23	0.00	377,795.23	CORRESPONDE

El monto a cancelar al COSORCIO VIAL CALIFORNIA, asciende a la suma de S/. 377,795.23 (Trescientos Setentisiete Mil Setecientos Noventicinco con 23/100 Soles), con un avance físico Actual de 26.40%.

5. CONCLUSIONES:

VALORIZACION N° 03, CON DOCUMENTACION INADECUADA

RESIDENTE DE SERVICIO:

- 5.1. No se anexo El registro Diario de Control de Asistencia y Temperatura que se realiza a los trabajadores del Servicio de Mantenimiento Periódico.
- 5.2. No se anexo La Ficha de Sintomatología COVID-19. de los trabajadores involucrados en la ejecución del servicio del Mantenimiento Periódico.
- 5.3. No anexo El formato de Declaración Jurada de Condiciones de Salud en el Trabajo.
- 5.4. Folio 133, 134, existe discrepancia con longitud (kilometro).
- 5.5. Folio 135, 136, no firma el profesional responsable.



Instituto Vial Provincial

Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD



MPSCH

- 5.6. Folios, 157 al 161, fechas describe mes de octubre.
- 5.7. Las Actas de entrega de Terreno, Acta de Inicio de Servicio, no están firmadas
- 5.8. No existe panel fotográfico en donde se aprecie la presencia del Residente de Servicio del Mantenimiento Periódico.
- 5.9. Folio 251, en partida 04.01, la cantidad acumulada no es la correcta.

INSPECTOR:

- 5.10. No existe panel fotográfico en donde se aprecie la presencia de Inspección de Servicio de Mantenimiento Periódico.
- 5.11. Anexar Contrato de Servicio N° 028-2020-MPSCH-LOG.

SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA – MPSCH

- 5.12. En Referencia, se hace mención del contrato de servicio N° 007-2020-MPSCH-LOG, a que se refiere.

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar las coordinaciones respectivas con los profesionales que emitieron sus respectivos informes de la Valorización N° 03, del **Servicio: “Mantenimiento Periódico y Rutinario de los Caminos Vecinales Tramo Emp. PE-3N – Villa Cruz de Algallama – Paccha Parte Alta Long= 4.330 Km – California – los ángeles – La Cruz de Ashiquino – Mal Paso – Tierra Negra – Long. = 15.906 Km – Distrito de Santa Cruz de Chuca – Provincia de Santiago de Chuco – La Libertad**, para la correcta presentación.

Se está alcanzando al Jefe de operaciones del IVP-SCH, Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez, para el trámite correspondiente.

Es cuanto tengo que informar a Ud., para los fines que estime conveniente.

ADJUNTO:

INFORME N° 1314-2020-MPSCH/DIST/SGI
INFORME N° 241-2020-HMMT/DSYLO/MPSCH
CARTA N° 013-2020-AJDL.C
INFORME N° 006-2020-AJDL/INSP. (283 FOLIOS Inc. Valorización N° 03)

Atentamente,


Marcial Nicolás Barrantes Perimango
ING. CIVIL
R. CIP. N° 225678



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD" INFORME N° 1314 - 2020-MPSCH/DIST/SGI


A : ING. RAFAEL K. VALENCIA REBAZA
Gerente de IVP de la MPSCH

DE : ING. DAVID IVAN SILVA TORRES
Sub Gerente de Infraestructura - MPSCH

ASUNTO : CONFORMIDAD DE VALORIZACION N° 03 CONTRATISTA - CONTRACTUAL
(TRAMO 08)

REFERENCIA : (01) INFORME N°0241-2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH
(02) CARTA N° 013-2020-AJDL-C
(03) OBRA: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: EMP - PE - 3N VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD." (8.1)
(04) OBRA: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD." (8.2)
(05) CONTRATO DE SERVICIO N° 007-2020-MPSCH-LOG

FECHA : Santiago de Chuco, 15 de Diciembre del 2020



Me es sumamente honroso dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo; por otro lado referente al asunto de la presente manifiesto lo siguiente:

I. BASE LEGAL

- Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 27972 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
- Reglamento Nacional de Edificaciones

II. ANTECEDENTE

- ✓ Mediante el documento de la referencia, **INFORME N°0241-2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH**, el Encargado de la División de Supervisión y Liquidación de Obras, con fecha 09 de Diciembre del 2020, da la **CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION N° 03 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO** del contratista "CONSORCIO VIAL CALIFORNIA"; presentado por el INSPECTOR DE OBRA el Ing. ALEX JAVIER DIAZ LEON de las obras denominadas: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: EMP - PE - 3N VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD." (8.1); "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL

[Firma]
Sub Gerente de Infraestructura



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

CAMINO VECINA: CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO – TIERRA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.” (8.2) quien solicita el Pago N° 03 por servicios de ejecución de obra al CONTRATISTA “CONSORCIO VIAL CALIFORNIA”

III. ANALISIS

Se detallan en los cuadros de los tramos valorizados

TRAMOS N°8.01: CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO – TIERRA

VALORIZACION BRUTA	S/. 188,335.21
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (-) SIN IGV	S/. -
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (-) SIN IGV	S/. -
VALORIZACION NETA	S/. 188,335.21
IGV (18%)	S/. 33,900.34
VALORIZACION (INCL. IGV)	S/. 222,235.55
RETENCION DE 10% FIEL CUMPLIMIENTO	

TRAMOS N°8.02: EMP – PE – 3N VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA

VALORIZACION BRUTA	S/. 131,830.24
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (-) SIN IGV	S/. -
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (-) SIN IGV	S/. -
VALORIZACION NETA	S/. 131,830.24
IGV (18%)	S/. 23,729.44
VALORIZACION (INCL. IGV)	S/. 155,559.68
RETENCION DE 10% FIEL CUMPLIMIENTO	

COSTO GLOBAL DE TODO EL SERVICIO

VALORIZACION BRUTA	S/. 320,165.45
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (-) SIN IGV	S/. -
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (-) SIN IGV	S/. -
VALORIZACION NETA	S/. 320,165.45
IGV (18%)	S/. 57,629.78
VALORIZACION (INCL. IGV)	S/. 377,795.23
RETENCION DE 10% FIEL CUMPLIMIENTO	Se retuvo todo
MONTO TOTAL	S/. 377,795.23



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ La **Valorización Bruta N° 03 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO** del contratista fue por S/. **377,795.23 (TRECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 23/100 SOLES)**.
- ✓ Se recomendó que se haga **RETENCION DE 10 % GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO ES POR EL MONTO DE S/. 172,400.00 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES) INCLU IGV**; en las primeras valorizaciones.
- ✓ La Amortización del Adelanto Directo: -
- ✓ La Amortización del Adelanto de Materiales: -
- ✓ Por lo tanto el monto a cancelar al **CONTRATISTA POR CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA VALORIZACION N°03 – POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO**; asciende a S/. **377,795.23 (TRECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 23/100 SOLES) INCL. IGV**; se recomienda hacer la retención de fiel cumplimiento.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y acciones que estime por conveniente, salvo mejor parecer.

Atentamente,

Adjunto:

- Referencias
- Val N°03()
- Digital ()

Ing. David Ivan Silva Torres
SUSCRITO EN REPRESENTACION



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco


PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



290

INFORME N° 241 - 2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH



A : ING° DAVID IVAN SILVA TORRES
SUB-GERENTE DE INFRAESTRUCTURA MPSCH

DEL : ING. HERMES M. MELENDEZ TAMAYO
JEFE (e) DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

ASUNTO : VALORIZACIÓN DE SERVICIO N°03 – NOVIEMBRE 2020

REFERENCIA: a) TRAMO I: "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES EMP.PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA - Long. 4.330 Km. DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"

TRAMO II: "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES CALIFORNIA - LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO – TIERRA NEGRA- Long. 15.906 Kms. DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"

b) Carta N°013 - 2020 – AJDL-C

c) Carta N°007-2020-CONSORCIO VIAL CALIFORNIA/RL/EGD

FECHA : Santiago de Chuco, 09 de Diciembre del 2020

Es grato dirigirme a Usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo, vistos los documentos de la referencia, el suscrito como Jefe de la División de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco **OTORGA LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN N° 03- DICIEMBRE 2020** del Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS: EMP.PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA - Long. 4.330 Km. – CALIFORNIA - LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO – TIERRA NEGRA- Long. 15.906 Kms. DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD" y elaborado por el Contratista **CONSORCIO VIAL CALIFORNIA** según Contrato de Servicios N° 009-2020-MPSCH-LOG y aprobado por el Inspector de Obra.

Se informa trabajos valorizados en el periodo del 01 al 30 de Noviembre 2020.

DATOS GENERALES

1.- DENOMINACION

TRAMO I: "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES EMP.PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA - Long. 4.330 Km. DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"

TRAMO II: "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES CALIFORNIA - LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO – TIERRA NEGRA- Long. 15.906 Kms. DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"

2.- UBICACIÓN

- Caseríos : Tramo I: Villa Cruz de Algallama, Paccha Parte Alta,
Tramo II: California, Los Ángeles, La Cruz de Ashiquino, Mal Paso, Tierra Negra.
- Distrito : Santa Cruz de Chuca.
- Provincia : Santiago de Chuco.
- Región : La Libertad

3.- DATOS DEL MANTENIMIENTO:



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019

E-mail: mpsch@terra.com.pe



EJECUTOR

- Proceso de Selección : PES-PROG-008-2020-MPSCH/CS
- Contratista : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
- Representante Legal : Edgar Gómez Domínguez
- Contrato de Servicios : N° 016-2020-MPSCH-LOG.
- Suscripción de Contrato : 28/08/2020
- Modalidad : A Suma Alzada
- Valor Referencial (inc. IGV) : S/ 1'724,000.00
- Monto Contratado (inc. IGV) : S/ 1'724,000.00
- Monto del Tramo (inc. IGV) : S/ 306,181.00 - S/ 1'124,739.00
- Factor de Relación : 1.000
- Fuente de Financiamiento : MTC -Provias - D. U. N°070-2020
- Plazo de Ejecución Inicial : 500 Días Calendarios
- Entrega de Terreno : 05 de Setiembre del 2020
- Inicio de Plazo Contractual : 05 de Setiembre del 2020 (Elaboración Plan de Trabajo)
- Inicio de Plazo Fase II : 22 de Setiembre 2020
- Fecha Término Programado : 31 de Diciembre del 2021
- Residente de Obra : Ing. Quelvin Julio Quipuzcoa Alayo CIP 110887

TRAMO I: CALIFORNIA, LOS ÁNGELES, LA CRUZ DE ASHIQUINO, MAL PASO, TIERRA NEGRA.

- Porcentaje Programado : 33.66%
- Porcentaje Programado Acumulado : 72.13%
- Porcentaje Ejecutado : 19.76%
- Porcentaje Ejecutado Acumulado : 50.81%
- Estado del Mantenimiento : Atrasado en 21.32% (18.82% del Programado)
- Monto Valorizado : S/ 222,235.55

TRAMO II: VILLA CRUZ DE ALGALLAMA, PACCHA PARTE ALTA,

- Porcentaje Programado : 32.56%
- Porcentaje Programado Acumulado : 69.77%
- Porcentaje Ejecutado : 50.81%
- Porcentaje Ejecutado Acumulado : 81.66%
- Estado del Mantenimiento : Adelantado
- Monto Valorizado : S/ 155,559.68

INSPECTOR

- Inspector : Ing. Alex Javier Díaz León CIP 126547
- Contrato de Inspección de Obra : N° 028-2020-MPSCH-LOG.
- Fecha de Contrato : 24/08/2020
- Plazo de Prestación de Servicio : 120 Días Calendario
- Monto Contratado (inc. IGV) : S/ 19,224.20



4.- ANTECEDENTES

- Con fecha 28 de Agosto del 2020 se firma el Contrato de Servicios N°016-2020-MPSCH-LOG del Mantenimiento Periódico y Rutinario "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS: EMP.PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA - Long. 4.330 Km. - CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA- Long. 15.906 Kms. DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD" con la Empresa Contratista CONSORCIO VIAL CALIFORNIA por un monto total de S/ 1'724,000.00 y con un presupuesto por tramos de S/ 306,181.00 y S/ 1'124,739.00, con un plazo de ejecución de 500 días calendario.
- El día 24 de Agosto del 2020 se firma el Contrato de Inspección de Servicio N°028-2020-MPSCH-LOG con el Consultor Ing. Alex Javier Díaz León CIP 126547 por un monto de S/ 19,224.20, con un plazo de ejecución de 120 días calendario.
- Con fecha 05/09/2020 se firma el Acta de Entrega de Terreno con la participación de representantes de todos los involucrados.



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019

E-mail: mpsch@terra.com.pe



- El 22/09/2020 se firma el Acta de Inicio de Obra (Fase II) con una fecha programada de término de servicio del 31 de Diciembre 2020.
- Con fecha 12 de Setiembre 2020, el Inspector recepciona la Carta N°003-2020-CONSORCIO VIAL CALIFORNIA/RL/EGD con la cual el Contratista CONSORCIO VIAL CALIFORNIA hace entrega del Plan de Trabajo para su revisión y trámite respectivo
- El Ingeniero Inspector del Servicio mediante Informe N°006-2020-AJDL-C del 15 de Setiembre de 2020 ingresa por mesa de partes de la Entidad con Expediente Administrativo N° 4430 el Plan de Trabajo aprobado para su Conformidad.
- Mediante INFORME N°121-2020-HMMT/DEYP/SGI/MPSCCH, de fecha 25 de Setiembre del 2020 la División de Estudios y Proyectos otorga la Conformidad del Plan de Trabajo y sugiere su aprobación mediante la Resolución Respectiva.
- Con Resolución de Gerencia Municipal N°00312-2020-MPSCH/GM de fecha 28 de Setiembre 2020 de Aprueban el Plan de Trabajo del Mantenimiento Rutinario y Periódico.
- Mediante Carta N°008-2020-AJDL-C el Ing. Inspector hace llegar la Valorización de Servicio N°01 – Setiembre 2020 incluyendo la Carta N°003-2020-CONSORCIO VIAL CALIFORNIA/RL/EGD del 05/10/2020, para su revisión y conformidad de pago.
- Mediante Carta N°010-2020-AJDL-C el Ing. Inspector hace llegar la Valorización de Servicio N°02 – Octubre 2020 incluyendo la Carta N°005-2020-CONSORCIO VIAL CALIFORNIA/RL/EGD del 05/11/2020, para su revisión y conformidad de pago.
- Mediante Carta N°013-2020-AJDL-C el Ing. Inspector hace llegar la Valorización de Servicio N°03 – Noviembre 2020 incluyendo la Carta N°007-2020-CONSORCIO VIAL CALIFORNIA/RL/EGD del 30/11/2020, para su revisión y conformidad de pago.



5.- DESCRIPCION DE APRTIDAS DEL MANTENIMIENTO REALIZADAS EN LOS 02 TRAMOS

- Movilización de Equipos y Maquinaria desde Trujillo a pie de obra. Se ha trasladado la maquinaria que se describe en el informe del Ing. Inspector.
- Ejecución de partida de Trazo y Replanteo continua en un tramo acumulado de 16.00Km. con el uso de equipo topográfico completo y dejando monumentados BMs y niveles.
- Ejecución de Capa Nivelante de $e=0.05m$. empleando 1,475 m3 de material, acumulando 3,900 m3 que representa el 80% del metrado total.
- Colocación, nivelación, conformación y compactación de Material Granular para afirmado habiendo empleado 4,700 m3 de material con el uso de maquinaria, acumulando 8,900 m3 correspondiendo al 70% del total.
- Extracción, selección, acarreo y apilamiento en lugares estratégicos de 46,200 m3 aprox. de material para afirmado que representa aprox. el 60%.
- Eliminación de aproximadamente 22,300 m3 de material excedente hasta botaderos autorizados.
- Conformación y Perfilado de Cunetas con maquinaria y mano de obra en tramo de 6,730 ml.
- Implementación de protocolos Covid 19 de seguridad laboral y equipamiento con EPPs para todo el personal.

6.-DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICION:

RESUMEN VALORIZACIÓN N° 03 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (Noviembre 2020)

TRAMO I: CALIFORNIA - LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO – TIERRA NEGRA

VALORIZACIÓN CONTRACTUAL (TRAMO I)	SIN IGV		S/. 188,335.21
	S/.	0.00	
REINTEGROS (REAJUSTES RECONOCIDOS)	SIN IGV		S/. 0.00
	S/.	0.00	



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019

E-mail: mpsch@terra.com.pe



VALORIZACION BRUTA			S/.188,335.21
AMORTIZACIONES	SIN IGV		S/.0.00 (-)
ADELANTO DIRECTO	S/. 0.00		
ADELANTO PARA MATERIALES	S/. 0.00		
DEDUCCIONES (DQNC)			S/. 0.00
ADELANTO DIRECTO	S/. 0.00		
ADELANTO PARA MATERIALES	S/. 0.00		
VALORIZACION NETA			S/. 188,335.21
I. G. V. 18.00%			S/. 33,900.34
NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA			S/. 222,235.55

SON : DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 97/100 SOLES

RESUMEN VALORIZACIÓN N° 03 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (Noviembre 2020)

TRAMO II: EMP.PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA

VALORIZACIÓN CONTRACTUAL (TRAMO II)	SIN IGV		S/. 131,830.24
	S/. 0.00		
REINTEGROS (REAJUSTES RECONOCIDOS)	SIN IGV		S/. 0.00
	S/. 0.00		
VALORIZACION BRUTA			S/.131,830.24
AMORTIZACIONES	SIN IGV		S/.0.00 (-)
ADELANTO DIRECTO	S/. 0.00		
ADELANTO PARA MATERIALES	S/. 0.00		
DEDUCCIONES (DQNC)			S/. 0.00
ADELANTO DIRECTO	S/. 0.00		
ADELANTO PARA MATERIALES	S/. 0.00		
VALORIZACION NETA			S/. 131,830.24
I. G. V. 18.00%			S/. 23,729.44



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019

E-mail: mpsch@terra.com.pe



NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA

S/. 155,559.68

SON : CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 26/100 SOLES



7.- TOTAL A CANCELAR POR VALORIZACIÓN DE SERVICIO N°02 – OCTUBRE 2020

TRAMO I: CALIFORNIA-LOS ANGELES-LA CRUZ ASHIQUINO-MAL PASO-TIERRA NEGRA

S/. 222,235.55

TRAMO II : VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA

S/. 155,559.68

TOTAL A CANCELAR VALORIZACIÓN DE SERVICIO N°02 – OCTUBRE 2020 S/ 377,795.23

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 23/100 SOLES

8.- ANALISIS

- Se ha revisado el trámite seguido a los documentos de la referencia generados por el Contratista y el Inspector del Servicio.
- El Informe de Aprobación de la Valorización del Servicio emitido por el Inspector indica que la valorización está de acuerdo con lo ejecutado y cumple con el contenido de documentos e información técnica requerida y necesaria para el cumplimiento de las metas y objetivos del servicio contratado.
- El Ing. Inspector del Servicio, en las conclusiones de su informe, debe ser claro y específico respecto a la aprobación de la Valorización de Servicio correspondiente.
- El mantenimiento se encuentra en ejecución.

9.- RECOMENDACIONES

- Se recomienda al Ing. Residente e Ing Inspector que deben presentar la documentación con el número de ejemplares originales y copias establecidos, contenido en formato digital y con el uso de separadores y la numeración requerida.
- Se recomienda al Ing. Residente e Ing Inspector que deben firmar todos los folios de la Valorización de todos los documentos que se presenten para su trámite. El Representante Legal también debe firmar todos los folios.
- Presentar todos los Análisis de Materiales y pruebas de campo requeridos (Estudio de Canteras, CBR, Densidad de Campo, etc) realizados en un laboratorio que cuente con autorización de INDECOPI.
- Presentar registro fotográfico de la ejecución de las partidas con su respectiva descripción.
- Verificar el cumplimiento de plan de trabajo, especialmente la Adecuación e Implementación de Protocolos ante la Emergencia Sanitaria por el Covid 19.

10.- CONCLUSIONES

- El Ing. Inspector del Servicio, en su informe, APRUEBA la Valorización de Servicio N°03 - Noviembre 2020.
- Luego de su revisión, la Jefatura de la División de Supervisión y Liquidación de Obras de la Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, **OTORGA LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN N°03 – NOVIEMBRE 2020** del Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019

E-mail: mpsch@terra.com.pe



TRAMOS: EMP.PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA - Long. 4.330 Km. – CALIFORNIA - LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO – TIERRA NEGRA- Long. 15.906 Kms. DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD” y elaborado por el Contratista **CONSORCIO VIAL CALIFORNIA** y aprobado por el Inspector de Obra y sugiere su **CANCELACION** en cumplimiento de las cláusulas contractuales.

Es todo cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.


Ing. Hermés M. Meléndez Tamayo
CIP. 111401
Jefe División de Supervisión y Liquidaciones

Año de la Universalización de la Salud

Santiago de Chuco, 04 de Diciembre del 2020

CARTA N° 013 - 2020 - AJDL-C

Sr: **DR. FELIPE WILMER ANGULO ZAVALA.**
Gerente de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.

Asunto: **ALCANZO VALORIZACIÓN N° 03 – DEL CONTRATISTA “CONSORCIO VIAL CALIFORNIA”.**

Referencia: **SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: “EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA LONG=4.330KM”, - “CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM” – DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.**


Tengo a bien dirigirme a usted en calidad de inspector para saludarlo cordialmente y a la vez alcanzarle la valorización N° 03 presentado por el contratista “CONSORCIO VIAL CALIFORNIA” referente al “SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: “EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA LONG=4.330KM”, - “CALIFORNIA -LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM” – DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD”; correspondiente al mes de noviembre del presente año.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para testimoniarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima.

Atentamente,


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO	
GERENCIA MUNICIPAL	
PROVEIDO	
PASE a:	IUP
PARA:	SU ATENCIÓN
PRELIMINAR REVISIÓN	
FECHA:	07/12/20
FOLIO:	125



INFORME N° 006 – 2020 –AJDL/INSP

A : **ING. RAFAEL K. VALENCIA REBAZA.**
Gerente de IVP de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.

DE : **ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON.**
Inspector del servicio de ejecución del Mantenimiento Periódico.

ASUNTO : **VALORIZACIÓN N° 03 DEL CONTRATISTA**


REFERENCIA : **SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA LONG=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" – DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD**

FECHA : Santiago de Chuco 04 de Diciembre del 2020

Mediante el presente tengo a bien de alcanzarle el pronunciamiento al informe mensual del contratista referente a la Valorización N° 03 del: "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA LONG=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" – DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD", detallando lo siguiente:

I. ANTECEDENTES.

- a) Conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local.
- b) La Ley Orgánica de Municipalidades señala que las municipalidades provinciales y distritales, dentro del marco de las competencias y funciones específicas, son competentes para promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales.
- c) Mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprobó la reanudación de las actividades: "Mantenimientos, Mejoramiento y Conservación Rutinarios y Periódicos de Vías Nacionales, Departamentales y Locales" y de acuerdo a lo señalado en el numeral 1.2 del Artículo 1 del mencionado decreto supremo, las referidas actividades se encuentran autorizadas para su reanudación de forma automática, una vez que las personas jurídicas que realizan dichas labores registren su "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.
- d) Con Decreto de Urgencia N° 070-2020 se dictó medidas destinadas a generar empleo para la ejecución de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional, departamental y vecinal a efectos de establecer medidas necesarias, en materia económica y financiera, que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, los


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco de sus competencias, la ejecución de acciones oportunas para la reactivación de la actividad económica, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento periódico y rutinario de las vías nacionales, departamentales y vecinales. Los trabajos de mantenimiento proyectado facilitan el traslado de los productos agropecuarios de las zonas a intervenir, hasta los centros de consumo, permitiendo garantizar el abastecimiento de los productos a consecuencia de la Emergencia Sanitaria generada por el brote del Coronavirus (COVID-19).

- e) El Decreto de Urgencia N° 070-2020 014-2019 estableció, entre otras, medidas que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco de sus competencias, la ejecución de acciones oportunas, en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19, para la reactivación de la actividad económica a nivel nacional y atención a la población, fomentando trabajo local a través de mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento periódico y rutinario de las vías departamentales y vecinales.
- f) Al respecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 del D.U. N° 070- 2020, numeral 21.3, los Titulares de los pliegos habilitados en la presente transferencia de partidas aprueban mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 21.1, a nivel programático, dentro de los cuales se registran el desagregado del **INSPECTOR**, quien estará a cargo de Monitorear y evaluar la calidad técnica del servicio, considerando al plan de trabajo como documento técnico de calidad del servicio.
- g) En ese sentido, la presencia del Inspector, es prioritario y como profesional competente para Monitorear y evaluar la calidad técnica del servicio mediante las actividades programadas en el Plan de Trabajo de cada uno de los caminos vecinales priorizados por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, en el marco del D.U. N° 070-2020.
- h) El objetivo como profesional es Inspeccionar, controlar, Fiscalizar y verificar la ejecución de las actividades de mantenimiento vial dando cumplimiento al Plan de Trabajo aprobado por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, en el marco del D.U. N° 070-2020.

II. DATOS GENERALES DEL SERVICIO:

1. Nombre del Servicio

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA LONG=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" – DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD",

2. Ubicación

Región : LA LIBERTAD

Provincia : SANTIAGO DE CHUCO

Distrito : SANTA CRUZ DE CHUCA

Caserío : VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA - CALIFORNIA -LOS ANGELES


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

3. Proceso De Adjudicación del Servicio

PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 008-2020-MPSCH/CS

4. Fuente de financiamiento

Recursos Ordinarios

5. Modalidad Contratación

a Suma Alzada

6. Contrato de Servicio

N° 016-2020-MPSCH/LOG

7. Decreto de Urgencia

N° 070-2020

8. Fecha de Suscripción

28 de agosto del 2020

9. Ejecutor De Servicio

CONSORCIO VIAL CALIFORNIA

Conformado por:

CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.

RUC: 20568073658

ECAN INGENIERIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ECAN INGENIERIA S.R.L.

RUC: 20600813715

Representante Legal: Sr. Edgar Gomez Dominguez

10. Residente De Obra

ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO

11. Monto Contratado Para La Ejecución Del Servicio

S/. 1,724,000.00 (Un millón Setecientos Veinticuatro mil con 00/100 Soles), inc el IGV.

12. Fecha Entrega Terreno

05 de setiembre del 2020 (Elaboración del Plan de Trabajo)

13. Fecha de Conformidad de Plan de Trabajo

21 de Setiembre del 2020

14. Fecha de Inicio de Servicio

22 de Setiembre del 2020

15. Plazo de Ejecución

120 DIAS CALENDARIOS


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

ALEX JAVIER DIAZ LEON

INGENIERO CIVIL

REG. CIP N° 126547

280

16. Fecha Límite de ejecución

31 de Diciembre del 2020

DATOS DE INSPECCIÓN

17. Contrato Inspección

N° 028 – 2020 – MPSCH-LOG.

18. Fecha Contrato Inspección

24 de Agosto 2020

19. Inspector del Servicio

ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON

Ingeniero Civil con Reg. CIP N° 126547

20. Monto Contratado Para La Inspección del Servicio

S/. 19,224.20 (Diecinueve mil Doscientos Veinticuatro con 20/100 Soles).

21. Plazo Prestación Inspección

120 días calendarios

III. DE LA PRESENTACIÓN DE LA VALORIZACION


Mediante la **Carta N° 0006-CONSORCIO VIAL CALIFORNIA**, de fecha 30 de Noviembre, la empresa CONSORCIO VIAL CALIFORNIA, con representante legal Sr. **Edgar Gomez Dominguez**, realizo la entrega de la Valorización N° 03 SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA LONG=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" – DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD, a mi persona en calidad de INSPECTOR para su evaluacion y posteriormente su aprobacion.

IV. ESTADO FÍSICO DEL SERVICIO

El Avance Físico del servicio nos refleja un avance ejecutado de 26.40%, en el periodo comprendido para el mes de Noviembre del 2020, en comparación al 33.43% del Avance Programado Mensual; además se hace mención que el avance ejecutado Acumulado 57.41%, contra el avance programado acumulado que es de 71.64%, por lo tanto, nos refleja un atraso en el presente periodo de -14.23%.


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

Cuadro de Avance de Obra

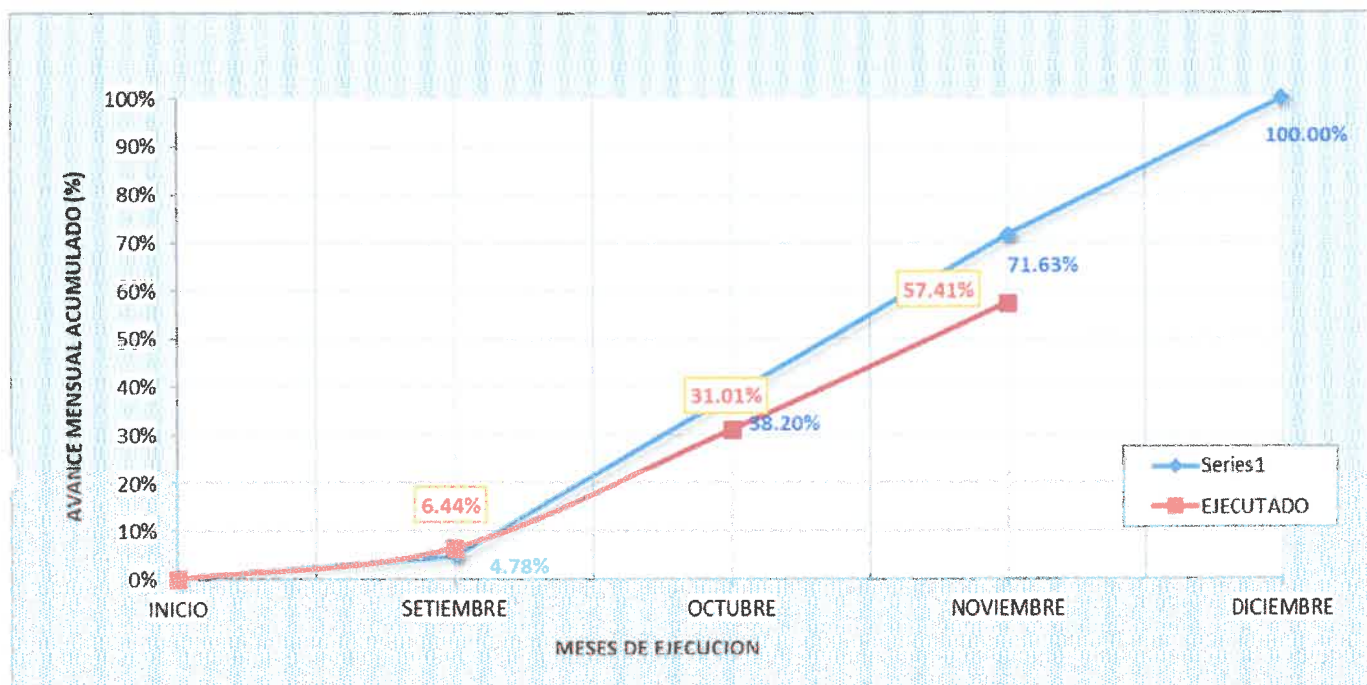

1. SITUACIÓN DEL PROYECTO


El proyecto se encuentra en ejecución; documentado en los datos de la ficha de control del avance programado vigente, el avance programado acumulado es de 71.64%, y el ejecutado acumulado 57.41%.

COMENTARIOS:

La obra se viene desarrollando con normalidad desde el 22 de setiembre del 2020.

2. LABORES EFECTUADAS POR EL INSPECTOR EN EL PRESENTE PERIODO

- Inspección de los trabajos correspondientes a la capa nivelante E=0.05m.
- Verificación de los trabajos de conformación de base con material granular de cantera E=0.15m.
- Control y verificación de las actividades correspondientes al transporte de material granular y material excedente hasta y mayor a un KM.
- Se verificaron los trabajos de reconfiguración de cunetas.
- Revisión y control de la Programación del servicio.
- Verificación de los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las partidas conformantes del Plan de Trabajo.
- Elaboración de metrados de obra ejecutada.
- Control de la Programación y Avance de Obra.


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

ALEX JAVIER DIAZ LEON**INGENIERO CIVIL****REG. CIP N° 126547**

- Coordinaciones y reuniones con el Contratista para lograr que la obra se ejecute de acuerdo a lo programado.
- Preparación y presentación de Informe Mensual.
- Control del Plan de Seguridad y Salud en Obra, incluyendo las medidas del plan para la vigilancia prevención y control del COVID-19.
- Se verifico la ejecución de partidas correspondientes al periodo del 01 al 30 de noviembre del 2020.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Se concluye dando opinión favorable de esta inspección para la conformidad del Pago a Favor del **CONSORCIO VIAL CALIFORNIA** por concepto de ejecución del: **SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA LONG=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" – DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD**" correspondiente a la Valorización N° 03 del Mes de Noviembre del 2020 por el monto de **S/.377,795.23** (Trescientos Setenta y siete Mil Setecientos noventa y cinco con 23/100 soles); incluido el IGV, que corresponde al 26.40 % del Avance Físico de Obra.

Sin otro particular y atento de brindarle mi servicio, me suscribo de usted.

Atentamente,


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547




CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA



- CARTA DE LA
EMPRESA
DIRIGIDA AL
INSPECTOR.





CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA



CARTA N°007 – CONSORCIO VIAL CALIFORNIA/RL/EGD.

SR. : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON – CIP N° 126547
Inspector de Obra.

ASUNTO : ALCANZA VALORIZACION DE SERVICIO N° 03

REFERENCIA : SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO “EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM”, - “CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM” - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

FECHA : 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Me es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo y al mismo tiempo alcanzarle el INFORME DE VALORIZACION N° 03 correspondiente al mes de noviembre del 2020 (periodo de 01 de noviembre del 2020 al 30 de noviembre del 2020). Para su respectiva revisión y aprobación.

Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente:

CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
.....
EDGAR GOMES MANGUEZ
DNI N° 24944779
REPRESENTANTE COMUN

.....
ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547


Cc:

- Archivo





CONSORCIO VIAL CALIFORNIA



CARTA N°007 – CONSORCIO VIAL CALIFORNIA/RL/EGD.

SR. : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON – CIP N° 126547
Inspector de Obra.

ASUNTO : ALCANZA VALORIZACION DE SERVICIO N° 03

REFERENCIA : SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO “EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM”, - “CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM” - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

FECHA : 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Me es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo y al mismo tiempo alcanzarle el INFORME DE VALORIZACION N° 03 correspondiente al mes de noviembre del 2020 (periodo de 01 de noviembre del 2020 al 30 de noviembre del 2020). Para su respectiva revisión y aprobación.

Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente:

CONSORCIO VIAL CALIFORNIA

CARLOS DOMÍNGUEZ
44779
CAROLINANTE COMUN


Cc:

- Archivo





CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA



- FICHA TECNICA.



1-A: FICHA TECNICA DEL CAMINO VECINAL

273

1. **Municipalidad**

2. **Datos Responsable:** Fecha:

Cargo:

3. **Ubicación Política Administrativa:** **Cod. Ubigeo:**

Distrito(s):

Provincia(s):

Departamento:

4. Datos del SINAC: Clasificador de Rutas Vigente

Jerarquía Vial: Código de Ruta:

Código de Ruta Provisional (Rutas sin Clasificar):

Trayectoria:

5. Ubicación Geográfica:

De la Ruta:

Inicio: Descripción

Progresiva: Cota: msnm ZONA:

Coordenada (UTM - WGS84):

Fin: Descripción

Progresiva: Cota: msnm ZONA:

Coordenada (UTM - WGS84):

Sello y Firma de Responsable de elaboración del ICV

Nota: La Información de la Ficha debe tener el respaldo de la Información digital respectiva: Archivos GPS (Puntos=Waypoints y Eje Vial=Tracks), Fotografías (jpg), Video de la Obra (formato Avi). Deberá entregar en DVD.


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

1-A: FICHA TECNICA DEL CAMINO VECINAL

272

1. Municipalidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

2. Datos Responsable: ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887 Fecha:

Cargo: RESIDENTE DE SERVICIO

3. Ubicación Política Administrativa: Cod. Ubigeo:

Distrito(s): SANTA CRUZ DE CHUCA

Provincia(s): SANTIAGO DE CHUCO

Departamento: LA LIBERTAD

4. Datos del SINAC: Clasificador de Rutas Vigente

Jerarquía Vial: Código de Ruta: R131029

Código de Ruta Provisional (Rutas sin Clasificar):

Trayectoria: TRAMO EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA

5. Ubicación Geográfica:

De la Ruta:

Inicio: Descripción EMP. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA

Progresiva: 00+000 Cota: 3,347 msnm ZONA:

Coordenada (UTM - WGS84): 91.011.415 N 818.878.126 E

Fin: Descripción PACCHA PARTE ALTA


Progresiva: 04+330 Cota: 3,567 msnm ZONA:

Coordenada (UTM - WGS84): 9.104.280.004 N 816.671.263 E


Sello y Firma de Responsable de elaboración de ICV

Nota: La Información de la Ficha debe tener el respaldo de la Información digital respectiva: Archivos GPS (Puntos=Waypoints y Eje Vial=Tracks), Fotografías (jpg), Video de la Obra (formato Avi). Deberá entregar en DVD.

ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547



CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA



- FACTURA DEL
CONTRATISTA.



CORPORACION SORIANO L & C S.A.C.

MZA. T LOTE. 17 URB. URB.SAN ANDRES 5TA

VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20600813715****E001-52**

Fecha de Vencimiento :

Fecha de Emisión : **21/12/2020**Señor(es) : **MUNICIPALIDAD PROVINC
SANTIAGO DE CHUCO**RUC : **20187630101**Dirección del Cliente : **JR. PACO YUNQUE 735 ---- SAN
CRISTOBAL LA LIBERTAD-
SANTIAGO DE CHUCO-
SANTIAGO DE CHUCO**Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO DE LA VALORIZACION N.03 DE LA EJECUCION DEL SERVICIO SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES-EMP. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA LONG= 4.330 KM-CALIFORNIA - LOS ANGELES.	320165.4491	0.00

Valor de Venta de Operaciones :

Gratuitas :

**SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
CINCO Y 23/100 SOLES**

Sub Total :	S/ 320,165.45
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 320,165.45
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 57,629.78
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 377,795.23

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA




- INFORME DE
RESIDENTE.





CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA



VALORIZACION N° 03 – NOVIEMBRE 2020

SERVICIO	:	"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"
CONTRATISTA	:	CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
INSPECTOR	:	ALEX JAVIER DIAZ LEON – CIP N°126547
RESIDENTE	:	QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N°110887
ENTIDAD	:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
PERIODO	:	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020



NOVIEMBRE 2020





INFORME MENSUAL 03

(NOVIEMBRE – 2020)

EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO

FASE: II

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

1.1. NOMBRE DEL SERVICIO:

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG. =4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

1.2. N° DE CONTRATO:

Contrato de Servicio: N° 016-2020-MPSCH-LOG.

1.3. ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

1.4. CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL CALIFORNIA

- ECAN INGENIERIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – ECAN INGENIERIA S.R.L.
- CORPORACION SORIANO L & C S.A.C.

1.5. INSPECTOR:

ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N°126547

1.6. RESIDENTE:

QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N°110887

1.7. MONTO DE CONTRATO:

S/. 1,724,000.00 INC. IGV


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547


Quelvin Julio Quipuzcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887





CONSORCIO VIAL CALIFORNIA



1.8. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO:

S/. 1,430,920.00 INC. IGV

1.9. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:

S/. 258,600.00 INC. IGV

1.10. PLAZO DE EJECUCIÓN:

120 DIAS CALENDARIOS

1.11. FECHA DE INICIO:

22 DE SETIEMBRE DEL 2020

1.12. FECHA DE CULMINACIÓN:

31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS – FASE II:

2.1. TRAMO CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA - SANTA CRUZ DE CHUCA - SANTIAGO DE CHUCO

2.1.1. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Durante el periodo de 01 de noviembre del 2020 al 30 de noviembre del 2020
Se trabajo en las siguientes partidas:

01.00 OBRAS PROVICIONALES

01.02 Trazo y Replanteo

02.00 PAVIMENTOS

02.01 Capa Nivelante E=0.05M

02.02 Material Granular de Cantera E=0.15M

03.00 TRANSPORTE

03.01 Transporte de Material Granular hasta 1 KM

03.02 Transporte de Material Granular mayor a 1 KM

03.03 Transporte de Material Excedente hasta 1 KM

03.04 Transporte de Material Excedente mayor a 1 KM

04.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01 Reconformación de Cunetas


07.00 EMERGENCIA SANITARIA

07.01 Emergencia sanitaria COVID-19


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547


Quelpuza Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887





2.1.2. DETALLE DE CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADOS Y ANEXAR LOS CERTIFICADOS DE LABORATORIO.

Durante el periodo de 01 de noviembre del 2020 al 30 de noviembre del 2020, se realizaron ensayos de densidad de campo, los cuales se anexan al informe.

2.2. TRAMO EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA - SANTA CRUZ DE CHUCA - SANTIAGO DE CHUCO

2.2.1. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Durante el periodo de periodo de 01 de noviembre del 2020 al 30 de noviembre del 2020
Se trabajó en las siguientes partidas:

01.00 OBRAS PROVINCIALES

01.02 Trazo y Replanteo

02.00 PAVIMENTOS

02.01 Capa Nivelante E=0.05M

02.02 Material Granular de Cantera E=0.15M

03.00 TRANSPORTE

03.01 Transporte de Material Granular hasta 1 KM

03.02 Transporte de Material Granular mayor a 1 KM

03.03 Transporte de Material Excedente hasta 1 KM

03.04 Transporte de Material Excedente mayor a 1 KM

04.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01 Reconformación de Cunetas

07.00 EMERGENCIA SANITARIA

07.01 Emergencia sanitaria COVID-19

2.2.2. DETALLE DE CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADOS Y ANEXAR LOS CERTIFICADOS DE LABORATORIO.

Durante el periodo de periodo de 01 de noviembre del 2020 al 30 de noviembre del 2020, se realizaron ensayos de densidad de campo, los cuales se anexan al informe.

3. ESTADO DE SITUACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO – FASE II:

3.1. SITUACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

3.1.1. TRAMO CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA - SANTA CRUZ DE CHUCA - SANTIAGO DE CHUCO

3.1.1.1. DETALLAR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y LOS PORCENTAJES DE AVANCE.


Durante el periodo de periodo de 01 de noviembre del 2020 al 30 de noviembre del 2020

Se realizaron los trabajos en las siguientes partidas.

ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

Quipuzco Alayo
ING CIVIL
R. CIP: 110887





CONSORCIO VIAL CALIFORNIA



01.00 OBRAS PROVICIONALES

01.02 Trazo y Replanteo

Esta partida cuenta con un avance del 12.01 %.

02.00 PAVIMENTOS

02.01 Capa Nivelante E=0.05M

Esta partida cuenta con un avance del 18.90%.

02.02 Material Granular de Cantera E=0.15M

Esta partida cuenta con un avance del 18.90%.

03.00 TRANSPORTES

03.01 Transporte de Material Granular hasta 1 KM

Esta partida cuenta con un avance del 18.92%.

03.02 Transporte de Material Granular mayor a 1 KM

Esta partida cuenta con un avance del 27.54%.

03.03 Transporte de Material Excedente hasta 1 KM

Esta partida cuenta con un avance del 20.07%.

03.04 Transporte de Material Excedente mayor a 1 KM

Esta partida cuenta con un avance del 30.78%.

04.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01 Reconformación de Cunetas

Esta partida cuenta con un avance del 24.56%.

07.00 EMERGENCIA SANITARIA

07.01 Emergencia sanitaria COVID-19


Esta partida cuenta con un avance del 25%.

3.1.1.2. DETALLAR LOS CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADAS Y ANEXAR LOS CERTIFICADOS DE LABORATORIO.

Durante el periodo de periodo de 01 de noviembre del 2020 al 30 de noviembre del 2020, se realizaron ensayos de densidad de campo, los cuales se anexan al informe.


3.1.1.3. CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS

Ver anexos.


Quelin J. Quipuzcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547





CONSORCIO VIAL CALIFORNIA



3.1.2. TRAMO EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA - SANTA CRUZ DE CHUCA - SANTIAGO DE CHUCO

3.1.2.1. DETALLAR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y LOS PORCENTAJES DE AVANCE.

Durante el periodo de 01 de noviembre del 2020 al 30 de noviembre del 2020 Se realizaron los trabajos en las siguientes partidas.

01.00 OBRAS PROVICIONALES

01.02 Trazo y Replanteo

Esta partida cuenta con un avance del 53.81 %.

02.00 PAVIMENTOS

02.01 Capa Nivelante E=0.05M

Esta partida cuenta con un avance del 67.44%.

02.02 Material Granular de Cantera E=0.15M

Esta partida cuenta con un avance del 75.37%.

03.00 TRANSPORTES

03.01 Transporte de Material Granular hasta 1 KM

Esta partida cuenta con un avance del 75.30%.

03.02 Transporte de Material Granular mayor a 1 KM

Esta partida cuenta con un avance del 75.70%.

03.03 Transporte de Material Excedente hasta 1 KM

Esta partida cuenta con un avance del 75.19%.

03.04 Transporte de Material Excedente mayor a 1 KM

Esta partida cuenta con un avance del 75.69%.

04.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01 Reconformación de Cunetas

Esta partida cuenta con un avance del 65.36%.

07.00 EMERGENCIA SANITARIA

07.01 Emergencia sanitaria COVID-19

Esta partida cuenta con un avance del 25%.



3.1.2.2. DETALLAR LOS CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADAS Y ANEXAR LOS CERTIFICADOS DE LABORATORIO.

Durante el periodo de 01 de noviembre del 2020 al 30 de noviembre del 2020, se realizaron ensayos de densidad de campo, los cuales se anexan al informe.


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547


Quelvini Quipuzcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887





3.1.2.3. CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS
Ver anexos.

3.2 SITUACIÓN DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA

3.2.1 RETENCIÓN DE GARANTÍAS.

Retención del 10% de fiel cumplimiento del contrato.

3.2.2 VIGENCIA DE LAS CARTAS FIANZAS.

No aplica.

3.2.3 VIGENCIA DE LOS SEGUROS (SCTR, SOAT) Y ANEXAR COPIAS.

22/12/2020.

3.2.4 PENALIDADES (APLICADAS Y COBRADAS).

No aplica.

3.2.5 RELACIÓN DE PERSONAL QUE TRABAJÓ (PROFESIONAL, TÉCNICOS Y OBREROS).

PERSONAL ASEGURADO					
SEDE: CONSTRUCCION					
Nro	PATERNO	MATERNO	NOMBRES	DNI	FECHA DE NACIMIENTO
1	RONCAL	MORALES	CARLOS EDUARDO	18010553	16/04/1972
2	SALINAS	DE LA CRUZ	ELVIS HECTOR	70893861	16/01/1992
3	CHÁVEZ	ESPEJO	WALTER	47271818	19/09/1991
4	SÁNCHEZ	ASUNCIÓN	LAZARO	42828408	14/02/1983
5	LIMAY	CHAVARRIA	RUPERTO	41840754	17/08/1982
6	MARDONADO	NOGUERA	JUAN	15236259	04/05/1976
7	POLO	LAYZA	WALTER	47750955	08/04/1953
8	GUEVARA	LLAURY	LORGIO	80459091	02/03/1978
9	CASTILLO	FLORES	JORGE	47037843	23/04/1991
10	MARIÑOS	GUEVARA	CARLOS	63151922	05/11/2002
11	MARIÑOS	RUIZ	AGUSTÍN	48739396	21/05/1996
12	CASTILLO	VASQUEZ	JUAN	80470817	30/03/1978
13	FLORES	VASQUEZ	ADRIANA	48220937	06/03/1994
14	CHACON	ARAUJO	KALIN	71647271	23/06/1999
15	PAITAN	CALDERON	EDGAR	42322993	25/02/1983

3.2.6 RELACIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS.

Se utiliza la misma cantidad de equipos en cada uno de los tramos:

- 01 excavadora
- 01 motoniveladora
- 01 rodillo liso vibratorio
- 01 cisterna para agua
- 04 camión volquete
- 01 camioneta Pick Up



Quipuzcoa Alayo
ING CIVIL
R. CIP. 110887


ALEX XAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547





CONSORCIO VIAL CALIFORNIA



3.2.7 SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIA SANITARIA.

Se viene realizando todos los trabajos respetando todos los parámetros de Emergencia Sanitaria COVID-19 según plan de trabajo.

4. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO (% AVANCE MENSUAL)

Se presenta el cuadro resumen de informe mensual de valorización N°03

HOJA DE CANCELACION

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Proyecto	"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"	
Cliente	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO	
Ubicación	SANTA CRUZ DE CHUCA	
Contratista	CONSORCIO VIAL CALIFORNIA	
Inspector	ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547	
Residente	ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887	
MONTO REFERENCIAL		1,724,876.17
MONTO CONTRATADO		1,724,000.00
MONTO CONTRATADO MANTENIMIENTO PERIODICO		1,430,920.00
MONTO CONTRATADO MANTENIMIENTO RUTINARIO		258,600.00
ITEM	DESCRIPCION	MONTO VALORIZADO
01	TRAMO CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA	163,769.75
02	TRAMO EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA	114,634.99
1.00.00	COSTO DIRECTO	S/. 278,404.74
	GASTOS GENERALES 10%	S/. 27,840.47
	UTILIDAD 5%	S/. 13,920.24
2.00.00	SUBTOTAL	S/. 320,165.45
	REAJUSTES	0.00
3.00.00	SUBTOTAL CON REAJUSTES	S/. 320,165.45
	AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO 10%	S/. 0.00
	AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES 20%	S/. 0.00
4.00.00	SUBTOTAL CON AMORTIZACIONES	S/. 320,165.45
5.00.00	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)	S/. 57,629.78
6.00.00	TOTAL NETO A RECIBIR	S/. 377,795.23
Porcentaje de avance ejecutado en el mes (%)		26.40%

5. CONCLUSIONES

- El informe mensual de Valorización N°03, obedece a los trabajos realizados desde el 01 de noviembre del 2020 al 30 de noviembre del 2020, dichos trabajos aprobados por el inspector designado por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.
- El porcentaje de avance físico en el SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM", -"CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906

ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
CIP N° 126547

Quelvin J. Qupuzcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887





CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA




KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD. el informe mensual de Valorización N°03 es del **26.40.%** del ejecutado real mensual contra el **33.43%** ejecutado programado mensual, y un **57.41 %** ejecutado acumulado real contra el **71.64%** ejecutado acumulado programado; estando el estado del Servicio atrasado en un **80.14%**.

- El monto correspondiente al informe Mensual de Valorización N°03 es de **S/. 377,795.23** (trescientos setenta y siete y setecientos noventa y cinco con 23/100 soles).
- Recomendamos a la entidad contratante la Municipalidad Provincial de Provincial de Santiago De Chuco, revisar, aprobar y tramitar el informe mensual de Valorización N°03 correspondiente al mes de Noviembre del 2020.



Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887


ALEX JAVIER DIAZ LEÓN
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547





CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA



- RESUMEN DE
VALORIZACION
MENSUAL.



RESUMEN DE VALORIZACION N° 03

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Obra : "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM", -
"CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

Ubicación : SANTA CRUZ DE CHUCA

Contratista : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA


Inspector : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547

Residente : ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

PRESUPUESTADO		VALORIZADO ANTERIOR		VALORIZADO DEL MES		ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
Item	Descripción	MONTO CONTRATADO	EJECUTADO ANT. ACUM.	%	EJECUTADO EN EL MES	%	EJECUTADO ACT. ACUM	%	Parcial EJECUCION
1.00	TRAMO CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA	S/. 828,842.30	S/. 257,364.12		S/. 163,768.75		S/. 421,133.87		S/. 407,708.43
2.00	TRAMO EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA	S/. 225,630.80	S/. 69,608.30		S/. 114,634.99		S/. 184,243.29		S/. 41,387.51
	SUB TOTALES COSTO DIRECTO	1,054,473.10	326,972.42		278,404.74		605,377.16		449,095.94
	GASTOS GENERALES (10%)	105,447.31	32,697.24		27,840.47		60,537.71		44,909.60
	UTILIDAD (5%)	52,723.66	16,348.62		13,920.24		30,268.86		22,454.80
	SUB TOTAL	S/. 1,212,644.07	S/. 376,018.28		S/. 320,165.45		S/. 696,183.73		S/. 516,460.34
	I.G.V. (18 %)	218,275.93	67,683.29		57,629.78		125,313.07		92,962.86
	TOTAL	S/. 1,430,920.00	S/. 443,701.57	31.01%	S/. 377,795.23	26.40%	S/. 821,496.80	57.41%	S/. 609,423.20
									42.59%

Quelvin QuiPUZCOA Alayo
ING CIVIL
R. CIP. 110887

ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547



- CONTROL Y
SUSTENTO DE
METRADOS Y
ACTIVIDADES
EJECUTADAS.



CONTROL Y SUSTENTO DE METRADOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS

256

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Proyecto : "SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : TRAMO CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA
Contratista : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
Inspector : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547
Residente : ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

Monto Contratado S/. 1,724,000.00
Plazo de ejecución 120 días calendario

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATADO	CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS				% EJECUTADO
				ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR EJECUTAR	
1.00	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	0.50	0.00	0.50	0.50	50.00%
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	15.91	14.00	1.91	15.91	0.00	100.00%
2.00	PAVIMENTOS							
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	3,976.50	1,800.00	751.50	2,551.50	1,425.00	64.16%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	11,929.50	3,400.00	2,254.50	5,654.50	6,275.00	47.40%
3.00	TRANSPORTE							
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	12,289.50	3,500.00	2,325.23	5,825.23	6,464.28	47.40%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	116,188.51	32,000.00	32,001.85	64,001.85	52,186.66	55.08%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	7,723.00	2,200.00	1,550.15	3,750.15	3,972.85	48.56%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	55,845.33	15,900.00	17,190.13	33,090.13	22,755.20	59.25%
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE							
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	15,906.00	7,200.00	3,906.00	11,106.00	4,800.00	69.82%
5.00	SEÑALIZACION							
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00%
05.02.	SENALES PREVENTIVAS	und	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00%
05.03.	SENALES REGLAMENTARIAS	und	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00%
05.04.	SENALES INFORMATIVAS	und	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00%
6.00	IMPACTO AMBIENTAL							
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%
7.00	EMERGENCIA SANITARIA							
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	0.50	0.25	0.75	0.25	75.00%

CONTROL Y SUSTENTO DE METRADOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Servicio : "SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : TRAMO EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA
Contratista : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
Inspector : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547
Residente : ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

Monto Contratado S/. 1,724,000.00
Plazo de ejecución 120 días calendario

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATADO	CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS				% EJECUTADO
				ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR EJECUTAR	
1.00	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	0.50	0.00	0.50	0.50	50.00%
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	4.33	2.00	2.33	4.33	0.00	100.00%
2.00	PAVIMENTOS							
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	1,075.00	350.00	725.00	1,075.00	0.00	100.00%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	3,247.50	800.00	2,447.50	3,247.50	0.00	100.00%
3.00	TRANSPORTE							
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	3,360.00	830.00	2,530.00	3,360.00	0.00	100.00%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	12,344.55	3,000.00	9,344.55	12,344.55	0.00	100.00%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	1,935.00	480.00	1,455.00	1,935.00	0.00	100.00%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	2,838.83	690.00	2,148.83	2,838.83	0.00	100.00%
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE							
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	4,330.00	1,500.00	2,830.00	4,330.00	0.00	100.00%
5.00	SEÑALIZACION							
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00%
05.02.	SENALES PREVENTIVAS	und	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00%
05.03.	SENALES REGLAMENTARIAS	und	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%
05.04.	SENALES INFORMATIVAS	und	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%
6.00	IMPACTO AMBIENTAL							
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00%
7.00	EMERGENCIA SANITARIA							
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	0.50	0.25	0.75	0.25	75.00%

Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887

ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

SUSTENTO DE METRADOS

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Proyecto : "SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA
PARTE ALTA LONG.=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUVA
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : TRAMO CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA
Contratista : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
Inspector : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547
Residente : ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

Monto Contratado
Plazo de ejecución

S/. 1,724,000.00
120 días calendario

1.00 OBRAS PROVISIONALES
01.02. TRAZO Y REPLANTEO

Descripción		Longitud	Parcial
Inicio	Fin	(km)	(km)
14.00	15.91	1.91	1.91
TOTAL			1.91

02 PAVIMENTOS
02.01. CAPA NIVELANTE E=0.05 M

M3

Progresiva		Longitud	Ancho	Espesor	Area	Volumen
Inicio	Fin	(m)	(m)	(m)	(m2)	(m3)
12+900	13+000	100.00	5.00	0.05	500.00	25.00
13+000	14+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
14+000	15+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
15+000	15+906	906.00	5.00	0.05	4,530.00	226.50
TOTAL						751.50

02.02. MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M

M3

Progresiva		Longitud	Ancho	Espesor	Area	Volumen
Inicio	Fin	(m)	(m)	(m)	(m2)	(m3)
12+900	13+000	100.00	5.00	0.15	500.00	75.00
13+000	14+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
14+000	15+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
15+000	15+906	906.00	5.00	0.15	4,530.00	679.50
TOTAL						2,254.50

03 TRANSPORTE
03.01. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM
03.02. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM

Progresiva		CANTERA	CANTERA	DISTANCIA	Longitud	Ancho	Area	Plazoletas 3%	ESPESOR	VOLUMEN	D<=1km	D>1km
Inicio	Fin	UBICACION (km)	ACCESO (km)	(KM)	(m)	(m)	(m2)	(m2)	(m)	(m3)		
12.90	13.00	0.00	0.36	13.31	100.00	5.00	500.00	15.00	0.15	77.25	77.25	950.72
13.00	14.00	0.00	0.36	13.86	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	9,932.03
14.00	15.00	0.00	0.36	14.86	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	10,705.31
15.00	15.91	0.00	0.36	15.81	910.00	5.00	4,550.00	136.50	0.15	702.98	702.98	10,413.80
TOTAL											2,325.23	32,001.85

03.03. TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM
03.04. TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM

Progresiva		DME	DME	DISTANCIA	Longitud	Ancho	Area	Plazoletas 3%	ESPESOR	VOLUMEN	D<=1km	D>1km
Inicio	Fin	UBICACION (km)	ACCESO (km)	(KM)	(m)	(m)	(m2)	(m2)	(m)	(m3)		
12.90	13.00	2.32	0.00	10.63	100.00	5.00	500.00	15.00	0.10	51.50	51.50	496.15
13.00	14.00	2.32	0.00	11.19	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.10	515.00	515.00	5,245.28
14.00	15.00	2.32	0.00	12.18	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.10	515.00	515.00	5,759.76
15.00	15.91	2.32	0.00	13.14	910.00	5.00	4,550.00	136.50	0.10	468.65	468.65	5,688.94
TOTAL											1,550.15	17,190.13

4.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
04.01. RECONFORMACION DE CUNETAS

Progresiva		Longitud	Parcial
Inicio	Fin	(m)	(m)
12+000	13+000	1,000.00	1,000.00
13+000	14+000	1,000.00	1,000.00
14+000	15+000	1,000.00	1,000.00
15+000	15+906	906.00	906.00
TOTAL			3,906.00

Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887

ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

SUSTENTO DE METRADOS

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Servicio "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM", - "CALIFORNIA-LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : TRAMO EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA
Contratista : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
Inspector : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547
Residente : ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

Monto Contratado
Plazo de ejecución

S/. 1,724,000.00
120 días calendario

1.00 OBRAS PROVISIONALES
01.02. TRAZO Y REPLANTEO

Descripción		Longitud	Parcial
Inicio	Fin	(km)	(km)
0.00	1.00	1.00	1.00
1.00	2.00	1.00	1.00
2.00	2.33	0.33	0.33
TOTAL			2.33

02 PAVIMENTOS
02.01. CAPA NIVELANTE E=0.05 M

M3

Progresiva		Longitud	Ancho	Espesor	Area	Volumen
Inicio	Fin	(m)	(m)	(m)	(m2)	(m3)
0+000	1+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
1+000	2+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
2+000	2+900	900.00	5.00	0.05	4,500.00	225.00
TOTAL						725.00

02.02. MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M

M3

Progresiva		Longitud	Ancho	Espesor	Area	Volumen
Inicio	Fin	(m)	(m)	(m)	(m2)	(m3)
0+000	1+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	747.50
1+000	2+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	747.50
2+000	3+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	747.50
3+000	3+277	276.67	5.00	0.15	1,383.35	205.00
TOTAL						2,447.50

03 TRANSPORTE

03.01. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM
03.02. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM

Progresiva		CANTERA	CANTERA	DISTANCIA	Longitud	Ancho	Area	Plazoletas 3%	ESPESOR	VOLUMEN	D<=1km	D>1km
Inicio	Fin	UBICACION (km)	ACCESO (km)	(KM)	(m)	(m)	(m2)	(m2)	(m)	(m3)		
0.00	1.00	0.00	3.06	3.56	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	1,974.58
1.00	2.00	0.00	3.06	4.56	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	2,746.93
2.00	3.00	0.00	3.06	5.56	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	3,519.43
3.00	3.28	0.00	3.06	6.19	275.08	5.00	1,375.40	41.26	0.15	212.50	212.50	1,103.60
TOTAL											2,530.00	9,344.55

03.03. TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM
03.04. TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM



Progresiva		CANTERA	CANTERA	DISTANCIA	Longitud	Ancho	Area	Plazoletas 3%	ESPESOR	VOLUMEN	D<=1km	D>1km
Inicio	Fin	UBICACION (km)	ACCESO (km)	(KM)	(m)	(m)	(m2)	(m2)	(m)	(m3)		
2.42	3.00	1.50	0.62	1.83	583.50	5.00	2,917.50	87.53	0.15	450.75	450.75	372.89
3.00	4.00	1.50	0.62	2.62	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	1,250.68
4.00	4.30	1.50	0.62	3.27	300.00	5.00	1,500.00	45.00	0.15	231.75	231.75	525.27
TOTAL											1,455.00	2,148.83

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
RECONFORMACION DE CUNETAS

Progresiva		Longitud	Parcial
Inicio	Fin	(m)	(m)
0+000	1+000	1,000.00	1,000.00
1+000	2+000	1,000.00	1,000.00
2+000	2+830	830.00	830.00
TOTAL			2,830.00

Quelvin J. Quipuzco Alayo
ING CIVIL
R. CIP. 110887

ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547



- ANALISIS DE
VALORIZACION
MENSUAL.



ANALISIS DE VALORIZACION MENSUAL N° 03

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Proyecto: "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : TRAMO EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA
Contralista: CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
Inspector: ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547
Residente: ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

Monto Contratado: S/. 1,724,000.00
Plazo de ejecución: 120 días calendario

DESAGREGADO DE PARTIDAS																		
Descripción																		
PRESUPUESTO GENERAL																		
PRECIO SI.																		
METRADO																		
PARCIAL SI.																		
AVANCE ACUMULADO ANTERIOR																		
AVANCE ACTUAL																		
AVANCE ACUMULADO ACTUAL																		
SALDO POR VALORIZAR																		

Quelvin QuiPUZCOA Alayo
ING CIVIL
R. CIP. 110887

ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

ANALISIS DE VALORIZACION MENSUAL N° 03

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Proyecto: "SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG=4.330KM" - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : TRAMO CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA
Contratista: CONSORCIO VIAL CALIFORNIA

Inspector: ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547

Residente: ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

Monto Contratado: S/. 1,724,000.00
Plazo de ejecución: 120 días calendario

DESAGREGADO DE PARTIDAS																					
Descripción			PRESUPUESTO GENERAL				AVANCE ACUMULADO ANTERIOR				AVANCE ACTUAL				AVANCE ACUMULADO ACTUAL				SALDO POR VALORIZAR		
		Und	METRADO	PRECIO SI.	PARCIAL SI.	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	
1.00																					
01.01.	OBRAS PROVISIONALES																				
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS		gib	1.00	SI./ 40,220.52	SI./ 40,220.52	0.50	20,110.26	50.00%	0.00	0.00	0.00%	0.50	20,110.26	50.00%	0.50	20,110.26	50.00%	0.50	20,110.26	50.00%
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO		km	15.91	SI./ 998.09	SI./ 15,879.61	14.00	13,973.26	87.99%	1.91	1,906.35	12.01%	15.91	15,879.61	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.00																					
	PAVIMENTOS																				
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M		m3	3976.50	SI./ 4.62	SI./ 18,371.43	1,800.00	8,316.00	45.27%	751.50	3,471.93	18.90%	2,551.50	11,783.93	64.17%	1,425.00	6,583.50	35.83%	1,425.00	6,583.50	35.83%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M		m3	11929.50	SI./ 32.06	SI./ 382,459.77	3,400.00	109,004.00	28.50%	2,254.50	72,279.27	18.90%	5,654.50	181,283.27	47.40%	6,275.00	201,176.50	52.60%	6,275.00	201,176.50	52.60%
3.00																					
	TRANSPORTE																				
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM		m3k	12289.50	SI./ 4.93	SI./ 60,587.24	3,500.00	17,255.00	28.48%	2,325.23	11,463.36	18.92%	5,825.23	28,718.36	47.40%	6,464.28	31,868.88	52.60%	6,464.28	31,868.88	52.60%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM		m3k	116188.51	SI./ 1.09	SI./ 126,645.48	32,000.00	34,880.00	27.54%	32,001.85	34,882.02	27.54%	64,001.85	69,762.02	55.08%	52,186.66	56,883.46	44.92%	52,186.66	56,883.46	44.92%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM		m3k	7723.00	SI./ 4.93	SI./ 38,074.39	2,200.00	10,846.00	28.49%	1,550.15	7,642.24	20.07%	3,750.15	18,488.24	48.56%	3,972.85	19,586.15	51.44%	3,972.85	19,586.15	51.44%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM		m3k	55845.33	SI./ 1.09	SI./ 60,871.41	15,900.00	17,331.00	28.47%	17,190.13	18,737.24	30.78%	33,090.13	36,068.24	59.25%	22,755.20	24,803.17	40.75%	22,755.20	24,803.17	40.75%
4.00																					
	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE																				
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS		ml	15906.00	SI./ 1.84	SI./ 29,267.04	7,200.00	13,248.00	45.27%	3,906.00	7,187.04	24.56%	11,106.00	20,435.04	69.82%	4,800.00	8,832.00	30.18%	4,800.00	8,832.00	30.18%
5.00																					
	SEÑALIZACION																				
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS		und	16.00	SI./ 315.24	SI./ 5,043.84	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	16.00	5,043.84	100.00%	16.00	5,043.84	100.00%
05.02.	SEÑALES PREVENTIVAS		und	20.00	SI./ 389.22	SI./ 7,784.40	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	20.00	7,784.40	100.00%	20.00	7,784.40	100.00%
05.03.	SENALES REGLAMENTARIAS		und	5.00	SI./ 389.22	SI./ 1,946.10	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.00	1,946.10	100.00%	5.00	1,946.10	100.00%
05.04.	SENALES INFORMATIVAS		und	5.00	SI./ 468.32	SI./ 2,341.60	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.00	2,341.60	100.00%	5.00	2,341.60	100.00%
6.00																					
	IMPACTO AMBIENTAL																				
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS		ha	2.00	SI./ 7,274.14	SI./ 14,548.28	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	14,548.28	100.00%	2.00	14,548.28	100.00%
7.00																					
	EMERGENCIA SANITARIA																				
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19		gib	1.00	SI./ 24,801.19	SI./ 24,801.19	0.50	12,400.60	50.00%	0.25	6,200.30	25.00%	0.75	18,600.90	75.00%	0.25	6,200.30	25.00%	0.25	6,200.30	25.00%
	Costo Directo					828,842.30		257,364.12			163,769.75			421,133.87			407,708.43			407,708.43	
	GASTOS GENERALES (10%) C.D.		10.00%			82,884.23		25,736.41			16,376.97			42,113.38			40,770.85			40,770.85	
	UTILIDAD (5%) C.D.		5.00%			41,442.12		12,868.21			8,188.49			21,056.70			20,385.42			20,385.42	
	SUB TOTAL					953,168.65		295,968.74			188,335.21			484,303.95			468,864.70			468,864.70	
	IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (IGV 18%)		18.00%			171,570.35		53,274.37			33,900.34			87,174.71			84,395.64			84,395.64	
	VALOR REFERENCIAL DE OBRA					1,124,739.00		349,243.11			222,235.55			571,478.66			553,260.34			553,260.34	
	PORCENTAJE AVANCE DE OBRA					100.00%		31.05%			19.76%			50.81%			49.19%			49.19%	

Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887

ANALISIS DE VALORIZACION MENSUAL N° 03

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
 "SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Proyecto:
 Cliente :
 Ubicación :
 Contratista:
 Inspector:
 Residente:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 TRAMO EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA
 CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
 ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547
 ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

Monto Contratado:
 Plazo de ejecución:

S/ 1,724,000.00
 120 días calendario

DESAGREGADO DE PARTIDAS														
		PRESUPUESTO GENERAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR			
		Unid	METRADO	PRECIO SI.	PARCIAL SI.	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%
OBRAS PROVISIONALES														
1.00														
01.01.		glb	1.00	S/ 40,220.52	S/ 40,220.52	0.50	20,110.26	50.00%	0.00	0.00	0.00%	0.50	20,110.26	50.00%
01.02.		km	4.33	S/ 998.09	S/ 4,321.73	2.00	1,996.18	46.19%	2.33	2,325.55	53.81%	4.33	4,321.73	100.00%
PAVIMENTOS														
2.00														
02.01.		m3	1075.00	S/ 4.62	S/ 4,966.50	350.00	1,617.00	32.56%	725.00	3,349.50	67.44%	1,075.00	4,966.50	100.00%
02.02.		m3	3247.50	S/ 32.06	S/ 104,114.85	800.00	25,648.00	24.63%	2,447.50	78,466.85	75.37%	3,247.50	104,114.85	100.00%
TRANSPORTE														
3.00														
03.01.		m3k	3360.00	S/ 3.29	S/ 11,054.40	830.00	2,730.70	24.70%	2,530.00	8,323.70	75.30%	3,360.00	11,054.40	100.00%
03.02.		m3k	12344.55	S/ 0.64	S/ 7,900.51	3,000.00	1,920.00	24.30%	9,344.55	5,980.51	75.70%	12,344.55	7,900.51	100.00%
03.03.		m3k	1935.00	S/ 2.81	S/ 5,437.35	480.00	1,348.80	24.81%	1,455.00	4,088.35	75.19%	1,935.00	5,437.35	100.00%
03.04.		m3k	2838.83	S/ 0.64	S/ 1,816.85	690.00	441.60	24.31%	2,148.83	1,375.25	75.69%	2,838.83	1,816.85	100.00%
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE														
4.00														
04.01.		ml	4330.00	S/ 1.84	S/ 7,967.20	1,500.00	2,760.00	34.64%	2,830.00	5,207.20	65.36%	4,330.00	7,967.20	100.00%
RECONFORMACION DE CUNETAS														
5.00														
05.01.		und	5.00	S/ 315.24	S/ 1,576.20	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
05.02.		und	4.00	S/ 389.22	S/ 1,556.88	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
05.03.		und	2.00	S/ 389.22	S/ 778.44	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
05.04.		und	2.00	S/ 468.32	S/ 936.64	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
IMPACTO AMBIENTAL														
6.00														
06.01.		ha	1.50	S/ 7,274.14	S/ 10,911.21	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS														
7.00														
07.01.		glb	1.00	S/ 22,071.52	S/ 22,071.52	0.50	11,035.76	50.00%	0.25	5,517.88	25.00%	0.75	16,553.64	75.00%
EMERGENCIA SANITARIA COVID 19														
Costo Directo														
GASTOS GENERALES (10%) C.D.														
UTILIDAD (5%) C.D.														
SUB TOTAL														
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (IGV 18%)														
VALOR REFERENCIAL DE OBRA														
PORCENTAJE AVANCE DE OBRA														

ANALISIS DE VALORIZACION MENSUAL N° 03

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Proyecto: "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"


Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : TRAMO CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA
Contratista: CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
Inspector: ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547
Residente: ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

Monto Contratado: S/. 1,724,000.00
Plazo de ejecución: 120 días calendario


DESAGREGADO DE PARTIDAS		PRESUPUESTO GENERAL				AVANCE ACUMULADO ANTERIOR				AVANCE ACTUAL				AVANCE ACUMULADO ACTUAL				SALDO POR VALORIZAR			
		Und	METRADO	PRECIO SI.	PARCIAL SI.	METRADO	VALORIZADO	%		METRADO	VALORIZADO	%		METRADO	VALORIZADO	%		METRADO	VALORIZADO	%	
1.00	OBRAS PROVISIONALES																				
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	gib	1.00	S/. 40,220.52	S/. 40,220.52	0.50	20,110.26	50.00%		0.00	0.00	0.00%		0.50	20,110.26	50.00%		0.50	20,110.26	50.00%	
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	15.91	S/. 998.09	S/. 15,879.61	14.00	13,973.26	87.99%		1.91	1,906.35	12.01%		15.91	15,879.61	100.00%		0.00	0.00	0.00%	
2.00	PAVIMENTOS																				
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	3976.50	S/. 4.62	S/. 18,371.43	1,800.00	8,316.00	45.27%		751.50	3,471.93	18.90%		2,551.50	11,787.93	64.17%		1,425.00	6,583.50	35.83%	
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	11929.50	S/. 32.06	S/. 382,459.77	3,400.00	109,004.00	28.50%		2,254.50	72,279.27	18.90%		5,654.50	181,283.27	47.40%		6,275.00	201,176.50	52.60%	
3.00	TRANSPORTE																				
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	12289.50	S/. 4.93	S/. 60,587.24	3,500.00	17,255.00	28.48%		2,325.23	11,463.36	18.92%		5,825.23	28,718.36	47.40%		6,464.28	31,868.68	52.60%	
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	116188.51	S/. 1.09	S/. 126,645.48	32,000.00	34,880.00	27.54%		32,001.85	34,882.02	27.54%		64,001.85	69,762.02	55.08%		52,186.66	56,883.46	44.92%	
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	7723.00	S/. 4.93	S/. 38,074.39	2,200.00	10,846.00	28.48%		1,590.15	7,642.24	20.07%		3,750.15	18,488.24	48.56%		3,972.85	19,586.15	51.44%	
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	55845.33	S/. 1.09	S/. 60,871.41	15,900.00	17,331.00	28.47%		17,180.13	18,737.24	30.78%		33,090.13	36,068.24	59.25%		22,755.20	24,803.17	40.75%	
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE																				
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	15906.00	S/. 1.84	S/. 29,267.04	7,200.00	13,248.00	45.27%		3,906.00	7,187.04	24.56%		11,106.00	20,435.04	64.17%		4,800.00	8,832.00	35.83%	
5.00	SEÑALIZACION																				
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	16.00	S/. 315.24	S/. 5,043.84	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00%		16.00	5,043.84	100.00%	
05.02.	SENALES PREVENTIVAS	und	20.00	S/. 389.22	S/. 7,784.40	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00%		20.00	7,784.40	100.00%	
05.03.	SENALES REGLAMENTARIAS	und	5.00	S/. 389.22	S/. 1,946.10	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00%		5.00	1,946.10	100.00%	
05.04.	SENALES INFORMATIVAS	und	5.00	S/. 468.32	S/. 2,341.60	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00%		5.00	2,341.60	100.00%	
6.00	IMPACTO AMBIENTAL																				
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	S/. 7,274.14	S/. 14,548.28	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00%		2.00	14,548.28	100.00%	
7.00	EMERGENCIA SANITARIA																				
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gib	1.00	S/. 24,801.19	S/. 24,801.19	0.50	12,400.60	50.00%		0.25	6,200.30	25.00%		0.75	18,600.90	75.00%		0.25	6,200.30	25.00%	
	Costo Directo				828,842.30		257,364.12				163,769.75				421,133.87				407,708.43		
	GASTOS GENERALES (10%) C.D.		10.00%		82,884.23		25,736.41				16,376.97				42,113.38				40,770.85		
	UTILIDAD (5%) C.D.		5.00%		41,442.12		12,868.21				8,188.49				21,056.70				20,385.42		
	SUB TOTAL				953,168.65		295,968.74				188,335.21				484,303.95				468,864.70		
	IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (IGV 18%)		18.00%		171,570.35		53,274.37				33,900.34				87,174.71				84,395.64		
	VALOR REFERENCIAL DE OBRA				1,124,739.00		349,243.11				222,235.55				571,478.66				553,260.34		
	PERCENTAJE AVANCE DE OBRA				100.00%		31.05%				19.76%				50.81%				49.13%		

Quevin J. Quiquiza Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887

ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547



CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA



- HOJA DE
CANCELACION.



HOJA DE CANCELACION

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Proyecto	"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"
Cliente	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación	SANTA CRUZ DE CHUCA
Contratista	CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
Inspector	ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547
Residente	ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

MONTO REFERENCIAL	1,724,876.17
MONTO CONTRATADO	1,724,000.00
MONTO CONTRATADO MANTENIMIENTO PERIODICO	1,430,920.00
MONTO CONTRATADO MANTENIMIENTO RUTINARIO	258,600.00


ITEM	DESCRIPCION	MONTO VALORIZADO
01	TRAMO CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA	163,769.75
02	TRAMO EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA	114,634.99
1.00.00	COSTO DIRECTO	S/. 278,404.74
	GASTOS GENERALES 10%	S/. 27,840.47
	UTILIDAD 5%	S/. 13,920.24
2.00.00	SUBTOTAL	S/. 320,165.45
	REAJUSTES	0.00
3.00.00	SUBTOTAL CON REAJUSTES	S/. 320,165.45
	AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO 10%	S/. 0.00
	AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES 20%	S/. 0.00
4.00.00	SUBTOTAL CON AMORTIZACIONES	S/. 320,165.45
5.00.00	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)	S/. 57,629.78
6.00.00	TOTAL NETO A RECIBIR	S/. 377,795.23
Porcentaje de avance ejecutado en el mes (%)		26.40%


 ALEX JAVIER DIAZ LEON
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 126547


 Quelin J. Quipuzcoa Alayo
 ING. CIVIL
 R. CIP. 110887



CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA



- CUADRO
COMPARATIVO
DE AVANCE DEL
SERVICIO
(PROGRAMADO –
EJECUTADO -
PAGADO).



CUADRO COMPARATIVO DE AVANCE - PROGRAMADO - EJECUTADO - PAGADO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE

Proyecto : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 Cliente : SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"
 Ubicación : TRAMO CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA
 Contratista : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
 Inspector : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547
 Residente : ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

Monto Contratado SI. 1,724,000.00
 Plazo de ejecución 120 días calendarios

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS				
MES	MONTOS (Inc/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL SI.	ACUMUL. SI.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	54,088.52	54,088.52	4.81%	4.81%
31-Oct-20	378,619.73	432,708.25	33.66%	38.47%
30-Nov-20	378,619.73	811,327.98	33.66%	72.13%
31-Dic-20	313,411.02	1,124,739.00	27.87%	100.00%
TOTAL	1,124,739.00		100.00%	

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS				
MES	MONTOS (Inc/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL SI.	ACUMUL. SI.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	54,665.14	54,665.14	4.86%	4.86%
31-Oct-20	294,577.97	349,243.11	26.19%	31.05%
30-Nov-20	222,235.55	571,478.65	19.76%	50.81%
31-Dic-20	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	571,478.65		50.81%	

Quelvin J. Qupuzcoa Alayo
 ING CIVIL
 R. CIP. 110887

Alex J. Diaz Leon
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 126547

CUADRO COMPRATIVO DE AVANCE - PROGRAMADO - EJECUTADO - PAGADO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Proyecto : "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : TRAMO EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA
Contratista : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
Inspector : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547
Residente : ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

Monto Contratado SI/. 1,724,000.00
Plazo de ejecucion 120 dias calendarios

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL SI/.	ACUMUL. SI/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	14,239.78	14,239.78	4.65%	4.65%
31-Oct-20	99,678.44	113,918.22	32.56%	37.21%
30-Nov-20	99,678.44	213,596.66	32.56%	69.77%
31-Dic-20	92,584.34	306,181.00	30.23%	100.00%
TOTAL	306,181.00		100.00%	

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL SI/.	ACUMUL. SI/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	37,486.20	37,486.20	12.24%	12.24%
31-Oct-20	56,972.26	94,458.46	18.61%	30.85%
30-Nov-20	155,559.68	250,018.14	50.81%	81.66%
31-Dic-20	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	250,018.14		81.66%	


Quelvin J. Qupuzcoa Alayo
ING CIVIL
R. CIP. 110887


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

CUADRO COMPARATIVO DE AVANCE PROGRAMADO - EJECUTADO - PAGADO - GENERAL

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA- PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Proyecto :
 Cliente :
 Ubicación :
 Contratista :
 Inspector :
 Residente :

Monto Contratado
 Plazo de ejecución

S/. 1,724,000.00
 120 días calendarios

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS


MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	68,328.30	68,328.30	4.78%	4.78%
31-Oct-20	478,298.17	546,626.47	33.43%	38.21%
30-Nov-20	478,298.17	1,024,924.64	33.43%	71.64%
31-Dic-20	405,995.36	1,430,920.00	28.36%	100.00%
TOTAL	1,430,920.00		100.00%	

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	92,151.34	92,151.34	6.44%	6.44%
31-Oct-20	351,550.23	443,701.57	24.57%	31.01%
30-Nov-20	377,795.23	821,496.80	26.40%	57.41%
31-Dic-20	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	821,496.80		57.41%	

Quelvin J. Quiñuzcoa Alayo
 ING. CIVIL
 R. CIP. 110887

ALEX JAVIER DIAZ LEON
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 126547



CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA



- CUADRO DE
BARRAS Y CURVA
S.




CUADRO DE BARRAS Y CURVA S.

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA- PACCHA PARTE ALTA LONG=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Proyecto : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 Cliente : TRAMO CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA
 Ubicación : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
 Contratista : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547
 Inspector :
 Residente : ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

Monto Contratado SI. 1,724,000.00
 Plazo de ejecución 120 días calendario

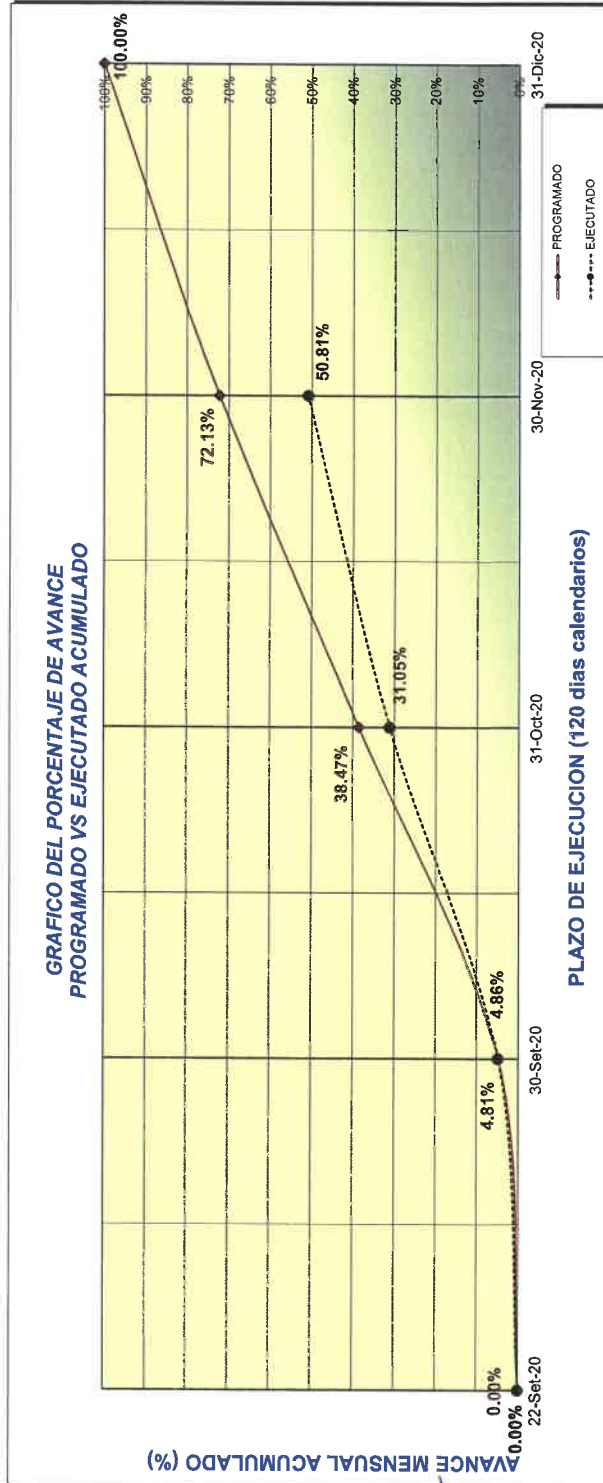

Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
 ING CIVIL
 R. CIP. 110887

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Inc/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	54,088.52	54,088.52	4.81%	4.81%
31-Oct-20	378,619.73	432,708.25	33.66%	38.47%
30-Nov-20	378,619.73	811,327.98	33.66%	72.13%
31-Dic-20	313,411.02	1,124,739.00	27.87%	100.00%
TOTAL	1,124,739.00		100.00%	

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (Inc/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	54,665.14	54,665.14	4.86%	4.86%
31-Oct-20	294,577.97	349,243.11	26.19%	31.05%
30-Nov-20	222,235.55	571,478.65	19.76%	50.81%
31-Dic-20	0.00	0.00	0.00%	50.81%
TOTAL	571,478.65		50.81%	

Alex Javier Diaz Leon
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 126547

CUADRO DE BARRAS Y CURVA S.

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO


TRAMO EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA

CONSORCIO VIAL CALIFORNIA

ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547

ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

Monto Contratado
Plazo de ejecución
SI. 1,724,000.00
120 días calendario

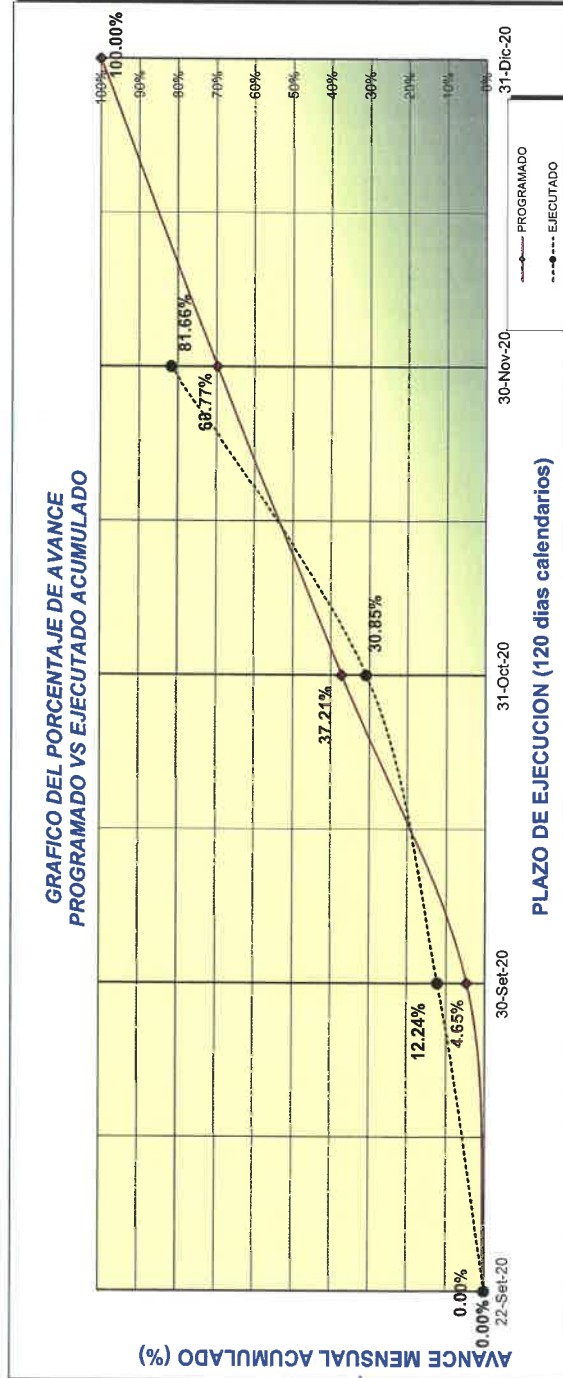

QUELVIN J. QUIPUZCOA ALAYO
ING. CIVIL
R. CIP. 110887

MONITOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONITOS (INC/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
	SI.	SI.	%	%
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	14,239.78	14,239.78	4.65%	4.65%
31-Oct-20	99,678.44	113,918.22	32.56%	37.21%
30-Nov-20	99,678.44	213,596.66	32.56%	69.77%
31-Dic-20	92,584.34	306,181.00	30.23%	100.00%
TOTAL	306,181.00		100.00%	

MONITOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONITOS (INC/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
	SI.	SI.	%	%
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	37,486.20	37,486.20	12.24%	12.24%
31-Oct-20	56,972.26	94,458.46	18.61%	30.85%
30-Nov-20	155,559.68	250,018.14	50.81%	81.66%
31-Dic-20	0.00	0.00	0.00%	81.66%
TOTAL	250,018.14		81.66%	

ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

CUADRO DE BARRAS Y CURVA - GENERAL

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Proyecto :

Cliente :

Ubicación : SANTA CRUZ DE CHUCA

Contratista : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA

Inspector : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547


Residente : ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

Monto Contratado

Plazo de ejecución

S/. 1,724,000.00

120 días calendario

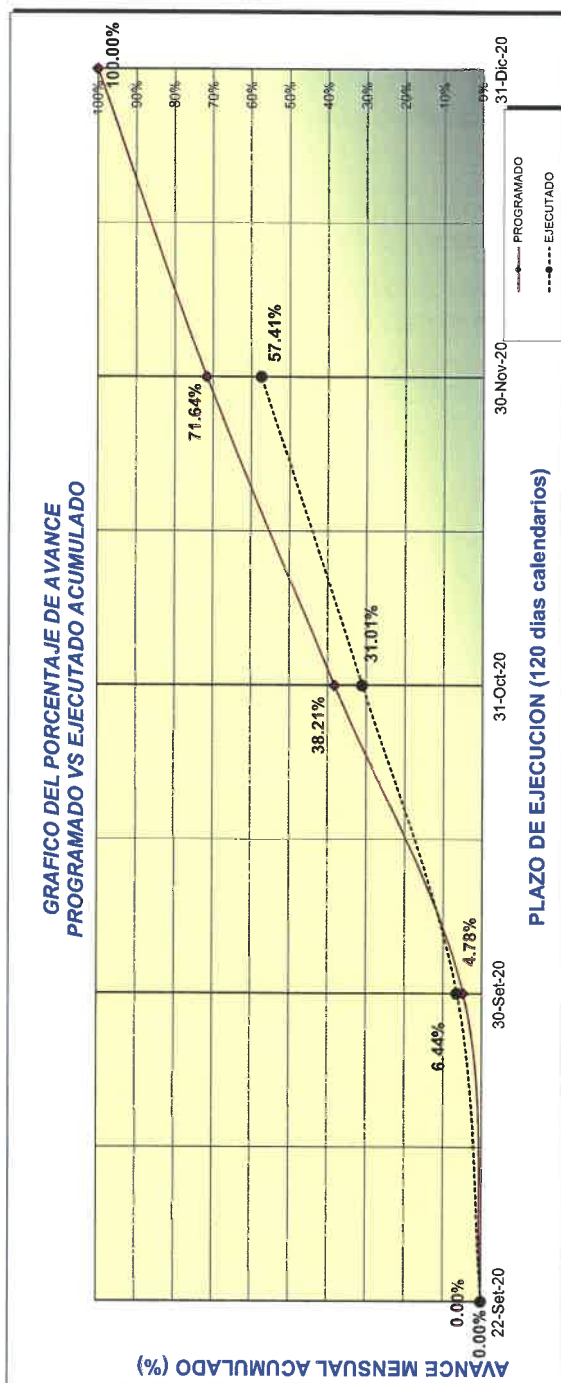

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	68,328.30	68,328.30	4.78%	4.78%
31-Oct-20	478,298.17	546,626.47	33.43%	38.21%
30-Nov-20	478,298.17	1,024,924.64	33.43%	71.64%
31-Dic-20	405,995.36	1,430,920.00	28.36%	100.00%
TOTAL	1,430,920.00		100.00%	

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	92,151.34	92,151.34	6.44%	6.44%
31-Oct-20	351,550.23	443,701.57	24.57%	31.01%
30-Nov-20	377,795.23	821,496.80	26.40%	57.41%
31-Dic-20	0.00	0.00	0.00%	57.41%
TOTAL	821,496.80		57.41%	

Quelvin J. Qupuzcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887

ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547



CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA



- CRONOGRAMA
DE AVANCE DEL
SERVICIO
PROGRAMADO.



Proyecto

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG =4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM". - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente :

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

Ubicación :

TRAMO CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA

Contratista :

CONSORCIO VIAL CALIFORNIA

Inspector :

ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547

Residente :

ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

Monto Contratado

S/. 1,724,000.00

Plazo de ejecucion

120 dias calendarios

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO

ITEM	PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04
01	OBRAS PRELIMINARES								
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	glb	1.00	40,220.52	40,220.52	2,011.03	14,077.18	14,077.18	10,055.13
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	15.91	998.09	15,879.61	793.98	5,557.86	5,557.86	3,969.90
02	PAVIMENTOS				0.00				
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	3,976.50	4.62	18,371.43	918.57	6,430.00	6,430.00	4,592.86
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	m3	11,929.50	32.06	382,459.77	19,122.99	133,860.92	133,860.92	95,614.94
03	TRANSPORTE				0.00				
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	12,289.50	4.93	60,587.24	3,029.36	21,205.53	21,205.53	15,146.81
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	116,188.51	1.09	126,645.48	6,332.27	44,325.92	44,325.92	31,661.37
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	7,723.00	4.93	38,074.39	1,903.72	13,326.04	13,326.04	9,518.60
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	55,845.33	1.09	60,871.41	3,043.57	21,304.99	21,304.99	15,217.85
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				0.00				
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	15,906.00	1.84	29,267.04	1,463.35	10,243.46	10,243.46	7,316.76
05	SEÑALIZACION				0.00				
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	16.00	315.24	5,043.84				5,043.84
05.02	SENALES PREVENTIVAS	und	20.00	389.22	7,784.40				7,784.40
05.03	SENALES REGLAMENTARIAS	und	5.00	389.22	1,946.10				1,946.10
05.04	SENALES INFORMATIVAS	und	5.00	468.32	2,341.60				2,341.60
06	IMPACTO AMBIENTAL				0.00				
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	7,274.14	14,548.28				14,548.28
07	EMERGENCIA SANITARIA				0.00				
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	24,801.19	24,801.19	1,240.06	8,680.42	8,680.42	6,200.30
COSTO DIRECTO					S/.828,842.30	S/.39,858.90	S/.279,012.33	S/.279,012.33	S/.230,958.74
COSTO INDIRECTO (10.00%)					S/.82,884.23	S/.3,985.89	S/.27,901.23	S/.27,901.23	S/.23,095.88
UTILIDAD (5%)					S/.41,442.12	S/.1,992.95	S/.13,950.62	S/.13,950.62	S/.11,547.93
SUB TOTAL					S/.953,168.65	S/.45,837.74	S/.320,864.18	S/.320,864.18	S/.265,602.55
IGV (18%)					S/.171,570.36	S/.8,250.78	S/.57,755.55	S/.57,755.55	S/.47,808.47
COSTO TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL					S/.1,124,739.00	S/.54,088.52	S/.378,619.73	S/.378,619.73	S/.313,411.02

AVANCE TOTAL CONTRACTUAL

PROGRAMADO MENSUAL	4.81%	33.66%	33.66%	27.87%
ACUMULADO	4.81%	38.47%	72.13%	100.00%


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547


Quelvin Julio Qupizcoa Alayo
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 110887

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO

Proyecto : "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : TRAMO EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA
Contratista : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
Inspector : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547
Residente : ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

Monto Contratado : S/. 1,724,000.00
Plazo de ejecución : 120 días calendarios


ITEM	PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04
01	OBRAS PRELIMINARES								
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	glb	1.00	40,220.52	40,220.52	2,011.03	14,077.18	14,077.18	10,055.13
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	4.33	998.09	4,321.73	216.09	1,512.61	1,512.61	1,080.43
02	PAVIMENTOS				0.00				
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	1,075.00	4.62	4,966.50	248.33	1,738.28	1,738.28	1,241.63
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	m3	3,247.50	32.06	104,114.85	5,205.74	36,440.20	36,440.20	26,028.71
03	TRANSPORTE				0.00				
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	3,360.00	3.29	11,054.40	552.72	3,869.04	3,869.04	2,763.60
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	12,344.55	0.64	7,900.51	395.03	2,765.18	2,765.18	1,975.13
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	1,935.00	2.81	5,437.35	271.87	1,903.07	1,903.07	1,359.34
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	2,838.83	0.64	1,816.85	90.84	635.90	635.90	454.21
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				0.00				
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	4,330.00	1.84	7,967.20	398.36	2,788.52	2,788.52	1,991.80
05	SEÑALIZACION				0.00				
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	5.00	315.24	1,576.20				1,576.20
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	4.00	389.22	1,556.88				1,556.88
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	2.00	389.22	778.44				778.44
05.04	SEÑALES INFORMATIVAS	und	2.00	468.32	936.64				936.64
06	IMPACTO AMBIENTAL				0.00				
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	1.50	7,274.14	10,911.21				10,911.21
07	EMERGENCIA SANITARIA				0.00				
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	22,071.52	22,071.52	1,103.58	7,725.03	7,725.03	5,517.88
COSTO DIRECTO					S/.225,630.80	S/.10,493.57	S/.73,455.00	S/.73,455.00	S/.68,227.23
COSTO INDIRECTO (10.00%)					S/.22,563.08	S/.1,049.36	S/.7,345.50	S/.7,345.50	S/.6,822.72
UTILIDAD (5%)					S/.11,281.54	S/.524.68	S/.3,672.75	S/.3,672.75	S/.3,411.36
SUB TOTAL					S/.259,475.42	S/.12,067.61	S/.84,473.25	S/.84,473.25	S/.78,461.31
IGV (18%)					S/.46,705.58	S/.2,172.17	S/.15,205.19	S/.15,205.19	S/.14,123.03
COSTO TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL					S/.306,181.00	S/.14,239.78	S/.99,678.44	S/.99,678.44	S/.92,584.34

AVANCE TOTAL CONTRACTUAL

PROGRAMADO MENSUAL	4.65%	32.56%	32.56%	30.24%
ACUMULADO	4.65%	37.21%	69.77%	100.00%

ALEX JAVIER DIAZ LEON
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 126547

QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO
 R. CIP. 110887



CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA



- PANEL
FOTOGRAFICO.





CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA



PANEL FOTOGRAFICO

TRAMO "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA
LONG= 15.906 KM"

Foto N° 01: Se Observan las charlas de seguridad por parte del residente de obra



Fuente:Propia

Foto N° 02: Se observan trabajos de compactacion de material granular e=0.20 m en el KM



Fuente:Propia

[Signature]
Guarín J. Guipuzcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887

[Signature]
ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547



CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA



Foto N° 03: Se observan trabajos de compactacion de material granular e=0.20 m en KM



Fuente: Propia

Foto N° 04: Se observan trabajos de transporte y descarga de material granular hasta 1 km



Fuente: Propia

Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887


Alex Javier Diaz Leon
ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547



CONSORCIO VIAL CALIFORNIA



Foto N° 05: Se observan el acopio en cantera de material granular hasta 1km

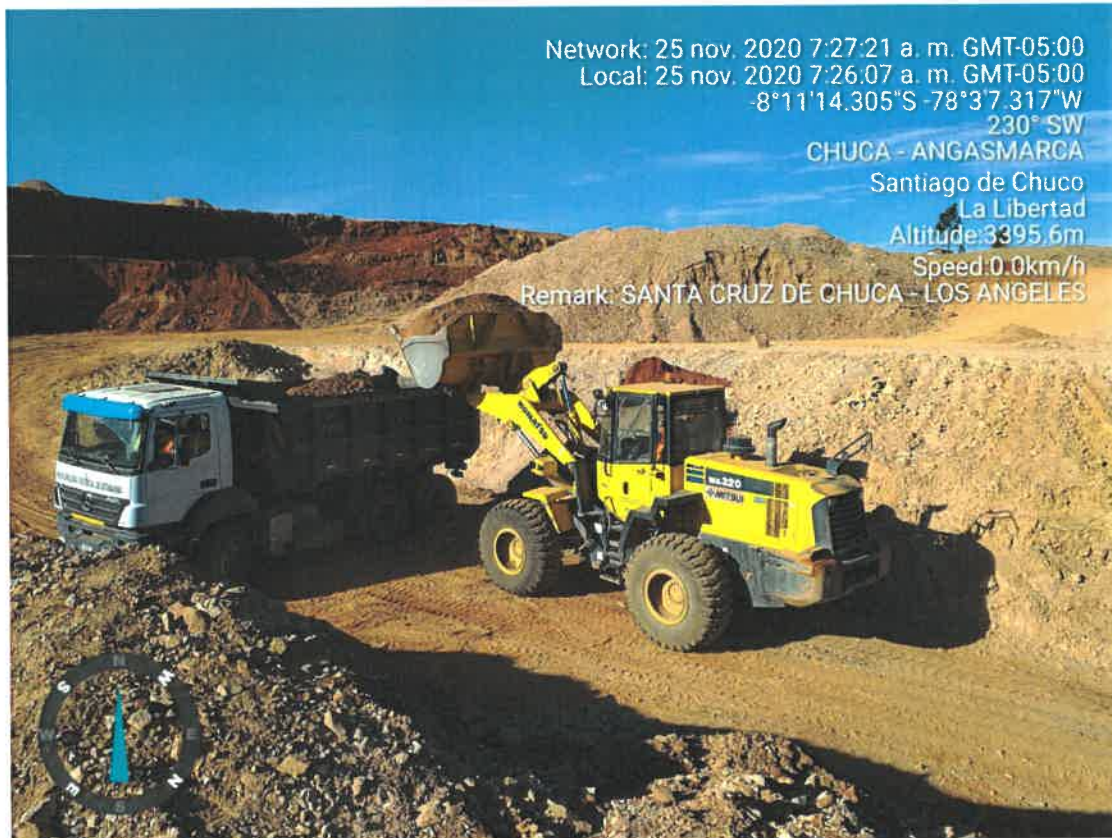

Fuente: Propia


Foto N° 06: Se observa la cantera para los tramos "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM"




Fuente: Propia

[Signature]
 Ing. J. Quipuzcoa Alayo
 ING. CIVIL
 R. CIP. 110887

[Signature]
 ALEX JAVIER DIAZ LEON
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 126547



CONSORCIO VIAL CALIFORNIA



TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM" 231

Foto N° 07: Se observa la reconformación de cuentas en el KM 1+000



Fuente:Propia


Foto N° 08: Se observan trabajos de compactacion de material granular e=0.20 m en KM 3+000



Fuente:Propia


Kelvin J. Quipuzcoa Alayo
ING CIVIL
R. CIP. 110887


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547



CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA



230

Foto N° 09: Se observa la reconfiguración de cuentas en el KM 2+000 – 3+000



Fuente: Propia

Foto N° 10: Se observa el acopio y traslado de material granular hasta y mayor a 1km



Fuente: Propia

[Signature]
ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547



CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA



229

- ACTA DE
ENTREGA DE
TERRENO.



“ACTA DE ENTREGA DE TERRENO”

Servicio

MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA LONG= 4.330 KM” Y “CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO TIERRA NEGRA LONG= 16.906”, DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Tramo

“CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO TIERRA NEGRA” LONG = 16.906 KM

Provincia

SANTIAGO DE CHUCO

Distrito

SANTA CRUZ DE CHUCA

Entidad Contratante

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)

Empresa Ejecutora

CONSORCIO VIAL CALIFORNIA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.)

N.º de Contrato

CONTRATO DE SERVICIO N.º 016-2020-MPSCH-LOG

Fecha de Contrato

28/08/2020

Modalidad

SUMA ALZADA

Monto Presupuestado

S/. 1,355,795.63 soles Inc. (I.G.V.)

Monto Contractual

S/. 1,355,107.00 soles Inc. (I.G.V.)

Inspector de Servicio

Ing. ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN

Plazo de Ejecución

PLAN DE TRABAJO: 20 D.C.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C.

MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C.

INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C.

TOTAL: 505 DÍAS CALENDARIOS (sujeto a fecha de contrato)

Fecha de Culminación

31/12/2021

En el caserío de Villa Cruz de Algallma, distrito de Santa Cruz de Chuca, provincia de Santiago de Chucuito – La libertad, siendo las 10:00 p.m. del 29 de agosto del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chucuito (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza con CIP. N° 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N° 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N° 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Ing. Alex Javier Díaz León con CIP N° 126547 y por último, por parte del Contratista el Ing. Quelvin Julio Quipuzcoa Alayo con CIP N° 110887 como Residente de servicio y el Sr. Edgar Gómez Domínguez con DNI N° 44944779, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL CALIFORNIA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.). A fin de realizar la ENTREGA DE TERRENO del tramo: “CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO TIERRA NEGRA” con una longitud de 16.906 km.

Este acto protocolar tiene por finalidad hacer la entrega de la ruta mencionada en todo su recorrido físico para la recolección de información necesaria y de esta manera hacer la elaboración del PLAN DE TRABAJO de la ruta, que es parte de la FASE I del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y formatos (anexos) estipulados en los Términos de Referencia del D.U. N° 070-2020 presentados para la contratación.


Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. PE-3N –

VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA LONG= 4.330 KM” Y “CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO TIERRA NEGRA LONG= 16.906”, DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Siendo las 10:30 p.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para dar inicio a la elaboración del Plan de Trabajo y continuar con los procedimientos posteriores para dar inicio a la FASE II y III (mantenimiento periódico y rutinario) del servicio. Del mismo día, se da por concluida el acto de **ENTREGA DE TERRENO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.

AREA USUARIA


Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 190782


Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 218511

AREA RESPONSABLE


Ing. David Iván Silva Torres
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
CIP N° 63635
Ing. David Iván Silva Torres
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH
CIP N° 63635

EMPRESA EJECUTORA


Ing. Quiruván Quipuzcoa Alayo
Residente de Servicio
CIP N° 110887


CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ
DNI N° 44944779
REPRESENTANTE COMÚN
Sr. Edgar Gómez Domínguez
Representante Común de CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
DNI N° 44944779

INSPECTOR


ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN
INGENIERO CIVIL
Ing. Alex Javier Díaz León
Inspector del Servicio
CIP N° 126547


Gabriel Quiruván Quipuzcoa
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 192701

“ACTA DE ENTREGA DE TERRENO”

Servicio

MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA LONG= 4.330 KM” Y “CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO TIERRA NEGRA LONG= 16.906”, DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Tramo

“EMP. PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA”
LONG = 4.330 KM

Provincia

SANTIAGO DE CHUCO

Distrito

SANTA CRUZ DE CHUCA

Entidad Contratante

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)
CONSORCIO VIAL CALIFORNIA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. +
CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.)

Empresa Ejecutora

N.º de Contrato

CONTRATO DE SERVICIO N.º 016-2020-MPSCH-LOG

Fecha de Contrato

28/08/2020

Modalidad

SUMA ALZADA

Monto Presupuestado

S/. 369,080.54 soles Inc. (I.G.V.)

Monto Contractual

S/. 368,893.00 soles Inc. (I.G.V.)

Inspector de Servicio

Ing. ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN

Plazo de Ejecución

PLAN DE TRABAJO: 20 D.C.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C.

MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C.

INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C.

TOTAL: 505 DÍAS CALENDARIOS (sujeto a fecha de contrato)

Fecha de Culminación

31/12/2021

En el caserío de Villa Cruz de Algallama, distrito de Santa Cruz de Chuca, provincia de Santiago de Chuco – La libertad, siendo las 10:00 p.m. del 29 de agosto del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza con CIP. N° 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N° 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N° 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Ing. Alex Javier Díaz León con CIP N° 126547 y por último, por parte del Contratista el Ing. Quelvin Julio Quipuzcoa Alayo con CIP N° 110887 como Residente de servicio y el Sr. Edgar Gómez Domínguez con DNI N° 44944779, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL CALIFORNIA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.). A fin de realizar la ENTREGA DE TERRENO del tramo: “EMP. PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA” con una longitud de 4.330 km.

Este acto protocolar tiene por finalidad hacer la entrega de la ruta mencionada en todo su recorrido físico para la recolección de información necesaria y de esta manera hacer la elaboración del PLAN DE TRABAJO de la ruta, que es parte de la FASE I del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y formatos (anexos) estipulados en los Términos de Referencia del D.U. N° 070-2020 presentados para la contratación.

Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. PE-3N –


VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA LONG= 4.330 KM” Y “CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO TIERRA NEGRA LONG= 16.906”, DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Siendo las 10:30 p.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para dar inicio a la elaboración del Plan de Trabajo y continuar con los procedimientos posteriores para dar inicio a la FASE II y III (mantenimiento periódico y rutinario) del servicio. Del mismo día, se da por concluida el acto de **ENTREGA DE TERRENO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.

AREA USUARIA


INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 190782


INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO


Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 218511

AREA RESPONSABLE


MUNICIPIO PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. David Iván Silva Torres
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
CIP N° 63635

Ing. David Iván Silva Torres
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH
CIP N° 63635


EMPRESA EJECUTORA



Ing. Quelpuzcoa Alayo
Residente de Servicio
CIP N° 110887


CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ
DNI N° 44944779
REPRESENTANTE COMÚN
Sr. Edgar Gómez Domínguez
Representante Común de CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
DNI N° 44944779


INSPECTOR


ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN
INGENIERO CIVIL
Ing. Alex Javier Díaz León
Inspector del Servicio
CIP N° 126547


Gabriel Cruz Pardo Cuccio
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 132701



CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA



224

- ACTA DE INICIO
DE SERVICIO.



“ACTA DE INICIO DE SERVICIO”

MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA LONG= 4.330 KM” Y “CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO TIERRA NEGRA LONG= 16.906”, DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

“CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO TIERRA NEGRA” LONG = 16.906 KM

SANTIAGO DE CHUCO

SANTA CRUZ DE CHUCA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)

CONSORCIO VIAL CALIFORNIA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.)

CONTRATO DE SERVICIO N.º 016-2020-MPSCH-LOG

28/08/2020

SUMA ALZADA

S/. 1,355,795.63 soles Inc. (I.G.V.)

S/. 1,355,107.00 soles Inc. (I.G.V.)

Ing. ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN

RESOLUCIÓN GERENCIAL N.º 150-2020-MPSCH/GM

21/09/2020

22/09/2020

MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C. (sujeto a fecha de contrato)

MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C.

INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C.

31/12/2021

Servicio

Tramo

Provincia

Distrito

Entidad Contratante

Empresa Ejecutora

N.º de Contrato

Fecha de Contrato

Modalidad

Monto Presupuestado

Monto Contractual

Inspector de Servicio

Aprobación Plan de Trabajo

Fecha de Aprobación

Fecha de Inicio

Plazo de Ejecución

Fecha de Culminación

CONSORCIO VIAL CALIFORNIA

EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ
DNI N.º 44944779
REPRESENTANTE COMÚN

Quevin J. Quipuzcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. N.º 110887

Nicolás Barrantes Parimango
ING. CIVIL
R. CIP. N.º 225678

Alex Javier Díaz León
INGENIERO CIVIL
R. CIP. N.º 126547


Ing. David Iván Silva Torres
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
CIP N.º 63635


En el caserío de Villa Cruz de Algallama, distrito de Santa Cruz de Chuca, provincia de Santiago de Chuco – La libertad, siendo las 10:00 a.m. del 22 de septiembre del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza con CIP. N.º 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N.º 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH, el Ing. Marcial Nicolás Barrantes Parimango con CIP N.º 225678 como monitor designado del servicio intervenido (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N.º 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Alex Javier Díaz León con CIP N.º 126547; asimismo, representando a Provías Descentralizado está el Ing. Gabriel Omar Panta Cossio con CIP N.º 192701 encargado de Monitoreo y Seguimiento y el Ing. Bach. Eduardo Rafael Príncipe León con DNI N.º 46839109 como Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento; finalmente, por parte del Contratista Ing. Quevin Julio Quipuzcoa Alayo con CIP N.º 110887 como Residente de servicio y el Sr. Edgar Gómez Domínguez con DNI N.º 44944779, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL CALIFORNIA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.). A fin de realizar el **INICIO DE SERVICIO** del tramo: **“CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO TIERRA NEGRA”** con una longitud de **16.906 km.**

Este acto protocolar tiene por finalidad dar inicio a la ejecución de las actividades de **MANTENIMIENTO PERIÓDICO** de la ruta mencionada en todo su recorrido físico correspondiente a la FASE II del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y partidas estipulados en el Plan de Trabajo previamente aprobado por la Entidad.

Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: "EMP. PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA LONG= 4.330 KM" Y "CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO TIERRA NEGRA LONG= 16.906"**, DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.


Siendo las 10:30 a.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas acorde con el Plan de Trabajo, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para empezar la ejecución del Mantenimiento Periódico. Del mismo día, se da por concluido el acto de **INICIO DE SERVICIO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.

AREA USUARIA


Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 190782


Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 218511


Quelin J. Quiroz Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887


Ing. Marcial Nicolás Barrantes Parimango
Monitor Designado del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 225678


AREA RESPONSABLE



Ing. David Iván Silva Torres
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
CIP N° 63635

Ing. David Iván Silva Torres
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH
CIP N° 63635

CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ
DNI N° 4494779
REPRESENTANTE COMÚN

REPRESENTANTES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD


Ing. Gabriel Omar Panta Cossio
Monitoreo y Seguimiento a Mantenimiento Vial
Provincia de Santiago de Chuco
CIP N° 192701


Ing. Bach. Eduardo Rafael Príncipe León
Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento
Provincia de Santiago de Chuco
DNI N° 46839109

EMPRESA EJECUTORA


Quelpin J. Quipuzcoa Alayo
ING. CIVIL
REG. CIP N° 110887
Ing. Quelpin J. Quipuzcoa Alayo
Residente de Servicio
CIP N° 110887


CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ
DNI N° 44944779
REPRESENTANTE COMÚN

Sr. Edgar Gómez Domínguez
Representante Común de CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
DNI N° 44944779

INSPECTOR


ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

Ing. Alex Javier Díaz León
Inspector del Servicio
CIP N° 126547

“ACTA DE INICIO DE SERVICIO”

Servicio

MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA LONG= 4.330 KM” Y “CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO TIERRA NEGRA LONG= 16.906”, DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Tramo

“EMP. PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA” LONG = 4.330 KM

Provincia

SANTIAGO DE CHUCO

Distrito

SANTA CRUZ DE CHUCA

Entidad Contratante

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)

Empresa Ejecutora

CONSORCIO VIAL CALIFORNIA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.)

N.º de Contrato

CONTRATO DE SERVICIO N.º 016-2020-MPSCH-LOG

Fecha de Contrato

28/08/2020

Modalidad

SUMA ALZADA

Monto Presupuestado

S/. 369,080.54 soles Inc. (I.G.V.)

Monto Contractual

S/. 368,893.00 soles Inc. (I.G.V.)

Inspector de Servicio

Ing. ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN

Aprobación Plan de Trabajo

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 150-2020-MPSCH/GM

Fecha de Aprobación

21/09/2020

Fecha de Inicio

22/09/2020

Plazo de Ejecución


MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C. (sujeto a fecha de contrato)

MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C.

INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C.

31/12/2021

Fecha de Culminación


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. David Iván Silva Torres
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
D. N.º 63635

En el caserío de Villa Cruz de Algallama, distrito de Santa Cruz de Chuca, provincia de Santiago de Chucuito – La libertad, siendo las 10:00 a.m. del 22 de septiembre del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chucuito (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza con CIP. N° 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N° 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH, el Ing. Marcial Nicolás Barrantes Parimango con CIP N° 225678 como monitor designado del servicio intervenido (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N° 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Omar Panta Cossio con CIP N° 192701 encargado de Monitoreo y Seguimiento y el Ing. Bach. Eduardo Rafael Príncipe León con DNI N° 46839109 como Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento; finalmente, por parte del Contratista Ing. Quelvin Julio Quipuzcoa Alayo con CIP N° 110887 como Residente de servicio y el Sr. Edgar Gómez Domínguez con DNI N° 44944779, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL CALIFORNIA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.). A fin de realizar el **INICIO DE SERVICIO** del tramo: “EMP. PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA” con una longitud de 4.330 km.


Este acto protocolar tiene por finalidad dar inicio a la ejecución de las actividades de **MANTENIMIENTO PERIÓDICO** de la ruta mencionada en todo su recorrido físico correspondiente a la FASE II del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y partidas estipulados en el Plan de Trabajo previamente aprobado por la Entidad.


Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: "EMP. PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA LONG= 4.330 KM" Y "CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO TIERRA NEGRA LONG= 16.906"**, DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Siendo las 10:30 a.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas acorde con el Plan de Trabajo, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para empezar la ejecución del Mantenimiento Periódico. Del mismo día, se da por concluido el acto de **INICIO DE SERVICIO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.

AREA USUARIA


Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 190782


Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 218511


Quelvin J. Quirozco Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887



Ing. Marcial Nicolás Barrantes Parimango
Monitor Designado del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 225678


AREA RESPONSABLE


Ing. David Iván Silva Torres
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
CIP N° 63635

Ing. David Iván Silva Torres
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH
CIP N° 63635

REPRESENTANTES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD


Ing. Gabriel Omar Panta Cossio
Monitoreo y Seguimiento a Mantenimiento Vial
Provincia de Santiago de Chuco
CIP N° 192701


Ing. Bach. Eduardo Rafael Príncipe León
Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento
Provincia de Santiago de Chuco
DNI N° 46839109

EMPRESA EJECUTORA


Quelpuzcoa Alayo
Ing. Quelpuzcoa Alayo
Residente de Servicio
CIP N° 110887

CONSORCIO VIAL CALIFORNIA


EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ
DNI N° 44944779
REPRESENTANTE COMÚN

Sr. Edgar Gómez Domínguez
Representante Común de CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
DNI N° 44944779

INSPECTOR


ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547
Ing. Alex Javier Díaz León
Inspector del Servicio
CIP N° 126547
