



ORDEN DE SERVICIO

Exp. SIAP
1998

7p-6473
6474
6475
6476

NUMERO:

001074

DE FECHA: 21/12/2020

Señor(es) **CORPORACION SORIANO L & C SAC** RUC Nº **20600813715**
Direccion **MZA. T LOTE 17 URB SAN ANDRES 5TA VISTOR LARCO HERRERA -TRUJILLO-LA LIBERTAD**
Referencia Nº **CONTRATO DE SERVICIOS Nº 018-2020-MPSCH-LOG**
Condiciones de Pago : **CCl** **OFICINA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA---IVP**
Objeto del Servicio : **EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP-PE 3N PISCOCHACA-SHUBA-NAMOBAL-SOCOBAMBA-EMP PE 3N-LAS PIEDRAS LONG 11.62 KM; EMP PE 3N-MOLLEBAMBA EL MIRADOR -EMP LI -118-ORUCULLAY LONG 8.71 KM Y EMP PE 3N TULPO MIRAFLORES -MICHICUILCA LONG-8.00 KM DE LA PROVINCIA DE CHUCO-LA LIBERTAD.**
Destino a **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO** Pedido Nº : **001074**

LOS SIGUIENTES SERVICIOS :			VALOR	
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
		PAGO DE VALORIZACION Nº 03: DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP-PE 3N PISCOCHACA-SHUBA-NAMOBAL-SOCOBAMBA-EMP PE 3N-LAS PIEDRAS LONG 11.62 KM; EMP PE 3N-MOLLEBAMBA EL MIRADOR -EMP LI -118-ORUCULLAY LONG 8.71 KM Y EMP,PE 3N TULPO MIRAFLORES -MICHICUILCA LONG-8.00 KM DE LA PROVINCIA DE CHUCO-LA LIBERTAD. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. SEGÚN: INFORME Nº 317-2020-IVP-MPSCH/GG/VRRK INFORME Nº1306-2020-MPSCH/DIST/SGI PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION Nº 10-2020-MPSCH/CS		
			TOTAL S/.	1,073,432.57

AFECTACION PRESUPUESTAL DEL SERVICIO			DISTRIBUCION CONTABLE
ACTIVIDAD/PROYECTO:	META	CLASIFICADOR:	CUENTAS POR PAGAR
0138-PROMOCION ,IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA	0188-MANTENIMEINTO DE CAMINO VECINAL	23.27.16	S/. 1,073,432.57

AUTORIZACION DEL SERVICIO		ÁREA USUARIA:							
 Lic. Yamil J. Rodríguez Marquina JEFE DE LOGISTICA UNIDAD DE LOGISTICA	 Abog. John Jairo Curay Reyes ADMINISTRACION Y FINANZAS ADMINISTRACION y/o GERENCIA	<table><tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td>18</td><td>12</td><td>2020</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	18	12	2020	 FIRMA
DIA	MES	AÑO							
18	12	2020							

Detrac. (12%) = S/. 128,812.00
Total Pagar = S/. 944,620.57

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROVEIDO
PASE a: Contabilidad
PARA: Derengado
FECHA: 21/12/2020 Firma:



CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 0000000493
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA : 10 SANTIAGO DE CHUCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO [301197]

MES : JULIO
FECHA DE DOCUMENTO : 07/07/2020
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION. PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS); SANTIAGO DE CHUCO - L.L, EN EL MARCO DEL D.U 070-2020 - ART. 21.1 (ANEXO 13)

N° DE DOCUMENTO F01-378-2020-LOG

FECHA APROBACION : 07/07/2020
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRGPROD/PRY ACT/IOBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESFESPD	MONTO
0001 INICIAL	
0138 3000133 5006373 15 033 0066 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	837,081.00
0210 MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS); SANTIAGO DE	837,081.00
3 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	837,081.00
5 GASTOS CORRIENTES	837,081.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	837,081.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	837,081.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	825,461.00
2.3.2.4.3 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	825,461.00
2.3.2.4.3.1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	825,461.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	11,620.00
2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	11,620.00
2.3.2.7.1.6 ESTUDIOS	11,620.00
TOTAL	837,081.00
TOTAL CERTIFICACION	837,081.00
TOTAL NOTA	837,081.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
SANTIAGO DE CHUCO
C.P.C. Natividad Z. Pereda Sánchez
OFC. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma

TP: 18

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 0000000494
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA : 10 SANTIAGO DE CHUCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO [301197]

MES : JULIO
FECHA DE DOCUMENTO : 07/07/2020
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM

N° DE DOCUMENTO F01-379-2020-LOG

FECHA APROBACION : 07/07/2020
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION. PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI-118 (ORUCULLAY); SANTIAGO DE CHUCO - LL, EN EL MARCO DEL D.U 070-2020 - ART. 21.1 (ANEXO 13)

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA	MONTO
PRG PROD/PRY ACT/AL/OBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESFESPD	

0001 INICIAL

0138 3000133 5006373 15 033 0066 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	627,450.98
0211 MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI-118 (ORUCULLAY); SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	627,450.98
3 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	627,450.98
5 GASTOS CORRIENTES	627,450.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	627,450.98
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	627,450.98
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	618,740.98
2.3.2.4.3 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	618,740.98
2.3.2.4.3.1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	618,740.98
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	8,710.00
2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	8,710.00
2.3.2.7.1.6 ESTUDIOS	8,710.00

TOTAL	627,450.98
TOTAL CERTIFICACION	627,450.98
TOTAL NOTA	627,450.98

TR:18

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
SANTIAGO DE CHUCO
Autoridad Z. Pereda Sánchez
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma

"Año de la universalización de la salud"

INFORME N° 317-2020-IVP-MPSCH/GG/VRRK

A : Dr. JOHN JAIRO CURAY REYES.
Director de administración y Finanzas de la MPSCH

DE : ING. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente del Instituto Vial Provincial de Santiago de Chuco

ASUNTO : APROBACIÓN DE CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N° 03 DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS
CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA -
NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS), LONG. 11.62
KM; EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI-118
(ORUCULLAY), LONG. 8.71 KM Y EMP. PE-3N (TULPO) - MIRAFLORES -
MICHILQUILCA LONG. 8.00 KM.

REFERENCIA : Informe N° 190-2020-JO/IVPSCH/LFGCH
INFORME N° 016-2020-IVP-MPSCH/TACSMRP/FRGC
Informe N° 1306-2020-MPSCH/DST/SGI
CARTA N° 007-2020-LBLL-IO/MPSCH
Informe N° 006-2020- LBLL/INSP
CARTA N° 006-2020-CONSORCIO VIAL MIRAFLORES/RL/EGD
CONTRATO N° 018-2020-MPSCH-LOG
DU. N° 070-2020

FECHA : Santiago de Chuco, 18 de diciembre del 2020

Previo cordial saludo y afecto, por medio del presente tengo a bien manifestarle con respecto al asunto de la referencia lo siguiente:

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Ejecución de Servicio

: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS
CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA -
NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS), LONG. 11.62 KM;
EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI-118 (ORUCULLAY),
LONG. 8.71 KM Y EMP. PE-3N (TULPO) - MIRAFLORES - MICHILQUILCA
LONG. 8.00 KM.

Longitud : 28.33 Km.
Superficie de Rodadura : Afirmado.
Espesor de Afirmado : 0.15 m.
Velocidad Directriz : 30 km/h.
Perfilado de Cunetas : Terreno natural
Hitos Kilométricos : 30 unidades




UBICACIÓN

Distrito : MOLLEBAMBA
Provincia : Santiago de Chuco
Región : La Libertad

RESPONSABLES DEL SERVICIO

EJECUTOR:

Fuente de financiamiento : Recursos por operaciones oficios de crédito



Modalidad Contratación : a Suma Alzada
Contrato de Servicio : CONTRATO N° 018-2020-MPSCH-LOG
Contratista : CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
Monto Referencial del Servicio : S/. 2, 414,792.54 inc el IGV.
Monto del Contrato de Servicio : S/. 2, 414,700.00 inc el IGV
Plazo de Ejecución mantenimiento Periódico : 120 DIAS CALENDARIOS
Inicio Plazo de Servicio Contractual : 19-09-2020
Fecha Termino de Servicio Contractual : 31-12-2020

INSPECTOR

INSPECTOR : ING. LUIS BRACO LEON LEON
Contrato De Servicio : N° 030-2020-MPSCH-LOG

2. DE LA PRESENTACIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE DEL SERVICIO N° 03-NOVIEMBRE 2020

Mediante CARTA N° 004-2020-LBLL-IO/MPSCH, del Inspector de Servicio, recepcionada por mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, el día 04/12/2020, el ING. LUIS BRACO LEON LEON, hace llegar a la Municipalidad la Valorización N° 03 del por los trabajos ejecutados en el periodo comprendido entre el 01/11/2020 hasta el 30/11/2020, del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS), LONG. 11.62 KM; EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI-118 (ORUCULLAY), LONG. 8.71 KM Y EMP. PE-3N (TULPO) - MIRAFLORES – MICHQUILCA LONG. 8.00 KM., DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.

3. ANÁLISIS DEL IVP.

Para la ejecución del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS), LONG. 11.62 KM; EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI-118 (ORUCULLAY), LONG. 8.71 KM Y EMP. PE-3N (TULPO) - MIRAFLORES – MICHQUILCA LONG. 8.00 KM., DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, en el proceso especial de selección N° 10-2020-MPSCH/CS-Segunda convocatoria, la empresa contratista CONSORCIO VIAL MIRAFLORES, ha sido favorecida con la buena pro, por su monto ofertado de S/. 2, 414,700.00 inc. IGV que a continuación se detalla:

- A) Elaboración del Plan de Trabajo la suma de S/. 24,147.00 inc IGV, que se desarrollara exclusivamente para tal fase.
B) Ejecución del mantenimiento Periódico la suma de 2, 004,201.00, inc. IGV, que se desarrollara exclusivamente en la fase de Ejecución del Mantenimiento Periódico.



PRESUPUESTO OFERTADO

Item	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
		METRADOS		COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
		Unidad	Cantidad		
01	OBRAS PRELIMINARES				
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	3.00	40,220.52	120,661.56
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	28.33	998.09	28,275.89
02	PAVIMENTOS				

02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M.	m3	7,082.50	4.62	32,721.15
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M.	m3	21,247.50	32.06	681,194.85
03	TRANSPORTE				
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM.	m3k	21,900.00	6.57	143,883.00
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM.	m3k	139,176.81	0.93	129,279.99
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM.	m3k	13,475.00	6.57	88,530.75
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM.	m3k	55,813.73	0.93	51,926.83
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	28,330.00	1.84	52,127.20
05	SEÑALIZACIÓN				
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und	30.00	315.24	9,457.20
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	Und	52.00	389.22	20,239.44
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	Und	12.00	389.22	4,670.64
05.11	SEÑALES INFORMATIVAS	Und	10.00	468.3200	4,683.20
06	IMPACTO AMBIENTAL				
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	6.00	7,274.1400	43,644.84
07	EMERGENCIA SANITARIA				
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	3.00	21,879.53	65,638.59
COSTO DIRECTO		CD		S/.	1,476,935.15
GASTOS GENERALES		GG	10%	S/.	147,693.51
UTILIDAD		U	5%	S/.	73,846.76
SUB TOTAL		CD+GG+U		S/.	1,698,475.42
IGV			18%	S/.	305,725.58
TOTAL PRESUPUESTO		PT		S/.	2,004,201.00
PORCENTAJE					100.00%

- C) Ejecución del Mantenimiento Rutinario, la suma de S/. 362,205.00, inc. IGV, que se desarrollara exclusivamente para tal fase.
- D) La Elaboración del Inventario de Condición Vial la Suma de S/. 24,147.00, inc. IGV, que se desarrollara exclusivamente para tal fase.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL SERVICIO DURANTE EL MES

De acuerdo a la verificación de los trabajos referidos al "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS), LONG. 11.62 KM; EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI-118 (ORUCULLAY), LONG. 8.71 KM Y EMP. PE-3N (TULPO) - MIRAFLORES - MICHICILCA LONG. 8.00 KM., DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD", se ha observado que desde la fecha 01 de NOVIEMBRE hasta 30 de NOVIEMBRE del 2020, se desarrollaron las siguientes actividades:

1.00 OBRAS PRELIMINARES:

1.01 TRAZO Y REPLANTEO.

2.0 PAVIMENTOS.

2.01 CAPA NIVELANTE E=5 CM

2.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=15 CM.



3.0 MANTENIMIENTO DE CALZADA EN AFIRMADO:

- 3.01 Transporte de material granular hasta 1 km
- 3.02 Transporte de material granular mayor a 1 km
- 3.03 Transporte de material excedente hasta 1 km.
- 3.04 Transporte de material excedente mayor a 1 km

4.0 Obras de arte y drenaje

4.01 Reconformación de cunetas

5.0 Emergencia sanitaria

5.01 emergencia sanitaria COVID 19

6.0 Emergencia sanitaria

6.01 emergencia sanitaria COVID 19

NOTA: Toda esta información esta detallada en el informe del Ing. Inspector de Servicio mediante CARTA N° 007-2020-LBLL-IO/MPSCH





Instituto Vial Provincial



MPSCH

Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS) - EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) - EL M. RADOR - EMP. P. U-18 (ORICULLA), LONG. 8.71 KM Y EMP. PE-3N (TULPO) - M. RAÍLORES - M. CHINICHA LONG. 3.00 KM, DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

CONTRATO: Nº 09-2020-M-PCSU-LOS
INSPECTOR: ING. LUIS BRACCO LEON LEON
CONTRATISTA: CONSORCIO VALM RAILORES



PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD



PRESEMP. OFERTADO (CD-EG-4) S/ EV 1698,475.42
PRESEMP. OFERTADO (CD-EG-4) S/ EV 2,004,201.00
FECHA DE PRESUPUESTO 01/09/2020
PLAZO DE EJECUCIÓN 90 d.e. (90 meses)
FECHA DE INICIO Y TÉRMINO CONTRACTUAL 22/09/2020 - 31/09/2020

VALORIZACION DE AVANCE DE SERVICIO Nº 03, MANTENIMIENTO PERIÓDICO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

FORMULA 01 : SERVICIO PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UNID	MONTO CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE VALORIZACION		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
			P.U.	METRO	SOLES	METRO	SOLES	%	METRO	SOLES	METRO	%
01	OBRAS PRELIMINARES	gb										
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	km	40,220.52	3.00	120,661.56	1.50	60,330.78	57.37%	120,661.56	1.50	60,330.78	50.00%
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	988.09	28.33	28,276.89	25.11	25,022.04	88.05%	28,276.89	28.33	28,276.89	100.00%
02	PAVIMENTOS	m3										
02.01	CAPA INFLANTE E=0.05 M	m3	4.62	7,062.50	32,721.25	2,415.00	11,157.30	34.07%	32,721.25	7,062.50	32,721.25	100.00%
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	m3	32.06	21,247.50	681,944.05	7,170.00	229,870.20	33.75%	681,944.05	21,247.50	681,944.05	100.00%
03	TRANSPORTE	m3										
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3	6.57	21,900.00	143,883.00	7,365.00	14,535.00	10.09%	143,883.00	21,900.00	143,883.00	100.00%
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3	0.63	139,178.81	88,521.81	50,655.00	47,868.05	54.07%	139,178.81	139,178.81	139,178.81	100.00%
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCENTRADO HASTA 1 KM	m3	6.57	13,475.00	88,530.75	4,275.00	26,088.75	31.75%	88,530.75	13,475.00	88,530.75	100.00%
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCENTRADO MAYOR A 1 KM	m3	0.63	55,613.73	35,028.63	21,285.00	20,228.35	58.05%	55,613.73	55,613.73	55,613.73	100.00%
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	m										
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	1.84	28,330.00	52,127.20	12,300.00	22,827.20	43.75%	52,127.20	28,330.00	52,127.20	100.00%
05	SEÑALIZACION	Und										
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und	315.24	30.00	9,457.20				9,457.20	30.00	9,457.20	100.00%
05.02	SENALES PREVENTIVAS	Und	389.22	52.00	20,238.44				20,238.44	52.00	20,238.44	100.00%
05.03	SENALES REGULATORIAS	Und	389.22	12.00	4,670.64				4,670.64	12.00	4,670.64	100.00%
06.11	SENALES INFORMATIVAS	Und	408.32	10.00	4,083.20				4,083.20	10.00	4,083.20	100.00%
06	IMPACTO AMBIENTAL	ha										
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	7,214.14	8.00	43,644.84				43,644.84	8.00	43,644.84	100.00%
07	EMERGENCIA SANITARIA	gb										
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COMO 19	gb	21,879.53	3.00	65,638.59	1.50	32,819.30	50.00%	65,638.59	3.00	65,638.59	100.00%

A.	COSTO DIRECTO	1,478,935.15	10.00%	528,465.83	701,033.39	1,317,499.40	159,433.74
B.	GASTOS GENERALES	147,893.51	6.000%	52,068.59	78,103.36	131,749.94	15,943.57
C.	UTILIDAD	28,323.29		28,323.29	38,574.99	65,474.97	7,871.79
D.	SUB TOTAL	1,655,151.95		608,857.71	818,711.74	1,515,724.31	183,351.11
E.	IG.V.	305,725.39		108,978.43	163,743.95	272,722.38	33,000.20
F.	TOTAL	2,000,201.00		714,414.20	1,073,422.57	1,788,446.69	216,351.31
G.	PORCENTAJE	100.00%		35.69%	53.59%	89.27%	10.89%



Jr. Paco Yunque N° 735 - Ciudad de Santiago de Chuco

e-mail: ivpstgodechucu@yahoo.com

402

El resumen de la valorización de Servicio N° 03 NOVIEMBRE 2020, para efectos de pago al contratista CONSORCIO VIAL MIRAFLORES, se ha determinado el importe de **SI. 1, 073,432.57 (UN MILLÓN SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 57/100 SOLES), INC. EL IGV** cuyo detalle es el siguiente.

ENTIDAD : :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO : : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EM P. PE-3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EM P. PE-3N (LAS PIEDRAS), LONG. 1162 KM; EM P. PE-3N (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EM P. IJ-18 (ORUCULLA), LONG. 8.71KM Y EM P. PE-3N (TULPO) - MIRAFLORES - MICHICULLA LONG. 8.00 KM., DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATO : :N°08-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR : :ING. LUIS BRACOLEON LEON

CONTRATISTA : :CONSORCIO VIAL MIRAFLORES



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD



RESUMEN GENERAL VALORIZACION N° 03-NOVIEMBRE MANTENIMIENTO PERIODICO


DESCRIPCION	MONTO CONTRATO	VALORIZACION				% AVANCE
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUM.	SALDO	
1.- VALORIZACION CONTRACTUAL						
Valorización No. 03	1,698,475.42	605,435.70	909,688.62	1,515,124.32	183,351.10	89.21%
	1,698,475.42	605,435.70	909,688.62	1,515,124.32	183,351.10	89.21%
Avance Ejecutado		35.650%	53.555%	89.205%		
Avance Programado		0.000%	4.720%	4.720%		
2.- REAJUSTES						
Reajuste de la Valorización No. 03		-	-	-		
Regularización Reajuste Valorización anteriores		-	-	-		
Retención por atraso de Obra		-	-	-		
*El reajuste no se aplica según CGC 47.1		0.00	0.00	0.00		
A.- VALORIZACION BRUTA (sin IGV) (1+2)		605,435.70	909,688.62	1,515,124.32		
3.- RETENCIÓN POR GARANTIA						
Valorización No.03		-	-	-		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
* Contratista si solicita retención de garantía		0.00	0.00	0.00	0.00	
4.- AMORTIZACION POR ADELANTO MATERIALES						
Valorización No.03		-	-	-		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
5.- DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE						
Por Adelanto Directo		-	-	-		
Por Adelanto de Materiales		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto Directo		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto de Materiales		-	-	-		
	0.00	0.00	0.00	0.00		
B.- VALORIZACION NETA (sin IGV) (1)		605,435.70	909,688.62	1,515,124.32		
C.- MONTO NETO		605,435.70	909,688.62	1,515,124.32		
D.- I.G.V. (18% DE B)		108,978.43	163,743.95	272,722.38		
E.- MONTO A CANCELAR (C+D)		714,414.13	1,073,432.57	1,787,846.70		
F.- MONTO A FACTURAR (A*0.18)		714,414.13	1,073,432.57	1,787,846.70		



Para efectos de control de avance de ejecución del servicio, se ha determinado que Como el monto de la valorización acumulada ejecutada es mayor que el monto de la valorización acumulada programada, la obra se encuentra adelantada por lo que no procede comparación por atraso según el art. 205 del RLCE, en ella se puede visualizar que el avance programado para el mes de NOVIEMBRE 2020, incluyendo la situación actual del servicio y el realmente ejecutado acumulado Promedio de los dos tramos es de 89.21 %, es decir la obra está atrasada un 5.60 %, frente a lo programado de 70.80 %, es decir el servicio de mantenimiento se encuentra adelantado en todas sus actividades.

PERIODO	VALORIZACIONES DE SERVICIO PROGRAMADA					VALORIZACIONES DE SERVICIO REAL				
	CONTRATO ORIGINAL	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)		PRINCIPAL TOTAL	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)	
		PARCIAL	ACUM. (A)	PARCIAL	ACUM.		PARCIAL	ACUM. (B)	PARCIAL	ACUMULADO
SET. 2020	94,599.17	94,599.17	94,599.17	4.72%	4.72%	121,744.06	121,744.06	121,744.06	6.07%	6.07%
OCT. 2020	662,194.20	662,194.20	756,793.36	33.04%	37.76%	592,670.06	592,670.06	714,414.12	29.57%	35.65%
NOV. 2020	662,194.20	662,194.20	1,418,987.56	33.04%	70.80%	1,073,432.57	1,073,432.57	1,787,846.69	53.56%	89.21%
DIC. 2020	585,213.44	585,213.44	2,004,201.00	29.20%	100.00%					
TOTALES	2,004,201.00	2,004,201.00				1,787,846.69	1,787,846.69			

DIAGRAMA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

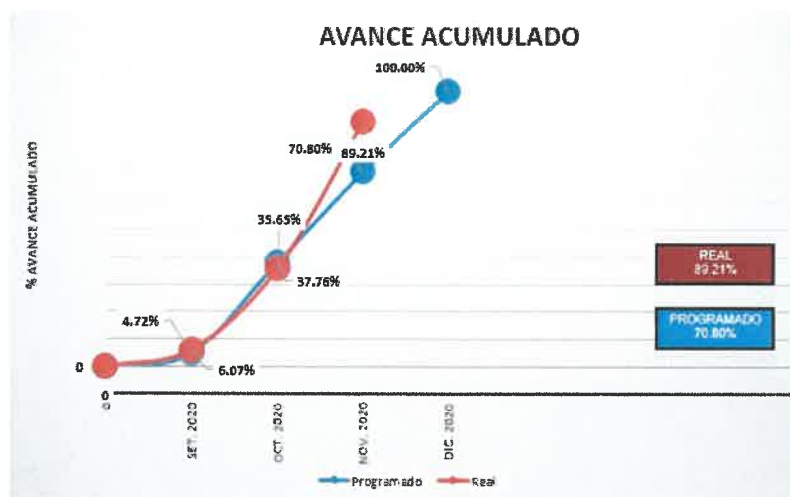

La retención de la Garantía de Fiel Cumplimiento, que tiene como responsabilidad el CONSORCIO VIAL MIRAFLORES, en dejar como garantía del trabajo a ejecutar, fue descontado en las dos primeras Valorizaciones concerniente a los meses de Setiembre y Octubre del 2020, de las cuales será retenido el 10% del monto del contrato.

Dentro del contenido del informe mensual del contratista, de valorización N° 03 al mes de NOVIEMBRE del 2020, nos detalla las pólizas de seguros por la compañía de seguros LA POSITIVA relacionadas al SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIÓN Y SALUD SCTR SALUD CONTRATO DE N° 612453, SCTR PENSIONES POLIZA 6648509, vigente desde el 23/11/2020 hasta el 23/12/2020, seguros contra accidentes personales emitidas por la compañía aseguradora cuya fecha debe de coincidir al mes de NOVIEMBRE del 2020, Pólizas de seguros contra todo riesgo (SCTR – SALUD), FUE EMITIDA EL 02/12/2020, Que cubre la vigencia desde 23/11/2020 hasta el 23/12/2020.

CONCLUSIÓN:

Conforme al calendario de avance del SERVICIO vigente, la ejecución del servicio de SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS), LONG. 11.62 KM; EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI-118 (ORUCULLAY), LONG. 8.71 KM Y EMP. PE-3N (TULPO) - MIRAFLORES – MICHQUILCA LONG. 8.00 KM., DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, ubicado en el distrito de MOLLEBAMBA, Provincia de Santiago de Chuco, Departamento la Libertad, se encuentra adelantado; por cuanto el acumulado programado para el mes de NOVIEMBRE del 2020 es el 70.80 % contra lo realmente ejecutado



que es el 89.21%, de las cuales se tiene la ejecución de forma atrasada en todas las actividades programadas, Como el monto de la valorización acumulado ejecutada es mayor que el monto de la valorización acumulada programada, la obra se encuentra adelantada por lo que no procede comparación por atraso según el art. 205 del RLCE.

LOS METRADOS CONCILIADOS ENTRE EL INSPECTOR y el Residente del SERVICIO, han generado la VALORIZACION DEL SERVICIO N° 03, correspondiente a los trabajos ejecutados en el periodo comprendido entre el 01/11/2020 hasta el 30/11/2020 por la empresa contratista CONSORCIO VIAL MIRAFLORES, el mismo que asciende a la suma de **S/. 1, 073,432.57 (UN MILLÓN SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 57/100 SOLES), INC. EL IGV.**

Las pólizas de seguros contra accidentes personales emitidas por la compañía aseguradora LA POSITIVA relacionadas al SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIÓN Y SALUD SCTR SALUD CONTRATO DE N° 612453, SCTR PENSIONES POLIZA 6648509, vigente desde el 23/11/2020 hasta el 23/12/2020 y sus normas reglamentarias, a favor de la empresa **CORPORACION SORIANO L&C S.A.C.**, DE FECHA 02/12/2020, se encuentra vigente.

La Retención de la Garantía, que garantiza el **FIEL CUMPLIMIENTO** de la ejecución del servicio por un monto a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO, se realizó en las dos primeras Valorizaciones concerniente a los meses de Setiembre Y Octubre del 2020, sumando el monto de **S/. 241,470.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES)**, considerando al 10% del monto del contrato.

Después de haber evaluado el informe del Inspector con respecto a la valorización del servicio N° 03 por los trabajos ejecutados por el **CONSORCIO VIAL MIRAFLORES**, durante el periodo comprendido entre el 01/11/2020 hasta el 30/11/2020, del servicio de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS), LONG. 11.62 KM; EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI-118 (ORUCULLAY), LONG. 8.71 KM Y EMP. PE-3N (TULPO) - MIRAFLORES - MICHQUILCA LONG. 8.00 KM., DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD", la misma que asciende a la suma de **S/. 1, 073,432.57 (UN MILLÓN SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 57/100 SOLES), INC. EL IGV**, esta gerencia da su **CONFORMIDAD** respectiva al informe N° 190-2020-JO/IVPSCH/LFGCH, así mismo se toma la referencia de la conformidad de parte del área responsable mediante informe N° 1306-2020-MPSCH/DIST/SGI.

Concluyendo que el monto a cancelar es de **S/. 1, 073,432.57 (UN MILLÓN SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 57/100 SOLES), INC. EL IGV**, Resumiendo esto en el cuadro resumen de Valorización N° 03 NOVIEMBRE del 2020.

RECOMENDACION

Hacer efectivo la Valorización del SERVICIO N° 03 mes de NOVIEMBRE 2020, por un monto a Pagar de **S/. 1, 073,432.57 (UN MILLÓN SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 57/100 SOLES), INC. EL IGV**, por el periodo comprendido entre el 01/11/2020 hasta el 30/11/2020, generado por el avance de los trabajos ejecutados en el servicio DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS), LONG. 11.62 KM; EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI-118 (ORUCULLAY), LONG. 8.71 KM Y EMP. PE-3N (TULPO) - MIRAFLORES - MICHQUILCA LONG. 8.00 KM., DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD, la misma que está a cargo del contratista, **CONSORCIO VIAL MIRAFLORES**, e Inspeccionado por el



Inspector de servicio el ING. LUIS BRACO LEON LEON, para efectos consiguientes a este informe se hace llegar la siguiente documentación:

Adjunta:

- ✚ Informe N° 190-2020-JO/IVPSCH/LFGCH
- ✚ INFORME N° 016-2020-IVP-MPSCH/TACSMRP/FRGC
- ✚ Informe N° 1306-2020-MPSCH/DST/SGI
- ✚ CARTA N° 007-2020-LBLL-IO/MPSCH
- ✚ Informe N° 006-2020- LBLL/INSP
- ✚ CARTA N° 006-2020-CONSORCIO VIAL MIRAFLORES/RL/EGD
- ✚ CONTRATO N° 018-2020-MPSCH-LOG
- ✚ DU. N° 070-2020
- ✚ 01 archivador Original de la valorización presentada por el contratista
- ✚ Planilla de Valorización N° 03 resumida por la entidad
- ✚ Resumen de la Valorización del servicio N° 03 por la entidad

Sin otro particular, me suscribo de Usted, no sin antes reiterar mi estima personal.

Atentamente,


INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE
SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Pablo A. Rebaza Rafael K.
D.N. 218511
GERENTE GENERAL



RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 02 OCTUBRE 2020, POR LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO: : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE-3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS), LONG. 11.62 KM; EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI-118 (ORUCULLAY), LONG. 8.71 KM Y EMP. PE-3N (TULPO) - MIRAFLORES - MICHIGUILCA LONG. 8.00 KM., DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
INSPECTOR : ING. LUIS BRACO LEON LEON
SERVICIO (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI-118 (ORUCULLAY), LONG. 8.71 KM Y EMP. PE-3N (TULPO) - MIRAFLORES - MICHIGUILCA LONG. 8.00 KM

N° Contrato : N° 006-2020-MPSCHILOG	
Plazo de Ejecución	120 Días Calendarios
Anticipo	\$/0.00 Sin IGV
Anticipo de Materiales	\$/0.00 Sin IGV
Fecha Inicio Elec. Servicio	: 22 septiembre 2020
Fecha Término Servicio	: 31 diciembre 2020

ACTIVIDAD	COSTO DIRECTO (S/.)	GASTOS GENERALES 10%	UTILIDAD 5%	SUB TOTAL	IGV 18%	TOTAL S/.
PLAN DE TRABAJO	17,794.40	1,779.44	889.72	20,463.56	3,683.44	24,147.00
MANTENIMIENTO PERIÓDICO	1,476,835.15	147,683.52	73,846.76	1,698,475.42	305,725.58	2,004,201.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO	266,915.99	26,691.60	13,345.80	306,953.39	55,251.61	362,205.00
INVENTARIO DE CONDICION VIAL	17,794.40	1,779.44	889.72	20,463.56	3,683.44	24,147.00
	1,779,439.94	177,943.99	88,972.00	2,046,355.93	368,344.07	2,414,700.00
	TOTAL S/.					2,414,700.00

N° Valorización	Valorización Bruta	Reintegro de Valorización	Realiste de Reintegro de Valorización	Deducción del reajuste que no corresponde	Retención Segun Art. 151 DS 344-2018-EF Reglamento de la ley N° 30225		Anticipo Materiales		MONTOS A PAGAR	IGV	Valorización del mes
					Retención de Garantía 10%	Retención SI/IGV	Adelanto	Amortización	SI/IGV		
V. N° 01. Set. 2020	103,172.94	0.00	0.00	0.00	241,470.00	102,317.80	0.00	0.00	855.14	153.93	1,009.07
V. N° 02. Oct. 2020	502,262.76	0.00	0.00	0.00	120,735.00	102,317.80	0.00	0.00	399,944.96	71,980.09	471,935.06
V. N° 03. Nov. 2020	909,688.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,688.62	163,743.95	1,073,432.57
V. N° 04. Dic. 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Parcial	1,515,124.32	0.00	0.00	0.00	204,635.59	241,470.00	0.00	0.00	1,310,488.73	235,887.97	1,546,376.70

ADICIONALES											
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General	1,515,124.32	0.00	0.00	0.00	204,635.59	241,470.00	0.00	0.00	1,310,488.73	235,887.97	1,546,376.70

NOTA: Conforme lo establece el Resolución de Superintendencia N° 071-2018/SUNAT, a partir del 01 de abril de 2018, los siguientes servicios, contenidos en el Anexo 3 de la R.S. 183-2004/SUNAT, cuyo nacimiento de la obligación tributaria del IGV se origine a partir de dicha fecha, estarán sujetos a la aplicación del 12%:

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
SANTIAGO DE CHUCO
CP 218311
Jefe de Operaciones
Gerente General
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

JEFE DE OPERACIONES
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

GERENTE GENERAL
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

397

396

ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS), LONG. 11.62 KM; EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI-118 (ORUCULLAY), LONG. 8.71 KM Y EMP. PE-3N (TULPO) - MIRAFLORES - MICHIGUILCA LONG. 8.00 KM., DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATO : N° 018-2020-MPSCH/LOG
INSPECTOR : ING. LUIS BRACO LEON LEON
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MIRAFLORES



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD



RESUMEN DE PAGO N° 03 - NOVIEMBRE 2020
CONTRATO N° 018-2020-MPSCH/LOG **MES DE NOVIEMBRE 2020**

PAGO A CUENTA A CANCELAR AL CONTRATISTA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

CONCEPTO		MONTOS S/.
1.- Monto Valorizado sin Reajuste en el presente mes :		909,688.62
- Valorizacion No.03		909,688.62
2.- Reajuste de las Valorizaciones :		0.00
- Reajuste de la Valorizacion No.03		0.00
- Regularizacion Reajuste Valorización anterior		0.00
- Retención por atraso de Obra		0.00
* El reajuste no se aplica según CGC 47.1		
A.- VALORIZACION BRUTA (VB) (sin IGV) (1+2)	S/.	909,688.62
3.- Retención de Garantía :		0.00
- En la Valorizacion No.03		0.00
- Regularización Valorizaciones anteriores		0.00
* Contratista no solicito retención de Garantia		
4.- Amortizacion del Adelanto de Materiales :		0.00
- En la Valorizacion No.03		0.00
- Regularización Valorizaciones anteriores		0.00
* Contratista no solicito adelanto		
5.- Deducción del Reajuste que no corresponde :		0.00
- Por Adelanto Directo		0.00
- Por Adelanto de Materiales		0.00
- Por Regularización del Adelanto Directo		0.00
- Por Regularización del Adelanto de Materiales		0.00
B.- VALORIZACION NETA (sin IGV) (1)	S/.	909,688.62
C.- MONTO NETO	S/.	909,688.62
D.- I.G.V. (18% DE B)	S/.	163,743.95
E.- MONTO A CANCELAR (C+D)	S/.	1,073,432.57
F.- MONTO A FACTURAR (A*0.18)	S/.	1,073,432.57



395

ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: : *SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS), LONG. 11.62 KM; EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI-118 (ORUCULLAY), LONG. 8.71 KM Y EMP. PE-3N (TULPO) - MIRAFLORES - MICHILILCA LONG. 8.00 KM., DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD*

CONTRATO : N° 018-2020-MPSCH/LOG
INSPECTOR : ING. LUIS BRACO LEON LEON
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MIRAFLORES



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD



RESUMEN GENERAL VALORIZACION N° 03-NOVIEMBRE MANTENIMIENTO PERIODICO

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO	VALORIZACION				% AVANCE
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUM.	SALDO	
1.- VALORIZACION CONTRACTUAL						
Valorizacion No. 03	1,698,475.42	605,435.70	909,688.62	1,515,124.32	183,351.10	89.21%
	1,698,475.42	605,435.70	909,688.62	1,515,124.32	183,351.10	89.21%
Avance Ejecutado		35.650%	53.555%	89.205%		
Avance Programado		0.000%	4.720%	4.720%		
2.- REAJUSTES						
Reajuste de la Valorizacion No. 03		-	-	-		
Regularizacion Reajuste Valorización anteriores		-	-	-		
Retención por atraso de Obra		-	-	-		
*El reajuste no se aplica según CGC 47.1		0.00	0.00	0.00		
A.- VALORIZACION BRUTA (sin IGV) (1+2)		605,435.70	909,688.62	1,515,124.32		
3.- RETENCIÓN POR GARANTIA						
Valorizacion No.03		-	-	-		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
* Contratista si solicito retención de garantía		0.00	0.00	0.00	0.00	
4.- AMORTIZACION POR ADELANTO MATERIALES						
Valorizacion No.03		-	-	-		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
5.- DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE						
Por Adelanto Directo		-	-	-		
Por Adelanto de Materiales		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto Directo		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto de Materiales		-	-	-		
		0.00	0.00	0.00		
B.- VALORIZACION NETA (sin IGV) (1)		605,435.70	909,688.62	1,515,124.32		
C.- MONTO NETO		605,435.70	909,688.62	1,515,124.32		
D.- I.G.V. (18% DE B)		108,978.43	163,743.95	272,722.38		
E.- MONTO A CANCELAR (C+D)		714,414.13	1,073,432.57	1,787,846.70		
F.- MONTO A FACTURAR (A*0.18)		714,414.13	1,073,432.57	1,787,846.70		



ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHILCO

SERVICIO:

CONTRATO : : N° 018-2020-MPSC-HLOS

INSPECTOR : : ING. LUIS BRACCO LEON LEON

CONTRATISTA : : CONSORCIO VIAL MIRAFLORES

: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PEIN (PISCOCACHA) - SUIRA, NACIONAL - SOCORRAMBA - EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS), LONG. 11.62 KM. EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LU-118 (ORUCULLAY), LONG. 8.71 KM Y EMP. PEIN (TULPO) - MIRAFLORES - MICHUQUILA LONG. 8.60 KM, DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHILCO - LA LIBERTAD



PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHILCO - REGION LA LIBERTAD

MPSC-H

PRESUPUESTO OFERTADO (CD-CGAU) S/ CV 1,898,475.42

PRESUPUESTO OFERTADO (CD-CGAU) INC/ CV 2,004,201.00

FECHA DE PRESUPUESTO 01/09/2020

PLAZO DE EJECUCION 120 d.s. (04 meses)

FECHA DE INICIO Y TERMINO CONTRACTUAL 22/09/2020 - 31/12/2020

VALORIZACION DE AVANCE DE SERVICIO N° 03, MANTENIMIENTO PERIODICO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

FORMULA 01 : SERVICIO PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UNID	P.U.	MONTO CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE VALORIZACION		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
				METRAO	SOLES	METRAO	SOLES	METRAO	%	METRAO	SOLES	METRAO	%
01	OBRAS PRELIMINARES				148,937.45		85,392.82		57.33%		85,392.82		57.33%
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	40,220.52	3.00	120,661.56	1.50	60,330.78	50.00%	50.00%	1.50	60,330.78	1.5000	50.00%
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	998.09	28.33	28,278.89	25.11	25,062.04	88.83%	11.37%	28.33	28,278.89	-	100.00%
02	PAVIMENTOS				713,916.00		241,037.50	33.75%	66.24%		713,916.00		100.00%
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M.	m ³	4.62	7,082.50	32,721.15	2,415.00	11,157.30	34.09%	66.24%	7,082.50	32,721.15	-	100.00%
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M.	m ³	32.06	21,247.50	681,194.85	7,170.00	229,870.20	33.75%	66.25%	21,247.50	681,194.85	-	100.00%
03	TRANSPORTE				413,620.57		144,594.20	34.95%	65.04%		413,620.57		100.00%
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM.	m ³ k	6.57	21,900.00	143,883.00	7,385.00	48,388.05	33.95%	66.37%	21,900.00	143,883.00	-	100.00%
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM.	m ³ k	0.93	139,176.81	129,279.99	47,893.05	88,521.81	68.49%	62.95%	139,176.81	129,279.99	-	100.00%
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM.	m ³ k	6.57	13,475.00	88,530.75	4,275.00	28,086.75	31.73%	68.27%	13,475.00	88,530.75	-	100.00%
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM.	m ³ k	0.93	55,813.73	51,926.83	21,285.00	20,226.35	38.95%	61.05%	55,813.73	51,926.84	100.00	100.00%
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				52,127.20		22,632.00	43.47%	56.53%		52,127.20		100.00%
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	1.84	28,330.00	52,127.20	12,300.00	22,632.00	43.47%	56.53%	28,330.00	52,127.20	-	100.00%
05	SEÑALIZACION				39,050.48		0.00	0.00%	0.00%		39,050.48		100.00%
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und	315.24	30.00	9,457.20	-	-	-	-	30.00	9,457.20	30.00	100.00%
05.02	SENALES PREVENTIVAS	Und	389.22	52.00	20,239.44	-	-	-	-	52.00	20,239.44	52.00	100.00%
5.03	SENALES REGLAMENTARIAS	Und	389.22	12.00	4,670.64	-	-	-	-	12.00	4,670.64	12.00	100.00%
05.11	SENALES INFORMATIVAS	Und	468.32	10.00	4,683.20	-	-	-	-	10.00	4,683.20	10.00	100.00%
06	IMPACTO AMBIENTAL				43,644.84		0.00	0.00%	0.00%		43,644.84		100.00%
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	7,274.14	6.00	43,644.84	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EMERGENCIA SANITARIA				65,638.59		32,819.30	50.00%	25.00%		65,638.59		75.00%
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	21,879.53	3.00	65,638.59	1.50	32,819.30	50.00%	25.00%	2.25	48,228.34	-	75.00%

A-	COSTO DIRECTO	1,476,935.15	10.000%	526,465.83	791,033.58	1,317,498.40	159,435.74
B-	GASTOS GENERALES	147,693.51	5.000%	52,846.58	79,103.36	131,749.94	15,943.57
C-	UTILIDAD	73,846.76		26,323.29	39,551.68	65,874.97	7,971.79
D-	SUB TOTAL	1,698,475.42		608,435.71	909,888.82	1,515,124.31	183,351.11
E-	IG.V.	305,725.58		108,378.43	163,743.95	272,722.38	33,003.20
F-	TOTAL	2,004,201.00		714,414.120	1,073,432.37	1,787,846.69	216,354.31
G-	PORCENTAJE	100.00%		35.65%	53.56%	89.21%	10.80%



399

25/3

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE-3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS), LONG. 11.62 KM, EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI-118 (ORUCULLAY), LONG. 8.71 KM Y EMP. PE-3N (TULPO) - MIRAFLORES - MICHICUILCA LONG. 8.00 KM., DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATO: N° 018-2020-MPSCH/LOG
INSPECTOR: ING. LUIS BRACO LEON LEON
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MIRAFLORES



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD



PLANILLA DE RESUMEN DE METRADOS, MANTENIMIENTO PERIODICO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

Partida	Descripción	Und	Metrado Contrato Original	Acumulado Anterior	Val N° 03	Acumulado Actual		Saldo por Valorizar	
					Nov-20	Metrado	%	Metrado	%
01	OBRAS PRELIMINARES								
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	3.00	1.500	-	1.500	50.00%	1.5000	50.00%
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	28.33	25.11	3.22	28.330	100.00%	-	-
02	PAVIMENTOS								
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M.	m3	7,082.50	2,415.000	4,667.500	7,082.500	100.00%	-	-
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M.	m3	21,247.50	7,170.000	14,077.500	21,247.500	100.00%	-	-
03	TRANSPORTE								
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM.	m3k	21,900.00	7,365.000	14,535.000	21,900.000	100.00%	-	-
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM.	m3k	139,176.81	50,655.000	88,521.810	139,176.810	100.00%	-	-
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM.	m3k	13,475.00	4,275.000	9,200.000	13,475.000	100.00%	-	-
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM.	m3k	55,813.73	21,285.000	34,428.730	55,713.730	99.82%	100.0000	0.18%
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE								
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	28,330.00	12,300.000	16,030.000	28,330.000	100.00%	-	-
05	SEÑALIZACIÓN								
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und	30.00	-	-	-	-	30.0000	100.00%
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	Und	52.00	-	-	-	-	52.0000	100.00%
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	Und	12.00	-	-	-	-	12.0000	100.00%
05.11	SEÑALES INFORMATIVAS	Und	10.00	-	-	-	-	10.0000	100.00%
06	IMPACTO AMBIENTAL								
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	6.00	-	-	-	-	6.0000	100.00%
07	EMERGENCIA SANITARIA								
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	3.00	1.500	0.750	2.250	75.00%	0.7500	25.00%



ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUICO

SERVICIO : *SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE-3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NADOBAL - SOCORAMBA - EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS), LONG. 11.62 KM. EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LL-116 (ORUCULLAY), LONG. 8.71 KM Y EMP. PE-3N (TULPO) - MIRAFLORES - MIRAFLORES - LONG. 8.00 KM, DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUICO - LA LIBERTAD

CONTRATO : N° 018-2020-MPSC/LOG



INSPECTOR : ING. LUIS BRACOLEON LEON

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MIRAFLORES

CUADRO COMPARATIVO DE AVANCES : PROGRAMADO VS EJECUTADO (CURVA "S") COMPARACION EFECTUADA CON EL CSP N° 01

PERIODO	VALORIZACIONES DE SERVICIO PROGRAMADA				VALORIZACIONES DE SERVICIO REAL				SITUACION DE SERVICIO	
	CONTRATO ORIGINAL	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)	PRINCIPAL TOTAL	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)	SERVICIO	%
		PARCIAL	ACUM. (A)			PARCIAL	ACUM. (B)			
SET. 2020	94,599.17	94,599.17	94,599.17	4.72%	121,744.06	121,744.06	121,744.06	6.07%	ADELANTADA	28.69%
OCT. 2020	662,194.20	662,194.20	756,793.36	33.04%	592,670.06	592,670.06	714,414.12	29.57%	ATRASADA	5.60%
NOV. 2020	662,194.20	662,194.20	1,418,987.56	33.04%	1,073,432.57	1,073,432.57	1,787,846.69	53.56%	ADELANTADA	25.99%
DIC. 2020	585,213.44	585,213.44	2,004,201.00	29.20%						
TOTALES	2,004,201.00	2,004,201.00			1,787,846.69	1,787,846.69				

NOTAS : 1.- Montos que considera costo directo + gastos generales + utilidad, montos sin incluir IGV.
2.- En el avance programado se ha considerado el Calendario de Avance Servicio que corresponde al mes de Setiembre

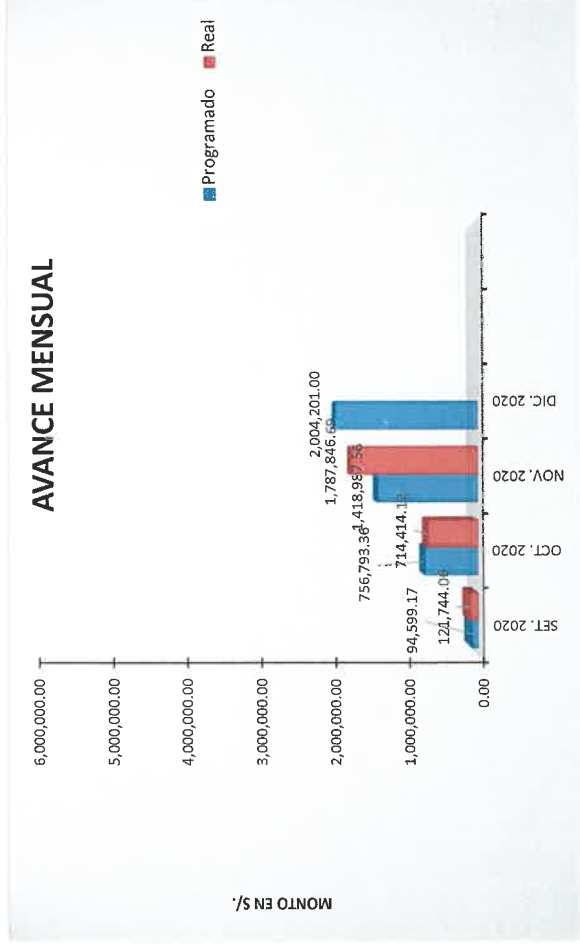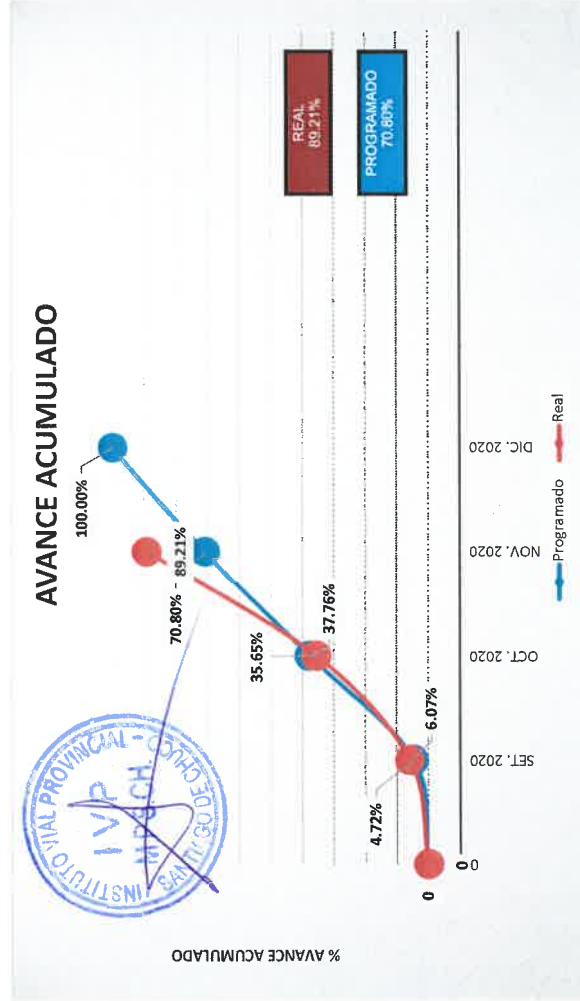

301

ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS), LONG. 11.62 KM; EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI-118 (ORUCULLAY), LONG. 8.71 KM Y EMP. PE-3N (TULPO) - MIRAFLORES - MICHICUILCA LONG. 8.00 KM., DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATO: : N° 018-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR : ING. LUIS BRACO LEON LEON

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MIRAFLORES



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD



EVALUACION DEL AVANCE VALORIZADO RESPECTO AL PROGRAMADO

PRESUPUESTO	MONTO TOTAL X PRESUPUESTO	MONTO AVANCE ACUMULADO	
		VALORIZADO	PROGRAMADO
SERVICIO PRINCIPAL	2,004,201.00	1,787,846.69	1,418,987.56
TOTAL (Sin IGV)	2,004,201.00	1,787,846.69	1,418,987.56
		89.21%	70.80%

Situacion de Obra	$S/.1,787,846.69 > S/.1,418,987.56 \implies$	Adelantada
		25.995%

VERIFICACION SI REQUIERE CALENDARIO ACELERADO (ART. 205 DEL RLCE)

a.- Monto Valorizacion Acumulado Programado	1,418,987.56
b.- Porcentaje art. 205 del Reglamento.	80%
c.- Monto Tope (80% de a)	1,135,190.05
d.- Monto Valorizacion Acumulado Ejecutado	1,787,846.69

Se tiene que:
 $(d) > (c) \implies S/.1,787,846.69 > S/.1,135,190.05$

Conclusion :

Como el monto de la valorizacion acumulado ejecutada es mayor que el monto de la valorizacion acumulada programada, la obra se encuentra adelantada por lo que no procede comparacion por atraso según el art. 205 del RLCE.



390

ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS), LONG. 11.62 KM; EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI-118 (ORUCULLAY), LONG. 8.71 KM Y EMP. PE-3N (TULPO) - MIRAFLORES - MICHILQUILCA LONG. 8.00 KM., DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATO : N° 018-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR : ING. LUIS BRACO LEON LEON

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MIRAFLORES



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD



RESUMEN DE METRADOS MANTENIMIENTO PERIODICO VALORIZACION N° 03

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO
01	OBRAS PRELIMINARES		
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	-
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	3.22
02	PAVIMENTOS		
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M.	m3	4,667.50
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M.	m3	14,077.50
03	TRANSPORTE		
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM.	m3k	14,535.00
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM.	m3k	88,521.81
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM.	m3k	9,200.00
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM.	m3k	34,428.73
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE		
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	16,030.00
05	SEÑALIZACIÓN		
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und	-
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	Und	-
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	Und	-
05.11	SEÑALES INFORMATIVAS	Und	-
06	IMPACTO AMBIENTAL		
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0
07	EMERGENCIA SANITARIA		
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	0.75



“Año de la Universalización de la Salud”

INFORME N° 190-2020-JO/IVPSCH/LFGCH

A : ING. RAFAEL K. VALENCIA REBAZA
GERENTE DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

DE : ING. LUIS F. GUTIERREZ CHÁVEZ
JEFE DE OPERACIONES DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

ASUNTO : EVALUACIÓN Y CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N° 03 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. PE-3N (PISCOCHACA) – SHUBA – NABOBAL – SOCOBAMBA – EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS) LONG= 11.620 KM”; “EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) MIRADOR – EMP. LI-118 (OROCULLAY) LONG= 8.710” Y “EMP. PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHIGUILCA LONG= 8.000 KM” DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.

REFERENCIA :

MONITOR DESIGNADO POR IVP	a)	INF. N°015-2020-IVP-MPSCH/TACSMRP/FRGC
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	b)	INF. N°1306-2020-MPSCH/DIST/SGI
INSPECTOR DE SERVICIO	c)	CARTA N°007-2020/LBLL-IO/MPSCH
CONTRATISTA	d)	CARTA N°006-2020/CONSORCIO VIAL MIRAFLORES/RL/RGD

FECHA : SANTIAGO DE CHUCO, 17 DE DICIEMBRE DE 2020

Por medio del presente, le expreso mi cordial saludo y afecto, a su vez presento la VALORIZACIÓN N°03 del SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. PE-3N (PISCOCHACA) – SHUBA – NABOBAL – SOCOBAMBA – EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS) LONG= 11.620 KM”; “EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) MIRADOR – EMP. LI-118 (OROCULLAY) LONG= 8.710” Y “EMP. PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHIGUILCA LONG= 8.000 KM” DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, correspondiente al mes de noviembre (del 01 al 30) de 2020, la cual fue elaborada por el CONSORCIO VIAL MIRAFLORES y alcanzada al Inspector de servicio mediante documento de referencia d); este a su vez dio su Conformidad y la ingresó a la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad) con documento de referencia c) para realizar el trámite correspondiente.

Para el pago de la VALORIZACIÓN N° 03, se debe contar con la CONFORMIDAD del área responsable (Sub Gerencia de Infraestructura) y posteriormente se dará la APROBACIÓN del área usuaria (Instituto Vial Provincial de Santiago de Chuco), según se estipula los Términos de Referencia del D.U. N° 070-2020 para los Mantenimientos Viales de los caminos vecinales de la provincia de Santiago de Chuco.

Dentro de este marco, a su vez contando con la CONFORMIDAD de VALORIZACIÓN N° 03 del área responsable (documento de referencia b); siguiendo el trámite correspondiente; esta Jefatura de Operaciones del IVP de Santiago de Chuco, como parte de sus funciones, realizó la evaluación dicha documentación por medio del Monitor designado, el Ing. Frank Renato Gutiérrez Contreras, la cual se detalla en su informe respectivo (documento de referencia a); de esta manera se dará CONFORMIDAD (de no haber observaciones); a fin de dar paso a la evaluación para la APROBACIÓN por parte de su persona.

I. INFORME GENERAL:

A) INFORMACIÓN TÉCNICA:

Nombre de Servicio

SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: "EMP. PE-3N (PISCOCHACA) – SHUBA – NABOBAL – SOCOBAMBA – EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS) LONG= 11.620 KM"; "EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) MIRADOR – EMP. LI-118 (OROCULLAY) LONG= 8.710" Y "EMP. PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHQUILCA LONG= 8.000 KM" DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.

EJECUTOR:

Convocatoria del servicio	: RES-PROC-10-2020-MPSCH/CS-1
Fuente de Financiamiento	: Recursos por operaciones oficios de crédito
Modalidad Contratación	: A suma alzada
Contrato de Servicio	: N° 018-2020-MPSCH-LOG
Decreto de Urgencia	: N° 070-2020
Fecha de Suscripción	: 28-08-2020
Contratista	: CONSORSICIO VIAL MIRAFLORES
Residente del Servicio	: Ing. Carlos Eduardo Roncal Morales
Monto Referencial del Servicio	: S/. 2,414,792.54 (INCL. IGV)
Monto del Contrato del Servicio	: S/. 2,414,700.00 (INCL. IGV).
Adelanto Directo	: NO APLICA
Plazo de Ejecución	: MANTENIMIENTO PERIODICO - 120 DC (sujeto a firma de contrato). MANTENIMIENTO RUTINARIO – 360 DC
Fecha Entrega Terreno	: 29/08/2020
Resolución de Aprobación de P.T.	: RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 149-2020-MPSCH/GM
Fecha de Aprobación	: 21/09/2020
Fecha Inicio Servicio Contractual	: 22/09/2020
Fecha Término Servicio Contractual	: 31/12/2021

INSPECCIÓN:

Inspector de Servicio	: Ing. Luis Branco León León
Contrato de Inspección	: N° 030-2020-MPSCH-LOG
Fecha de Designación	: 24/08/2020
Monto Contractual	: S/. 26,193.50
Plazo de Designación	: 120 DC (MANTENIMIENTO PERIÓDICO)

II. ANALISIS

Según lo detallado y analizado en el Informe del Monitor designado, la Sub Gerencia de Infraestructura (área responsable) y del Inspector concerniente a la VALORIZACIÓN N° 02 (del 01 al 31 de octubre) de la Fase II: MANTENIMIENTO PERIÓDICO del servicio en mención, presentada por el Contratista, se tiene la siguiente información resumida a considerar:

A) DEL AVANCE EJECUTADO

Los metrados ejecutados por tramos son:

TRAMO: EMP. PE-3N (PISCOCHACA) – SHUBA – NABOBAL – SOCOBAMBA – EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS)

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATADO	CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS				% EJECUTADO
				ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR EJECUTAR	
1.00	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	0.50	0.00	0.50	0.50	50.00%
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	11.62	8.40	3.22	11.62	0.00	100.00%
2.00	PAVIMENTOS							
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	2,905.00	2040.00	865.00	2,905.00	0.00	100.00%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	8,715.00	6150.00	2,565.00	8,715.00	0.00	100.00%
3.00	TRANSPORTE							
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	8,985.00	6225.00	2,760.00	8,985.00	0.00	100.00%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	65,727.28	44925.00	20,802.28	65,727.28	0.00	100.00%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	5,580.00	3675.00	1,905.00	5,580.00	0.00	100.00%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	28,408.50	19150.00	9,258.50	28,408.50	0.00	100.00%
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE							
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	11,620.00	8200.00	3,420.00	11,620.00	0.00	100.00%
5.00	SEÑALIZACION							
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00%
05.02.	SENALES PREVENTIVAS	und	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00%
05.03.	SENALES REGLAMENTARIAS	und	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00%
05.04.	SENALES INFORMATIVAS	und	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00%
6.00	IMPACTO AMBIENTAL							
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%
7.00	EMERGENCIA SANITARIA							
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	0.50	0.25	0.75	0.25	75.00%

TRAMO: EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) MIRADOR – EMP. LI-118 (OROCULLAY)

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATADO	CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS				% EJECUTADO
				ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR EJECUTAR	
1.00	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	0.50	0.00	0.50	0.50	50.00%
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	8.71	8.71	0.00	8.71	0.00	100.00%
2.00	PAVIMENTOS							
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	2,177.50	125.00	2,052.50	2,177.50	0.00	100.00%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	6,532.50	375.00	6,157.50	6,532.50	0.00	100.00%
3.00	TRANSPORTE							
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	6,735.00	405.00	6,330.00	6,735.00	0.00	100.00%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	39,459.53	1995.00	37,464.53	39,459.53	0.00	100.00%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	4,125.00	195.00	3,930.00	4,125.00	0.00	100.00%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	15,015.23	1125.00	13,890.23	15,015.23	0.00	100.00%
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE							
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	8,710.00	2800.00	5,910.00	8,710.00	0.00	100.00%
5.00	SEÑALIZACION							
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00%
05.02.	SENALES PREVENTIVAS	und	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00%
05.03.	SENALES REGLAMENTARIAS	und	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00%
05.04.	SENALES INFORMATIVAS	und	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00%
6.00	IMPACTO AMBIENTAL							
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%
7.00	EMERGENCIA SANITARIA							
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	0.50	0.25	0.75	0.25	75.00%

TRAMO: EMP. PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHQUILCA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATADO	CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS				% EJECUTADO
				ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR EJECUTAR	
1.00	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	0.50	0.00	0.50	0.50	50.00%
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	100.00%
2.00	PAVIMENTOS							
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	2,000.00	250.00	1,750.00	2,000.00	0.00	100.00%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	6,000.00	645.00	5,355.00	6,000.00	0.00	100.00%
3.00	TRANSPORTE							
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	6,180.00	735.00	5,445.00	6,180.00	0.00	100.00%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	33,990.00	3735.00	30,255.00	33,990.00	0.00	100.00%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	3,770.00	405.00	3,365.00	3,770.00	0.00	100.00%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	12,390.00	1110.00	11,280.00	12,390.00	0.00	100.00%
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE							
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	8,000.00	1300.00	6,700.00	8,000.00	0.00	100.00%
5.00	SENALES							
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00%
05.02.	SENALES PREVENTIVAS	und	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00%
05.03.	SENALES REGLAMENTARIAS	und	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%
05.04.	SENALES INFORMATIVAS	und	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%
6.00	IMPACTO AMBIENTAL							
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%
7.00	EMERGENCIA SANITARIA							
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	0.50	0.25	0.75	0.25	75.00%

Las partidas que se vienen ejecutando a la fecha corresponden a las obras preliminares (movilización y desmovilización de equipos, trazo y replanteo), asimismo, se está ejecutando las partidas de colocación de pavimento (capa nivelante y afirmado) por lo cual se ejecuta a su vez las partidas de transporte de material excedente; también se realizó parte de la partida reconformación de cunetas; finalmente la partida de emergencia sanitaria COVID 19 se ejecutó a un 50%. Todo viene siendo ejecutado conforme a las normas de evaluación, dentro de los lineamientos y Especificaciones Técnicas establecidos en el Plan de Trabajo, elaborado por el Contratista y previamente aprobado por la Entidad.

En cuanto al avance acumulado ejecutado respecto al programado (curva S) tenemos el siguiente resumen:

N° VAL.	MES	PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCE MENSUAL ACUM.	
				EJECUTADO	PROGRAMADO
3	NOVIEMBRE	01/11/2020	30/11/2020	89.20%	70.80%

Se observa un porcentaje de avance general POSITIVO del **+18.40%**, lo cual significa que la ejecución está adelantada.

B) DEL MONTO VALORIZADO

De acuerdo con las actividades ejecutadas se tiene una valorización con la siguiente configuración:

N° Valorización	Valorización Bruta	MONTO A PAGAR	IGV	Valorización del mes
		S/IGV		

N° 01. Septiembre	S/.103,172.94	S/.103,172.94	S/.18,571.13	S/.121,744.07
N° 02. Octubre	S/.502,262.76	S/.502,262.76	S/.90,407.30	S/.592,670.06
N° 03. Noviembre	S/.909,688.62	S/.909,688.62	S/.163,743.95	S/.1,073,432.57
N° 04. Diciembre	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00

Parcial	S/.1,515,124.32	S/.1,515,124.32	S/.272,722.38	S/.1,787,846.70
---------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------

ADICIONALES

0	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00
---	---------	---------	---------	---------

Total General	S/.1,515,124.32	S/.1,515,124.32	S/.272,722.38	S/.1,787,846.70
---------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------

Se observa que la VALORIZACIÓN N° 03 del mes de noviembre corresponde a un monto de **S/. 1,073,432.57 (inc. IGV)**.

Por lo cual se tiene el siguiente detalle:

➤ VALORIZACIÓN BRUTA	S/.	909,688.62
➤ IGV (18%)	S/.	163,743.95
➤ <u>VALORIZACIÓN NETA</u>	S/.	<u>1,073,432.57</u>
➤ <u>RETENCIÓN G.F.V</u>	S/.	<u>0.00</u>
➤ SALDO A COBRAR	S/.	1,073,432.57

El saldo a cobrar por la VALORIZACIÓN N° 00 del 01 al 30 del mes de noviembre es de **S/. 1,073,432.57 (UN MILLÓN SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 57/100 NUEVOS SOLES) incluido el I.G.V.**

C) DE PENALIDADES PRESENTADAS

No se presentó ninguna ocurrencia que suponga la aplicación de PENALIDAD según las estipulaciones del contrato de servicio de en su CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.

III. CONCLUSIONES

Tomando en cuenta todo lo analizado anteriormente, se hace las siguientes conclusiones:

- ❖ La diferencia entre el avance ejecutado respecto al programado arroja un **porcentaje positivo de +18.40%**.
- ❖ El saldo a pagar por la VALORIZACIÓN N° 03 del mes de noviembre es de **S/. 1,073,432.57 (UN MILLÓN SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 57/100 NUEVOS SOLES inc. IGV)**.
- ❖ **No se presentaron PENALIDADES.**
- ❖ Se da **CONFORMIDAD** por parte de la oficina de Jefatura de Operaciones del IVP Santiago de Chuco a la VALORIZACIÓN N° 03 del servicio en mención.

IV. RECOMENDACIONES

Se recomienda **APROBAR** la presente VALORIZACIÓN N° 03 por su persona, a fin de realizar el pago correspondiente del CONSORCIO VIAL MIRAFLORES, conforme a lo estipulado en el cronograma programado del Plan de Trabajo del servicio y a lo ejecutado en campo. De igual modo, se sugiere seguir las recomendaciones indicadas en el Informe del Monitor designado (documento de referencia a).

Es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y fines.

ATENTAMENTE


Ing. Guillermo Chávez Luis F.
C.I. 190782
JEFE DE OPERACIONES

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

INFORME N° 016-2020-IVP-MPSCH/TACSMRP/FRGC



A : Ing. Luis Francisco Gutierrez Chavez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Santiago Chucú

DE : Ing. Frank Renato Gutierrez Contreras
Técnico Administrativo del Área del IVP – MPSCH – La Libertad

ASUNTO : ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°03 del 01/11/2020 al 30/11/2020 PARA SU TRAMITE RESECTIVO.
SERVICIO: Mantenimiento Periodico y Rutinario de los Caminos Vecinales Tramo:
- Emp.PE-3N (PISCOCHACA) – SHUBA – NABOBAL – SOCOBAMBA – Emp.PE-3N (LAS PIEDRAS) LONG= 11.620.
- Emp.PE-3N (MOLLEBAMBA) – MIRADOR – Emp.LI-118 (ORUCULLAY) LONG= 8.710.
- Emp.PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHQUILCA LONG= 08.000 - DISTRITO DE MOLLEBAMBA PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

REFERENCIA : CARTA N° 006-2020/CONSORCIO VIAL MIRAFLORES/RL/EGD
CARTA N°007-2020/LBLL-IO/MPSCH
INFORME N° 006-2020 LBLL/INSP
INFORME N° 0247-2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH
INFORME N°1306-2020-MPSCH/DIST/SGI
D.U.N° 070-2020

FECHA : Santiago de Chucú, 17 de Diciembre del 2020

Previo cordial saludo y afecto, por medio del presente tengo a bien manifestarle con respecto al asunto de la referencia lo siguiente:

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN TÉCNICA:
Ejecución de Servicio

: MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO Emp.PE-3N (PISCOCHACA) – SHUBA – NABOBAL – SOCOBAMBA – Emp.PE-3N (LAS PIEDRAS) DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD DE CHUCO –PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.

Longitud	: 11.620 Km.
Superficie de Rodadura	: Afirmado.
Ancho de Superficie	: 4.00 m.
Altura Promedio	: 3123.50 m.s.n.m.
Radio Mínimo en CH	: 15.00 m.
Radio Curvas de Volteo	: 10.00 m.
Peralte Máximo	: 12.00%
Bombeo	: 2.00%
Pendiente Máxima	: 15.30%
Pendiente Mínima	: 0.20%
Espesor de Afirmado	: 0.15 m.
Velocidad Directriz	: 30 km/h.
Perfilado de Cunetas	: Terreno natural
Hitos Kilométricos	: 12 unidades

UBICACIÓN DEL TRAMO : Emp.PE-3N (PISCOCHACA)-SHUBA-NABOBAL-SOCOBAMBA-Emp.PE-3N(LAS PIEDRAS)

Distrito : Mollebamba
Provincia : Santiago de Chuco
Región : La Libertad

Coordenadas Geográficas Inicio

Norte : 9098857.71 N
Este : 829852.457 E
Altitud : 2998.00 m.s.n.m.

Coordenadas Geográficas Final

Norte : 9096918.571 N
Este : 832171.685 E
Altitud : 3249 m.s.n.m

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Ejecución de Servicio : MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO Emp.PE-3N (MOLLEBAMBA) – EL MIRADOR – Emp.LI-118 (ORUCULLAY) DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD.

Longitud : 8.710 Km.
Superficie de Rodadura : Afirmado.
Ancho de Superficie : 4.00 m.
Altura Promedio : 3386.07 m.s.n.m.
Radio Mínimo en CH : 15.00 m.
Radio Curvas de Volteo : 10.00 m.
Peralte Máximo : 12.00%
Bombeo : 2.00%
Pendiente Máxima : 15.30%
Pendiente Mínima : 0.20%
Espesor de Afirmado : 0.15 m
Velocidad Directriz : 30 km/h.
Perfilado de Cunetas : Terreno natural
Hitos Kilométricos : 9 unidades

UBICACIÓN DEL TRAMO : Emp.PE-3N (MOLLEBAMBA)-EL MIRADOR-Emp.LI-118 (ORUCULLAY).

Distrito : Mollebamba
Provincia : Santiago de Chuco
Región : La Libertad

Coordenadas Geográficas Inicio

Norte : 9095340.938 N
Este : 833641.099 E
Altitud : 3121.660 m.s.n.m.

Coordenadas Geográficas Final

Norte : 9100740.386 N
Este : 835585.384 E
Altitud : 3650.48 m.s.n.m.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Ejecución de Servicio : MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES
TRAMO Emp.PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES - MICHQUILCA DEL DISTRITO
DE MOLLEBAMBA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD.

Longitud : 8.000 Km.
Superficie de Rodadura : Afirmado.
Ancho de Superficie : 4.00 m.
Altura Promedio : 3471.475 m.s.n.m.
Radio Mínimo en CH : 15.00 m.
Radio Curvas de Volteo : 10.00 m.
Peralte Máximo : 12.00%
Bombeo : 2.00%
Pendiente Máxima : 15.30%
Pendiente Mínima : 0.20%
Espesor de Afirmado : 0.15 m.
Velocidad Directriz : 30 km/h.
Perfilado de Cunetas : Terreno natural
Hitos Kilométricos : 9 unidades

UBICACIÓN DEL TRAMO : Emp.PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES - MICHQUILCA.

Distrito : Mollebamba
Provincia : Santiago de Chuco
Región : La Libertad

Coordenadas Geográficas Inicio

Norte : 9098795.119 N
Este : 831342.689 E
Altitud : 3096.65 m.s.n.m.

Coordenadas Geográficas Final

Norte : 9103622.684 N
Este : 832015.069 E

Altitud

: 3246.30 m.s.n.m.

DATOS DEL MANTENIMIENTO

EJECUTOR:

Proceso de Selección : PES-PROG-010-2020-MPSCH/CS
Contratista : CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
Representante Legal : Edgar Gomez Dominguez
Contrato de Servicios : N°018-2020-MPSCH-LOG.
Suscripción de Contrato : 28/08/2020
Modalidad : A Suma Alzada
Valor Referencial (inc. IGV) : S/ 2.414,700.00
Monto Contratado (inc. IGV) : S/ 2.414,700.00
Fuente de Financiamiento : Recurso por Operaciones Oficio de Credito
Plazo de Ejecución Inicial : 500 Dias Calendarios
Entrega de Terreno : 05 de setiembre del 2020
Inicio de Plazo Contractual : 21 de Setienbre del 2020 (Elaboración de plan de trabajo)
Inicio de Plazo Fase II : 22 de septiembre del 2020
Fecha Término Programado : 31 de Diciembre del 2020
Residente de Obra : Ing. Carlos Eduardo Roncal Morales

TRAMO: PISCOCHACA – SHUBA – NABOBAL – SOCOBAMBA - LAS PIEDRAS

Porcentaje Programado : 33.19 %
Porcentaje Programado Acumulado: 37.93 %
Porcentaje Ejecutado : 58.90 %
Porcentaje Ejecutado Acumulado : 64.00 %
Monto Valorizado : S/ 218,139.86

TRAMO: MOLLEBAMBA – EL MIRADOR - ORUCULLAY

Porcentaje Programado : 32.97 %
Porcentaje Programado Acumulado : 70.65 %
Porcentaje Ejecutado : 74.33 %
Porcentaje Ejecutado Acumulado : 88.54 %
Monto Valorizado : S/ 457,991.49

TRAMO: TULPO – MIRAFLORES – MICHQUILCA

Porcentaje Programado : 32.91 %
Porcentaje Programado Acumulado: 70.52 %
Porcentaje Ejecutado : 70.20 %
Porcentaje Ejecutado Acumulado : 88.00 %
Monto Valorizado : S/ 397,301.22

INSPECTOR:

Inspector : Ing. Luis Branco Leon Leon CIP 153510
Fecha de Contrato : 24/08/2020
Plazo de Prestación de Servicio : 120 Días Calendarios
Monto Contratado (inc. IGV) : S/ 26,193.50

2. ANTECEDENTES.

. Mediante Carta N° 006-2020/CONSORCIO VIAL MIRAFLORES/RL/EGD. de fecha 30 de Noviembre 2020, la Empresa CONSORCIO VIAL MIRAFLORES, con Representante Comun el Sr. Sr. Edgar Gomez Dominguez, realizo la entrega de la Valorizacion N° 03 del SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: Emp.PE-3N (PISCOCHACA) – SHUBA – NABOBAL – SOCOBAMBA – Emp.PE-3N (LAS PIEDRAS) LONG= 11.620; TRAMO: Emp.PE-3N (MOLLEBAMBA) – MIRADOR – Emp.LI-118 (ORUCULLAY) LONG= 8.710; TRAMO: Emp.PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHQUILCA LONG= 08.000 DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD” .

Mediante CARTA N° 007-2020/LBLL-IO/MPSCH que hace referencia al INFORME N° 006-2020-LBLL/INSP. De fecha 04 de Diciembre 2020, el Inspector del Servicio, hace pronunciamiento al informe mensual del contratista dando conformidad a la valorización N° 03 de Noviembre del . SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: Emp.PE-3N (PISCOCHACA) – SHUBA – NABOBAL – SOCOBAMBA – Emp.PE-3N (LAS PIEDRAS) LONG= 11.620; TRAMO: Emp.PE-3N (MOLLEBAMBA) – MIRADOR – Emp.LI-118 (ORUCULLAY) LONG= 8.710; TRAMO: Emp.PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHQUILCA LONG= 08.000 DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

Mediante Informe N° 0247-2020-HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH con fecha 10 de Diciembre del 2020 el Ing. Hermes Melendez Tamayo como Jefe de la Division de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco OTORGA LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACION N° 03 DE NOVIEMBRE 2020 del SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: Emp.PE-3N (PISCOCHACA) – SHUBA – NABOBAL – SOCOBAMBA – Emp.PE-3N (LAS PIEDRAS) LONG= 11.620; TRAMO: Emp.PE-3N (MOLLEBAMBA) – MIRADOR – Emp.LI-118 (ORUCULLAY) LONG= 8.710; TRAMO: Emp.PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHQUILCA LONG= 08.000 DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD”

Mediante INFORME N° 1306-2020-MPSCH/DIST/SGI con fecha 11 de Diciembre del 2020 el SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA el Ing. David Ivan Silva Torres hace llegar la CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION N° 03 del mes de Noviembre 2020 del SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: Emp.PE-3N (PISCOCHACA) – SHUBA – NABOBAL – SOCOBAMBA – Emp.PE-3N (LAS PIEDRAS) LONG= 11.620; TRAMO: Emp.PE-3N (MOLLEBAMBA) – MIRADOR – Emp.LI-118 (ORUCULLAY) LONG= 8.710; TRAMO: Emp.PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHQUILCA LONG= 08.000 DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

3. ANÁLISIS Y ESTADO DE SITUACION DEL SERVICIO CONTRATADO – FASE II.

La Sub Gerencia de Infraestructura de la MPSCH da la CONFORMIDAD DE PAGO de la VALORIZACION N° 03 NOVIEMBRE – POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO del CONTRATISTA según el informe se debe pagar según el cuadro adjunto del servicio: : Emp.PE-3N (PISCOCHACA) – SHUBA – NABOBAL – SOCOBAMBA – Emp.PE-3N (LAS PIEDRAS) LONG= 11.620; TRAMO: Emp.PE-3N (MOLLEBAMBA) – MIRADOR – Emp.LI-118 (ORUCULLAY) LONG= 8.710; TRAMO: Emp.PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHQUILCA LONG= 08.000 DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD, se detallan a continuación:

RESUMEN VALORIZACION N° 03- MANTENIMIENTO PERIODICO					
DESCRIPCION	(PISCOCHACA)-SHUBA-NABOBAL-SOCOBAMBA-(LAS PIEDRAS)				
VALORIZACION	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	
COSTO DIRECTO	S/ 30,908.61	S/ 356,797.46	S/ 160,751.55	S/ 548,457.62	
COSTO INDIRECTO (10%)	S/ 3,090.86	S/ 35,679.75	S/ 16,075.16	S/ 54,845.77	
UTILIDAD (5 %)	S/ 1,545.43	S/ 17,839.87	S/ 8,037.58	S/ 27,422.88	
SUB TOTAL	S/ 35,544.90	S/ 410,317.08	S/ 184,864.29	S/ 630,726.27	
IGV (18 %)	S/ 6,398.08	S/ 73,857.07	S/ 33,275.57	S/ 113,530.72	
TOTAL VALORIZADO	S/ 41,942.98	S/ 484,174.15	S/ 218,139.86	S/ 744,256.99	

RESUMEN VALORIZACION N° 03- MANTENIMIENTO PERIODICO					
DESCRIPCION	MOLLEBAMBA - MIRADOR - ORUCULLAY				
VALORIZACION	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	
COSTO DIRECTO	S/ 29,698.13	S/ 34,829.71	S/ 337,502.94	S/ 402,030.79	
COSTO INDIRECTO (10%)	S/ 2,969.81	S/ 3,482.97	S/ 33,750.29	S/ 40,203.07	
UTILIDAD (5 %)	S/ 1,484.91	S/ 1,741.49	S/ 16,875.15	S/ 20,101.55	
SUB TOTAL	S/ 34,152.85	S/ 40,054.17	S/ 388,128.38	S/ 462,335.41	
IGV (18 %)	S/ 6,147.51	S/ 7,209.76	S/ 69,863.11	S/ 83,220.37	
TOTAL VALORIZADO	S/ 40,300.36	S/ 47,263.93	S/ 457,991.49	S/ 545,555.78	

RESUMEN VALORIZACION N° 03- MANTENIMIENTO PERIODICO					
DESCRIPCION	(TULPO) - MIRAFLORES - MICHQUILCA				
VALORIZACION	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	
COSTO DIRECTO	S/ 29,108.86	S/ 45,123.05	S/ 292,779.09	S/ 367,011.00	
COSTO INDIRECTO (10%)	S/ 2,910.89	S/ 4,512.31	S/ 29,277.91	S/ 36,701.11	
UTILIDAD (5 %)	S/ 1,455.44	S/ 2,256.15	S/ 14,638.95	S/ 18,350.54	
SUB TOTAL	S/ 33,475.129	S/ 51,891.51	S/ 336,695.95	S/ 422,062.65	
IGV (18 %)	S/ 6,025.53	S/ 9,340.47	S/ 60,605.27	S/ 75,971.27	
TOTAL VALORIZADO	S/ 39,500.72	S/ 61,231.98	S/ 397,301.22	S/ 498,033.92	

VALORIZACION NOVIEMBRE	
PISCOCHACA - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - LAS PIEDRAS	S/. 218.139.86
MOLLEBAMBA-MIRADOR ORUCULLAY	S/. 457.991.49
TULPO-MIRAFLORES MICHICUILCA	S/. 397.301.22
TOTAL	S/. 1,073.432.57

493 - 210

494 - 211 ✓

495 - 212

Segun el contrato del SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: Emp.PE-3N (PISCOCHACA) – SHUBA – NABOBAL – SOCOBAMBA – Emp.PE-3N (LAS PIEDRAS) LONG= 11.620; TRAMO: Emp.PE-3N (MOLLEBAMBA) – MIRADOR – Emp.LI-118 (ORUCULLAY) LONG= 8.710; TRAMO: Emp.PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHICUILCA LONG= 08.000 DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD. en su clausula decima nos dice que : El Contratista da la autorización para la retención del 10 % de la garantía de fiel cumplimiento a travez de una carta de autorización, la misma que se cumplio de acuerdo a lo establecido con las retenciones correspondientes de Setiembre y Octubre, adjunto el cuadro de retenciones:

RETENCIONES PROYECTADAS MANTENIMIENTO PERIODICO			
PAQUETE - 10	PRESUPUESTO	SETIEMBRE	OCTUBRE
PISCOCHACA-SHUBA- NABOBAL- SOCOBAMBA-LAS PIEDRAS	S/ 990,427.60	S/. 49,521.38	S/. 49,521.38
MOLLEBAMBA- MIRADOR- ORUCULLAY	S/ 742,394.53	S/. 37,119.73	S/. 37,119.73
TULPO - MIRAFLORES - MICHICUILCA	S/ 681,877.87	S/. 34,093.89	S/. 34,093.89
TOTAL CONTRATADO	S/. 2,414,700.00	S/. 120,735.00	S/. 120,735.00
RETENCION 10 %	S/. 241,470.00		

4. CONCLUSION

4.1.- Conforme al análisis realizado del: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: Emp.PE-3N (PISCOCHACA) – SHUBA – NABOBAL – SOCOBAMBA – Emp.PE-3N (LAS PIEDRAS) LONG= 11.620; TRAMO: Emp.PE-3N (MOLLEBAMBA) – MIRADOR – Emp.LI-118 (ORUCULLAY) LONG= 8.710; TRAMO: Emp.PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHQUILCA LONG= 08.000 DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD el monto facturado por la VALORIZACION N° 03 correspondiente al mes de Noviembre del 2020, se hace efectivo la suma de S/. 1,073,432.57 UN MILLON SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 57/100 soles incluido impuestos de ley, con un avance del Servicio :

TRAMO: PISCOCHACA - SHUBA - NABOBAL - LAS PIEDRAS (90.54%)

TRAMO: MOLLEBAMBA – ELMIRADOR – ORUCULLAY (88.54%)

TRAMO: TULPO MIRAFLORES MICHQUILCA (88.00%)

Habiendo realizado las retenciones correspondientes programadas en la Valorizacion N° 01 Setiembre y la Valorizacion N° 02 Octubre con un monto de S/. 241,470.00 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES de acuerdo a la garantía de fiel cumplimiento del 10 %.

Por lo tanto el monto a cancelar al CONTRATISTA POR CONTRATO DE EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO TRAMO: Emp.PE-3N (PISCOCHACA) – SHUBA – NABOBAL – SOCOBAMBA – Emp.PE-3N (LAS PIEDRAS) LONG= 11.620; TRAMO: Emp.PE-3N (MOLLEBAMBA) – MIRADOR – Emp.LI-118 (ORUCULLAY) LONG= 8.710; TRAMO: Emp.PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHQUILCA LONG= 08.000 DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD, correspondiente a la Valorizacion N° 03 del Mes de Noviembre del 2020 la suma de S/. 1,073,432.57 UN MILLON SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 57/100 SOLES

El monto ejecutado de la Valorizacion N° 01 Setiembre, Valorizacion N° 02 Octubre y Valorizacion N° 03 Noviembre es un total acumulado de S/. 1,787,846.69 UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 69/100 SOLES correspondiente al SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO TRAMO: Emp.PE-3N (PISCOCHACA) – SHUBA – NABOBAL – SOCOBAMBA – Emp.PE-3N (LAS PIEDRAS) LONG= 11.620; TRAMO: Emp.PE-3N (MOLLEBAMBA) – MIRADOR – Emp.LI-118 (ORUCULLAY) LONG= 8.710; TRAMO: Emp.PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHQUILCA LONG= 08.000 DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

4.2.- RECOMENDACIÓN

Se le pide al residente como al inspector que tengan permanencia en Obra, para el control de los trabajos que se están ejecutando y en las fotos conste su presencia para el registro.

Se recomienda **Aprobar la Valorización N° 03 de Noviembre** y que siga el trámite correspondiente para su pago respectivo a la Empresa Contratista CONSORCIO VIAL MIRAFLORES y de esta manera continúen los trabajos de ejecución del Servicio: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
TRAMO: Emp.PE-3N (PISCOCHACA) – SHUBA – NABOBAL – SOCOBAMBA – Emp.PE-3N (LAS PIEDRAS) LONG= 11.620; TRAMO: Emp.PE-3N (MOLLEBAMBA) – MIRADOR – Emp.LI-118 (ORUCULLAY) LONG= 8.710
TRAMO: Emp.PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHQUILCA LONG= 08.000 DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

Sin otro particular, me suscribo a Usted, no sin antes reiterar mi estima personal.

Atentamente,

Adjunto:

01 copia Valorización N° 03 ejecutado de Noviembre Long= 11.620 Km.

01 copia Valorización N° 03 ejecutado de Noviembre Long= 8.710 Km.

01 copia Valorización N° 03 ejecutado de Noviembre Long= 8.000 Km.


Frank Renato Gutiérrez Contreras
ING. CIVIL
R. CIP. N° 225088

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Tramo :
Contratista:
Inspector:
Residente:
Jefe de Residentes:
Ing. CARLOS EDUARDO RONCAL MORALES - CIP: 53532
Ing. ANDRÉS LILIANA DELGADO KOBASHIKAWA - CIP: 218998
Ing. LUIS BRANCO LEON LEON - CIP: 153510
CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - (LAS PIEDRAS
(PISCOCHACA) -

Monto Contratado:	S/. 2,414,700.00
Plazo de ejecución:	120 días calendario

[illegible]

375

ANÁLISIS DE VALORIZACION MENSUAL N° 03

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Obra: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABORAL - SOCABAMBA - EMP. PE - 3N(LAS PIEDRAS - LONG.= 11.620 Km. - EMP. PE - 3N(MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI - 118(OROCULLAY) - LONG.= 8.710 Km.; - EMP. - PE - 3N(TULPO) - MIRAFLORES - MICHICUILCA - LONG.= 8.000 - DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
(TULPO) - MIRAFLORES - MICHICUILCA
Tramo : CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
Contratista: ING. LUIS BRANCO LEON LEON - CIP: 153510
Inspector: ING. CARLOS EDUARDO RONCAL MORALES - CIP: 53532
Residente: ING. ANDRÉS LILIANA DELGADO KOBASHIKAWA - CIP: 218998
Asis. de Residente:

Monto Contratado: S/. 2,414,700.00
Plazo de ejecución: 120 días calendario

PRESUPUESTO GENERAL		AVANCE ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
		METRADO	VALORIZADO	METRADO	VALORIZADO	METRADO	VALORIZADO	METRADO	VALORIZADO
Unid	Descripción	Metrado	Precio Si.	Parcial Si.					
DES AGREGADO DE PARTIDAS									
1.00	OBRAS PROVISIONALES								
01.01.	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	gib	S/. 40,220.52	S/. 40,220.52	0.50	20,110.26	50.00%	0.50	20,110.26
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	S/. 988.09	S/. 7,984.72	8.00	7,984.72	100.00%	0.00	0.00
2.00	PAVIMENTOS								
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	S/. 4.62	S/. 9,240.00	250.00	1,155.00	12.50%	1,750.00	8,085.00
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	S/. 32.06	S/. 192,360.00	645.00	20,678.70	10.75%	5,355.00	171,681.30
3.00	TRANSPORTE								
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	S/. 6.57	S/. 40,602.60	735.00	4,828.95	11.89%	5,445.00	35,773.65
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	S/. 0.91	S/. 30,930.80	3,735.00	3,398.85	10.99%	30,255.00	27,532.05
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	S/. 6.57	S/. 24,768.90	405.00	2,660.85	10.74%	3,365.00	22,108.05
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	S/. 0.91	S/. 11,274.90	1,110.00	1,010.10	8.96%	11,280.00	10,264.80
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE								
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	S/. 1.84	S/. 14,720.00	1,300.00	2,392.00	16.25%	6,700.00	12,328.00
5.00	SEÑALIZACION								
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	S/. 315.24	S/. 2,837.16	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
05.02.	SENALES PREVENTIVAS	und	S/. 389.22	S/. 5,838.30	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
05.03.	SENALES REGLAMENTARIAS	und	S/. 389.22	S/. 778.44	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
05.04.	SENALES INFORMATIVAS	und	S/. 468.32	S/. 936.64	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
6.00	IMPACTO AMBIENTAL								
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	S/. 7,274.14	S/. 14,548.28	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
7.00	EMERGENCIA SANITARIA								
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gib	S/. 20,024.96	S/. 20,024.96	0.50	10,012.48	50.00%	0.25	5,006.24
Costo Directo									
GASTOS GENERALES (10% I.C.D.)									
UTILIDAD (5% I.C.D.)									
SUB TOTAL									
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (IGV 18%)									
VALOR REFERENCIAL DE OBRA									
PORCENTAJE AVANCE DE OBRA									
100.00%									
17.80%									
70.20%									
88.00%									
25.00%									
50.00%									
50.055.32									
5,005.52									
2,502.76									
57,563.62									
10,361.46									
67,925.08									
12.00%									

374

ANÁLISIS DE VALORIZACION MENSUAL Nº 03

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Obra: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - EMP. PE-3N(LAS PIEDRAS - LONG = 11,620 Km; - EMP. PE-3N(MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI-118(OROCULLAY) - LONG = 8,710 Km; - EMP. - PE-3N(TULPO) - MIRAFLORES - MICHILICA - LONG = 8,000 - DISTRITO DE MOLLEBAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

Tramo : (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - OROCULLAY

Contratista: CONSORCIO VIAL MIRAFLORES

Inspector: ING. LUIS BRANCO LEON LEON - CIP: 153510

Residente: ING. CARLOS EDUARDO RONCAL MORALES - CIP: 53532

Asis. de Residente: ING. ANDREA LILIANA DELGADO KOBASHIKAWA - CIP: 218988

Monto Contratado: S/. 2,414,700.00
Plazo de ejecución: 120 días calendario

DESAGREGADO DE PARTIDAS		PRESUPUESTO GENERAL				AVANCE ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
		Und	Metrado	Presup. G.	Presup. B.								
1.00	OBRAS PROVISIONALES												
01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	gib	1.00	S/. 40,220.52	S/. 40,220.52	0.50	20,110.26	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.50	20,110.26
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	8.71	S/. 998.09	S/. 8,693.36	8.71	8,693.36	0.00	0.00%	8.71	100.00%	0.00	0.00
2.00	PAVIMENTOS												
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	2177.50	S/. 4.62	S/. 10,060.05	125.00	577.50	2,052.50	9.482.55	2,177.50	100.00%	0.00	0.00
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	6532.50	S/. 32.06	S/. 209,431.95	375.00	12,022.50	6,157.50	197,409.45	6,532.50	100.00%	0.00	0.00
3.00	TRANSPORTE												
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	6735.00	S/. 6.57	S/. 44,248.95	405.00	2,660.85	6,330.00	41,588.10	6,735.00	100.00%	0.00	0.00
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	39459.53	S/. 0.91	S/. 35,908.17	1,995.00	1,815.45	37,464.53	34,092.72	39,459.53	100.00%	0.00	0.00
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	4125.00	S/. 6.57	S/. 27,101.25	195.00	1,281.15	3,930.00	25,820.10	4,125.00	100.00%	0.00	0.00
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	15015.23	S/. 0.91	S/. 13,663.86	1,125.00	1,023.75	13,690.23	12,640.11	15,015.23	100.00%	0.00	0.00
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE												
04.01	RECONSTRUCCIÓN DE CUNETAS	ml	8710.00	S/. 1.84	S/. 16,026.40	2,800.00	5,152.00	5,910.00	10,874.40	8,710.00	100.00%	0.00	0.00
5.00	SEÑALIZACIÓN												
05.01	INSTALACIÓN DE POSTES KILOMÉTRICOS	und	9.00	S/. 315.24	S/. 2,837.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9.00	2,837.16
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	10.00	S/. 389.22	S/. 3,892.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10.00	3,892.20
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	7.00	S/. 389.22	S/. 2,724.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7.00	2,724.54
05.04	SEÑALES INFORMATIVAS	und	5.00	S/. 468.32	S/. 2,341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.00	2,341.60
6.00	IMPACTO AMBIENTAL												
06.01	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ÁREAS OCUPADAS	ha	2.00	S/. 7,274.14	S/. 14,548.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.00	14,548.27
7.00	EMERGENCIA SANITARIA												
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gib	1.00	S/. 22,392.03	S/. 22,392.03	0.50	11,191.02	0.25	5,595.51	0.75	25.00%	0.25	5,595.51
	COSTO DIRECTO				454,080.32		64,527.85		337,502.94				52,049.53
	GASTOS GENERALES (10%) C.D.				45,408.03		6,452.78		33,750.29				5,204.96
	UTILIDAD (5%) C.D.				22,704.02		3,226.40		16,875.15				2,602.47
	SUB TOTAL				522,192.37		74,207.03		388,126.38				59,856.96
	IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (IGV 18%)				93,994.63		13,357.26		83,220.37				10,774.26
	VALOR REFERENCIAL DE OBRA				616,187.00		87,564.29		457,991.49				70,631.22
	PORCENTAJE AVANCE DE OBRA				100.00%		14.21%		74.33%		88.54%		11.46%

382



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” INFORME N° 1306 - 2020-MPSCH/DIST/SGI

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Instituto de Vialidad Municipal (IVP)

RECIBIDO

Exp. 7175
Fecha 11-12-20
Hora 11:55
Folio 371
Firma [Signature]

A : ING. RAFAEL K. VALENCIA REBAZA
Gerente de IVP de la MPSCH

DE : ING. DAVID IVAN SILVA TORRES
Sub Gerente de Infraestructura – MPSCH

ASUNTO : CONFORMIDAD DE VALORIZACION N° 03 CONTRATISTA – CONTRACTUAL
(TRAMO 10)

REFERENCIA : (01) INFORME N° 0247-2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH
(02) CARTA N° 007-2020-LBL-IO/MPSCH
(03) OBRA: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: TRAMO 01: EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS)” - LONG. = 11.620 KM;
TRAMO 02: EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI-118 (ORUCULLAY)” - LONG. = 8.710 KM;
TRAMO 03: EMP. PE-3N (TULPO) - MIRAFLORES - MICHICUILCA” - LONG. = 8.000 KM EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.” Perteneciente al paquete N° 10
(04) CONTRATO DE SERVICIO N° 018-2020-MPSCH-LOG

FECHA : Santiago de Chuco, 11 de Diciembre del 2020

Me es sumamente honroso dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo; por otro lado referente al asunto de la presente manifiesto lo siguiente:

I. BASE LEGAL

- Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 27972 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
- Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
- Reglamento Nacional de Edificaciones

II. ANTECEDENTE

- ✓ Mediante el documento de la referencia, **INFORME N° 0247-2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH**, el Encargado de la División de Supervisión y Liquidación de Obras, con fecha 11 de Diciembre del 2020, da la **CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION N° 03 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO** del contratista “**CONSORCIO VIAL MIRAFLORES**”; presentado por el Ing. **LUIS BRANCO LEÓN LEÓN** - INSPECTOR de la obra denominada: “**MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: TRAMO 01: EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS)**” - LONG. = 11.620 KM; **TRAMO 02: EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI-118 (ORUCULLAY)**” - LONG. = 8.710 KM; **TRAMO 03: EMP. PE-3N (TULPO) - MIRAFLORES - MICHICUILCA**” - LONG. = 8.000 KM EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE

[Signature]
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

CHUCO - LA LIBERTAD"; quien solicita el Pago N° 03 por servicios de ejecución de obra al CONTRATISTA "CONSORCIO VIAL MIRAFLORES."

III. ANALISIS FINANCIERO

Se detallan en los cuadros de los tramos valorizados

TRAMOS N°10.01: EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS) - LONG. = 11.620 K

VALORIZACION BRUTA	S/. 184,864.28
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (-) SIN IGV	S/. -
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (-) SIN IGV	S/. -
VALORIZACION NETA	S/. 184,864.28
IGV (18%)	S/. 33,275.58
VALORIZACION (INCL. IGV)	S/. 218,139.86
RETENCION DE 10% FIEL CUMPLIMIENTO	

TRAMOS N°10.02: EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI-118 (ORUCULLAY) - LONG. = 8.710 KM

VALORIZACION BRUTA	S/. 388,128.38
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (-) SIN IGV	S/. -
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (-) SIN IGV	S/. -
VALORIZACION NETA	S/. 388,128.38
IGV (18%)	S/. 69,863.11
VALORIZACION (INCL. IGV)	S/. 457,991.49
RETENCION DE 10% FIEL CUMPLIMIENTO	

TRAMOS N°10.03: EMP. PE-3N (TULPO) - MIRAFLORES - MICHQUILCA - LONG. = 8.000 KM

VALORIZACION BRUTA	S/. 336,695.95
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (-) SIN IGV	S/. -
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (-) SIN IGV	S/. -
VALORIZACION NETA	S/. 336,695.95
IGV (18%)	S/. 60,605.27
VALORIZACION (INCL. IGV)	S/. 397,301.22
RETENCION DE 10% FIEL CUMPLIMIENTO	

COSTO GLOBAL DE TODO EL SERVICIO

VALORIZACION BRUTA	S/. 909,688.61
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (-) SIN IGV	S/. -
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (-) SIN IGV	S/. -
VALORIZACION NETA	S/. 909,688.61
IGV (18%)	S/. 163,743.96
VALORIZACION (INCL. IGV)	S/. 1'073,432.57
RETENCION DE 10% FIEL CUMPLIMIENTO	Se retuvo todo
MONTO TOTAL	S/. 1'073,432.57

Sub Gerente de Infraestructura



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ La **Valorización Bruta N° 03 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO** del contratista fue por **S/. 909,688.61 (NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 61/100 SOLES)**.
- ✓ Se recomendó en las primeras valorizaciones hacer el descuento total de la RETENCION DEL 10% GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO **S/. 241,470.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES) INCLU IGV**; esta recomendación ya se aplicó obviarla y si aún queda saldo por retener se deja a criterio del Área encargada.
- ✓ La Amortización del Adelanto Directo: -
- ✓ La Amortización del Adelanto de Materiales: -
- ✓ Por lo tanto, el monto a cancelar al **CONTRATISTA POR CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA VALORIZACION N°03 - POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO**; asciende a **S/. 1'073,432.57 (UN MILLON SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 57/100 SOLES) INCL. IGV**; se recomienda hacer la retención de fiel cumplimiento.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y acciones que estime por conveniente, salvo mejor parecer.

Atentamente,

Adjunto:

- Referencias
- Val N°03()
- Digital ()

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ina. Devorán Silva Torres
SUB GERENTE DE BIENESTAR SOCIAL



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019

E-mail: mpsch@terra.com.pe



INFORME N° 247 – 2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSC

RECIBIDO
Fecha: 11/12/20 Hora: 9:24
N° de Folia: 368
Firma: _____



A : ING° DAVID IVAN SILVA TORRES
SUB-GERENTE DE INFRAESTRUCTURA MPSCH

DEL : ING. HERMES M. MELENDEZ TAMAYO
JEFE (e) DIVISIÓN DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

ASUNTO : VALORIZACIÓN DE SERVICIO N°03 – NOVIEMBRE 2020

REFERENCIA: a) "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO I EMP-PE 3N – PISCOCHACA – SHUBA – NAMOBAL – SOCOBAMBA – EMP PE 3N LAS PIEDRAS, LONG 11.620 KM; TRAMO II EMP PE 3N – MOLLEBAMBA – EL MIRADOR – EMP LI 118 – ORUCULLAY, LONG 8.710 KM; TRAMO III EMP PE 3N – TULPO – MIRAFLORES – MICHQUILCA, LONG 8.000 KM DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"

b) Carta N°007-2020/LBLL- IO/MPSC

d) Carta N°006-2020/CONSORCIO VIAL MIRAFLORES/RL/EGD

FECHA : Santiago de Chuco, 10 de Diciembre del 2020

Es grato dirigirme a Usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo, vistos los documentos de la referencia, el suscrito como Jefe de la División de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco **OTORGA LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN N° 03- NOVIEMBRE 2020** del Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO I EMP-PE 3N – PISCOCHACA – SHUBA – NAMOBAL- SOCOBAMBA – EMP PE 3N LAS PIEDRAS, LONG 11.620 KM; TRAMO II EMP PE 3N – MOLLEBAMBA – EL MIRADOR – EMP LI 118 – ORUCULLAY, LONG 8.710 KM; TRAMO III EMP PE 3N – TULPO – MIRAFLORES – MICHQUILCA, LONG 8.000 KM DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD" y elaborado por el Contratista CONSORCIO VIAL MIRAFLORES según Contrato de Servicios N° 018-2020-MPSCH-LOG.

Se informa trabajos valorizados en el periodo del 01 al 30 de Noviembre 2020.

DATOS GENERALES

1.- DENOMINACION

"MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO I EMP-PE 3N – PISCOCHACA – SHUBA – NAMOBAL- SOCOBAMBA – EMP PE 3N LAS PIEDRAS, LONG 11.620 KM; TRAMO II EMP PE 3N – MOLLEBAMBA – EL MIRADOR – EMP LI 118 – ORUCULLAY, LONG 8.710 KM TRAMO III EMP PE 3N – TULPO – MIRAFLORES – MICHQUILCA, LONG 8.000 KM DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"

2.- UBICACIÓN

- Caseríos : Tramo I: Piscochaca, Shuba, Namobal, Socobamba, Las Piedras
Tramo II: Mollebamba, El Mirador, Orucullay
Tramo III: Tulpo, Miraflores, Michiquilca
- Distrito : Mollebamba
- Provincia : Santiago de Chuco
- Región : La Libertad

3.- DATOS DEL MANTENIMIENTO:

EJECUTOR



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019

E-mail: mpsch@terra.com.pe



- Proceso de Selección : RES-PROG- 010-2020-MPSCH-2
- Contratista : **CONSORCIO VIAL MIRAFLORES**
- Representante Legal : Edgar Gómez Domínguez
- Contrato de Servicios : N° 018-2020-MPSCH-LOG.
- Suscripción de Contrato : 28/08/2020
- Modalidad : A Suma Alzada
- Monto Contratado (inc. IGV) : S/ 2,414,700.00
- Factor de Relación : 1.000
- Plazo de Ejecución Inicial : 500 Días Calendarios
- Entrega de Terreno : 29/08/2020
- Inicio de Plazo Contractual II : 22 de Setiembre del 2020
- Fecha Término Programado : 31 de Diciembre del 2022
- Residente de Obra : Ing. Carlos E. Roncal Morales CIP 53532
- **TRAMO I: Piscochaca, Shuba, Namobal, Socobamba, Las Piedras**
- Porcentaje Programado : 33.19%
- Porcentaje Programado Acumulado : 71.12%
- Porcentaje Ejecutado : 58.90%
- Porcentaje Ejecutado Acumulado : 64.00%
- Estado del Mantenimiento : Atrasado
- Monto Valorizado : S/. 218,139.86
- **TRAMO II: Mollebamba, El Mirador, Orucullay**
- Porcentaje Programado : 32.97%
- Porcentaje Programado Acumulado : 70.65%
- Porcentaje Ejecutado : 74.33%
- Porcentaje Ejecutado Acumulado : 88.54%
- Estado del Mantenimiento : Adelantado
- Monto Valorizado : S/. 457,991.49
- **TRAMO III: Tulpo, Miraflores, Michiquilca**
- Porcentaje Programado : 32.91%
- Porcentaje Programado Acumulado : 70.52%
- Porcentaje Ejecutado : 70.20%
- Porcentaje Ejecutado Acumulado : 88.00%
- Estado del Mantenimiento : Adelantado
- Monto Valorizado : S/. 397,301.22

INSPECTOR

- Inspector : Ing. Luis Branco León León CIP 153510
- Contrato de Inspección de Obra : N° 030-2020-MPSCH-LOG.
- Fecha de Contrato : 24/08/2020
- Plazo de Prestación de Servicio : 120 Días Calendario
- Monto Contratado (inc. IGV) : S/ 26,193.50

4.- ANTECEDENTES

- Con fecha 28 de Agosto del 2020 se firma el Contrato de Servicios N°018-2020-MPSCH-LOG del Mantenimiento Periódico y Rutinario – Paquete N°12 “**MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO I EMP-PE 3N – PISCOCHACA – SHUBA – NAMOBAL -SOCOBAMBA- EMP PE 3N LAS PIEDRAS, LONG 11.620 KM; TRAMO II EMP PE 3N – MOLLEBAMBA – EL MIRADOR – EMP LI 118 – ORUCULLAY, LONG 8.710 KM TRAMO III EMP PE 3N – TULPO – MIRAFLORES – MICHICUILCA, LONG 8.000 KM DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD**” con la Empresa Contratista **CONSORCIO VIAL MIRAFLORES** por un monto de S/. 2'414,700.00, con un plazo de ejecución de 500 días calendario.






Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



366

- El día 24 de Agosto del 2020 se firma el Contrato de Inspección de Servicio N°030-2020-MPSCH-LOG con el Consultor Ing. Luis Branco León León CIP153510 por un monto de S/.26,193.50 con un plazo de ejecución de 120 días calendario.
- Con fecha 29/08/2020 se firma el Acta de Entrega de Terreno con la participación de representantes de todos los involucrados.
- El 22/09/2020 se firma el Acta de Inicio de Obra con una fecha programada de término de servicio del 31 de Diciembre 2020.
- Con fecha 16 de Setiembre del 2020 el Inspector recepciona la Carta N°001-2020/CONSORCIO VIAL MIRAFLORES/RL/EGD con la cual el Consorcio hace entrega del Plan de Trabajo para su revisión y tramite respectivo.
- El Ingeniero Inspector del Servicio mediante Carta N°002-2020/LBLL- IO/MPSCH del 18 de Setiembre del 2020 ingresa por mesa de partes de la Entidad con Expediente Administrativo N° 4423 el Plan de Trabajo aprobado para su Conformidad.
- Mediante INFORME N°124-2020-HMMT/DEYP/SGI/MPSCH, de fecha 19 de Setiembre del 2020 la División de Estudios y Proyectos otorga la Conformidad del Plan de Trabajo y sugiere su aprobación mediante la Resolución Respectiva.
- Con Resolución de Gerencia Municipal N°00012-2020-MPSCH/GM de fecha 28 de Setiembre 2020 de Aprueban el Plan de Trabajo del Mantenimiento Rutinario y Periódico.
- Mediante Carta N°002-2020/LBLL- IO/MPSCH el Ing. Inspector hace llegar la Valorización de Servicio N°01 – Setiembre 2020 adjunto a la Carta N°001-2020/CONSORCIO VIAL MIRAFLORES/RL/EGD para su revisión y conformidad de pago.
- Mediante Carta N°004-2020/LBLL- IO/MPSCH el Ing. Inspector hace llegar la Valorización de Servicio N°02 – Octubre 2020 adjunto a la Carta N°004-2020/CONSORCIO VIAL MIRAFLORES/RL/EGD para su revisión y conformidad de pago.
- Mediante Carta N°006-2020/LBLL- IO/MPSCH el Ing. Inspector hace llegar la Valorización de Servicio N°02 – Octubre 2020 adjunto a la Carta N°005-2020/CONSORCIO VIAL MIRAFLORES/RL/EGD para su revisión y conformidad de pago.
- Mediante Carta N°007-2020/LBLL- IO/MPSCH el Ing. Inspector hace llegar la Valorización de Servicio N°03 – Noviembre 2020 adjunto a la Carta N°006-2020/CONSORCIO VIAL MIRAFLORES/RL/EGD para su revisión y conformidad de pago.



5.- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MANTENIMIENTO

- Movilización de Equipos y Maquinaria desde Trujillo a pie de obra. Se ha trasladado 01 excavadora, 01 motoniveladora, 01 rodillo liso autopropulsado, 01 cisterna para agua, 02 volquetes de 15m3, 01 camioneta y 01 combi para transporte de personal.
- Ejecución de partida de Trazo y Replanteo en un total del 100% del tramo con el uso de equipo topográfico completo y dejando monumentados BMs y niveles.
- Implementación de protocolos de seguridad y equipamiento con EPPs para todo el personal.
- Transporte de personal técnico en camioneta y personal obrero en una combi.
- Ejecución de Capa Nivelante de $e=0.05m$ empleando 4,660m3 de material acumulando 100% del metrado total.
- Extracción, selección, acarreo y apilamiento en lugares estratégicos de 103,000 m3 aprox. De material para afirmado.
- Colocación, nivelación, conformación y compactación de Material Granular para afirmado habiendo empleado 14,070m3 de material con el uso de maquinaria acumulando el 100% del total.
- Eliminación de aproximadamente 43,600 m3 de material excedente hasta botaderos autorizados.
- Conformación y Perfilado de Cunetas con maquinaria y mano de obra en tramo de 16,020 ml, acumulando el 100.00% de la longitud total.
- Implementación de protocolos de seguridad y equipamiento con EPPs para todo el personal.



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



6.-DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICION:

RESUMEN VALORIZACIÓN N° 03 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (01 al 30 de Noviembre 2020)

TRAMO I Piscochaca, Shuba, Namobal, Socobamba, Las Piedras

VALORIZACIÓN CONTRACTUAL	SIN IGV		S/. 184,864.28
REINTEGROS (REAJUSTES RECONOCIDOS)	S/. SIN IGV	0.00	S/. 0.00
	S/. SIN IGV	0.00	
VALORIZACION BRUTA			S/.184,864.28
AMORTIZACIONES	SIN IGV		S/.0.00 (-)
ADELANTO DIRECTO	S/.		
ADELANTO PARA MATERIALES	S/.	0.00	
DEDUCCIONES (DQNC)			S/. 0.00
ADELANTO DIRECTO	S/.	0.00	
ADELANTO PARA MATERIALES	S/.	0.00	
VALORIZACION NETA			S/. 184,864.28
I. G. V. 18.00%			S/. 33,275.58
NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA			S/. 218,139.86

SON : DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 86/100 SOLES

RESUMEN VALORIZACIÓN N° 03 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (01 al 30 de Noviembre 2020)

TRAMO II Mollebamba, El Mirador, Orucullay

VALORIZACIÓN CONTRACTUAL	SIN IGV		S/. 388,128.38
REINTEGROS (REAJUSTES RECONOCIDOS)	S/. SIN IGV	0.00	S/. 0.00
	S/. SIN IGV	0.00	
VALORIZACION BRUTA			S/.388,128.38
AMORTIZACIONES	SIN IGV		S/.0.00 (-)
ADELANTO DIRECTO	S/.		
ADELANTO PARA MATERIALES	S/.	0.00	



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019

E-mail: mpsch@terra.com.pe



DEDUCCIONES (DQNC)		S/. 0.00
ADELANTO DIRECTO	S/. 0.00	
ADELANTO PARA MATERIALES	S/. 0.00	
VALORIZACION NETA		S/. 388,128.38
I. G. V. 18.00%		S/. 69,863.11
NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA		S/. 457,991.49

SON : CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 49/100 SOLES

RESUMEN VALORIZACIÓN N° 03 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (01 al 30 de Noviembre 2020)

TRAMO III Tulpo, Miraflores, Michiquilca

VALORIZACIÓN CONTRACTUAL	SIN IGV	S/. 336,695.95
REINTEGROS (REAJUSTES RECONOCIDOS)	SIN IGV	S/. 0.00
VALORIZACION BRUTA		S/. 336,695.95
AMORTIZACIONES	SIN IGV	S/. 0.00 (-)
ADELANTO DIRECTO	S/. 0.00	
ADELANTO PARA MATERIALES	S/. 0.00	
DEDUCCIONES (DQNC)		S/. 0.00
ADELANTO DIRECTO	S/. 0.00	
ADELANTO PARA MATERIALES	S/. 0.00	
VALORIZACION NETA		S/. 336,695.95
I. G. V. 18.00%		S/. 60,605.27
NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA		S/. 397,301.22

SON : TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS UNO CON 22/100 SOLES

7.- TOTAL A CANCELAR POR VALORIZACIÓN DE SERVICIO N°01 – SETIEMBRE 2020

Tramo I: Piscochaca, Shuba, Namobal, Socobamba, Las Piedras
Tramo II: Mollebamba, El Mirador, Orucullay
Tramo III: Tulpo, Miraflores, Michiquilca

S/. 218,139.86
S/. 457,991.49
S/. 397,301.22



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019

E-mail: mpsch@terra.com.pe



TOTAL A CANCELAR VALORIZACIÓN DE SERVICIO N°02 – OCTUBRE 2020 S/1'073,432.57

SON: UN MILLON SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 57/100 SOLES



8.- ANALISIS

- Se ha revisado el trámite seguido a los documentos de la referencia generados por el Contratista y el Inspector del Servicio.
- El Informe de Aprobación de la Valorización del Servicio emitido por el Inspector indica que la valorización está de acuerdo con lo ejecutado y cumple con el contenido de documentos e información técnica requerida y necesaria para el cumplimiento de las metas y objetivos del servicio contratado.
- El Ing. Inspector del Servicio, en las conclusiones de su informe, debe ser claro y específico respecto a la aprobación de la Valorización de Servicio correspondiente.
- El mantenimiento se encuentra en ejecución y Adelantado en su programación de ejecución de Obra.

9.- RECOMENDACIONES

- Se recomienda al Ing. Residente e Ing Inspector que deben presentar la documentación con el número de ejemplares originales y copias establecidos, contenido en formato digital y con el uso de separadores y la numeración requerida.
- Se recomienda al Ing. Residente e Ing Inspector que deben firmar todos los folios de la Valorización de todos los documentos que se presenten para su trámite. El Representante Legal también debe firmar todos los folios.
- Presentar todos los Análisis de Materiales y pruebas de campo requeridos (Estudio de Canteras, CBR, Densidad de Campo, etc) realizados en un laboratorio que cuente con autorización de INDECOPI.
- Presentar registro fotográfico de la ejecución de las partidas con su respectiva descripción.
- Verificar el cumplimiento de plan de trabajo, especialmente la Adecuación e Implementación de Protocolos ante la Emergencia Sanitaria por el Covid 19.

10.- CONCLUSIONES

- El Ing. Inspector del Servicio, en su informe, APRUEBA la Valorización de Servicio N°03 - Noviembre 2020.
- Luego de su revisión, la Jefatura de la División de Supervisión y Liquidación de Obras de la Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, **OTORGA LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN N°03 – NOVIEMBRE 2020** del Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO I EMP-PE 3N – PISCOCHACA – SHUBA – NAMOBAL - SOCOBAMBA – EMP PE 3N LAS PIEDRAS, LONG 11.620 KM; TRAMO II EMP PE 3N – MOLLEBAMBA – EL MIRADOR – EMP LI 118 – ORUCULLAY, LONG 8.710 KM TRAMO III EMP PE 3N – TULPO – MIRAFLORES – MICHQUILCA, LONG 8.000 KM DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD" y elaborado por el Contratista **CONSORCIO VIAL MIRAFLORES** y sugiere su **CANCELACION** en cumplimiento de las cláusulas contractuales.

Es todo cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

Ing. Hermes M. Meléndez Tamayo
CIP. 111461
Jefe División de Supervisión y Liquidaciones

Santiago de Chuco, 04 de diciembre del 2020

CARTA N° 007 – 2020/LBLL-IO/MPSCH

SR.

DR. FELIPE WILMER ANGULO ZAVALETA.

Gerente de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

ASUNTO:

ALCANZO VALORIZACIÓN N° 03 DEL CONTRATISTA "CONSORCIO VIAL MIRAFLORES"

REF:

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS - LONG. = 11.620 Km; - EMP. PE-3N (MOLLEBAMABA) -EL MIRADOR-EMP. LI – 118 (OROCULLAY)-LONG. = 8.710 Km; - EMP. PE-3N (TULPO) - MIRAFLORES - MICHQUILCA - LONG. = 8.000 - DISTRITO DE MOLLEBAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.


PRESENTE.-

De mi consideración:

Tengo a bien dirigirme a usted en calidad de inspector para hacerle llegar mis saludos cordiales y a la vez alcanzarle la **VALORIZACIÓN N° 03** del servicio citado en referencia presentado por el contratista **CONSORCIO VIAL MIRAFLORES**, correspondiente al periodo desde el 01 hasta el 30 de noviembre del presente año, la cual ha sido revisada y aprobada por mi persona.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente.



Luis Branco León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510



"Año de la universalización de la salud"

INFORME N° 006 – 2020 –LBLL/INSP

A : **ING. RAFAEL K. VALENCIA REBAZA.**
Gerente de IVP de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.

DE : **ING. LUIS BRANCO LEON LEON.**
Inspector del servicio

ASUNTO : **INFORME DE VALORIZACIÓN N° 03 DEL "CONSORCIO VIAL MIRAFLORES"**

REFERENCIA : **SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS - LONG. = 11.620 Km; - EMP. PE-3N (MOLLEBAMABA) -EL MIRADOR-EMP. LI – 118 (OROCULLAY)-LONG. = 8.710 Km; - EMP. PE-3N (TULPO) - MIRAFLORES - MICHQUILCA - LONG. = 8.000 - DISTRITO DE MOLLEBAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD**

FECHA : Santiago de Chuco 04 de Diciembre del 2020

Mediante el presente tengo a bien de alcanzarle el pronunciamiento al informe mensual del contratista referente a la Valorización N° 03 del: "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS - LONG. = 11.620 Km; - EMP. PE-3N (MOLLEBAMABA) -EL MIRADOR-EMP. LI – 118 (OROCULLAY)-LONG. = 8.710 Km; - EMP. PE-3N (TULPO) - MIRAFLORES - MICHQUILCA - LONG. = 8.000 - DISTRITO DE MOLLEBAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD", detallando lo siguiente:

I. ANTECEDENTES.

- a) Conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local.
- b) La Ley Orgánica de Municipalidades señala que las municipalidades provinciales y distritales, dentro del marco de las competencias y funciones específicas, son competentes para promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales.
- c) Mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprobó la reanudación de las actividades: "Mantenimientos, Mejoramiento y Conservación Rutinarios y Periódicos de Vías Nacionales, Departamentales y Locales" y de acuerdo a lo señalado en el numeral 1.2 del Artículo 1 del mencionado decreto supremo, las referidas actividades se encuentran autorizadas para su reanudación de forma automática, una vez que las personas jurídicas que realizan dichas labores registren su "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.
- d) Con Decreto de Urgencia N° 070-2020 se dictó medidas destinadas a generar empleo para la ejecución de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional, departamental y vecinal a efectos de establecer medidas necesarias, en materia económica y financiera, que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, los

Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco de sus competencias, la ejecución de acciones oportunas para la reactivación de la actividad económica, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento periódico y rutinario de las vías nacionales, departamentales y vecinales. Los trabajos de mantenimiento proyectado facilitan el traslado de los productos agropecuarios de las zonas a intervenir, hasta los centros de consumo, permitiendo garantizar el abastecimiento de los productos a consecuencia de la Emergencia Sanitaria generada por el brote del Coronavirus (COVID-19).

- e) El Decreto de Urgencia N° 070-2020 014-2019 estableció, entre otras, medidas que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco de sus competencias, la ejecución de acciones oportunas, en el marco de la emergencia sanitaria generada por el pandemia COVID-19, para la reactivación de la actividad económica a nivel nacional y atención a la población, fomentando trabajo local a través de mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento periódico y rutinario de las vías departamentales y vecinales.
- f) Al respecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 del D.U. N° 070- 2020, numeral 21.3, los Titulares de los pliegos habilitados en la presente transferencia de partidas aprueban mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 21.1, a nivel programático, dentro de los cuales se registran el desagregado del **INSPECTOR**, quien estará a cargo de Monitorear y evaluar la calidad técnica del servicio, considerando al plan de trabajo como documento técnico de calidad del servicio.
- g) En ese sentido, la presencia del Inspector, es prioritario y como profesional competente para Monitorear y evaluar la calidad técnica del servicio mediante las actividades programadas en el Plan de Trabajo de cada uno de los caminos vecinales priorizados por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, en el marco del D.U. N° 070-2020.
- h) El objetivo como profesional es Inspeccionar, controlar, Fiscalizar y verificar la ejecución de las actividades de mantenimiento vial dando cumplimiento al Plan de Trabajo aprobado por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, en el marco del D.U. N° 070-2020.

II. DATOS GENERALES DEL SERVICIO:

1. Nombre del Servicio

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS) - LONG. = 11.620 Km; - EMP. PE-3N (MOLLEBAMABA) -EL MIRADOR-EMP. LI - 118 (OROCULLAY)-LONG. = 8.710 Km; - EMP. PE-3N (TULPO) - MIRAFLORES - MICHQUILCA - LONG. = 8.000 - DISTRITO DE MOLLEBAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

2. Ubicación

Región : LA LIBERTAD

Provincia : SANTIAGO DE CHUCO

Distrito : MOLLEBAMBA

Caserío : SHUBA – NOBAL – SOCOBAMBA – EL MIRADOR – MIRAFLORES – MICHQUILCA



Luis Branco León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

3. Proceso De Adjudicación del Servicio

PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 010-2020-MPSCH/CS

000359

4. Fuente de financiamiento

Recursos Ordinarios

5. Modalidad Contratación

a Suma Alzada

6. Contrato de Servicio

N° 018-2020-MPSCH/LOG

7. Decreto de Urgencia

N° 070-2020

8. Fecha de Suscripción

28 de agosto del 2020

9. Ejecutor De Servicio

CONSORCIO VIAL MIRAFLORES

Conformado por:

CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.

RUC: 20568073658

ECAN INGENIERIA SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - ECAN
INGENIERIA S.R.L.

RUC: 20600813715

Representante Legal: Sr. Edgar Gomez Dominguez

10. Residente De Obra

ING. CARLOS EDUARDO RONCAL MORALES

11. Monto Contratado Para La Ejecución Del Servicio

S/. 2,414,700.00 (Dos millones Cuatrocientos Catorce mil Setecientos con 00/100 Soles). inc el IGV.

12. Fecha Entrega Terreno

05 de setiembre del 2020 (Elaboración del Plan de Trabajo)

13. Fecha de Conformidad de Plan de Trabajo

21 de Setiembre del 2020

14. Fecha de Inicio de Servicio

22 de Setiembre del 2020

15. Plazo de Ejecución

120 DIAS CALENDARIOS

16. Fecha Límite de ejecución

31 de Diciembre del 2020



Luis Branco León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

000558

DATOS DE INSPECCIÓN

17. Contrato Inspección

N° 030 – 2020 – MPSCH-LOG.

18. Fecha Contrato Inspección

24 de Agosto 2020

19. Inspector del Servicio

ING. LUIS BRANCO LEON LEON

Ingeniero Civil con Reg. CIP N° 153510

20. Monto Contratado Para La Inspección del Servicio

S/. 26,193.50 (Veintiseis mil Ciento Noventa y Tres con 00/100 Soles).

21. Plazo Prestación Inspección

120 días calendarios

III. DE LA PRESENTACIÓN DE LA VALORIZACION

Mediante la **Carta N° 0006-CONSORCIO VIAL MIRAFLORES**, de fecha 30 de Noviembre, la empresa CONSORCIO VIAL MIRAFLORES, con representante común **Edgar Gomez Dominguez**, realizo la entrega de la Valorización N° 03 del "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS - LONG. = 11.620 Km; - EMP. PE-3N (MOLLEBAMABA) -EL MIRADOR-EMP. LI – 118 (OROCULLAY)-LONG. = 8.710 Km; - EMP. PE-3N (TULPO) - MIRAFLORES - MICHIKUILCA - LONG. = 8.000 - DISTRITO DE MOLLEBAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"- a mi persona en calidad de INSPECTOR para su evaluacion y posteriormente su aprobacion.

IV. ESTADO FÍSICO DEL SERVICIO


El Avance Físico de la obra nos refleja un avance ejecutado de 53.56%, en el periodo comprendido para el mes de Noviembre del 2020, en comparación al 33.04% del Avance Programado Mensual; además se hace mención que el avance ejecutado Acumulado es 89.20 %, contra el avance programado acumulado que es de 70.80%, por lo tanto, nos refleja un adelanto en el presente periodo de 18.40%.



Luis Branco León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

Cuadro de Avance de Obra

000557

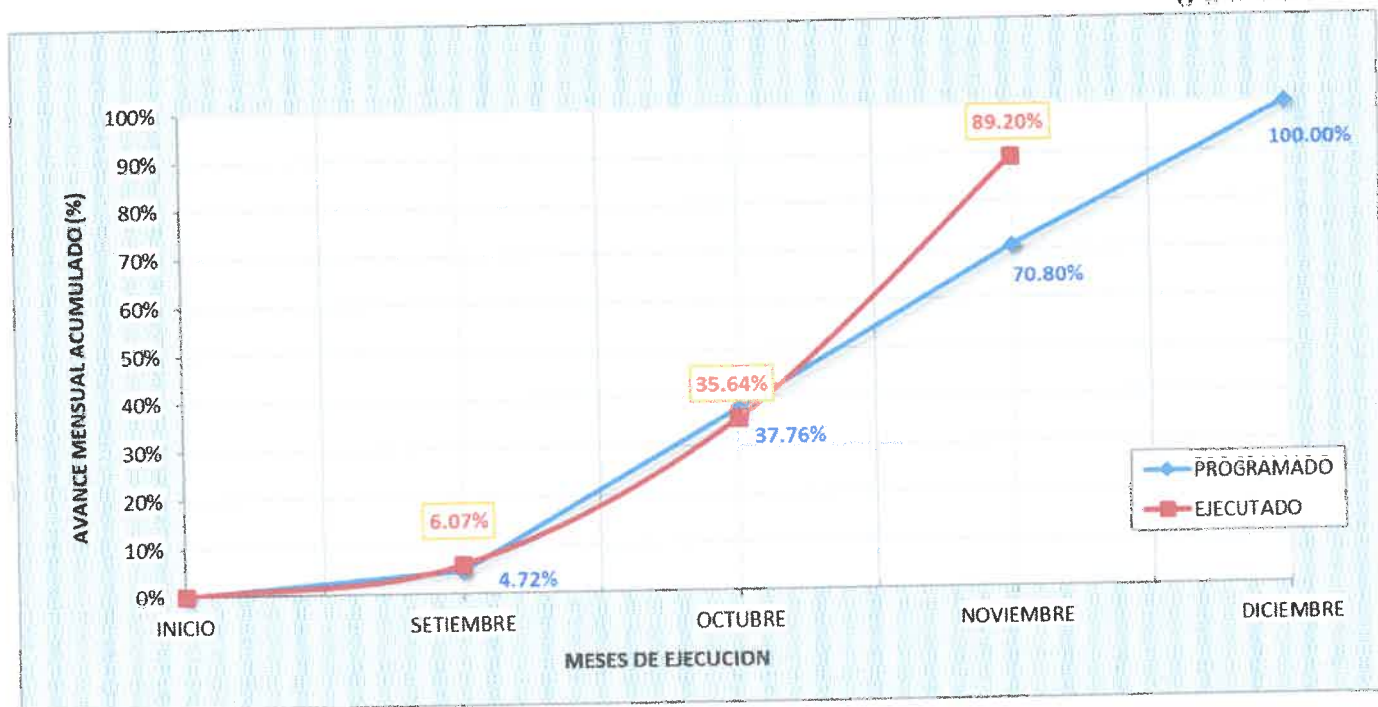

1. SITUACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra en ejecución; documentado en los datos de la ficha de control el avance programado vigente, el avance programado acumulado es de 89.20%, y el ejecutado acumulado 70.80%.

COMENTARIOS:

La obra se viene desarrollando con normalidad desde el 22 de setiembre del 2020.

2. LABORES EFECTUADAS POR EL INSPECTOR EN EL PRESENTE PERÍODO

- Inspección de los trabajos correspondientes a la capa nivelante E=0.05m.
- Verificación de los trabajos de conformación de base con material granular de cantera E=0.15m.
- Control y verificación de las actividades correspondientes al transporte de material granular y material excedente hasta y mayor a un KM.
- Se verificaron los trabajos de reconfiguración de cunetas.
- Revisión y control de la Programación del servicio.
- Verificación de los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las partidas conformantes del Plan de Trabajo.
- Elaboración de metrados de obra ejecutada.
- Control de la Programación y Avance de Obra.
- Coordinaciones y reuniones con el Contratista para lograr que la obra se ejecute de acuerdo a lo programado.
- Preparación y presentación de Informe Mensual.
- Control del Plan de Seguridad y Salud en Obra, incluyendo las medidas del plan para la vigilancia prevención y control del COVID-19.
- Se verifico la ejecución de partidas correspondientes al periodo del 01 al 30 de noviembre del 2020.



Luis Branco León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:


Finalmente, se concluye dando opinión favorable de esta inspección para la conformidad del Pago a Favor del **CONSORCIO VIAL MIRAFLORES** por concepto de ejecución del: **SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS)- LONG. = 11.620 Km; - EMP. PE-3N (MOLLEBAMABA) -EL MIRADOR-EMP. LI – 118 (OROCULLAY)-LONG. = 8.710 Km; - EMP. PE-3N (TULPO) - MIRAFLORES - MICHIKUILCA - LONG. = 8.000 - DISTRITO DE MOLLEBAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD** correspondiente a la Valorización N° 03 del Mes de Noviembre del 2020 por el monto de S/. 1,073,432.57 (Un Millon Setenta y tres Mil Cuatrocientos treinta y dos con 57/100 Soles). incluido el IGV, que corresponde al 53.56% de Avance Físico de Obra.

Sin otro particular, me suscribo de Usted, no sin antes reiterar mi estima personal.

Atentamente,



Luis Branco León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510



VALORIZACIÓN N° 03 – NOVIEMBRE 2020

SERVICIO	: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE - 3N (LAS PIEDRAS - LONG.= 11.620 Km; - EMP. PE - 3N(MOLLEBAMABA) - EL MIRADOR - EMP. LI - 118(OROCULLAY) - LONG.=8.710 Km; - EMP. - PE - 3N(TULPO) - MIRAFLORES - MICHQUILCA - LONG. =8.000 - DISTRITO DE MOLLEBAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD".
CONTRATISTA	: CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
INSPECTOR	: ING. LUIS BRANCO LEON LEON – CIP: 153510
RESIDENTE	: ING. CARLOS EDUARDO RONCAL MORALES – CIP: 53532
ASIS. DE RESIDENTE	: ING. ANDREA LILIANA DELGADO KOBASHIKAWA – CIP: 218998
ENTIDAD	: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
PERIODO	: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.



NOVIEMBRE 2020



- CARTA DE LA
EMPRESA
DIRIGIDA AL
INSPECTOR.



CARTA N°006-2020/CONSORCIO VIAL MIRAFLORES /RL/EGD.

SR. : ING. LUIS BRANCO LEON LEON – CIP: 153510
Inspector de Servicio.

ASUNTO : ALCANZA VALORIZACIÓN DE SERVICIO N° 03

REFERENCIA : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE - 3N (LAS PIEDRAS - LONG. = 11.620 Km; - EMP. PE - 3N(MOLLEBAMABA) - EL MIRADOR - EMP. LI - 118(OROCULLAY) - LONG.=8.710 Km; - EMP. - PE - 3N(TULPO) - MIRAFLORES - MICHQUILCA - LONG. =8.000 - DISTRITO DE MOLLEBAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

FECHA : 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Me es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo y al mismo tiempo alcanzarle el INFORME DE VALORIZACIÓN N° 03 correspondiente al mes de noviembre del 2020 (periodo de 01 de noviembre del 2020 al 30 de noviembre del 2020). Para su respectiva revisión y aprobación.

Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente:

CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
EDGAR GONZALEZ DOMINGUEZ
CIP 443944779
REPRESENTANTE COMUN

Luis Branco León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

Cc:

- Archivo



- **FICHA
TECNICA.**

000051

1-A: FICHA TECNICA DEL CAMINO VECINAL**1. Municipalidad** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO**2. Datos Responsable:** ING. CARLOS EDUARDO RONCAL MORALES - CIP: 53532 Fecha:

Cargo: RESIDENTE DE SERVICIO

3. Ubicación Política Administrativa: Cod. Ubigeo:

Distrito(s): MOLLEBAMBA

Provincia(s): SANTIAGO DE CHUCO

Departamento: LA LIBERTAD

4. Datos del SINAC: Clasificador de Rutas Vigente

Jerarquía Vial: Código de Ruta: R131019

Código de Ruta Provisional (Rutas sin Clasificar):

Trayectoria: (TULPO) - MIRAFLORES - MICHQUILCA

5. Ubicación Geográfica:**De la Ruta:****Inicio:** Descripción TULPO

Progresiva: 00+000 Cota: 3,096 msnm ZONA:


Coordenada (UTM - WGS84): 9098795.12 N 831342.689 E

Fin: Descripción MICHQUILCA

Progresiva: 08+000 Cota: 3,246 msnm ZONA:

Coordenada (UTM - WGS84): 9.103.622.684 N 832.015.069 E

Sello y Firma de Responsable de elaboración del ICV

Nota: La Información de la Ficha debe tener el respaldo de la Información digital respectiva: Archivos GPS (Puntos=Waypoints y Eje Vial=Tracks), Fotografías (jpg), Video de la Obra (formato Avi). Deberá entregar en DVD.
ING. CIVIL
R. CIP. 53532
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

1-A: FICHA TECNICA DEL CAMINO VECINAL

1. **Municipalidad**

2. **Datos Responsable:** Fecha:

Cargo:

3. **Ubicación Política Administrativa:** **Cod. Ubigeo:**

Distrito(s):

Provincia(s):

Departamento:

4. Datos del SINAC: Clasificador de Rutas Vigente

Jerarquía Vial: Código de Ruta:

Código de Ruta Provisional (Rutas sin Clasificar):

Trayectoria:

5. Ubicación Geográfica:

De la Ruta:

Inicio: Descripción

Progresiva: Cota: msnm ZONA:

Coordenada (UTM - WGS84):

Fin: Descripción

Progresiva: Cota: msnm ZONA:

Coordenada (UTM - WGS84):

Sello y Firma de Responsable de elaboración del ICV

Nota: La Información de la Ficha debe tener el respaldo de la Información digital respectiva: Archivos GPS (Puntos=Waypoints y Eje Vial=Tracks), Fotografías (jpg), Video de la Obra (formato Avi). Deberá entregar en DVD.


Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532




Luis Bragao León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

000550

1-A: FICHA TECNICA DEL CAMINO VECINAL1. **Municipalidad** 2. **Datos Responsable:** Fecha: Cargo: 3. **Ubicación Política Administrativa:** **Cod. Ubigeo:**Distrito(s): Provincia(s): Departamento: 4. **Datos del SINAC: Clasificador de Rutas Vigente**Jerarquía Vial: Código de Ruta: Código de Ruta Provisional (Rutas sin Clasificar): Trayectoria: 5. **Ubicación Geográfica:****De la Ruta:****Inicio:** Descripción Progresiva: Cota: msnm ZONA: Coordenada (UTM - WGS84): **Fin:** Descripción Progresiva: Cota: msnm ZONA: Coordenada (UTM - WGS84):

Sello y Firma de Responsable de elaboración del ICV

Nota: La Información de la Ficha debe tener el respaldo de la Información digital respectiva: Archivos GPS (Puntos=Waypoints y Eje Vial=Tracks), Fotografías (jpg), Video de la Obra (formato Avi). Deberá entregar en DVD.


Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532




Luis Brundo León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510



CONSORCIO VIAL **MIRAFLORES**

000549

- FACTURA DEL CONTRATISTA.

CORPORACION SORIANO L & C S.A.C.

MZA. T LOTE. 17 URB. URB.SAN ANDRES 5TA
VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20600813715****E001-55**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **21/12/2020**
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD PROVINC
SANTIAGO DE CHUCO**
 RUC : **20187630101**
 Dirección del Cliente : **JR. PACO YUNQUE 735 ---- SAN
CRISTOBAL LA LIBERTAD-
SANTIAGO DE CHUCO-
SANTIAGO DE CHUCO**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO DE VALORIZACION N.3 DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP.PE3N PISCOCHACA- SHUBA-NABOBAL- SOCOBAMBA- EMP.PE-3N LAS PIEDRAS- LONG.11.62 KM- EMP.PE-3N MOLLEBAMBA-EL MIRADOR	909688.6187	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas : S/ 0.00


**SON: UN MILLON SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
DOS Y 57/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 909,688.62
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 909,688.62
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 163,743.95
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,073,432.57

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



- INFORME DE
RESIDENTE.



VALORIZACIÓN N° 03 – NOVIEMBRE 2020

SERVICIO	: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE - 3N (LAS PIEDRAS - LONG.= 11.620 Km; - EMP. PE - 3N(MOLLEBAMABA) - EL MIRADOR - EMP. LI - 118(OROCULLAY) - LONG.=8.710 Km; - EMP. - PE - 3N(TULPO) - MIRAFLORES - MICHIKUILCA - LONG. =8.000 - DISTRITO DE MOLLEBAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD".
CONTRATISTA	: CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
INSPECTOR	: ING. LUIS BRANCO LEON LEON – CIP: 153510
RESIDENTE	: ING. CARLOS EDUARDO RONCAL MORALES – CIP: 53532
ASIS. DE RESIDENTE	: ING. ANDREA LILIANA DELGADO KOBASHIKAWA – CIP: 218998
ENTIDAD	: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
PERIODO	: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.




Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532

NOVIEMBRE 2020


Luis Branco León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510





INFORME MENSUAL 03
(NOVIEMBRE – 2020)
EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO
FASE: II

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

1.1. NOMBRE DEL SERVICIO:

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE - 3N (LAS PIEDRAS - LONG.= 11.620 Km; - EMP. PE - 3N(MOLLEBAMABA) - EL MIRADOR - EMP. LI - 118(OROCULLAY) - LONG.=8.710 Km; - EMP. - PE - 3N(TULPO) - MIRAFLORES - MICHQUILCA - LONG. =8.000 - DISTRITO DE MOLLEBAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD".

1.2. N° DE CONTRATO:

Contrato De Sevicio: N° 018-2020-MPSCH-LOG.

1.3. ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

1.4. CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
ECAN INGENIERÍA S.R.L. Y CORPORACIÓN SORIANO L & C S.A.C.
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO: Sr. EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ CON
DNI: 44944779

1.5. INSPECTOR:

ING. LUIS BRANCO LEON LEON – CIP: 153510

1.6. RESIDENTE:

ING. CARLOS EDUARDO RONCAL MORALES – CIP: 53532


Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532

1.7. ASISTENTE DE RESIDENTE

ING. ANDREA LILIANA DELGADO KOBASHIKAWA – CIP: 218998


Luis Branco León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510





1.8. MONTO DE CONTRATO:

S/. 2,414,700.00 INC. IGV.

1.9. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO:

S/. 2,004,201.00 INC. IGV

1.10. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:

S/. 362,205.00 INC. IGV

1.11. PLAZO DE EJECUCIÓN:

120 DIAS CALENDARIOS

1.12. FECHA DE INICIO:

22 DE SETIEMBRE DEL 2020

1.13. FECHA DE CULMINACIÓN:

31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS – FASE II:

2.1. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Durante el periodo del 01 de noviembre del 2020 al 30 de noviembre del 2020
Se trabajo en las siguientes partidas.

01.00 OBRAS PROVISIONALES

01.02 Trazo y replanteo.

02.00 PAVIMENTOS

02.01 Capa nivelante E= 0.05 m.

02.02 Material granular de cantera E= 0.15 m.

03.00 TRANSPORTE

03.01 Transporte de material granular hasta 1 km.

03.02 Transporte de material granular mayor a 1 km.

03.03 Transporte de material excedente hasta 1 km.

03.04 Transporte de material excedente mayor a 1 km.

04.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01 Reconformación de cunetas.

07.00 EMERGENCIA SANITARIA


07.01 Emergencia sanitaria COVID-19



Luis Branca León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510



Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532



2.2. DETALLE DE CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADOS Y ANEXAR LOS CERTIFICADOS DE LABORATORIO.

Durante el periodo del 01 de noviembre del 2020 al 30 de noviembre del 2020, se vienen realizando los trabajos de densidad de campo correspondientes, los cuales se adjuntarán en los anexos de la presente valorización.

3. ESTADO DE SITUACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO – FASE II:

3.1. SITUACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

3.1.1. DETALLAR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y LOS PORCENTAJES DE AVANCE.

Durante el periodo del 01 de noviembre del 2020 al 30 de noviembre del 2020 Se realizaron los trabajos en las siguientes partidas.

TRAMO: “EMP. PE-3N (PISCOCHACA) – SHUBA – NABOBAL – SOCOBAMBA – EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS) – LONG.= 11.620 KM”

01.00 OBRAS PROVISIONALES

01.02 Trazo y replanteo.

Esta partida cuenta con un avance del 27.71%.

02.00 PAVIMENTOS

02.01 Capa nivelante E= 0.05 m.

Esta partida cuenta con un avance del 29.78%

02.02 Material granular de cantera E= 0.15 m.

Esta partida cuenta con un avance del 29.43%.

03.00 TRANSPORTE

03.01 Transporte de material granular hasta 1 km.

Esta partida cuenta con un avance del 30.72%

03.02 Transporte de material granular mayor a 1 km.

Esta partida cuenta con un avance del 31.65%.

03.03 Transporte de material excedente hasta 1 km.

Esta partida cuenta con un avance del 34.14%.

03.04 Transporte de material excedente mayor a 1 km.

Esta partida cuenta con un avance del 32.59%.



Luis Brando León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

04.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01 Reconformación de cunetas.

Esta partida cuenta con un avance del 29.43%.


07.00 EMERGENCIA SANITARIA

07.01 Emergencia sanitaria COVID-19

Esta partida cuenta con un avance del 25.00%.



Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532



TRAMO: "EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) – EL MIRADOR – EMP. LI-118 (OROCULLAY) – LONG. = 8.710 KM"

02.00 PAVIMENTOS

02.01 Capa nivelante E= 0.05 m.

Esta partida cuenta con un avance del 94.26%

02.02 Material granular de cantera E= 0.15 m.

Esta partida cuenta con un avance del 94.26%.

03.00 TRANSPORTE

03.01 Transporte de material granular hasta 1 km.

Esta partida cuenta con un avance del 93.99%

03.02 Transporte de material granular mayor a 1 km.

Esta partida cuenta con un avance del 94.94%.

03.03 Transporte de material excedente hasta 1 km.

Esta partida cuenta con un avance del 95.27%.

03.04 Transporte de material excedente mayor a 1 km.

Esta partida cuenta con un avance del 92.51%.

04.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01 Reconformación de cunetas.

Esta partida cuenta con un avance del 67.85%.

07.00 EMERGENCIA SANITARIA

07.01 Emergencia sanitaria COVID-19

Esta partida cuenta con un avance del 25.00%.

TRAMO: "EMP. PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHQUILCA – LONG. 8.000 KM"

02.00 PAVIMENTOS

02.01 Capa nivelante E= 0.05 m.

Esta partida cuenta con un avance del 87.50%

02.02 Material granular de cantera E= 0.15 m.

Esta partida cuenta con un avance del 89.25%.

03.00 TRANSPORTE

03.01 Transporte de material granular hasta 1 km.

Esta partida cuenta con un avance del 88.11%

03.02 Transporte de material granular mayor a 1 km.

Esta partida cuenta con un avance del 89.01%.

03.03 Transporte de material excedente hasta 1 km.

Esta partida cuenta con un avance del 89.26%.

03.04 Transporte de material excedente mayor a 1 km.

Esta partida cuenta con un avance del 91.04%.


Luis Branca León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510


Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532

**04.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE****04.01 Reconformación de cunetas.**

Esta partida cuenta con un avance del 83.75%.

07.00 EMERGENCIA SANITARIA**07.01 Emergencia sanitaria COVID-19**

Esta partida cuenta con un avance del 25.00%.

3.1.2. DETALLAR LOS CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADAS Y ANEXAR LOS CERTIFICADOS DE LABORATORIO.

Durante el periodo de 01 de noviembre del 2020 al 30 de noviembre del 2020, se vienen realizando los trabajos de densidad de campo correspondientes, los cuales se adjuntarán en los anexos de la presente valorización.

3.2 SITUACIÓN DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA**3.2.1 RETENCIÓN DE GARANTÍAS.**

Retención del 10.00 % de garantía de fiel cumplimiento del contrato.

3.2.2 VIGENCIA DE LAS CARTAS FIANZAS.

No aplica.

3.2.3 VIGENCIA DE LOS SEGUROS (SCTR, SOAT) Y ANEXAR COPIAS.

22/12/2020.

3.2.4 PENALIDADES (APLICADAS Y COBRADAS).

No aplica.

3.2.5 RELACIÓN DE PERSONAL QUE TRABAJÓ (PROFESIONAL, TÉCNICOS Y OBREROS).

PERSONAL ASEGURADO					
SEDE: CONSTRUCCION					
Nro	PATERNO	MATERNO	NOMBRES	DNI	FECHA DE NACIMIENTO
1	RONCAL	MORALES	CARLOS EDUARDO	18010553	16/04/1972
2	SALINAS	DE LA CRUZ	ELVIS HECTOR	70893861	16/01/1992
3	CHÁVEZ	ESPEJO	WALTER	47271818	19/09/1991
4	SÁNCHEZ	ASUNCIÓN	LAZARO	42828408	14/02/1983
5	LIMAY	CHAVARRIA	RUPERTO	41840754	17/08/1982
6	MARDONADO	NOGUERA	JUAN	15236259	04/05/1976
7	POLO	LAYZA	WALTER	47750955	08/04/1953


Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532




Luis Brindico León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510



3.2.6 RELACIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS.

A continuación, se detalla la maquinaria utilizada para cada tramo:

- 01 excavadora
- 01 motoniveladora
- 01 rodillo liso vibratorio
- 01 cisterna para agua
- 05 camión volquete
- 01 camioneta pick up

3.2.7 SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIA SANITARIA.

Se viene realizando todos los trabajos respetando todos los parámetros de Emergencia Sanitaria COVID-19 según plan de trabajo.

4. CONCLUSIONES

- **El informe mensual de Valorización N°03**, obedece a los trabajos realizados desde el 01 de noviembre del 2020 al 30 de noviembre del 2020, dichos trabajos aprobados por el inspector designado por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.
- El porcentaje de avance físico en **el informe mensual de Valorización N°03** es del **53.56%** llegando al **89.20%** ejecutado acumulado, frente a un **33.04 %** programado del mes y un acumulado programado de **70.80%**; estando el Servicio adelantado en un **18.40%**.
- El monto correspondiente al informe mensual de Valorización N°03 es de **S/. 1,073,432.57**. (un millón setenta y tres mil cuatrocientos treinta y dos con 57/100 soles).
- Recomendamos a la entidad contratante la Municipalidad Provincial de Provincial de Santiago De Chuco, revisar, aprobar y tramitar el informe mensual de Valorización N°03 correspondiente al mes de noviembre del 2020.


Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532


 **Luis Branco León León**
INGENIERO CIVIL
CIP. 153510



- RESUMEN DE
VALORIZACION
MENSUAL.

RESUMEN DE VALORIZACION N° 03

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Obra : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE - 3N(LAS PIEDRAS - LONG.= 11.620 Km; - EMP. PE - 3N(MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI - 118(OROCULLAY) - LONG.=8.710 Km; - EMP. - PE - 3N(TULPO) - MIRAFLORES - MICHIGUILCA - LONG. =8.000 - DISTRITO DE MOLLEBAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : MOLLEBAMBA
Contratista : CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
Inspector : ING. LUIS BRANCO LEÓN LEÓN - CIP: 153510
Residente : ING. CARLOS EDUARDO RONCAL MORALES - CIP: 53532
Asis. de Residente: ING. ANDREA LILIANA DELGADO KOBASHIKAWA - CIP: 218998

PRESUPUESTADO			VALORIZADO ANTERIOR		VALORIZADO DEL MES		ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
Item	Descripción	MONTO EXPEDIENTE	EJECUTADO ANT. ACUM.	%	EJECUTADO EN EL MES	%	EJECUTADO ACT. ACUM	%	Parcial EJECUCION	%
	COSTO DIRECTO (TULPO)	S/. 417,066.32	S/. 74,231.91		S/. 292,779.09		S/. 367,011.00		S/. 50,055.32	
	COSTO DIRECTO (PISCOCHACA)	S/. 605,788.50	S/. 387,706.07		S/. 160,751.55		S/. 548,457.62		S/. 57,330.88	
	COSTO DIRECTO (MOLLEBAMBA)	S/. 454,080.32	S/. 64,527.85		S/. 337,502.94		S/. 402,030.79		S/. 52,049.53	
	TOTAL COSTO DIRECTO	S/. 1,476,935.14	S/. 526,465.83		S/. 791,033.58		S/. 1,317,499.41		S/. 159,435.73	
	SUB TOTALES COSTO DIRECTO	S/. 1,476,935.14	S/. 526,465.83		S/. 791,033.58		S/. 1,317,499.41		S/. 159,435.73	
	GASTOS GENERALES (10%)	S/. 147,693.52	S/. 52,646.58		S/. 79,103.36		S/. 131,749.94		S/. 15,943.58	
	UTILIDAD (5%)	S/. 73,846.76	S/. 26,323.29		S/. 39,551.68		S/. 65,874.97		S/. 7,971.79	
	SUB TOTAL	S/. 1,698,475.42	S/. 605,435.70		S/. 909,688.62		S/. 1,515,124.32		S/. 183,351.10	
	I.G.V. (18 %)	S/. 305,725.58	S/. 108,978.42		S/. 163,743.95		S/. 272,722.37		S/. 33,003.21	
	TOTAL	S/. 2,004,201.00	S/. 714,414.12	35.64%	S/. 1,073,432.57	53.56%	S/. 1,787,846.69	89.20%	S/. 216,354.31	10.80%

Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP: 53532

Luis Branco León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510



- CONTROL Y
SUSTENTO DE
METRADOS Y
ACTIVIDADES
EJECUTADAS.

CONTROL Y SUSTENTO DE METRADOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS

000236

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Proyecto : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE - 3N(LAS PIEDRAS - LONG.= 11.620 Km; - EMP. PE - 3N(MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI - 118(OROCULLAY) - LONG.=8.710 Km; - EMP. - PE - 3N(TULPO) - MIRAFLORES - MICHQUILCA - LONG. =8.000 - DISTRITO DE MOLLEBAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Tramo : (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - (LAS PIEDRAS)
Contratista : CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
Inspector : ING. LUIS BRANCO LEON LEON - CIP: 153510
Residente : ING. CARLOS EDUARDO RONCAL MORALES - CIP: 53532
Asis. de Residente: ING. ANDREA LILIANA DELGADO KOBASHIKAWA - CIP: 218998

Monto Contratado S/. 2,414,700.00
Plazo de ejecucion 120 días calendarios

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATADO	CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS				% EJECUTADO
				ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR EJECUTAR	
1.00	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	0.50	0.00	0.50	0.50	50.00%
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	11.62	8.40	3.22	11.62	0.00	100.00%
2.00	PAVIMENTOS							
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	2,905.00	2040.00	865.00	2,905.00	0.00	100.00%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	8,715.00	6150.00	2,565.00	8,715.00	0.00	100.00%
3.00	TRANSPORTE							
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	8,985.00	6225.00	2,760.00	8,985.00	0.00	100.00%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	65,727.28	44925.00	20,802.28	65,727.28	0.00	100.00%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	5,580.00	3675.00	1,905.00	5,580.00	0.00	100.00%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	28,408.50	19150.00	9,258.50	28,408.50	0.00	100.00%
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE							
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	11,620.00	8200.00	3,420.00	11,620.00	0.00	100.00%
5.00	SEÑALIZACION							
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00%
05.02.	SENALES PREVENTIVAS	und	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00%
03.	SENALES REGLAMENTARIAS	und	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00%
04.	SENALES INFORMATIVAS	und	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00%
6.00	IMPACTO AMBIENTAL							
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%
7.00	EMERGENCIA SANITARIA							
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	0.50	0.25	0.75	0.25	75.00%


Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532


 Luis Branco León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

000335

SUSTENTO DE METRADOS

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Proyecto : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE - 3N(LAS PIEDRAS - LONG.= 11.620 Km; - EMP. PE - 3N(MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI - 118(OROCULLAY) - LONG.=8.710 Km; - EMP. - PE - 3N(TULPO) - MIRAFLORES -

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CH. Monto Contratado S/. 2,414,700.00
 Tramo : (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA Plazo de ejecución 120 días calendario
 Contratista : CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
 Inspector : ING. LUIS BRANCO LEON LEON - CIP: 153510
 Residente : ING. CARLOS EDUARDO RONCAL MORALES - CIP: 53532
 Asis. de Residente: ING. ANDREA LILIANA DELGADO KOBASHIKAWA - CIP: 218998

1.00 OBRAS PROVISIONALES

01.02. TRAZO Y REPLANTEO

Descripción		Longitud	Parcial
Inicio	Fin	(km)	(km)
8.40	9.00	0.60	0.60
9.00	10.00	1.00	1.00
10.00	11.00	1.00	1.00
11.00	11.62	0.62	0.62
TOTAL			3.22

02 PAVIMENTOS

02.01. CAPA NIVELANTE E=0.05 M

M3

Progresiva		Longitud	Ancho	Espesor	Area	Volumen
Inicio	Fin	(m)	(m)	(m)	(m2)	(m3)
8+160	9+000	840.00	5.00	0.05	4,200.00	210.00
9+000	10+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
10+000	11+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
11+000	11+620	620.00	5.00	0.05	3,100.00	155.00
TOTAL						865.00

02.02. MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M

M3

Progresiva		Longitud	Ancho	Espesor	Area	Volumen
Inicio	Fin	(m)	(m)	(m)	(m2)	(m3)
8+200	9+000	800.00	5.00	0.15	4,000.00	600.00
9+000	10+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
10+000	11+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
11+000	11+620	620.00	5.00	0.15	3,100.00	465.00
TOTAL						2,565.00

03 TRANSPORTE

03.01. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM

03.02. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM

Progresiva		CANTERA	CANTERA	DISTANCIA	Longitud	Ancho	Area	Plazoletas 3%	ESPESOR	VOLUMEN	D<=1km	D>1km
Inicio	Fin	UBICACION (km)	ACCESO (km)	(KM)	(m)	(m)	(m2)	(m2)	(m)	(m3)		
8.05	9.00	5.00	3.70	7.23	952.81	5.00	4,764.05	142.92	0.15	736.05	736.05	4,582.35
9.00	10.00	5.00	3.70	8.20	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	5,565.08
10.00	11.00	5.00	3.70	9.20	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	6,337.59
11.00	11.62	5.00	3.70	10.01	620.00	5.00	3,100.00	93.00	0.15	478.95	478.95	4,317.26
TOTAL											2,760.00	20,802.28

03.03. TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM

03.04. TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM

Progresiva		DME	DME	DISTANCIA	Longitud	Ancho	Area	Plazoletas 3%	ESPESOR	VOLUMEN	D<=1km	D>1km
Inicio	Fin	UBICACION (km)	ACCESO (km)	(KM)	(m)	(m)	(m2)	(m2)	(m)	(m3)		
7.81	8.00	6.00	2.15	4.05	190.00	5.00	950.00	0.00	0.10	95.00	95.00	289.95
8.00	9.00	6.00	2.15	4.65	1,000.00	5.00	5,000.00	0.00	0.10	500.00	500.00	1,822.50
9.00	10.00	6.00	2.15	5.65	1,000.00	5.00	5,000.00	0.00	0.10	500.00	500.00	2,322.50
10.00	11.00	6.00	2.15	6.65	1,000.00	5.00	5,000.00	0.00	0.10	500.00	500.00	2,822.50
11.00	11.62	6.00	2.15	7.46	620.00	5.00	3,100.00	0.00	0.10	310.00	310.00	2,001.05
TOTAL											1,905.00	9,258.50

4.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01. RECONFORMACION DE CUNETAS

Progresiva		Longitud	Parcial
Inicio	Fin	(m)	(m)
8+200	9+000	800.00	800.00
9+000	10+000	1,000.00	1,000.00
10+000	11+000	1,000.00	1,000.00
11+000	11+620	620.00	620.00
TOTAL			3,420.00


Carlos E. Roncal Morales
 ING. CIVIL
 R. CIP. 53532




Luis Branco León León
 INGENIERO CIVIL
 CIP 153510

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS (METRADOS)

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Proyecto : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE - 3N(LAS PIEDRAS - LONG.= 11.620 Km; - EMP. PE - 3N(MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI - 118(OROCULLAY) - LONG.=8.710 Km; - EMP. - PE - 3N(TULPO) - MIRAFLORES - MICHQUILCA - LONG. =8.000 - DISTRITO DE MOLLEBAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 Tramo : (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - OROCULLAY
 Contratista : CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
 Inspector : ING. LUIS BRANCO LEON LEON - CIP: 153510
 Residente : ING. CARLOS EDUARDO RONCAL MORALES - CIP: 53532
 Asis. de Residente: ING. ANDREA LILIANA DELGADO KOBASHIKAWA - CIP: 218998

Monto Contratado S/. 2,414,700.00
 Plazo de ejecucion 120 días calendario

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATADO	CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS				% EJECUTADO
				ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR EJECUTAR	
1.00	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	0.50	0.00	0.50	0.50	50.00%
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	8.71	8.71	0.00	8.71	0.00	100.00%
2.00	PAVIMENTOS							
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	2,177.50	125.00	2,052.50	2,177.50	0.00	100.00%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	6,532.50	375.00	6,157.50	6,532.50	0.00	100.00%
3.00	TRANSPORTE							
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	6,735.00	405.00	6,330.00	6,735.00	0.00	100.00%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	39,459.53	1995.00	37,464.53	39,459.53	0.00	100.00%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	4,125.00	195.00	3,930.00	4,125.00	0.00	100.00%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	15,015.23	1125.00	13,890.23	15,015.23	0.00	100.00%
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE							
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	8,710.00	2800.00	5,910.00	8,710.00	0.00	100.00%
5.00	SEÑALIZACION							
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00%
05.02.	SENALES PREVENTIVAS	und	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00%
05.03.	SENALES REGLAMENTARIAS	und	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00%
05.04.	SENALES INFORMATIVAS	und	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00%
6.00	IMPACTO AMBIENTAL							
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%
7.00	EMERGENCIA SANITARIA							
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	0.50	0.25	0.75	0.25	75.00%


 Carlos E. Roncal Morales
 ING. CIVIL
 R. CIP. 53532


 Luis Branco León León
 INGENIERO CIVIL
 CIP 153510

SUSTENTO DE METRADOS

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Proyecto : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE - 3N(LAS PIEDRAS - LONG.= 11.620 Km; - EMP. PE - 3N(MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI - 118(OROCULLAY) - LONG.=8.710 Km; - EMP. - PE - 3N(TULPO) - MIRAFLORES - MICHIGUILCA - LONG.=8.000 - DISTRITO DE MOLLEBAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Ciente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CH **Monto Contratado** S/. 2,414,700.00
Tramo : (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - OROCULLAY **Plazo de ejecución** 120 días calendario
Contratista : CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
Inspector : ING. LUIS BRANCO LEON LEON - CIP: 153510
Residente : ING. CARLOS EDUARDO RONCAL MORALES - CIP: 53532
Asis. de Residente ING. ANDREA LILIANA DELGADO KOBASHIKAWA - CIP: 218998

02 PAVIMENTOS

02.01 CAPA NIVELANTE E=0.05 M

M3

Progresiva		Longitud	Ancho	Espesor	Area	Volumen
Inicio	Fin	(m)	(m)	(m)	(m2)	(m3)
0+500	1+000	500.00	5.00	0.05	2,500.00	125.00
1+000	2+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
2+000	3+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
3+000	4+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
4+000	5+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
5+000	6+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
6+000	7+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
7+000	8+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
8+000	8+710	710.00	5.00	0.05	3,550.00	177.50
TOTAL						2,052.50

02.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M

M3

Progresiva		Longitud	Ancho	Espesor	Area	Volumen
Inicio	Fin	(m)	(m)	(m)	(m2)	(m3)
0+500	1+000	500.00	5.00	0.15	2,500.00	375.00
1+000	2+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
2+000	3+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
3+000	4+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
4+000	5+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
5+000	6+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
6+000	7+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
7+000	8+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
8+000	8+710	710.00	5.00	0.15	3,550.00	532.50
TOTAL						6,157.50

03 TRANSPORTE

03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM

03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM

Progresiva		CANTERA	CANTERA	DISTANCIA	Longitud	Ancho	Area	Plazoletas 3%	ESPESOR	VOLUMEN	D<=1km	D>1km
Inicio	Fin	UBICACION (km)	ACCESO (km)	(KM)	(m)	(m)	(m2)	(m2)	(m)	(m3)		
0.52	1.00	4.00	4.82	8.07	484.18	5.00	2,420.90	72.63	0.15	374.03	374.03	2,642.96
1.00	2.00	4.00	4.82	7.32	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	4,885.44
2.00	3.00	4.00	4.82	6.32	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	4,112.94
3.00	4.00	4.00	4.82	5.32	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	3,340.44
4.00	5.00	4.00	4.82	5.32	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	3,340.44
5.00	6.00	4.00	4.82	6.32	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	4,112.94
6.00	7.00	4.00	4.82	7.32	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	4,885.44
7.00	8.00	4.00	4.82	8.32	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	5,657.87
8.00	8.71	4.00	4.82	9.18	710.00	5.00	3,550.00	106.50	0.15	548.48	548.48	4,486.03
TOTAL											6,330.00	37,464.53

03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM

03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM

Progresiva		DME	DME	DISTANCIA	Longitud	Ancho	Area	Plazoletas 3%	ESPESOR	VOLUMEN	D<=1km	D>1km
Inicio	Fin	UBICACION (km)	ACCESO (km)	(KM)	(m)	(m)	(m2)	(m2)	(m)	(m3)		
0.85	1.00	2.00	1.59	2.66	150.00	5.00	750.00	0.00	0.10	75.00	75.00	124.58
1.00	2.00	2.00	1.59	2.09	1,000.00	5.00	5,000.00	0.00	0.10	500.00	500.00	543.00
2.00	3.00	2.00	1.59	2.09	1,000.00	5.00	5,000.00	0.00	0.10	500.00	500.00	543.00
3.00	4.00	2.00	1.59	3.09	1,000.00	5.00	5,000.00	0.00	0.10	500.00	500.00	1,043.60
4.00	5.00	2.00	1.59	4.09	1,000.00	5.00	5,000.00	0.00	0.10	500.00	500.00	1,543.00
5.00	6.00	2.00	1.59	5.09	1,000.00	5.00	5,000.00	0.00	0.10	500.00	500.00	2,043.00
6.00	7.00	2.00	1.59	6.09	1,000.00	5.00	5,000.00	0.00	0.10	500.00	500.00	2,543.00
7.00	8.00	2.00	1.59	7.09	1,000.00	5.00	5,000.00	0.00	0.10	500.00	500.00	3,043.00
8.00	8.71	2.00	1.59	7.94	710.00	5.00	3,550.00	0.00	0.10	355.00	355.00	2,464.06
TOTAL											3,930.00	13,890.23

4.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS

Progresiva		Longitud	Parcial
Inicio	Fin	(m)	(m)
2+800	3+000	200.00	200.00
3+000	4+000	1,000.00	1,000.00
4+000	5+000	1,000.00	1,000.00
5+000	6+000	1,000.00	1,000.00
6+000	7+000	1,000.00	1,000.00
7+000	8+000	1,000.00	1,000.00
8+000	8+710	710.00	710.00
TOTAL			5,910.00


Carlos E. Roncal Morales
 ING. CIVIL
 R. CIP. 53532




Luis Branco León León
 INGENIERO CIVIL
 CIP 153510

000332

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS (METRADOS)

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Proyecto :

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE - 3N(LAS PIEDRAS - LONG.= 11.620 Km; - EMP. PE - 3N(MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI - 118(OROCULLAY) - LONG.=8.710 Km; - EMP. - PE - 3N(TULPO) - MIRAFLORES - MICHIGUILCA - LONG. =8.000 - DISTRITO DE MOLLEBAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 Tramo : (TULPO) - MIRAFLORES - MICHIGUILCA
 Contratista : CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
 Inspector : ING. LUIS BRANCO LEON LEON - CIP: 153510
 Residente : ING. CARLOS EDUARDO RONCAL MORALES - CIP: 53532
 Asis. de Residente: ING. ANDREA LILIANA DELGADO KOBASHIKAWA - CIP: 218998

Monto Contratado S/. 2,414,700.00
 Plazo de ejecucion 120 días calendario

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATADO	CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS				% EJECUTADO
				ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR EJECUTAR	
1.00	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	0.50	0.00	0.50	0.50	50.00%
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	100.00%
2.00	PAVIMENTOS							
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	2,000.00	250.00	1,750.00	2,000.00	0.00	100.00%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	6,000.00	645.00	5,355.00	6,000.00	0.00	100.00%
3.00	TRANSPORTE							
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	6,180.00	735.00	5,445.00	6,180.00	0.00	100.00%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	33,990.00	3735.00	30,255.00	33,990.00	0.00	100.00%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	3,770.00	405.00	3,365.00	3,770.00	0.00	100.00%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	12,390.00	1110.00	11,280.00	12,390.00	0.00	100.00%
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE							
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	8,000.00	1300.00	6,700.00	8,000.00	0.00	100.00%
5.00	SEÑALIZACION							
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00%
05.02.	SEÑALES PREVENTIVAS	und	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00%
05.03.	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%
05.04.	SEÑALES INFORMATIVAS	und	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%
6.00	IMPACTO AMBIENTAL							
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%
7.00	EMERGENCIA SANITARIA							
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	0.50	0.25	0.75	0.25	75.00%


 Carlos E. Roncal Morales
 ING. CIVIL
 R. CIP. 53532




 Luis Branco León León
 INGENIERO CIVIL
 CIP 153510

000331

SUSTENTO DE METRADOS

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Proyecto : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOCAMBAMBA - EMP. PE - 3N(LAS PIEDRAS - LONG.= 11.620 Km; - EMP. PE - 3N(MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI - 118(OROCULLAY) - LONG.=8.710 Km; - EMP. - PE - 3N(TULPO) - MIRAFLORES - MICHILQUILCA - LONG. =8.000 - DISTRITO DE MOLLEBAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Ciente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO Monto Contratado S/. 2,414,700.00
 Tramo : (TULPO) - MIRAFLORES - MICHILQUILCA Plazo de ejecución 120 días calendario
 Contratista : CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
 Inspector : ING. LUIS BRANCO LEON LEON - CIP: 153510
 Residente : ING. CARLOS EDUARDO RONCAL MORALES - CIP: 53532
 Asis. de Residente : ING. ANDREA LILIANA DELGADO KOBASHIKAWA - CIP: 218998

02 PAVIMENTOS
 02.01 CAPA NIVELANTE E=0.05 M

M3

Progresiva		Longitud	Ancho	Espesor	Area	Volumen
Inicio	Fin	(m)	(m)	(m)	(m2)	(m3)
1+000	2+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
2+000	3+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
3+000	4+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
4+000	5+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
5+000	6+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
6+000	7+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
7+000	8+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
TOTAL						1,750.00

02.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M

M3

Progresiva		Longitud	Ancho	Espesor	Area	Volumen
Inicio	Fin	(m)	(m)	(m)	(m2)	(m3)
0+860	1+000	140.00	5.00	0.15	700.00	105.00
1+000	2+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
2+000	3+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
3+000	4+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
4+000	5+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
5+000	6+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
6+000	7+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
7+000	8+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
TOTAL						5,355.00

03 TRANSPORTE

03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM
 03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM

Progresiva		CANTERA	CANTERA	DISTANCIA	Longitud	Ancho	Area	Plazoletas 3%	ESPESOR	VOLUMEN	D<=1km	D>1km
Inicio	Fin	UBICACION (km)	ACCESO (km)	(KM)	(m)	(m)	(m2)	(m2)	(m)	(m3)		
0.95	1.00	6.00	4.46	9.49	48.55	5.00	242.75	7.28	0.15	37.50	37.50	318.39
1.00	2.00	6.00	4.46	8.96	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	6,152.89
2.00	3.00	6.00	4.46	7.96	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	5,380.39
3.00	4.00	6.00	4.46	6.96	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	4,607.89
4.00	5.00	6.00	4.46	5.96	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	3,835.39
5.00	6.00	6.00	4.46	4.96	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	3,062.89
6.00	7.00	6.00	4.46	4.96	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	3,062.50
7.00	8.00	6.00	4.46	5.96	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	3,834.69
TOTAL											5,445.00	30,255.00

03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM
 03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM

Progresiva		DME	DME	DISTANCIA	Longitud	Ancho	Area	Plazoletas 3%	ESPESOR	VOLUMEN	D<=1km	D>1km
Inicio	Fin	UBICACION (km)	ACCESO (km)	(KM)	(m)	(m)	(m2)	(m2)	(m)	(m3)		
1.27	2.00	0.28	0.00	1.35	730.00	5.00	3,650.00	0	0.10	365.00	365.00	128.48
2.00	3.00	0.28	0.00	2.22	1,000.00	5.00	5,000.00	0	0.10	500.00	500.00	609.00
3.00	4.00	0.28	0.00	3.22	1,000.00	5.00	5,000.00	0	0.10	500.00	500.00	1,109.00
4.00	5.00	0.28	0.00	4.22	1,000.00	5.00	5,000.00	0	0.10	500.00	500.00	1,609.00
5.00	6.00	0.28	0.00	5.22	1,000.00	5.00	5,000.00	0	0.10	500.00	500.00	2,108.40
6.00	7.00	0.28	0.00	6.22	1,000.00	5.00	5,000.00	0	0.10	500.00	500.00	2,608.12
7.00	8.00	0.28	0.00	7.22	1,000.00	5.00	5,000.00	0	0.10	500.00	500.00	3,108.00
TOTAL											3,365.00	11,280.00

4.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
 04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS

Progresiva		Longitud	Parcial
Inicio	Fin	(m)	(m)
1+300	2+000	700.00	700.00
2+000	3+000	1,000.00	1,000.00
3+000	4+000	1,000.00	1,000.00
4+000	5+000	1,000.00	1,000.00
5+000	6+000	1,000.00	1,000.00
6+000	7+000	1,000.00	1,000.00
7+000	8+000	1,000.00	1,000.00
TOTAL			6,700.00

Carlos E. Roncal Morales
 ING. CIVIL
 R. CIP. 53532



Luis Branco León León
 INGENIERO CIVIL
 CIP 153510



- ANALISIS DE
VALORIZACION
MENSUAL.

ANALISIS DE VALORIZACION MENSUAL Nº 03

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Obra: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE - 3N(LAS PIEDRAS - LONG = 11,620 Km; - EMP. PE - 3N(MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI - 11(MOROCULLA) - LONG = 8,710 Km; - EMP. - PE - 3N(TULPO) - MIRAFLORES - MICHICUILCA - LONG. = 8,000 - DISTRITO DE MOLLEBAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
(PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - (LAS PIEDRAS)
Contralista: CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
Inspector: ING. LUIS BRANCO LEON LEON - CIP: 153510
Residente: ING. CARLOS EDUARDO RONCAL MORALES - CIP: 53532
Asis. de Residente: ING. ANDREA LILIANA DELGADO KOBASHIKAWA - CIP: 218998

Monto Contratado: S/. 2,414,700.00
Plazo de ejecución: 120 días calendario

PRESUPUESTO GENERAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
			Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	%
1.00	OBRAS PROVISIONALES													
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	gib	1.00	S/. 40,220.52	S/. 40,220.52	0.50	20,110.26	50.00%	0.50	20,110.26	50.00%	0.50	20,110.26	50.00%
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	11.62	S/. 998.09	S/. 11,597.81	8.40	8,383.96	72.29%	3.22	3,213.85	27.71%	11.62	11,597.81	100.00%
2.00	PAVIMENTOS													
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	2905.00	S/. 4.62	S/. 13,421.10	2,040.00	9,424.80	70.22%	865.00	3,996.30	29.78%	2,905.00	13,421.10	100.00%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	8715.00	S/. 32.06	S/. 279,402.90	6,150.00	197,169.00	70.57%	2,565.00	82,233.90	29.43%	8,715.00	279,402.90	100.00%
3.00	TRANSPORTE													
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	8985.00	S/. 6.57	S/. 59,031.45	6,225.00	40,898.25	69.28%	2,760.00	18,133.20	30.72%	8,985.00	59,031.45	100.00%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	65727.28	S/. 0.95	S/. 62,440.92	44,925.00	42,678.75	68.35%	20,802.28	19,762.17	31.65%	65,727.28	62,440.92	100.00%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	5680.00	S/. 6.57	S/. 36,660.60	3,675.00	24,144.75	65.86%	1,905.00	12,515.85	34.14%	5,580.00	36,660.60	100.00%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	28408.50	S/. 0.95	S/. 26,988.08	19,150.00	18,192.50	67.41%	9,258.50	8,795.58	32.59%	28,408.50	26,988.08	100.00%
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE													
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	11620.00	S/. 1.84	S/. 21,380.80	8,200.00	15,088.00	70.57%	3,420.00	6,292.80	29.43%	11,620.00	21,380.80	100.00%
5.00	SEÑALIZACION													
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	12.00	S/. 315.24	S/. 3,782.88	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
05.02.	SENALES PREVENTIVAS	und	27.00	S/. 389.22	S/. 10,508.94	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
05.03.	SENALES REGLAMENTARIAS	und	3.00	S/. 389.22	S/. 1,167.66	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
05.04.	SENALES INFORMATIVAS	und	3.00	S/. 468.32	S/. 1,404.96	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.00	IMPACTO AMBIENTAL													
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	S/. 7,274.14	S/. 14,548.28	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
7.00	EMERGENCIA SANITARIA													
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gib	1.00	S/. 23,231.60	S/. 23,231.60	0.50	11,615.80	50.00%	0.25	5,807.90	25.00%	0.75	17,423.70	75.00%
Costo Directo					605,785.50		387,706.07			160,751.55			548,457.62	
GASTOS GENERALES (10%) C.D.					60,578.55		38,770.61			16,075.16			54,845.77	
UTILIDAD (5%) C.D.					30,289.43		19,385.30			8,037.58			27,422.88	
SUB TOTAL					696,656.78		445,861.98			184,864.29			630,726.27	
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (IGV 18%)					125,398.22		80,255.15			113,530.72			11,867.50	
VALOR REFERENCIAL DE OBRA					822,055.00		526,117.13			218,139.86			744,256.99	
PORCENTAJE AVANCE DE OBRA					100.00%		64.00%			26.54%			90.54%	9.46%

Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532

Luis Branco León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

000000

ANALISIS DE VALORIZACION MENSUAL N° 03

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Obra "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO - EMP. PE-3N(LAS PIEDRAS - LONG = 11.620 Km; - EMP. PE-3N(MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI-118(OROCULLAY) - LONG = 8.710 Km; - EMP. - PE-3N(TULPO) - MIRAFLORES - MICHIGUILCA - LONG = 6.000 - DISTRITO DE MOLLEBAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - OROCULLAY

Tramo : (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - OROCULLAY

Contratista: CONSORCIO VIAL MIRAFLORES

Inspector: ING. LUIS BRANCO LEON LEON - CIP: 153510

Residente: ING. CARLOS EDUARDO RONCAL MORALES - CIP: 53532

Asis. de Residente: ING. ANDREA LILIANA DELGADO KOBASHIKAWA - CIP: 216988

Monto Contratado: S/ 2.414.700,00
Plazo de ejecución: 120 días calendario

DESCRIPCION DE PARTIDAS		PRESUPUESTO GENERAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		Und	Medida	Precio B.	Partida B.	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO
1.00	OBRAS PROVISIONALES															
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	S/ 40.220,52	S/ 40.220,52	0.50	20.110,26	50.00%	0.50	0.00	0.00%	0.50	20.110,26	50.00%	0.50	20.110,26
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	8.71	S/ 998,09	S/ 8.693,36	8.71	8.693,36	100.00%	0.00	0.00	0.00%	8.71	8.693,36	100.00%	0.00	0.00
2.00	PAVIMENTOS															
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	2177.50	S/ 4.62	S/ 10.060,05	125.00	577.50	5.74%	2.052.50	9.482,55	94.28%	2.177.50	10.060,05	100.00%	0.00	0.00
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	6532.50	S/ 32,06	S/ 209.431,95	375.00	12.022,50	5.74%	6.157,50	197.409,45	94.28%	6.532,50	209.431,95	100.00%	0.00	0.00
3.00	TRANSPORTE															
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	6735.00	S/ 6,57	S/ 44.248,95	405.00	2.680,85	6.01%	6.330.00	41.588,10	93.99%	6.735.00	44.248,95	100.00%	0.00	0.00
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	39459.53	S/ 0,91	S/ 35.908,17	1.995.00	1.815,45	5.06%	37.464,53	34.092,72	94.94%	39.459,53	35.908,17	100.00%	0.00	0.00
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	4125.00	S/ 8,57	S/ 27.101,25	195.00	1.281,15	4.73%	3.990.00	25.820,10	95.27%	4.125.00	27.101,25	100.00%	0.00	0.00
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	15015.23	S/ 0,91	S/ 13.863,86	1.125.00	1.023,75	7.48%	13.890,23	12.640,11	92.51%	15.015,23	13.863,86	100.00%	0.00	0.00
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE															
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	8710.00	S/ 1,84	S/ 16.026,40	2.800.00	5.152,00	32.15%	5.910.00	10.874,40	67.85%	8.710.00	16.026,40	100.00%	0.00	0.00
5.00	SEÑALIZACION															
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	9.00	S/ 315,24	S/ 2.837,16	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	9.00	2.837,16
05.02.	SENALES PREVENTIVAS	und	10.00	S/ 389,22	S/ 3.892,20	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	10.00	3.892,20
05.03.	SENALES REGLAMENTARIAS	und	7.00	S/ 389,22	S/ 2.724,54	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	7.00	2.724,54
05.04.	SENALES INFORMATIVAS	und	5.00	S/ 468,32	S/ 2.341,60	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.00	2.341,60
6.00	IMPACTO AMBIENTAL															
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	S/ 7.274,14	S/ 14.548,27	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	14.548,27
7.00	EMERGENCIA SANITARIA															
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	S/ 22.382,03	S/ 22.382,03	0.50	11.191,02	50.00%	0.25	5.595,51	25.00%	0.75	16.786,52	75.00%	0.25	5.595,51
COSTO DIRECTO					454.080,32		64.527,85			337.502,94			402.030,79			52.049,53
GASTOS GENERALES [10%] C.D.					45.408,03		6.452,78			33.750,29			40.203,07			5.204,98
UTILIDAD [5%] C.D.					22.704,02		3.226,40			16.875,15			20.101,55			2.602,47
SUB TOTAL					522.192,37		74.207,03			388.128,38			462.335,41			59.856,96
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA [IGV 18%]					93.994,63		13.357,26			69.863,11			83.720,37			10.774,26
VALOR REFERENCIAL DE OBRA					616.187,00		87.564,29			457.991,49			546.055,78			70.631,22
PORCENTAJE AVANCE DE OBRA					100.00%		14.21%			74.33%			88.54%			11.46%

Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP: 53532

Luis Branko León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510



- HOJA DE
CANCELACION.

HOJA DE CANCELACION

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Servicio	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE - 3N(LAS PIEDRAS) - LONG.= 11.620 Km; - EMP. PE - 3N(MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI - 118(OROCULLAY) - LONG.=8.710 Km; - EMP. - PE - 3N(TULPO) - MIRAFLORES - MICHQUILCA - LONG. =8.000 - DISTRITO DE MOLLEBAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"	
Cliente	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO	
Ubicación	MOLLEBAMBA	
Contratista	CONSORCIO VIAL MIRAFLORES	
Inspector	ING. LUIS BRANCO LEON LEON - CIP: 153510	
Residente	ING. CARLOS EDUARDO RONCAL MORALES - CIP: 53532	
Asis. de Residente:	ING. ANDREA LILIANA DELGADO KOBASHIKAWA - CIP: 218998	

MONTO REFERENCIAL	2,414,700.00
MONTO CONTRATADO	2,414,700.00
MONTO CONTRATADO MANTENIMIENTO PERIODICO (83.00 %)	2,004,201.00

	COSTO DIRECTO	
	PISCOCHACA (11.620 Km.)	S/. 160,751.55
	MOLLEBAMBA (8.710 km.)	S/. 337,502.94
	TULPO (8.000 km.)	S/. 292,779.09
1.00.00	COSTO DIRECTO TOTAL	S/. 791,033.58
	GASTOS GENERALES 10%	S/. 79,103.36
	UTILIDAD 5%	S/. 39,551.68
2.00.00	SUBTOTAL	S/. 909,688.62
	REAJUSTES	0.00
3.00.00	SUBTOTAL CON REAJUSTES	S/. 909,688.62
	AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO 10%	S/. 0.00
	AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES 20%	S/. 0.00
4.00.00	SUBTOTAL CON AMORTIZACIONES	S/. 909,688.62
5.00.00	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)	S/. 163,743.95
6.00.00	TOTAL NETO A RECIBIR	S/. 1,073,432.57
	Porcentaje de avance ejecutado en el mes (%)	53.56%


Carlos E. Roncal Morales
 ING. CIVIL
 R. CIP. 53532


 **Luis Branco León León**
 INGENIERO CIVIL
 CIP 153510



- CUADRO
COMPARATIVO
DE AVANCE DE
SERVICIO
(PROGRAMADO –
EJECUTADO -
PAGADO).

CUADRO COMPRATIVO DE AVANCE - PROGRAMADO - EJECUTADO - PAGADO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Proyecto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE - 3N(LAS PIEDRAS) - LONG.= 11.620 Km; - EMP. PE - 3N(MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI - 118(OROCULLAY) - LONG.=8.710 Km; - EMP. - PE - 3N(TULPO) - MIRAFLORES - MICHQUILCA - LONG. =8.000 - DISTRITO DE MOLLEBAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : MOLLEBAMBA
Contratista : CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
Inspector : ING. LUIS BRANCO LEON LEON - CIP: 153510
Residente : ING. CARLOS EDUARDO RONCAL MORALES - CIP: 53532
Asis. de Residente: ING. ANDREA LILIANA DELGADO KOBASHIKAWA - CIP: 218998

AVANCE DE SERVICIO PROGRAMADO

MES	MONTOS (Inc/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	94,599.17	94,599.17	4.72%	4.72%
31-Oct-20	662,194.20	756,793.37	33.04%	37.76%
30-Nov-20	662,194.20	1,418,987.57	33.04%	70.80%
31-Dic-20	585,213.43	2,004,201.00	29.20%	100.00%
TOTAL	2,004,201.00		100.00%	

AVANCE DE SERVICIO EJECUTADO

MES	MONTOS (Inc/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	121,744.06	121,744.06	6.07%	6.07%
31-Oct-20	592,670.06	714,414.12	29.57%	35.64%
30-Nov-20	1,073,432.57	1,787,846.69	53.56%	89.20%
31-Dic-20	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,787,846.69		89.20%	


AVANCE DE SERVICIO PAGADO

MES	MONTOS (Inc/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-Oct-20	0.00	0.00	0.00%	
30-Nov-20	0.00	0.00	0.00%	
31-Dic-20	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00		0.00%	

Carlos E. Roncal Morales
 ING. CIVIL
 R. CIP. 53532

Luis Branco León León
 INGENIERO CIVIL
 CIP 153510





- CUADRO DE
BARRAS Y
CURVA S.

CUADRO DE BARRAS Y CURVA S

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - EMP. PEÑ (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE - 3N(LAS PIEDRAS - LONG = 11.620 Km; - EMP. PE - 3N(MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI - 118(OROCULLAY) - LONG = 8.710 Km; - EMP. - PE - 3N(TULPO) - MIRAFLORES - MICHIGUILCA - LONG = 8.000 - DISTRITO DE MOLLEBAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"


Proyecto :

Cliente :
Tramo :
Contratista :
Inspector :
Residente :
Asis. de Residente:

Monto Contratado
Plazo de ejecución

SI. 2,414,700.00

120 días calendario

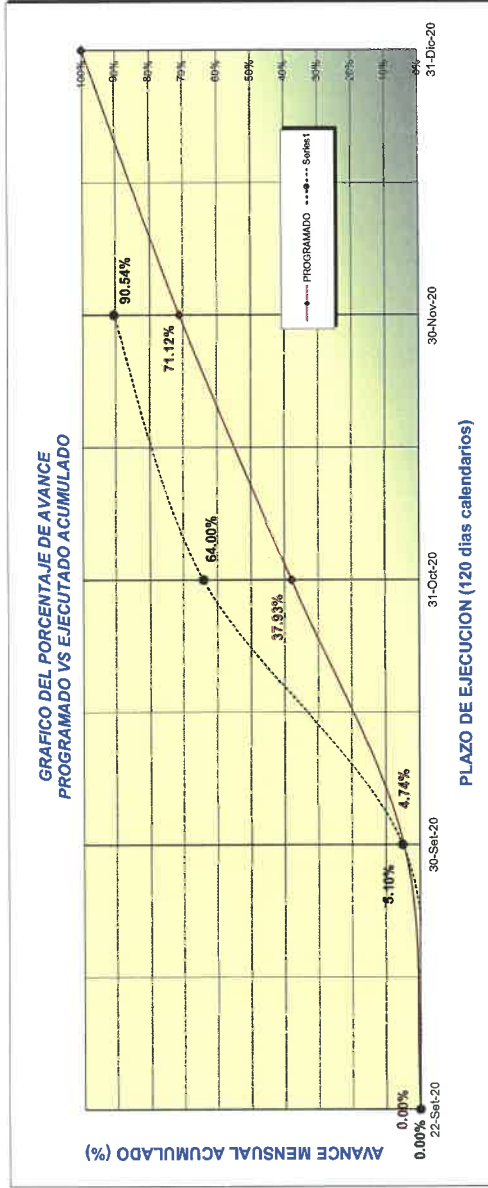

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Incl. IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL SI.	ACUMUL. SI.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	38,971.40	38,971.40	4.74%	4.74%
31-Oct-20	272,799.77	311,771.17	33.19%	37.93%
30-Nov-20	272,799.77	584,570.94	33.19%	71.12%
31-Dic-20	237,484.08	822,055.00	28.88%	100.00%
TOTAL	822,055.00		100.00%	

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (Incl. IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL SI.	ACUMUL. SI.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	41,942.98	41,942.98	5.10%	5.10%
31-Oct-20	484,174.15	526,117.13	58.90%	64.00%
30-Nov-20	218,139.86	744,256.99	26.54%	90.54%
31-Dic-20				
TOTAL	744,256.99		90.54%	

Carlos E. Roncal Morales

Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532



Luis Branco León
Luis Branco León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

CUADRO DE BARRAS Y CURVA S

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - EMP. PE3M (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE - 3N(LAS PIEDRAS - LONG. = 11,620 Km) - EMP. PE - 3N(MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI - 1N(OROCULLAY) - LONG. = 8,740 Km) - EMP. - PE - 3N(TULPO) - MIRAFLORES - MICHILILCA - LONG. = 8,000 - DISTRITO DE MOLLEBAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Proyecto :

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

Tramo : (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - OROCULLAY


Contratista : CONSORCIO VIAL MIRAFLORES

Inspector : ING. LUIS BRANCO LEON LEON - CIP: 153510

Residente : ING. CARLOS EDUARDO RONCAL MORALES - CIP: 53532

Asis. de Residente: ING. ANDREA LLIANA DELGADO KOBASHIKAWA - CIP: 218998

Monto Contratado
Plazo de ejecución
SI: 2,414,700.00
120 días calendario

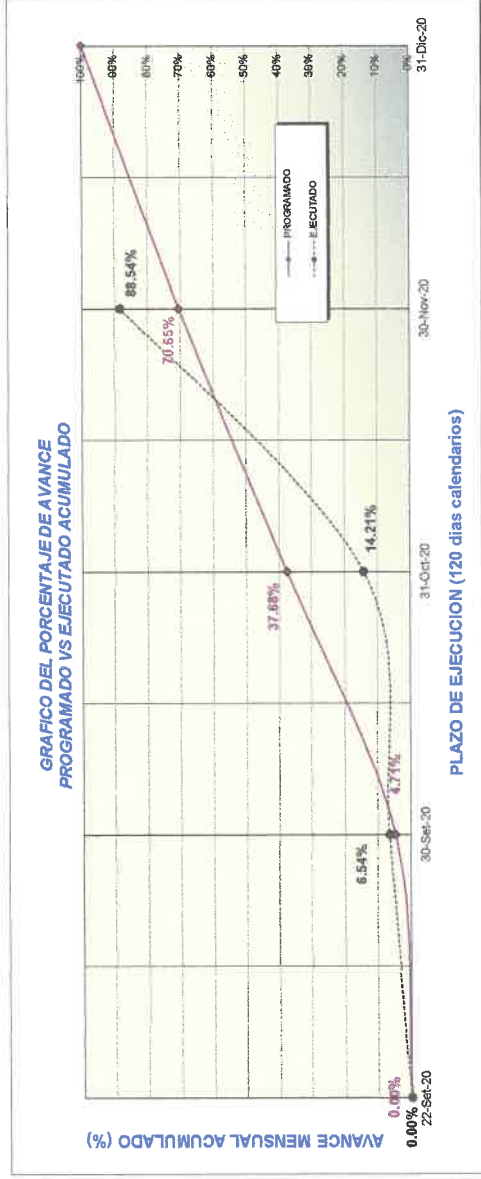

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL SI.	ACUMUL. SI.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	29,021.92	29,021.92	4.71%	4.71%
31-Oct-20	203,153.47	232,175.39	32.97%	37.68%
30-Nov-20	203,153.47	435,328.86	32.97%	70.65%
31-Dic-20	180,858.14	616,187.00	29.35%	100.00%
TOTAL	616,187.00		100.00%	

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL SI.	ACUMUL. SI.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	40,300.36	40,300.36	6.54%	6.54%
31-Oct-20	47,263.93	87,564.29	7.67%	14.21%
30-Nov-20	457,991.49	545,555.78	74.33%	88.54%
31-Dic-20				
TOTAL	545,555.78		88.54%	

Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP: 53532

Luis Branco León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510


CUADRO DE BARRAS Y CURVA S

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE - 3N(LAS PIEDRAS) - LONG. = 11,620 Km; - EMP. PE - 3N(MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI - 11(OROCULLAY) - LONG. = 8,710 Km; - EMP. PE - 3N(TULPO) - MIRAFLORES - MICHICUILCA - LONG. = 9,000 - DISTRITO DE MOLLEBAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Proyecto : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 Cliente : (TULPO) - MIRAFLORES - MICHICUILCA
 Tramo : CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
 Contratista : ING. LUIS BRANCO LEON LEON - CIP: 153510
 Inspector : ING. CARLOS EDUARDO RONCAL MORALES - CIP: 53532
 Asia. de Residente: ING. ANDREA LILIANA DELGADO KOBASHIKAWA - CIP: 218988

Monto Contratado
 Plazo de ejecucion
 S/. 2,414,700.00
 120 dias calendarios

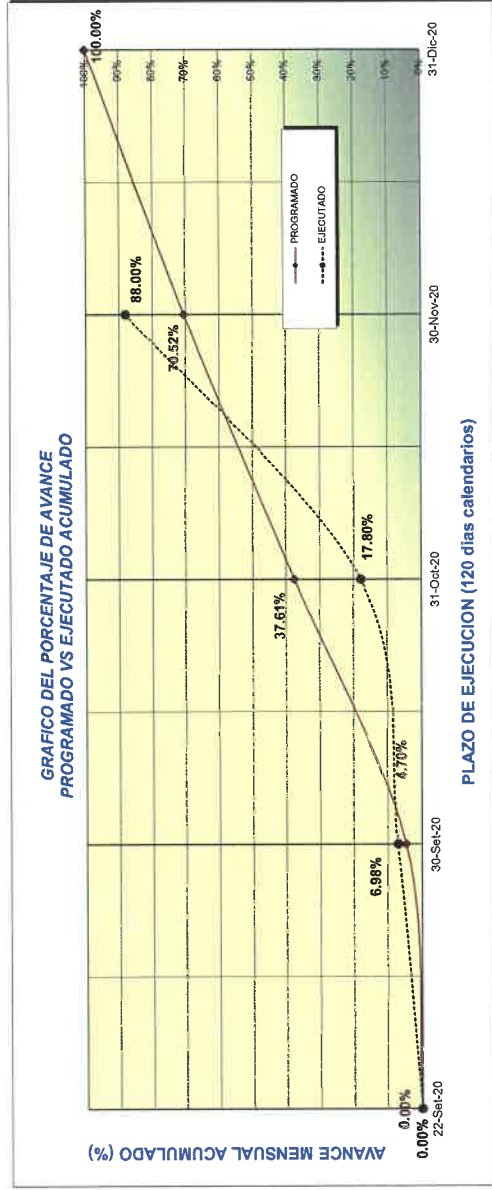

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Incl IGTV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	26,605.85	26,605.85	4.70%	4.70%
31-Oct-20	186,240.96	212,846.81	32.91%	37.61%
30-Nov-20	186,240.96	399,087.77	32.91%	70.52%
31-Dic-20	166,871.23	565,959.00	29.48%	100.00%
TOTAL	565,959.00		100.00%	

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (Incl IGTV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	39,500.72	39,500.72	6.98%	6.98%
31-Oct-20	61,231.98	100,732.70	10.82%	17.80%
30-Nov-20	397,301.22	498,033.92	70.20%	88.00%
31-Dic-20				
TOTAL	498,033.92		88.00%	

Carlos E. Roncal Morales
 ING. CIVIL
 R. CIP. 53532

Luis Branco Leon
 INGENIERO CIVIL
 CIP 153510

000319

CUADRO DE BARRAS Y CURVA S

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Proyecto : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOCAMBA - EMP. PE - 3N(LAS PIEDRAS - LONG.=11,620 Km; - EMP. PE - 3N(MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI - 118(OROCULLAY) - LONG.=8,710 Km; - EMP. - PE - 3N(TULPO) - MIRAFLORES - MICHIGUILCA - LONG. =6,000 - DISTRITO DE MOLLEBAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Ciente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

Ubicación : MOLLEBAMBA


Contratista : CONSORCIO VIAL MIRAFLORES

Inspector : ING. LUIS BRANCO LEON LEON - CIP: 153510

Residente : ING. CARLOS EDUARDO RONCAL MORALES - CIP: 53532

Asis. de Residente: ING. ANDREA LILIANA DELGADO KOBASHIKAWA - CIP: 218988

Monto Contratado
Plazo de ejecución
SI: 2,414,700.00
120 días calendario

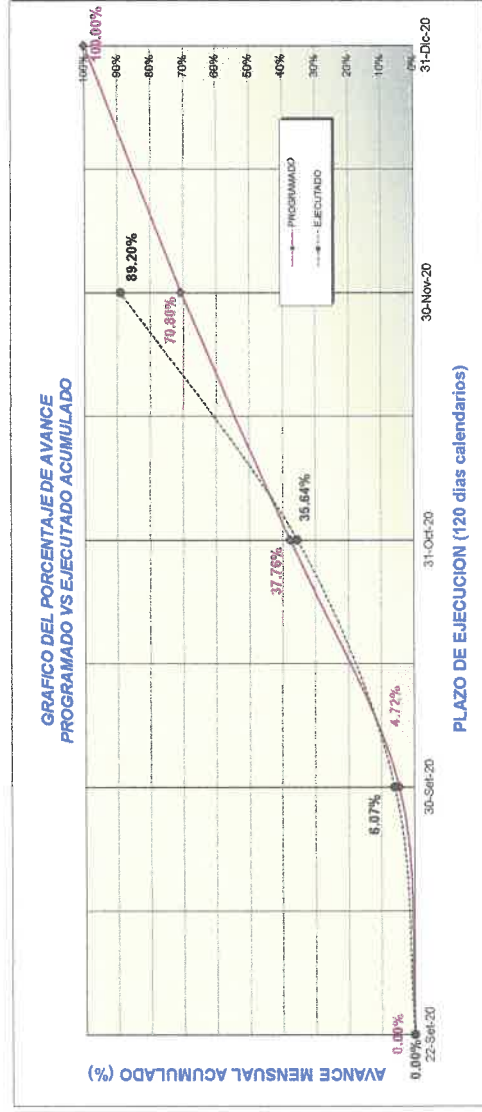

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL SI.	ACUMUL. SI.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	94,599.17	94,599.17	4.72%	4.72%
31-Oct-20	662,194.20	756,793.37	33.04%	37.76%
30-Nov-20	662,194.20	1,418,987.57	33.04%	70.80%
31-Dic-20	585,213.43	2,004,201.00	29.20%	100.00%
TOTAL	2,004,201.00		100.00%	

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL SI.	ACUMUL. SI.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	121,744.06	121,744.06	6.07%	6.07%
31-Oct-20	592,670.06	714,414.12	28.57%	35.64%
30-Nov-20	1,073,432.57	1,787,846.69	53.95%	89.20%
31-Dic-20				
TOTAL	1,787,846.69		89.20%	

Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP: 53532

Luis Branco Leon León
INGENIERO CIVIL
CIP: 153510



- CRONOGRAMA
DE AVANCE DE
SERVICIO
PROGRAMADO.

CRONOGRAMA DE AVANCE DE SERVICIO PROGRAMADO

Proyecto : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE - 3N(LAS PIEDRAS - LONG.= 11.620 Km; - EMP. PE - 3N(MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI - 118(OROCULLAY) - LONG.=8.710 Km; - EMP. - PE - 3N(TULPO) - MIRAFLORES - MICHQUILCA - LONG. =8.000 - DISTRITO DE MOLLEBAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Ciente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 Tramo : (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - (LAS PIEDRAS)
 Contratista : CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
 Inspector : ING. LUIS BRANCO LEON LEON - CIP: 153510
 Residente : ING. CARLOS EDUARDO RONCAL MORALES - CIP: 53532
 Asis. de Residente: ING. ANDREA LILIANA DELGADO KOBASHIKAWA - CIP: 218998

ITEM	PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04
						PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO
01	OBRAS PRELIMINARES								
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	glb	1.00	S/. 40,220.52	S/. 40,220.52	2,011.03	14,077.18	14,077.18	10,055.13
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	11.62	S/. 998.09	S/. 11,597.81	579.89	4,059.23	4,059.23	2,899.45
02	PAVIMENTOS								
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	2906.00	S/. 4.62	S/. 13,421.10	671.06	4,697.39	4,697.39	3,355.28
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	m3	8715.00	S/. 32.06	S/. 279,402.90	13,970.15	97,791.02	97,791.02	69,850.73
03	TRANSPORTE								
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	8985.00	S/. 6.57	S/. 59,031.45	2,951.57	20,661.01	20,661.01	14,757.86
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	65727.28	S/. 0.95	S/. 62,440.92	3,122.05	21,854.32	21,854.32	15,610.23
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	5580.00	S/. 6.57	S/. 36,660.60	1,833.03	12,831.21	12,831.21	9,165.15
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	28408.50	S/. 0.95	S/. 26,988.08	1,349.40	9,445.83	9,445.83	6,747.02
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE								
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	11620.00	S/. 1.84	S/. 21,380.80	1,069.04	7,483.28	7,483.28	5,345.20
05	SEÑALIZACION								
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	12.00	S/. 315.24	S/. 3,782.88				3,782.88
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	27.00	S/. 389.22	S/. 10,508.94				10,508.94
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	3.00	S/. 389.22	S/. 1,167.66				1,167.66
05.04	SEÑALES INFORMATIVAS	und	3.00	S/. 468.32	S/. 1,404.96				1,404.96
06	IMPACTO AMBIENTAL								
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	S/. 7,274.14	S/. 14,548.28				14,548.28
07	EMERGENCIA SANITARIA								
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	S/. 23,231.60	S/. 23,231.60	1,161.58	8,131.06	8,131.06	5,807.90
COSTO DIRECTO					S/ 605,788.50	28,718.79	201,031.52	201,031.52	175,006.67
COSTO INDIRECTO (10.00%)					S/ 60,578.85	S/ 2,871.88	S/ 20,103.15	S/ 20,103.15	S/ 17,500.67
UTILIDAD (5%)					S/ 30,289.43	S/ 1,435.94	S/ 10,051.58	S/ 10,051.58	S/ 8,750.33
SUB TOTAL					S/ 696,656.78	S/ 33,026.61	S/ 231,186.25	S/ 231,186.25	S/ 201,257.67
IGV (18%)					S/ 125,398.22	S/ 5,944.79	S/ 41,613.52	S/ 41,613.52	S/ 36,226.39
COSTO TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL					S/ 822,055.00	S/ 38,971.40	S/ 272,799.77	S/ 272,799.77	S/ 237,484.06

PROGRAMADO MENSUAL	4.74%	33.19%	33.19%	28.88%
ACUMULADO	4.74%	37.93%	71.12%	100.00%


Carlos E. Roncal Morales
 ING. CIVIL
 R. CIP. 53532




Luis Branco León León
 INGENIERO CIVIL
 CIP 153510

000315

CRONOGRAMA DE AVANCE DE SERVICIO PROGRAMADO

Proyecto : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE - 3N(LAS PIEDRAS - LONG.= 11.620 Km; - EMP. PE - 3N(MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI - 118(OROCULLAY) - LONG.=8.710 Km; - EMP. - PE - 3N(TULPO) - MIRAFLORES - MICHQUILCA - LONG. =8.000 - DISTRITO DE MOLLEBAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 Tramo : (MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - OROCULLAY
 Contratista : CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
 Inspector : ING. LUIS BRANCO LEON LEON - CIP: 153510
 Residente : ING. CARLOS EDUARDO RONCAL MORALES - CIP: 53532
 Asis. de Residente: ING. ANDREA LILIANA DELGADO KOBASHIKAWA - CIP: 218998

ITEM	PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04
						PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO
01	OBRAS PRELIMINARES								
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	gib	1.00	40,220.52	40,220.52	2,011.03	14,077.18	14,077.18	10,055.13
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	8.71	998.09	8,693.36	434.67	3,042.68	3,042.68	2,173.34
02	PAVIMENTOS								
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	2,177.50	4.62	10,060.05	503.00	3,521.02	3,521.02	2,515.01
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	m3	6,532.50	32.06	209,431.95	10,471.60	73,301.18	73,301.18	52,357.99
03	TRANSPORTE								
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	6,735.00	6.57	44,248.95	2,212.45	15,487.13	15,487.13	11,062.24
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	39,459.53	0.91	35,908.17	1,795.41	12,567.86	12,567.86	8,977.04
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	4,125.00	6.57	27,101.25	1,355.06	9,485.44	9,485.44	6,775.31
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	15,015.23	0.91	13,663.86	683.19	4,782.35	4,782.35	3,415.97
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE								
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	8,710.00	1.84	16,026.40	801.32	5,609.24	5,609.24	4,006.60
05	SEÑALIZACION								
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	9.00	315.24	2,837.16				2,837.16
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	10.00	389.22	3,892.20				3,892.20
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	7.00	389.22	2,724.54				2,724.54
05.04	SEÑALES INFORMATIVAS	und	5.00	468.32	2,341.60				2,341.60
06	IMPACTO AMBIENTAL								
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	7,274.14	14,548.28				14,548.28
07	EMERGENCIA SANITARIA								
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gib	1.00	22,382.03	22,382.03	1,119.10	7,833.71	7,833.71	5,595.51
COSTO DIRECTO					S/ 454,080.32	21,386.82	149,707.79	149,707.79	133,277.92
COSTO INDIRECTO (10.00%)					S/ 45,408.03	S/ 2,138.68	S/ 14,970.78	S/ 14,970.78	S/ 13,327.79
UTILIDAD (5%)					S/ 22,704.02	S/ 1,069.34	S/ 7,485.39	S/ 7,485.39	S/ 6,663.90
SUB TOTAL					S/ 522,192.37	S/ 24,594.84	S/ 172,163.96	S/ 172,163.96	S/ 153,269.61
IGV (18%)					S/ 93,994.63	S/ 4,427.08	S/ 30,989.51	S/ 30,989.51	S/ 27,588.53
COSTO TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL					S/ 616,187.00	S/ 29,021.92	S/ 203,153.47	S/ 203,153.47	S/ 180,858.14

PROGRAMADO MENSUAL	4.71%	32.97%	32.97%	29.35%
ACUMULADO	4.71%	37.68%	70.65%	100.00%


 Carlos E. Roncal Morales
 ING. CIVIL
 R. CIP. 53532


 Luis Branco León León
 INGENIERO CIVIL
 CIP 153510

CRONOGRAMA DE AVANCE DE SERVICIO PROGRAMADO

000314


Proyecto : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: - EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE - 3N(LAS PIEDRAS - LONG.= 11.820 Km; - EMP. PE - 3N(MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI - 118(OROCULLAY) - LONG.=8.710 Km; - EMP. - PE - 3N(TULPO) - MIRAFLORES - MICHQUILCA - LONG. =8.000 - DISTRITO DE MOLLEBAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Tramo : (TULPO) - MIRAFLORES - MICHQUILCA
Contratista : CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
Inspector : ING. LUIS BRANCO LEON LEON - CIP: 153510
Residente : ING. CARLOS EDUARDO RONCAL MORALES - CIP: 53532
Asis. de Residente: ING. ANDREA LILIANA DELGADO KOBASHIKAWA - CIP: 218998


ITEM	PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04
						PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO
01	OBRAS PRELIMINARES								
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	glb	1.00	S/. 40,220.52	S/. 40,220.52	2,011.03	14,077.18	14,077.18	10,055.13
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	8.00	S/. 998.09	S/. 7,984.72	399.24	2,794.65	2,794.65	1,996.18
02	PAVIMENTOS								
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	2000.00	S/. 4.62	S/. 9,240.00	462.00	3,234.00	3,234.00	2,310.00
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	m3	6000.00	S/. 32.06	S/. 192,360.00	9,618.00	67,326.00	67,326.00	48,090.00
03	TRANSPORTE								
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	6180.00	S/. 6.57	S/. 40,602.60	2,030.13	14,210.91	14,210.91	10,150.65
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	33990.00	S/. 0.91	S/. 30,930.90	1,546.54	10,825.82	10,825.82	7,732.72
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	3770.00	S/. 6.57	S/. 24,768.90	1,238.44	8,669.12	8,669.12	6,192.22
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	12390.00	S/. 0.91	S/. 11,274.90	563.74	3,946.22	3,946.22	2,818.72
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE								
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	8000.00	S/. 1.84	S/. 14,720.00	736.00	5,152.00	5,152.00	3,680.00
05	SEÑALIZACION								
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	9.00	S/. 315.24	S/. 2,837.16				2,837.16
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	15.00	S/. 389.22	S/. 5,838.30				5,838.30
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	2.00	S/. 389.22	S/. 778.44				778.44
05.04	SEÑALES INFORMATIVAS	und	2.00	S/. 468.32	S/. 936.64				936.64
06	IMPACTO AMBIENTAL								
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	S/. 7,274.14	S/. 14,548.28				14,548.28
07	EMERGENCIA SANITARIA								
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	S/. 20,024.96	S/. 20,024.96	1,001.24	7,008.74	7,008.74	5,006.24
COSTO DIRECTO					S/ 417,066.32	19,606.36	137,244.64	137,244.64	122,970.68
COSTO INDIRECTO (10.00%)					S/ 41,706.63	1,960.64	13,724.46	13,724.46	12,297.07
UTILIDAD (5%)					S/ 20,853.32	980.33	6,862.22	6,862.22	6,148.55
SUB TOTAL					S/ 479,626.27	22,547.33	157,831.32	157,831.32	141,416.30
IGV (18%)					S/ 86,332.73	4,058.52	28,409.64	28,409.64	25,454.93
COSTO TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL					S/ 565,959.00	26,605.85	186,240.96	186,240.96	166,871.23

PROGRAMADO MENSUAL	4.70%	32.91%	32.91%	29.48%
ACUMULADO	4.70%	37.61%	70.52%	100.00%


Carlos E. Roncal Morales
 ING. CIVIL
 R. CIP. 53532



Luis Branco León León
 INGENIERO CIVIL
 CIP 153510



- PANEL
FOTOGRAFICO.

CONSORCIO VIAL **MIRAFLORES**

TRAMO: EMP. PE3N (PISCOCHACA) - SHUBA - NABOBAL - SOCOBAMBA - EMP. PE - 3N (LAS
PIEDRAS - LONG. = 11.620 Km



EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR $E=0.15$ - KM 1+100 (LEV. OBS.)



RIEGO DE VÍA - KM 1+400 (LEV. OBS.)


Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532




Luis Brancó León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

CONSORCIO VIAL MIRAFLORES

COMPACTADO DE VÍA - KM: 1+600 (LEV. OBS.)



CANTERA KM 5+000


Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532


 **Luis Bracho León León**
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

CONSORCIO VIAL MIRAFLORES**TRAMO LAS PIEDRAS KM: 3+300****TRAMO LAS PIEDRAS - KM: 3+300**


Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532


 **Luis Branca León León**
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

CONSORCIO VIAL MIRAFLORES



KM 0+600



KM: 1+000


Carlos E. Roncal Morales
 ING. CIVIL
 R. CIP. 53532


 **Luis Blanco León León**
 INGENIERO CIVIL
 CIP 153510

CONSORCIO VIAL **MIRAFLORES**



KM 2+000




KM 4+000


Carlos E. Roncal Morales
 ING. CIVIL
 R. CIP. 53532


 **Luis Brancó León León**
 INGENIERO CIVIL
 CIP 153510




KM 5+000

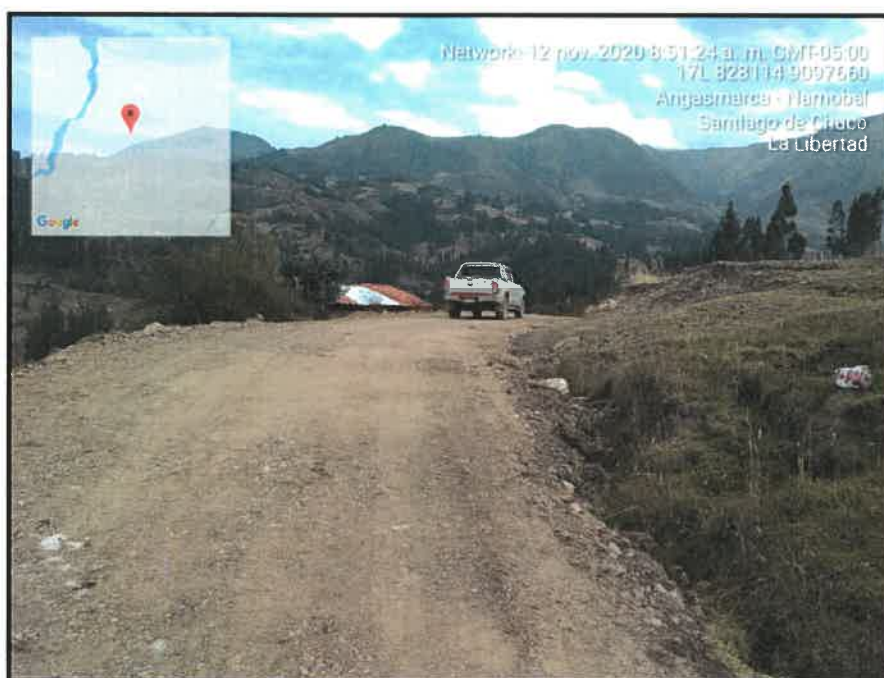

KM 7+000



Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532


 **Luis Blanco León León**
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

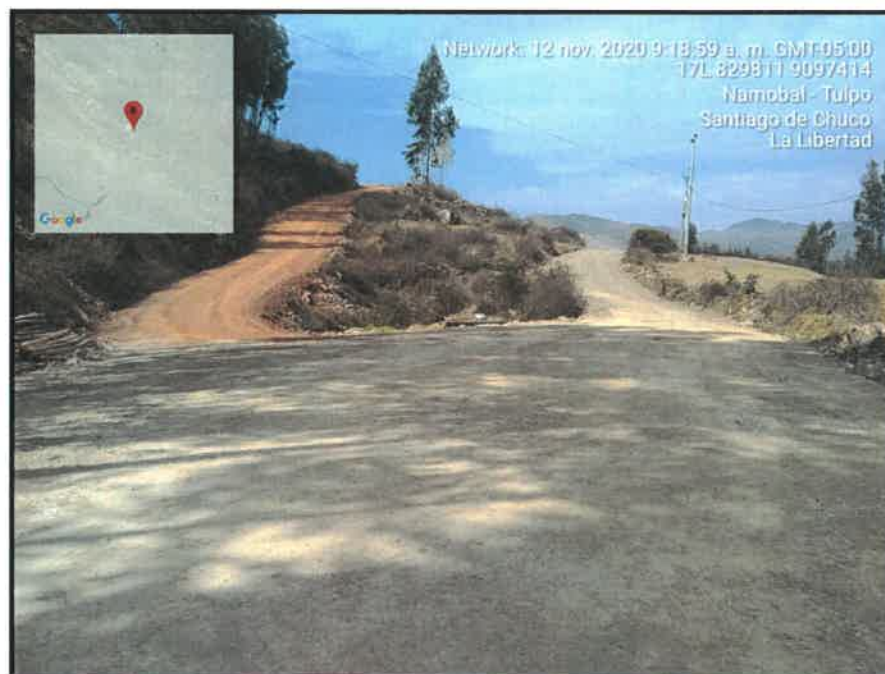CONSORCIO VIAL MIRAFLORES**KM 7+780****CRUCE LAS PIEDRAS - NABOBAL**


Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532


 **Luis Brando León León**
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

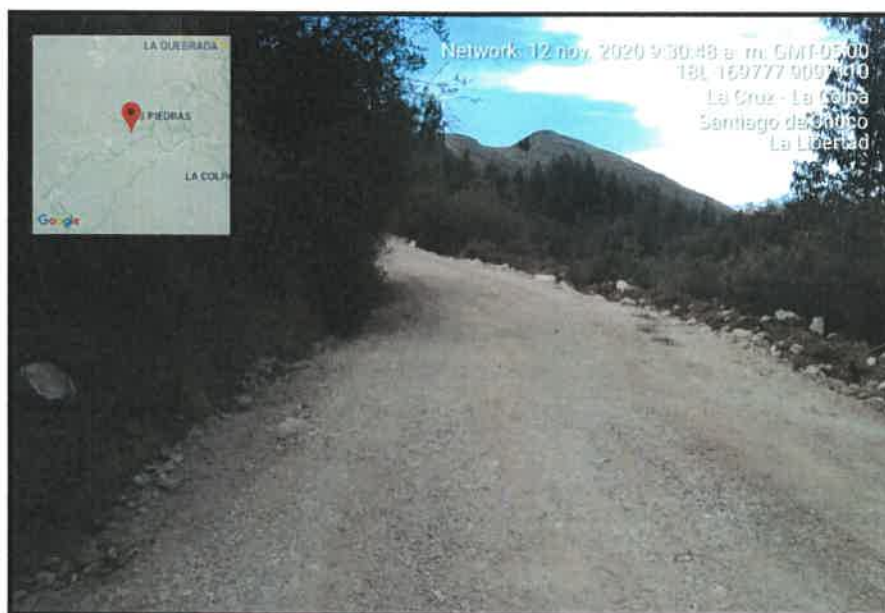CONSORCIO VIAL MIRAFLORES**LAS PIEDRAS KM 2+000****LAS PIEDRAS KM 3+840**


Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532




Luis Blanco León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

CONSORCIO VIAL **MIRAFLORES**

TRAMO: EMP. - PE - 3N(TULPO) - MIRAFLORES – MICHIGUILCA

LONG. =8.000



ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL - KM: 2+000



EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR KM: 1+800


.....
Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532


.....
 **Luis Branco León León**
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

CONSORCIO VIAL MIRAFLORES**COMPACTADO DE VÍA - KM 0+600****COMPACTADO DE VÍA KM 1+200**


.....
Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532


.....
 **Luis Branco León León**
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

CONSORCIO VIAL MIRAFLORES**COMPACTADO DE VÍA KM 1+500****CANTERA KM 6+000**


Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532


Luis Iván León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

CONSORCIO VIAL MIRAFLORES**CARGUÍO DE MATERIAL GRANULAR****DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR KM 7+100**


Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532


 **Amco León León**
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

CONSORCIO VIAL MIRAFLORES



EXTENDIDO Y CONFORMADO DE MATERIAL GRANULAR E=0.15 M - KM: 6+800



DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR KM 5+200


Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532




Luis Franco León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

CONSORCIO VIAL **MIRAFLORES**



VIA COMPACTADA KM 4+200



VIA COMPACTADA KM 2+100


Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532


 Luis Branco León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

CONSORCIO VIAL **MIRAFLORES**

TRAMO: EMP. PE - 3N(MOLLEBAMBA) - EL MIRADOR - EMP. LI - 118(OROCULLAY)

LONG. =8.710 Km




CORTE Y ACOPIO DE MATERIAL EN CANTERA KM 4+000



CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR


Carlos E. Roncal Morales
 ING. CIVIL
 R. CIP. 53532




Luis Ramón León León
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 153510

CONSORCIO VIAL MIRAFLORES



CARGUIO DE MATERIAL CANTERA KM 4+000



DESCARGA DE MATERIAL KM 2+000



Carlos E. Roncal Morales
 ING. CIVIL
 R. CIP. 53532


 **Luis Blanco León León**
 INGENIERO CIVIL
 CIP 153510

CONSORCIO VIAL MIRAFLORES



DESCARGA DE MATERIAL KM 3+100

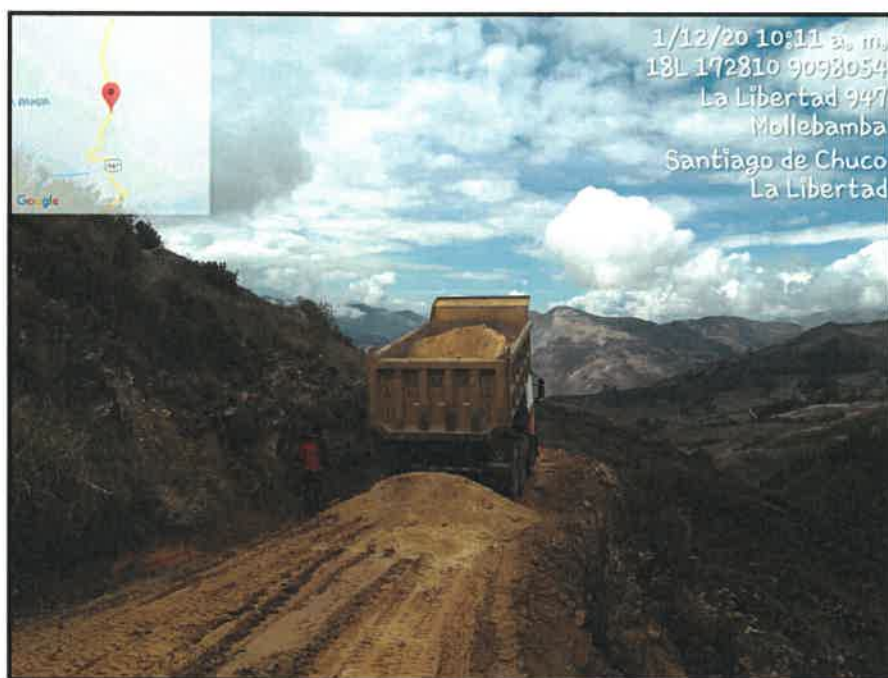

DESCARGA DE MATERIAL KM 4+200


Carlos E. Roncal Morales
 ING. CIVIL
 R. CIP. 53532


 **Luis Branco León León**
 INGENIERO CIVIL
 CIP 153510

CONSORCIO VIAL **MIRAFLORES**



DESCARGA DE MATERIAL KM 5+260



DESCARGA DE MATERIAL KM 7+100

Carlos E. Roncal Morales
Carlos E. Roncal Morales
 ING. CIVIL
 R. CIP. 53532

Luis Brancio León León
Luis Brancio León León
 INGENIERO CIVIL
 CIP 153510

CONSORCIO VIAL MIRAFLORES



RECONFORMACIÓN DE CUNETAS KM 4+300



EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR KM 5+200



Carlos E. Roncal Morales
 ING. CIVIL
 R. CIP. 53532


 **Luis Bruno León León**
 INGENIERO CIVIL
 CIP 153510

CONSORCIO VIAL MIRAFLORES



CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR KM 3+400

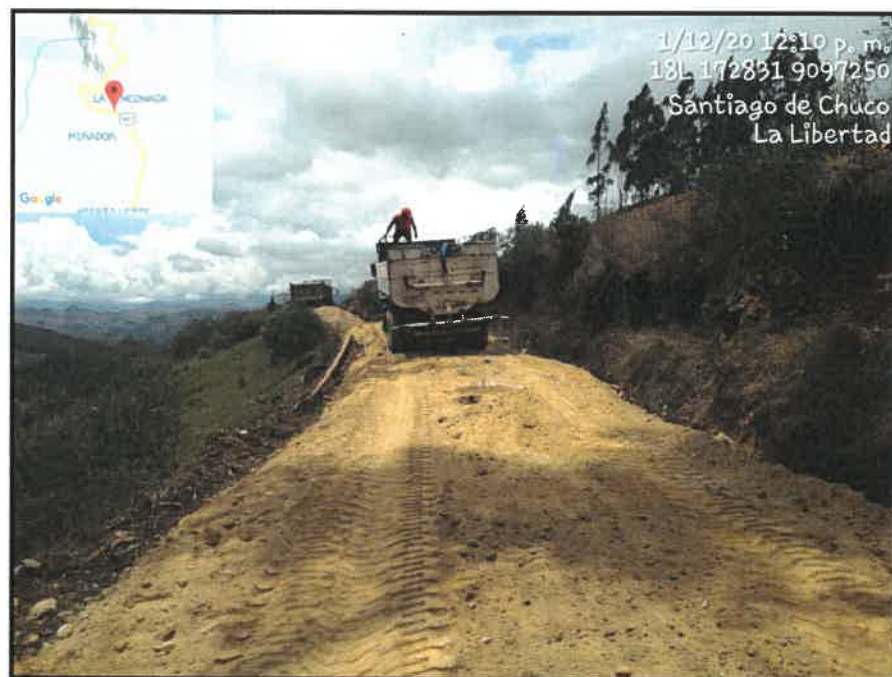

RIEGO DE VÍA KM 4+500

Carlos E. Roncal Morales
Carlos E. Roncal Morales
 ING. CIVIL
 R. CIP. 53532

Luis Brajca León León
Luis Brajca León León
 INGENIERO CIVIL
 CIP 153510

CONSORCIO VIAL **MIRAFLORES**



COMPACTADO DE VÍA KM 6+200




Carlos E. Roncal Morales
 ING. CIVIL
 R. CIP. 53532


 **Luis Blanco León León**
 INGENIERO CIVIL
 CIP 153510

CONSORCIO VIAL **MIRAFLORES**




.....
Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532


.....
 **Luis Blanco León León**
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

CONSORCIO VIAL **MIRAFLORES**




Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532



Luis Branda León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

CONSORCIO VIAL **MIRAFLORES**




.....
Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532


.....
 **Luis Ricardo León León**
INGENIERO CIVIL
CIP 153510



- ACTA DE
ENTREGA DE
TERRENO.

“ACTA DE ENTREGA DE TERRENO”

Servicio

MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. PE-3N – (PISCOCHACA) – SHUBA – NAMOBAL – SOCOBAMBA – EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS) LONG= 11.620 KM”; “EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) – EL MIRADOR – EMP. LI-118 (OROCULLAY) LONG= 8.710 KM” Y “EMP. PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHICUILCA LONG= 8.000 KM”, DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Tramo

“EMP. PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHICUILCA” LONG= 8.000 KM
SANTIAGO DE CHUCO
MOLLEBAMBA

Provincia

Distrito

Entidad Contratante

Empresa Ejecutora

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)
CONSORCIO VIAL MIRAFLORES (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. +
CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.)

N.º de Contrato

CONTRATO DE SERVICIO N.º 018-2020-MPSCH-LOG

Fecha de Contrato

28/08/2020

Modalidad

SUMA ALZADA

Monto Presupuestado

S/. 681,904.00 soles Inc. (I.G.V.)

Monto Contractual

S/. 681,879.00 soles Inc. (I.G.V.)

Inspector de Servicio

Ing. LUIS BRANCO LEÓN LEÓN

Plazo de Ejecución

PLAN DE TRABAJO: 20 D.C.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C.

MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C.

INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C.

TOTAL: 505 DÍAS CALENDARIOS (sujeto a fecha de contrato)

Fecha de Culminación

31/12/2021


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. David Iván Silva Torres
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
CIP N° 63635

En el centro poblado de Tulpo, distrito de Mollebamba, provincia de Santiago de Chuco – La libertad, siendo las 8:00 p.m. del 29 de agosto del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza con CIP. N° 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N° 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N° 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Ing. Luis Branco León León con CIP N° 153510 y por último, por parte del Contratista el Ing. Carlos Eduardo Roncal Morales con CIP N° 53532 como Residente de servicio y el Sr. Edgar Gómez Domínguez con DNI N° 44944779, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL MIRAFLORES (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.). A fin de realizar la ENTREGA DE TERRENO del tramo: “EMP. PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHICUILCA” con una longitud de 8.000 km.

Este acto protocolar tiene por finalidad hacer la entrega de la ruta mencionada en todo su recorrido físico para la recolección de información necesaria y de esta manera hacer la elaboración del PLAN DE TRABAJO de la ruta, que es parte de la FASE I del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y formatos (anexos) estipulados en los Términos de Referencia del D.U. N° 070-2020 presentados para la contratación.


Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. PE-3N –

(PISCOCHACA) – SHUBA – NAMOBAL – SOCOBAMBA – EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS) LONG= 11.620 KM”.
“EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) – EL MIRADOR – EMP. LI-118 (OROCULLAY) LONG= 8.710 KM” Y “EMP.
PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHQUILCA LONG= 8.000 KM”, DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA,
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Siendo las 8:30 p.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para dar inicio a la elaboración del Plan de Trabajo y continuar con los procedimientos posteriores para dar inicio a la FASE II y III (mantenimiento periódico y rutinario) del servicio. Del mismo día, se da por concluida el acto de **ENTREGA DE TERRENO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.

AREA USUARIA


Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 190782


Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 218511

AREA RESPONSABLE


Ing. David Iván Silva Torres
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH
CIP N° 63635

EMPRESA EJECUTORA


Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532


Ing. Carlos Eduardo Roncal Morales
Residente de Servicio
CIP N° 53532


Sr. Edgar Gómez Domínguez
DNI N° 44944779
REPRESENTANTE COMÚN

Sr. Edgar Gómez Domínguez
Representante Común de CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
DNI N° 44944779

INSPECTOR


Ing. Luis Branco León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510
Inspector del Servicio
CIP N° 153510


Ing. Luis Branco León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510
Inspector del Servicio
CIP N° 153510

“ACTA DE ENTREGA DE TERRENO”

Servicio

MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. PE-3N – (PISCOCHACA) – SHUBA – NAMOBAL – SOCOBAMBA – EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS) LONG= 11.620 KM”; “EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) – EL MIRADOR – EMP. LI-118 (OROCULLAY) LONG= 8.710 KM” Y “EMP. PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHQUILCA LONG= 8.000 KM”, DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Tramo

“EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) – EL MIRADOR – EMP. LI-118 (OROCULLAY)” LONG= 8.710 KM

Provincia

SANTIAGO DE CHUCO

Distrito

MOLLEBAMBA

Entidad Contratante

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)

Empresa Ejecutora

CONSORCIO VIAL MIRAFLORES (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.)

N.º de Contrato

CONTRATO DE SERVICIO N.º 018-2020-MPSCH-LOG

Fecha de Contrato

28/08/2020

Modalidad

SUMA ALZADA

Monto Presupuestado

S/. 742,422.98 soles Inc. (I.G.V.)

Monto Contractual

S/. 742,394.00 soles Inc. (I.G.V.)

Inspector de Servicio

Ing. LUIS BRANCO LEÓN LEÓN

Plazo de Ejecución

PLAN DE TRABAJO: 20 D.C.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C.

MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C.

INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C.

TOTAL: 505 DÍAS CALENDARIOS (sujeto a fecha de contrato)

Fecha de Culminación

31/12/2021

En el centro poblado de Tulpo, distrito de Mollebamba, provincia de Santiago de Chuco – La libertad, siendo las 8:00 p.m. del 29 de agosto del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza con CIP. N° 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N° 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N° 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Ing. Luis Branco León León con CIP N° 153510 y por último, por parte del Contratista el Ing. Carlos Eduardo Roncal Morales con CIP N° 53532 como Residente de servicio y el Sr. Edgar Gómez Domínguez con DNI N° 44944779, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL MIRAFLORES (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.). A fin de realizar la **ENTREGA DE TERRENO** del tramo: **“EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) – EL MIRADOR – EMP. LI-118 (OROCULLAY)”** con una longitud de **8.710 km**.

Este acto protocolar tiene por finalidad hacer la entrega de la ruta mencionada en todo su recorrido físico para la recolección de información necesaria y de esta manera hacer la elaboración del **PLAN DE TRABAJO** de la ruta, que es parte de la FASE I del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y formatos (anexos) estipulados en los Términos de Referencia del D.U. N° 070-2020 presentados para la contratación.

Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES**: "EMP. PE-3N – (PISCOCHACA) – SHUBA – NAMOBAL – SOCOBAMBA – EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS) LONG= 11.620 KM"; "EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) – EL MIRADOR – EMP. LI-118 (OROCULLAY) LONG= 8.710 KM" Y "EMP. PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHQUILCA LONG= 8.000 KM", DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Siendo las 8:30 p.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para dar inicio a la elaboración del Plan de Trabajo y continuar con los procedimientos posteriores para dar inicio a la FASE II y III (mantenimiento periódico y rutinario) del servicio. Del mismo día, se da por concluida el acto de **ENTREGA DE TERRENO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.

AREA USUARIA


INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 190782


INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 218511

AREA RESPONSABLE


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. David Iván Silva Torres
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
CIP N° 63635

Ing. David Iván Silva Torres
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH
CIP N° 63635

EMPRESA EJECUTORA


Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532

Ing. Carlos Eduardo Roncal Morales
Residente de Servicio
CIP N° 53532

CONSORCIO VIAL MIRAFLORES

EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ
DNI N° 44944779
REPRESENTANTE COMUN


Sr. Edgar Gómez Domínguez
Representante Común de CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
DNI N° 44944779

INSPECTOR


Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532


Luis Branco León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

Ing. Luis Branco León León
Inspector del Servicio
CIP N° 153510


Luis Branco León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

“ACTA DE ENTREGA DE TERRENO”

Servicio

MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. PE-3N – (PISCOCHACA) – SHUBA – NAMOBAL – SOCOBAMBA – EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS) LONG= 11.620 KM”; “EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) – EL MIRADOR – EMP. LI-118 (OROCULLAY) LONG= 8.710 KM” Y “EMP. PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHQUILCA LONG= 8.000 KM”, DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Tramo

“EMP. PE-3N – (PISCOCHACA) – SHUBA – NAMOBAL – SOCOBAMBA – EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS)” LONG= 11.620 KM

Provincia

SANTIAGO DE CHUCO

Distrito

MOLLEBAMBA

Entidad Contratante

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)

Empresa Ejecutora

CONSORCIO VIAL MIRAFLORES (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.)

N.º de Contrato

CONTRATO DE SERVICIO N.º 018-2020-MPSCH-LOG

Fecha de Contrato

28/08/2020

Modalidad

SUMA ALZADA

Monto Presupuestado

S/. 990,465.56 soles Inc. (I.G.V.)

Monto Contractual

S/. 990,427.00 soles Inc. (I.G.V.)

Inspector de Servicio

Ing. LUIS BRANCO LEÓN LEÓN

Plazo de Ejecución

PLAN DE TRABAJO: 20 D.C.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C.

MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C.

INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C.

TOTAL: 505 DÍAS CALENDARIOS (sujeto a fecha de contrato)

Fecha de Culminación

31/12/2021

En el centro poblado de Tulpo, distrito de Mollebamba, provincia de Santiago de Chuco – La libertad, siendo las 8:00 p.m. del 29 de agosto del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza con CIP. N° 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N° 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N° 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Ing. Luis Branco León León con CIP N° 153510 y por último, por parte del Contratista el Ing. Carlos Eduardo Roncal Morales con CIP N° 53532 como Residente de servicio y el Sr. Edgar Gómez Domínguez con DNI N° 44944779, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL MIRAFLORES (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.). A fin de realizar la **ENTREGA DE TERRENO** del tramo: **“EMP. PE-3N – (PISCOCHACA) – SHUBA – NAMOBAL – SOCOBAMBA – EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS)”** con una longitud de 11.620 km.

Este acto protocolar tiene por finalidad hacer la entrega de la ruta mencionada en todo su recorrido físico para la recolección de información necesaria y de esta manera hacer la elaboración del **PLAN DE TRABAJO** de la ruta, que es parte de la FASE I del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y formatos (anexos) estipulados en los Términos de Referencia del D.U. N° 070-2020 presentados para la contratación.



[Signature]
Ing. Luis Branco León León
CIP 153510
INGENIERO CIVIL

[Signature]
Ing. David Iván Silva Torres
CIP 63635
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

[Signature]
Ing. Carlos E. Roncal Morales
CIP 53532
ING. CIVIL
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ
DNI N° 44944779

Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES**: "EMP. PE-3N – (PISCOCHACA) – SHUBA – NAMOBAL – SOCOBAMBA – EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS) LONG= 11.620 KM"; "EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) – EL MIRADOR – EMP. LI-118 (OROCULLAY) LONG= 8.710 KM" Y "EMP. PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHQUILCA LONG= 8.000 KM", DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Siendo las 8:30 p.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para dar inicio a la elaboración del Plan de Trabajo y continuar con los procedimientos posteriores para dar inicio a la FASE II y III (mantenimiento periódico y rutinario) del servicio. Del mismo día, se da por concluida el acto de **ENTREGA DE TERRENO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.

AREA USUARIA


INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
CIP N° 190782
JEFE DE OPERACIONES

Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 190782


INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
CIP N° 218511
GERENTE GENERAL

Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 218511

AREA RESPONSABLE


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. David Iván Silva Torres
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
CIP N° 63635

Ing. David Iván Silva Torres
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH
CIP N° 63635

EMPRESA EJECUTORA


Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532

Ing. Carlos Eduardo Roncal Morales
Residente de Servicio
CIP N° 53532


CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ
DNI N° 44944779
REPRESENTANTE COMÚN


Sr. Edgar Gómez Domínguez
Representante Común de CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
DNI N° 44944779


INSPECTOR




Luis Branco León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

Ing. Luis Branco León León
Inspector del Servicio
CIP N° 153510


CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ
Reg. CIP N° 44944779



- ACTA DE
INICIO DE
SERVICIO.

“ACTA DE INICIO DE SERVICIO”

Servicio

MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. PE-3N – (PISCOCHACA) – SHUBA – NAMOBAL – SOCOBAMBA – EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS) LONG= 11.620 KM”; “EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) – EL MIRADOR – EMP. LI-118 (OROCULLAY) LONG= 8.710 KM” Y “EMP. PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHILQUILCA LONG= 8.000 KM”, DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Tramo

“EMP. PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHILQUILCA” LONG= 8.000 KM SANTIAGO DE CHUCO

Provincia

MOLLEBAMBA

Distrito

Entidad Contratante

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)

Empresa Ejecutora

CONSORCIO VIAL MIRAFLORES (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.)

N.º de Contrato

CONTRATO DE SERVICIO N.º 018-2020-MPSCH-LOG

Fecha de Contrato

28/08/2020

Modalidad

SUMA ALZADA

Monto Presupuestado

S/. 681,904.00 soles Inc. (I.G.V.)

Monto Contractual

S/. 681,879.00 soles Inc. (I.G.V.)

Inspector de Servicio

Ing. LUIS BRANCO LEÓN LEÓN

Aprobación Plan de Trabajo

RESOLUCIÓN GERENCIAL N.º 149-2020-MPSCH/GM

Fecha de Aprobación

21/09/2020

Fecha de Inicio

22/09/2020

Plazo de Ejecución

MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C. (sujeto a fecha de contrato)

MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C.

INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C.

31/12/2021

Fecha de Culminación

En el centro poblado de Tulpo, distrito de Mollebamba, provincia de Santiago de Chuco – La libertad, siendo las 8:00 p.m. del 22 de septiembre del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza con CIP. N.º 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N.º 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH, el Ing. Frank Renato Gutiérrez Contreras con CIP N.º 225088 como monitor designado del servicio intervenido (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N.º 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Ing. Luis Branco León León con CIP N.º 153510; asimismo, representando a Provias Descentralizado está el Ing. Gabriel Omar Panta Cossio con CIP N.º 192701 encargado de Monitoreo y Seguimiento y el Ing. Bach. Eduardo Rafael Príncipe León con DNI N.º 46839109 como Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento; finalmente, por parte del Contratista Ing. el Ing. Carlos Eduardo Roncal Morales con CIP N.º 53532 como Residente de servicio y el Sr. Edgar Gómez Domínguez con DNI N.º 44944779, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL MIRAFLORES (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.). A fin de realizar el **INICIO DE SERVICIO** del tramo: **“EMP. PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHILQUILCA”** con una longitud de **8.000 km**.

Este acto protocolar tiene por finalidad dar inicio a la ejecución de las actividades de **MANTENIMIENTO PERIÓDICO** de la ruta mencionada en todo su recorrido físico correspondiente a la FASE II del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y partidas estipulados en el Plan de Trabajo previamente aprobado por la Entidad.


Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES**: “EMP. PE-3N – (PISCOCHACA) – SHUBA – NAMOBAL – SOCOBAMBA – EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS) LONG= 11.620 KM”; “EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) – EL MIRADOR – EMP. LI-118 (OROCULLAY) LONG= 8.710 KM” Y “EMP. PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHQUILCA LONG= 8.000 KM”, DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Siendo las 8:30 a.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas acorde con el Plan de Trabajo, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para empezar la ejecución del Mantenimiento Periódico. Del mismo día, se da por concluido el acto de **INICIO DE SERVICIO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.

AREA USUARIA


INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
CIP N° 190782
JEFE DE OPERACIONES

Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 190782


INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
CIP N° 218511
GERENTE GENERAL

Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 218511


Frank Renato Gutiérrez Contreras
ING. CIVIL
R. CIP. N° 225088

Ing. Frank Renato Gutiérrez Contreras
Monitor Designado del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 225088

AREA RESPONSABLE

CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
EDGAR RIVERA GONZÁLEZ
CIP N° 190779
REPRESENTANTE COMÚN


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. David Iván Silva Torres
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
CIP N° 63635


Ing. David Iván Silva Torres
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH
CIP N° 63635


Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532

REPRESENTANTES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD


Gabriel Omar Panta Cossio
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 192701

Ing. Gabriel Omar Panta Cossio
Monitoreo y Seguimiento a Mantenimiento Vial
Provincia de Santiago de Chuco
CIP N° 192701


Eduardo Rafael Príncipe León
ANALISTA Y REGISTRADOR DE MONITOREO
Y SEGUIMIENTO A MANTENIMIENTO VIAL
PROV. SANTIAGO DE CHUCO

Ing. Bach. Eduardo Rafael Príncipe León
Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento
Provincia de Santiago de Chuco
DNI N° 46839109

EMPRESA EJECUTORA


Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532

Ing. Carlos Eduardo Roncal Morales
Residente de Servicio
CIP N° 53532

CONSORCIO VIAL MIRAFLORES

EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ
DNI N° 44944779
REPRESENTANTE COMUN.

Sr. Edgar Gómez Domínguez
Representante Común de CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
DNI N° 44944779

INSPECTOR


 Luis Branco León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

Ing. Luis Branco León León
Inspector del Servicio
CIP N° 153510

“ACTA DE INICIO DE SERVICIO”

Servicio

MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. PE-3N – (PISCOCHACA) – SHUBA – NAMOBAL – SOCOBAMBA – EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS) LONG= 11.620 KM”; “EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) – EL MIRADOR – EMP. LI-118 (OROCULLAY) LONG= 8.710 KM” Y “EMP. PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHQUILCA LONG= 8.000 KM”, DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Tramo

“EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) – EL MIRADOR – EMP. LI-118 (OROCULLAY)” LONG= 8.710 KM

Provincia

SANTIAGO DE CHUCO

Distrito

MOLLEBAMBA

Entidad Contratante

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)

Empresa Ejecutora

CONSORCIO VIAL MIRAFLORES (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.)

N.º de Contrato

CONTRATO DE SERVICIO N.º 018-2020-MPSCH-LOG

Fecha de Contrato

28/08/2020

Modalidad

SUMA ALZADA

Monto Presupuestado

S/. 742,422.98 soles Inc. (I.G.V.)

Monto Contractual

S/. 742,394.00 soles Inc. (I.G.V.)

Inspector de Servicio

Ing. LUIS BRANCO LEÓN LEÓN

Aprobación Plan de Trabajo

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 149-2020-MPSCH/GM

Fecha de Aprobación

21/09/2020

Fecha de Inicio

22/09/2020

Plazo de Ejecución

MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C. (sujeto a fecha de contrato)

MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C.

INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C.

Fecha de Culminación

31/12/2021

En el centro poblado de Tulpo, distrito de Mollebamba, provincia de Santiago de Chuco – La libertad, siendo las 8:00 p.m. del 22 de septiembre del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza con CIP. N° 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N° 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH, el Ing. Frank Renato Gutiérrez Contreras con CIP N° 225088 como monitor designado del servicio intervenido (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N° 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Ing. Luis Branco León León con CIP N° 153510; asimismo, representando a Provias Descentralizado está el Ing. Gabriel Omar Panta Cossio con CIP N° 192701 encargado de Monitoreo y Seguimiento y el Ing. Bach. Eduardo Rafael Príncipe León con DNI N° 46839109 como Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento; finalmente, por parte del Contratista Ing. el Ing. Carlos Eduardo Roncal Morales con CIP N° 53532 como Residente de servicio y el Sr. Edgar Gómez Domínguez con DNI N° 44944779, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL MIRAFLORES (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.). A fin de realizar el **INICIO DE SERVICIO** del tramo: “EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) – EL MIRADOR – EMP. LI-118 (OROCULLAY)” con una longitud de 8.710 km.



Luis Branco León León
INGENIERO CIVIL
CIP. 153510

Este acto protocolar tiene por finalidad dar inicio a la ejecución de las actividades de **MANTENIMIENTO PERIÓDICO** de la ruta mencionada en todo su recorrido físico correspondiente a la FASE II del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y partidas estipulados en el Plan de Trabajo previamente aprobado por la Entidad.


Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES**: "EMP. PE-3N – (PISCOCHACA) – SHUBA – NAMOBAL – SOCOBAMBA – EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS) LONG= 11.620 KM"; "EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) – EL MIRADOR – EMP. LI-118 (OROCULLAY) LONG= 8.710 KM" Y "EMP. PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHQUILCA LONG= 8.000 KM", DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Siendo las 8:30 a.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas acorde con el Plan de Trabajo, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para empezar la ejecución del Mantenimiento Periódico. Del mismo día, se da por concluido el acto de **INICIO DE SERVICIO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.

AREA USUARIA


INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
CIP: 190782
JEFE DE OPERACIONES

Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 190782


INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
CIP: 218511
GERENTE GENERAL

Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 218511


Frank Renato Gutiérrez Contreras
ING. CIVIL
R. CIP. N° 225088

Ing. Frank Renato Gutiérrez Contreras
Monitor Designado del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 225088

AREA RESPONSABLE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. David Iván Silva Torres
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
CIP N° 63635

Ing. David Iván Silva Torres
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH
CIP N° 63635


CONSORCIO VIAL "FLORES"
EDGAR GOMEZ DOMINGUEZ
DNI N° 44944779
REPRESENTANTE COMÚN


Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532

REPRESENTANTES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD


Gabriel Omar Panta Cossio
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 192701

Ing. Gabriel Omar Panta Cossio
Monitoreo y Seguimiento a Mantenimiento Vial
Provincia de Santiago de Chuco
CIP N° 192701


Eduardo R. Principio León
ANALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO VIAL
Y REGISTRADOR DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO VIAL
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO

Ing. Bach. Eduardo Rafael Principio León
Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento
Provincia de Santiago de Chuco
DNI N° 46839109

EMPRESA EJECUTORA


Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532

Ing. Carlos Eduardo Roncal Morales
Residente de Servicio
CIP N° 53532


CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ
DNI N° 44944779
REPRESENTANTE COMÚN

Sr. Edgar Gómez Domínguez
Representante Común de CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
DNI N° 44944779

INSPECTOR




Luis Branco León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

Ing. Luis Branco León León
Inspector del Servicio
CIP N° 153510

"ACTA DE INICIO DE SERVICIO"

Servicio

MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: "EMP. PE-3N – (PISCOCHACA) – SHUBA – NAMOBAL – SOCOBAMBA – EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS) LONG= 11.620 KM"; "EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) – EL MIRADOR – EMP. LI-118 (OROCULLAY) LONG= 8.710 KM" Y "EMP. PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHICUILCA LONG= 8.000 KM", DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Tramo

"EMP. PE-3N – (PISCOCHACA) – SHUBA – NAMOBAL – SOCOBAMBA – EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS)" LONG= 11.620 KM
SANTIAGO DE CHUCO

Provincia

MOLLEBAMBA

Distrito

Entidad Contratante

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)
CONSORCIO VIAL MIRAFLORES (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.)

Empresa Ejecutora

N.º de Contrato

CONTRATO DE SERVICIO N.º 018-2020-MPSCH-LOG

Fecha de Contrato

28/08/2020

Modalidad

SUMA ALZADA

Monto Presupuestado

S/. 990,465.56 soles Inc. (I.G.V.)

Monto Contractual

S/. 990,427.00 soles Inc. (I.G.V.)

Inspector de Servicio

Ing. LUIS BRANCO LEÓN LEÓN

Aprobación Plan de Trabajo

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 149-2020-MPSCH/GM

Fecha de Aprobación

21/09/2020

Fecha de Inicio

22/09/2020

Plazo de Ejecución

MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C. (sujeto a fecha de contrato)

MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C.

INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C.

Fecha de Culminación

31/12/2021

En el centro poblado de Tulpo, distrito de Mollebamba, provincia de Santiago de Chuco – La Libertad, siendo las 8:00 p.m. del 22 de septiembre del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza con CIP. N° 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N° 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH, el Ing. Frank Renato Gutiérrez Contreras con CIP N° 225088 como monitor designado del servicio intervenido (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N° 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Ing. Luis Branco León León con CIP N° 153510; asimismo, representando a Provias Descentralizado está el Ing. Gabriel Omar Panta Cossio con CIP N° 192701 encargado de Monitoreo y Seguimiento y el Ing. Bach. Eduardo Rafael Príncipe León con DNI N° 46839109 como Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento; finalmente, por parte del Contratista Ing. el Ing. Carlos Eduardo Roncal Morales con CIP N° 53532 como Residente de servicio y el Sr. Edgar Gómez Domínguez con DNI N° 44944779, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL MIRAFLORES (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.). A fin de realizar el INICIO DE SERVICIO del tramo: "EMP. PE-3N – (PISCOCHACA) – SHUBA – NAMOBAL – SOCOBAMBA – EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS)" con una longitud de 11.620 km.



Luis Branco León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

Este acto protocolar tiene por finalidad dar inicio a la ejecución de las actividades de **MANTENIMIENTO PERIÓDICO** de la ruta mencionada en todo su recorrido físico correspondiente a la FASE II del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y partidas estipulados en el Plan de Trabajo previamente aprobado por la Entidad.


Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES**: "EMP. PE-3N – (PISCOCHACA) – SHUBA – NAMOBAL – SOCOBAMBA – EMP. PE-3N (LAS PIEDRAS) LONG= 11.620 KM"; "EMP. PE-3N (MOLLEBAMBA) – EL MIRADOR – EMP. LI-118 (OROCULLAY) LONG= 8.710 KM" Y "EMP. PE-3N (TULPO) – MIRAFLORES – MICHQUILCA LONG= 8.000 KM", DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Siendo las 8:30 a.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas acorde con el Plan de Trabajo, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para empezar la ejecución del Mantenimiento Periódico. Del mismo día, se da por concluido el acto de **INICIO DE SERVICIO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.

AREA USUARIA


INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Jefe de Operaciones

Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 190782


Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente General

Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 218511


Frank Renato Gutiérrez Contreras
ING. CIVIL
R. CIP. N° 225088

Ing. Frank Renato Gutiérrez Contreras
Monitor Designado del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 225088

AREA RESPONSABLE


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. David Iván Silva Torres
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
CIP N° 63635

Ing. David Iván Silva Torres
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH
CIP N° 63635


CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ
DNI N° 43942779
REPRESENTANTE COMÚN


Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532

REPRESENTANTES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD


.....
Ing. Gabriel Omar Panta Cossio
ING. CIVIL
Reg. CIP N° 192701

Ing. Gabriel Omar Panta Cossio
Monitoreo y Seguimiento a Mantenimiento Vial
Provincia de Santiago de Chuco
CIP N° 192701


.....
Eduardo R. Príncipe León
ANALISTA Y REGISTRADOR DEL MONITOREO
Y SEGUIMIENTO A MANTENIMIENTO VIAL
PROV. SANTIAGO DE CHUCO

Ing. Bach. Eduardo Rafael Príncipe León
Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento
Provincia de Santiago de Chuco
DNI N° 46839109

EMPRESA EJECUTORA


.....
Carlos E. Roncal Morales
ING. CIVIL
R. CIP. 53532

Ing. Carlos Eduardo Roncal Morales
Residente de Servicio
CIP N° 53532

CONSORCIO VIAL MIRAFLORES


.....
EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ
DNI N° 44944779
REPRESENTANTE COMÚN

Sr. Edgar Gómez Domínguez
Representante Común de CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
DNI N° 44944779

INSPECTOR




.....
Luis Branco León León
INGENIERO CIVIL
CIP 153510

Ing. Luis Branco León León
Inspector del Servicio
CIP N° 153510
