

"Año de la universalización de la salud"

**INFORME N° 331-2020-IVP-MPSCH/GG/VRRK**

**A** : Dr. JOHN JAIRO CURAY REYES.  
Director de administración y Finanzas de la MPSCH

**DE** : ING. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza  
Gerente del Instituto Vial Provincial de Santiago de Chuco

**ASUNTO** : APROBACIÓN DE CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N° 03 DEL  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS  
CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA  
CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG, 7.00 KM; EMP. LI-911  
(SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG. 11.65 KM.

**REFERENCIA** : Informe N° 200-2020-JO/IVPSCH/LFGCH  
INFORME N° 020-2020-IVP-MPSCH/CEGB/TA  
Informe N° 1300-2020-MPSCH/DST/SGI  
CARTA N° 003-2020/INSPECTOR DE SERVICIO/ADRO  
CARTA N° 006-2020-CONSORCIO VIAL LA CHIRA/RL/JQQ  
CONTRATO N° 009-2020-MPSCH-LOG  
DU. N° 070-2020

**FECHA** : Santiago de Chuco, 21 de diciembre del 2020

Previo cordial saludo y afecto, por medio del presente tengo a bien manifestarle con respecto al asunto de la referencia lo siguiente:

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

**INFORMACIÓN TÉCNICA:**

Ejecución de Servicio : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS  
CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA  
- L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG, 7.00 KM; EMP. LI-911 (SITABAMBA) -  
UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG. 11.65 KM.

Longitud : 18.65 Km.  
Superficie de Rodadura : Afirmado.  
Espesor de Afirmado : 0.15 m.  
Velocidad Directriz : 30 km/h.  
Perfilado de Cunetas : Terreno natural  
Hitos Kilométricos : 18 unidades


**UBICACIÓN**

Distrito : SITABAMBA  
Provincia : Santiago de Chuco  
Región : La Libertad

**RESPONSABLES DEL SERVICIO**

**EJECUTOR:**

Fuente de financiamiento : Recursos por operaciones oficios de crédito  
Modalidad Contratación : a Suma Alzada  
Contrato de Servicio : CONTRATO N° 009-2020-MPSCH-LOG  
Contratista : CONSORCIO VIAL LA CHIRA  
Monto Referencial del Servicio : S/. 1, 589,688.70 inc el IGV.



Monto del Contrato de Servicio : S/. 1, 581,740.26 inc el IGV  
 Plazo de Ejecución mantenimiento Periódico : 120 DIAS CALENDARIOS  
 Inicio Plazo de Servicio Contractual : 22-09-2020  
 Fecha Termino de Servicio Contractual : 31-12-2020

**INSPECTOR**

INSPECTOR : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA  
 Contrato De Servicio : N° 034-2020-MPSCH-LOG

**2. DE LA PRESENTACIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE DEL SERVICIO N° 03-NOVIEMBRE 2020**

Mediante CARTA N° 003-2020/INSPECTOR DE SERVICIO/ADRO, del Inspector de Servicio, recepcionada por mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, el día 04/12/2020, el ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA, hace llegar a la Municipalidad la Valorización N° 03 del por los trabajos ejecutados en el periodo comprendido entre el 01/11/2020 hasta el 30/11/2020, del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG, 7.00 KM; EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG. 11.65 KM, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.

**3. ANÁLISIS DEL IVP.**

Para la ejecución del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG, 7.00 KM; EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG. 11.65 KM, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, en el proceso especial de selección N° 01-2020-MPSCH/CS-Segunda convocatoria, la empresa contratista CONSORCIO VIAL LA CHIRA, ha sido favorecida con la buena pro, por su monto ofertado de S/. 1, 581,740.26 inc. IGV que a continuación se detalla:

- A) Elaboración del Plan de Trabajo la suma de S/. 15,817.40 inc IGV, que se desarrollara exclusivamente para tal fase.
- B) Ejecución del mantenimiento Periódico la suma de 1, 312,844.42, inc. IGV, que se desarrollara exclusivamente en la fase de Ejecución del Mantenimiento Periódico.

**PRESUPUESTO OFERTADO**

Ítem	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
		METRADOS		COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
		Unidad	Cantidad		
<b>01</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	2.00	20,999.33	41,998.66
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	18.65	252.45	4,708.19
<b>02</b>	<b>PAVIMENTOS</b>				
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M.	m3	2,694.57	31.41	84,644.56
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M.	m3	8,018.13	56.26	451,124.98
<b>03</b>	<b>TRANSPORTE</b>				
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM.	m3k	12,854.23	10.35	133,020.44
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM.	m3k	69,418.25	1.86	128,859.39



03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM.	m3k	693.78	8.47	5,878.71
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM.	m3k	7,978.45	1.86	14,837.77
<b>04</b>	<b>OBRAS DE ARTE Y DRENAJE</b>				
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	18,650.00	0.67	12,519.00
<b>05</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>				
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und	18.00	182.35	3,282.38
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	Und	30.00	808.58	24,257.34
5.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	Und	12.00	766.47	9,197.68
05.11	SEÑALES INFORMATIVAS	Und	8.00	526.1500	4,209.20
<b>06</b>	<b>IMPACTO AMBIENTAL</b>				
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	1.50	1,378.9688	2,068.45
<b>07</b>	<b>EMERGENCIA SANITARIA</b>				
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	2.00	23,427.07	46,854.14
<b>COSTO DIRECTO</b>		<b>CD</b>		<b>SI.</b>	<b>967,460.89</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>GG</b>	<b>10%</b>	<b>SI.</b>	<b>96,746.09</b>
<b>UTILIDAD</b>		<b>U</b>	<b>5%</b>	<b>SI.</b>	<b>48,373.04</b>
<b>SUB TOTAL</b>		<b>CD+GG+U</b>		<b>SI.</b>	<b>1,112,580.02</b>
<b>IGV</b>			<b>18%</b>	<b>SI.</b>	<b>200,264.40</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>PT</b>		<b>SI.</b>	<b>1,312,844.42</b>
<b>PORCENTAJE</b>					<b>100.00%</b>

- C) Ejecución del Mantenimiento Rutinario, la suma de S/. 237,261.04, inc. IGV, que se desarrollara exclusivamente para tal fase.
- D) La Elaboración del Inventario de Condición Vial la Suma de S/. 15,817.40, inc. IGV, que se desarrollara exclusivamente para tal fase.

#### 4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL SERVICIO DURANTE EL MES

De acuerdo a la verificación de los trabajos referidos al "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG, 7.00 KM; EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG. 11.65 KM, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD", se ha observado que desde la fecha 01 de NOVIEMBRE hasta 30 de NOVIEMBRE del 2020, se desarrollaron las siguientes actividades:

#### 2.0 PAVIMENTOS.

2.01 CAPA NIVELANTE E=5 CM

2.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=15 CM.

#### 3.0 MANTENIMIENTO DE CALZADA EN AFIRMADO:

3.01 Transporte de material granular hasta 1 km

3.02 Transporte de material granular mayor a 1 km

3.03 Transporte de material excedente hasta 1 km.

3.04 Transporte de material excedente mayor a 1 km

#### 4.0 Obras de arte y drenaje





4.01 Reconformación de cunetas

5.0 Emergencia sanitaria

5.01 emergencia sanitaria COVID 19

**NOTA: Toda esta información esta detallada en el informe del Ing. Inspector de Servicio mediante CARTA N° 003-2020/INSPECTOR DE SERVICIO/ADRO**





Instituto Vial Provincial



MPSCB

# Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD

ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
 SERVICIO: : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VEICIALES TRAM OEMP.P. U-16 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCA SH (TUTURCO), LONG. 7,00 KM; EMP. U-18 (STABANBA) - JUCHICBAMBBA - CUMINAL LONG. 9,85 KM, DISTRITO DE SITABANBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD  
 CONTRATO: : N° 009-2020-MPSCB-01  
 INSPECTOR : : ING. SMITH JEAN CARLOS OTRIMANO GUYA  
 CONTRATISTA : : CONSORCIO VIALLA CHIRA



**IVP**  
 Instituto Vial Provincial  
 PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD


PRESUP. OFERTADO (CD-6664) S/IGV 112.284,02  
 PRESUP. OFERTADO (CD-6664) INCI/IGV 132.844,42  
 FECHA DE PRESUPUESTO 09/09/2020  
 PLAZO DE EJECUCIÓN 90 d.c. (91 meses)  
 FECHA DE INICIO Y TÉRMINO CONTRACTUAL 22/08/2020 - 31/07/2021

## VALORIZACION DE AVANCE DE SERVICIO N° 03, MANTENIMIENTO PERIODICO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

FORMULARIO : SERVICIO PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UNID	P.U.	MONTO CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE VALORIZACION		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR			
				METRADO	SOLES	METRADO	SOLES	METRADO	SOLES	METRADO	SOLES	METRADO	SOLES	%	%
01	OBRAS PRELIMINARES	gp	20.959,33	4.704,85	24.664,18	24.664,18	24.664,18	24.664,18	24.664,18	24.664,18	24.664,18	24.664,18	24.664,18	100,00%	100,00%
01.01	MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS	gp	41.989,65	4.704,85	20.989,34	20.989,34	20.989,34	20.989,34	20.989,34	20.989,34	20.989,34	20.989,34	20.989,34	50,00%	50,00%
01.02	TUADO Y REPLANTEO	gp	282,45	18,85	3.463,81	3.463,81	3.463,81	3.463,81	3.463,81	3.463,81	3.463,81	3.463,81	3.463,81	82,28%	82,28%
02	MATERIALES	gp	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%	100,00%
02.01	CAPA MEDIANTE FLOJIM	m3	31,41	2.694,57	40.020,75	40.020,75	40.020,75	40.020,75	40.020,75	40.020,75	40.020,75	40.020,75	40.020,75	29,42%	29,42%
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0,15 M	m3	55,26	8.098,13	163.080,00	163.080,00	163.080,00	163.080,00	163.080,00	163.080,00	163.080,00	163.080,00	163.080,00	34,42%	34,42%
03	TRANSPORTE	m3	262.208,31	262.208,31	320.427,05	320.427,05	320.427,05	320.427,05	320.427,05	320.427,05	320.427,05	320.427,05	320.427,05	88,64%	88,64%
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 110M	m3	10,35	12.854,23	34.027,05	34.027,05	34.027,05	34.027,05	34.027,05	34.027,05	34.027,05	34.027,05	34.027,05	28,29%	28,29%
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 110M	m3	1,85	68.418,23	57.080,40	57.080,40	57.080,40	57.080,40	57.080,40	57.080,40	57.080,40	57.080,40	57.080,40	24,23%	24,23%
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCENTRICE INSTA 110M	m3	8,47	689,78	2.697,95	2.697,95	2.697,95	2.697,95	2.697,95	2.697,95	2.697,95	2.697,95	2.697,95	16,28%	16,28%
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCENTRICE MAYOR A 110M	m3	1,85	7.978,45	6.672,00	6.672,00	6.672,00	6.672,00	6.672,00	6.672,00	6.672,00	6.672,00	6.672,00	28,39%	28,39%
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	m	12.519,00	12.519,00	3.428,00	3.428,00	3.428,00	3.428,00	3.428,00	3.428,00	3.428,00	3.428,00	3.428,00	87,79%	87,79%
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	0,67	18.680,00	3.428,00	3.428,00	3.428,00	3.428,00	3.428,00	3.428,00	3.428,00	3.428,00	3.428,00	67,70%	67,70%
05	SERIALIZACION	gp	162,35	3.222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und	808,88	24.297,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
05.02	SEÑALES PRELIMINARES	Und	786,47	9.997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	Und	526,15	4.208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
05.11	SEÑALES INFORMATIVAS	Und	1.378,97	2.684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06	IMPACTO AMBIENTAL	gp	23.427,07	46.854,14	23.427,07	23.427,07	23.427,07	23.427,07	23.427,07	23.427,07	23.427,07	23.427,07	23.427,07	100,00%	100,00%
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	gp	1.378,97	2.684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
07	EMERGENCIA SANITARIA	gp	23.427,07	46.854,14	23.427,07	23.427,07	23.427,07	23.427,07	23.427,07	23.427,07	23.427,07	23.427,07	23.427,07	100,00%	100,00%
07.01	EMERGENCIA SANITARIA (COND 19	gp	23.427,07	46.854,14	23.427,07	23.427,07	23.427,07	23.427,07	23.427,07	23.427,07	23.427,07	23.427,07	23.427,07	100,00%	100,00%
A-	COSTO DIRECTO			957.400,89	380.034,00	380.034,00	380.034,00	380.034,00	380.034,00	380.034,00	380.034,00	380.034,00	380.034,00	100,00%	100,00%
B-	GASTOS GENERALES			88.746,00	35.088,40	35.088,40	35.088,40	35.088,40	35.088,40	35.088,40	35.088,40	35.088,40	35.088,40	5,00%	5,00%
C-	UTILIDAD			48.372,04	19.048,70	19.048,70	19.048,70	19.048,70	19.048,70	19.048,70	19.048,70	19.048,70	19.048,70	5,00%	5,00%
D-	SUB TOTAL			1.112.200,92	438.219,10	438.219,10	438.219,10	438.219,10	438.219,10	438.219,10	438.219,10	438.219,10	438.219,10	100,00%	100,00%
E-	IG.V.			209.284,40	78.823,34	78.823,34	78.823,34	78.823,34	78.823,34	78.823,34	78.823,34	78.823,34	78.823,34	18,00%	18,00%
F-	TOTAL			1.321.844,42	517.042,43	517.042,43	517.042,43	517.042,43	517.042,43	517.042,43	517.042,43	517.042,43	517.042,43	100,00%	100,00%
G-	PORCENTAJE			100,00%	39,50%	39,50%	39,50%	39,50%	39,50%	39,50%	39,50%	39,50%	39,50%	30,29%	30,29%



El resumen de la valorización de Servicio N° 03 NOVIEMBRE 2020, para efectos de pago al contratista CONSORCIO VIAL LA CHIRA, se ha determinado el importe de **SI. 366,475.29 (TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 29/100 SOLES), INC. EL IGV** cuyo detalle es el siguiente.

ENTIDAD: :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EM P. LI-16 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG. 7.00 KM.; EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG. 1165 KM., DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATO : N°009-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL LA CHIRA



**RESUMEN GENERAL VALORIZACION N° 03 NOVIEMBRE MANTENIMIENTO PERIODICO**

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO	VALORIZACION			SALDO	% AVANCE
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUM.		
<b>1.- VALORIZACION CONTRACTUAL</b>						
Valorización No. 03	1,112,580.02	438,074.10	310,572.28	748,646.37	363,933.65	67.29%
	1,112,580.02	438,074.10	310,572.28	748,646.37	363,933.65	67.29%
<b>Avance Ejecutado</b>		<b>39.370%</b>	<b>27.919%</b>	<b>67.289%</b>		
<b>Avance Programado</b>		<b>0.000%</b>	<b>3.430%</b>	<b>3.430%</b>		
<b>2.- REAJUSTES</b>						
Reajuste de la Valorización No. 03		-	-	-		
Regularización Reajuste Valorización anteriores		-	-	-		
Relación por atraso de Obra		-	-	-		
*El reajuste no se aplica según CGC 47.1		0.00	0.00	0.00		
<b>A.- VALORIZACION BRUTA (sin IGV) (1+2)</b>		<b>438,074.10</b>	<b>310,572.28</b>	<b>748,646.37</b>		
<b>3.- RETENCIÓN POR GARANTIA</b>						
Valorización No.03		-	-	-		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
* Contratista si solicita relación de garantía		0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4.- AMORTIZACION POR ADELANTO MATERIALES</b>						
Valorización No.03		-	-	-		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
<b>5.- DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE</b>						
Por Adelanto Directo		-	-	-		
Por Adelanto de Materiales		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto Directo		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto de Materiales		-	-	-		
		0.00	0.00	0.00		
<b>B.- VALORIZACION NETA (sin IGV) (1)</b>		<b>438,074.10</b>	<b>310,572.28</b>	<b>748,646.37</b>		
<b>C.- MONTO NETO</b>		<b>438,074.10</b>	<b>310,572.28</b>	<b>748,646.37</b>		
<b>D.- I.G.V. (18% DE B)</b>		<b>78,853.34</b>	<b>55,903.01</b>	<b>134,756.35</b>		
<b>E.- MONTO A CANCELAR (C+D)</b>		<b>516,927.44</b>	<b>366,475.29</b>	<b>883,402.72</b>		
<b>F.- MONTO A FACTURAR (A*0.18)</b>		<b>516,927.44</b>	<b>366,475.29</b>	<b>883,402.72</b>		


Para efectos de control de avance de ejecución del servicio, se ha determinado que Como el monto de la valorización acumulada ejecutada es mayor que el 80% del monto de la valorización acumulada programada, la obra se encuentra dentro del atraso permisible, por lo que no es necesario que el contratista presente el calendario acelerado de avance de obra (CAAO), en ella se puede visualizar que el avance programado para el mes de NOVIEMBRE 2020, incluyendo la situación actual del servicio y el realmente ejecutado acumulado Promedio de los dos tramos es de 67.29 %, es



decir la obra está atrasada un 16.47 %, frente a lo programado de 83.76 %., es decir el servicio de mantenimiento se encuentra atrasado en todas sus actividades.

PERIODO	VALORIZACIONES DE SERVICIO PROGRAMADA					VALORIZACIONES DE SERVICIO REAL				
	CONTRATO ORIGINAL	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)		PRINCIPAL TOTAL	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)	
		PARCIAL	ACUM. (A)	PARCIAL	ACUM.		PARCIAL	ACUM. (B)	PARCIAL	ACUMULADO
SET. 2020	45,030.28	45,030.28	45,030.28	3.43%	3.43%	47,577.33	47,577.33	47,577.33	3.62%	3.62%
OCT. 2020	548,846.40	548,846.40	593,876.68	41.81%	45.24%	469,350.10	469,350.10	516,927.43	35.75%	39.37%
NOV. 2020	505,792.94	505,792.94	1,099,669.62	38.53%	83.76%	366,475.29	366,475.29	883,402.72	27.91%	67.29%
DIC. 2020	213,174.80	213,174.80	1,312,844.42	16.24%	100.00%					
<b>TOTALES</b>	<b>1,312,844.42</b>	<b>1,312,844.42</b>				<b>883,402.72</b>	<b>883,402.72</b>			

**DIAGRAMA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO**

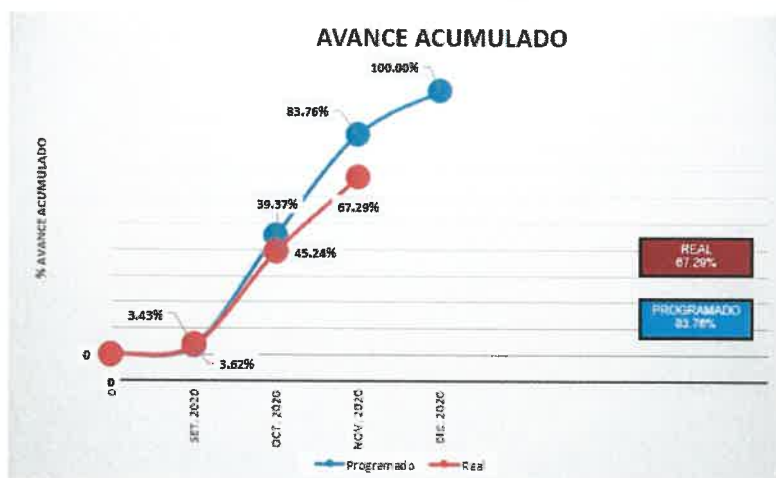

La retención de la Garantía de Fiel Cumplimiento, que tiene como responsabilidad el CONSORCIO VIAL LA CHIRA, en dejar como garantía del trabajo a ejecutar, fue descontado en las dos primeras Valorizaciones concerniente a los meses de Setiembre y Octubre del 2020, de las cuales será retenido el 10% del monto del contrato.

Dentro del contenido del informe mensual del contratista, de valorización N° 03 al mes de NOVIEMBRE del 2020, nos detalla las pólizas de seguros por la compañía de seguros LA POSITIVA relacionadas al SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIÓN Y SALUD SCTR SALUD CONTRATO DE N° 612453, SCTR PENSIONES POLIZA 6648509, vigente desde el 23/11/2020 hasta el 23/12/2020, seguros contra accidentes personales emitidas por la compañía aseguradora cuya fecha debe de coincidir al mes de NOVIEMBRE del 2020, Pólizas de seguros contra todo riesgo (SCTR – SALUD), FUE EMITIDA EL 02/12/2020, Que cubre la vigencia desde 23/11/2020 hasta el 23/12/2020.

**CONCLUSIÓN:**

Conforme al calendario de avance del SERVICIO vigente, la ejecución del servicio de SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG, 7.00 KM; EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG. 11.65 KM, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, ubicado en el distrito de SITABAMBA, Provincia de Santiago de Chuco, Departamento la Libertad, se encuentra adelantado; por cuanto el acumulado programado para el mes de



NOVIEMBRE del 2020 es el 83.76 % contra lo realmente ejecutado que es el 67.29%, de las cuales se tiene la ejecución de forma atrasada en todas las actividades programadas.

LOS METRADOS CONCILIADOS ENTRE EL INSPECTOR y el Residente del SERVICIO, han generado la VALORIZACION DEL SERVICIO N° 03, correspondiente a los trabajos ejecutados en el periodo comprendido entre el 01/11/2020 hasta el 30/11/2020 por la empresa contratista CONSORCIO VIAL LA CHIRA, el mismo que asciende a la suma de **S/. 366,475.29 (TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 29/100 SOLES), INC. EL IGV.**

Las pólizas de seguros contra accidentes personales emitidas por la compañía aseguradora LA POSITIVA relacionadas al SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIÓN Y SALUD SCTR SALUD CONTRATO DE N° 612453, SCTR PENSIONES POLIZA 6648509, vigente desde el 23/11/2020 hasta el 23/12/2020 y sus normas reglamentarias, a favor de la empresa **CORPORACION SORIANO L&C S.A.C.**, DE FECHA 02/12/2020, se encuentra vigente.

La Retención de la Garantía, que garantiza el **FIEL CUMPLIMIENTO** de la ejecución del servicio por un monto a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO, se realizará en las dos primeras Valorizaciones concerniente a los meses de Setiembre Y Octubre del 2020, sumando el monto de **S/. 158,174.03 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 03/100 SOLES)**, considerando el saldo del 10% del monto de la del contrato.

Después de haber evaluado el informe del Inspector con respecto a la valorización del servicio N° 03 por los trabajos ejecutados por el **CONSORCIO VIAL LA CHIRA**, durante el periodo comprendido entre el 01/11/2020 hasta el 30/11/2020, del servicio de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG, 7.00 KM; EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG. 11.65 KM, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD", la misma que asciende a la suma de **S/. 366,475.29 (TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 29/100 SOLES), INC. EL IGV**, esta gerencia da su **CONFORMIDAD** respectiva al informe N° 200-2020-JO/IVPSCH/LFGCH, así mismo al informe de la sub gerencia de infraestructura de la MPSCH. Quien vierte opinión favorable a dicha valorización.

Concluyendo que el monto a cancelar es de **S/. 366,475.29 (TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 29/100 SOLES), INC. EL IGV**, Resumiendo esto en el cuadro resumen de Valorización N° 03 NOVIEMBRE del 2020.

#### RECOMENDACION

Hacer efectivo la Valorización del SERVICIO N° 03 mes de NOVIEMBRE 2020, por un monto a Pagar de **S/. 366,475.29 (TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 29/100 SOLES), INC. EL IGV**, por el periodo comprendido entre el 01/11/2020 hasta el 30/11/2020, generado por el avance de los trabajos ejecutados en el servicio DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG, 7.00 KM; EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG. 11.65 KM, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, la misma que está a cargo del contratista, **CONSORCIO VIAL LA CHIRA**, e Inspeccionado por el Inspector de servicio el **ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA**, para efectos consiguientes a este informe se hace llegar la siguiente documentación:




Adjunta:

- ✚ Informe N° 200-2020-JO/IVPSCH/LFGCH
- ✚ INFORME N° 020-2020-IVP-MPSCH/CEGB/TA
- ✚ Informe N° 1300-2020-MPSCH/DST/SGI
- ✚ CARTA N° 003-2020/INSPECTOR DE SERVICIO/ADRO
- ✚ CARTA N° 006-2020-CONSORCIO VIAL LA CHIRA/RL/JQQ
- ✚ CONTRATO N° 009-2020-MPSCH-LOG
- ✚ DU. N° 070-2020
- ✚ 01 archivador Original de la valorización presentada por el contratista
- ✚ Planilla de Valorización N° 03 resumida por la entidad
- ✚ Resumen de la Valorización del servicio N° 03 por la entidad

Sin otro particular, me suscribo de Usted, no sin antes reiterar mi estima personal.

Atentamente,



INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
Ing. *Rafael X.*  
CIP 20841  
GERENTE GENERAL



RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 03 NOVIEMBRE 2020, POR LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG. 7.00 KM; EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG. 11.65 KM, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL LA CHIRA  
INSPECTOR : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA

SERVICIO : TRAMO: EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG. 7.00 KM; EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG. 11.65 KM

N° Contrato	: N° 009-2020-MPSC/HLOG
Plazo de Ejecución	120 Días Calendarios
Anticipo	:S/0,00 Sin IGV
Adelanto de Materiales	:S/0,00 Sin IGV
Fecha Inicio Elec. Servicio	: 22 septiembre 2020
Fecha Término Servicio	: 31 diciembre 2020

ACTIVIDAD	COSTO DIRECTO (S/.)	GASTOS GENERALES 10%	UTILIDAD 5%	SUB TOTAL	IGV 18%	TOTAL S/.
PLAN DE TRABAJO	11,656.16	1,165.62	582.81	13,404.58	2,412.82	15,817.40
MANTENIMIENTO PERIÓDICO	987,460.88	98,746.09	48,373.04	1,112,580.01	200,264.40	1,312,844.41
MANTENIMIENTO RUTINARIO	174,842.33	17,484.23	8,742.12	201,068.68	36,192.37	237,261.04
INVENTARIO DE CONDICION VIAL	11,656.16	1,165.62	582.81	13,404.58	2,412.82	15,817.40
<b>TOTAL S/.</b>	<b>1,165,615.52</b>	<b>116,561.55</b>	<b>58,280.78</b>	<b>1,340,457.85</b>	<b>241,282.41</b>	<b>1,581,740.26</b>

N° Valorización	Valorización Bruta	Reintegro de Valorización	Reajuste de Reintegro de Valorización	Deducción del reajuste que no corresponde	Retención según Art. 151 DS 344-2018-EF Reglamento de la ley N° 30225		Monto a Pagar	Valorización del mes	Avance Mensual	
					Retención S/IGV	Retención Inc. IGV			Actual	Acumulado
V. N° 01. Set. 2020	40,319.77	0.00	0.00	0.00	4,757.73	0.00	36,287.80	6,531.80	3.62%	3.62%
V. N° 02. Oct. 2020	387,764.33	0.00	0.00	0.00	153,416.30	0.00	267,740.52	48,193.29	35.75%	39.37%
V. N° 03. Nov. 2020	310,572.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,572.28	55,903.01	27.81%	67.29%
V. N° 04. Dic. 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Parcial</b>	<b>748,646.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,174.03</b>	<b>0.00</b>	<b>614,800.59</b>	<b>110,628.10</b>		<b>725,228.69</b>

ADICIONALES										
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total General</b>	<b>748,646.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,174.03</b>	<b>0.00</b>	<b>614,800.59</b>	<b>110,628.10</b>		<b>725,228.69</b>

NOTA: Conforme lo establece el Resolución de Superintendencia N° 071-2018/SUNAT, a partir del 01 de abril de 2018, los siguientes servicios, contenidos en el Anexo 3 de la R.S. 183-2004/SUNAT, cuyo nacimiento de la obligación tributaria del IGV se origine a partir de dicha fecha, estarán sujetos a la aplicación del 12%.

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL  
SANTIAGO DE CHUCO  
Gerente General  
CIP 218511  
Gerente General

JEFE DE OPERACIONES  
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

GERENTE GENERAL  
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO : \*SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG. 7.00 KM; EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG. 11.65 KM, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD\*

CONTRATO : N° 009-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL LA CHIRA



Instituto Vial Provincial  
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD



## RESUMEN DE PAGO N° 03 - NOVIEMBRE 2020

CONTRATO N° 009-2020-MPSCH/LOG

MES DE NOVIEMBRE 2020

### PAGO A CUENTA A CANCELAR AL CONTRATISTA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

CONCEPTO		MONTO
		SI.
<b>1.- Monto Valorizado sin Reajuste en el presente mes :</b>		<b>310,572.28</b>
- Valorizacion No.03		310,572.28
<b>2.- Reajuste de las Valorizaciones :</b>		<b>0.00</b>
- Reajuste de la Valorizacion No.03		0.00
- Regularizacion Reajuste Valorización anterior		0.00
- Retención por atraso de Obra		0.00
* El reajuste no se aplica según CGC 47.1		
<b>A.- VALORIZACION BRUTA (VB) (sin IGV) (1+2)</b>	<b>SI.</b>	<b>310,572.28</b>
<b>3.- Retención de Garantía :</b>		<b>0.00</b>
- En la Valorizacion No.03		0.00
- Regularización Valorizaciones anteriores		0.00
* Contratista no solicito retención de Garantía		
<b>4.- Amortizacion del Adelanto de Materiales :</b>		<b>0.00</b>
- En la Valorizacion No.03		0.00
- Regularización Valorizaciones anteriores		0.00
* Contratista no solicito adelanto		
<b>5.- Dedución del Reajuste que no corresponde :</b>		<b>0.00</b>
- Por Adelanto Directo		0.00
- Por Adelanto de Materiales		0.00
- Por Regularización del Adelanto Directo		0.00
- Por Regularización del Adelanto de Materiales		0.00
<b>B.- VALORIZACION NETA (sin IGV) (1)</b>	<b>SI.</b>	<b>310,572.28</b>
<b>C.- MONTO NETO</b>	<b>SI.</b>	<b>310,572.28</b>
<b>D.- I.G.V. ( 18% DE B )</b>	<b>SI.</b>	<b>55,903.01</b>
<b>E.- MONTO A CANCELAR (C+D)</b>	<b>SI.</b>	<b>366,475.29</b>
<b>F.- MONTO A FACTURAR (A*0.18)</b>	<b>SI.</b>	<b>366,475.29</b>



ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: : \*SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG. 7.00 KM; EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG. 11.65 KM, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD\*

CONTRATO : N° 009-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL LA CHIRA



*Instituto Vial Provincial*  
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD



**RESUMEN GENERAL VALORIZACION Nº 03 NOVIEMBRE MANTENIMIENTO PERIODICO**

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO	VALORIZACION				% AVANCE
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUM.	SALDO	
<b>1.- VALORIZACION CONTRACTUAL</b>						
Valorizacion No. 03	1,112,580.02	438,074.10	310,572.28	748,646.37	363,933.65	67.29%
	1,112,580.02	438,074.10	310,572.28	748,646.37	363,933.65	67.29%
Avance Ejecutado		39.370%	27.919%	67.289%		
Avance Programado		0.000%	3.430%	3.430%		
<b>2.- REAJUSTES</b>						
Reajuste de la Valorizacion No. 03		-	-	-		
Regularizacion Reajuste Valorización anteriores		-	-	-		
Retención por atraso de Obra		-	-	-		
*El reajuste no se aplica según CGC 47.1		0.00	0.00	0.00		
<b>A.- VALORIZACION BRUTA (sin IGV) (1+2)</b>		<b>438,074.10</b>	<b>310,572.28</b>	<b>748,646.37</b>		
<b>3.- RETENCIÓN POR GARANTIA</b>						
Valorizacion No.03		-	-	-		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
* Contratista si solicito retención de garantia		0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4.- AMORTIZACION POR ADELANTO MATERIALES</b>						
Valorizacion No.03		-	-	-		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
<b>5.- DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE</b>						
Por Adelanto Directo		-	-	-		
Por Adelanto de Materiales		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto Directo		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto de Materiales		-	-	-		
		0.00	0.00	0.00		
<b>B.- VALORIZACION NETA (sin IGV) (1)</b>		<b>438,074.10</b>	<b>310,572.28</b>	<b>748,646.37</b>		
<b>C.- MONTO NETO</b>		<b>438,074.10</b>	<b>310,572.28</b>	<b>748,646.37</b>		
<b>D.- I.G.V. (18% DE B)</b>		<b>78,853.34</b>	<b>55,903.01</b>	<b>134,756.35</b>		
<b>E.- MONTO A CANCELAR (C+D)</b>		<b>516,927.44</b>	<b>366,475.29</b>	<b>883,402.72</b>		
<b>F.- MONTO A FACTURAR (A*0.18)</b>		<b>516,927.44</b>	<b>366,475.29</b>	<b>883,402.72</b>		



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VEDNALES TRAMO EMP. LL-11E (DV. OHGAVARA) - LA CHIRA - L.D. AVICASH (TUTURCOO), LONG. 7,00 KM, EMP. LL-911 (STRABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUALONG. 11,85 KM, DISTRITO DE STRABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

CONTRATO: N° 003-2020-MP/SC/CHC/03  
INSPECTOR: ING. SMITH KEAN CARLOS OTIMAYO OLIVA  
CONTRATISTA: CONSORCIO VALLA CHIRA



PRESP. OFERTADO: (CD-OSG-J) S/159 11/12/2020  
PRESP. OFERTADO: (CD-OSG-J) S/159 11/12/2020  
FECHA DE PRESUPUESTO: 01/09/2020  
PLAZO DE EJECUCION: 120 d.c. (04 meses)  
FECHA DE INICIO Y TERMINO CONTRACTUAL: 22/08/2020 - 31/12/2020

VALORIZACION DE AVANCE DE SERVICIO N° 03. MANTENIMIENTO PERIODICO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020  
FORMULA 01 - SERVICIO PRINCIPAL

Table with columns: ITEM, DESCRIPCION, UNID, P.U, MONTO CONTRATO, METRADO, SOLES, %, ACUMULADO ANTERIOR, METRADO, SOLES, %, PRESENTE VALORIZACION, METRADO, SOLES, %, ACUMULADO ACTUAL, METRADO, SOLES, %, SALDO POR VALORIZAR, METRADO, SOLES, %.

Summary table with columns: A- COSTO DIRECTO, B- GASTOS GENERALES, C- UTILIDAD, D- SUB TOTAL, E- IGV, F- TOTAL, G- PORCENTAJE.



ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: : 'SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG. 7.00 KM; EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG. 11.65 KM, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD'

CONTRATO: : N° 009-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL LA CHIRA



*Instituto Vial Provincial*  
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD



**PLANILLA DE RESUMEN DE METRADOS, MANTENIMIENTO PERIODICO  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020**

Partida	Descripción	Und	Metrado Contrato Original	Acumulado Anterior	Val N° 03	Acumulado Actual		Saldos por Valorizar	
				Metrado	Nov-20	Metrado	%	Metrado	%
<b>01</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>								
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	g/b	2.00	1.0000	-	1.000	50.00%	1.0000	50.00%
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	18.65	13.8000	2.85	16.650	89.28%	2.0000	10.72%
<b>02</b>	<b>PAVIMENTOS</b>								
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M.	m3	2,694.57	1,275.0000	784.800	2,059.800	76.44%	634.7700	23.56%
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M.	m3	8,018.13	3,000.0000	2,898.020	5,898.020	73.56%	2,120.1100	26.44%
<b>03</b>	<b>TRANSPORTE</b>								
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM.	m3k	12,854.23	5,275.0000	3,812.850	9,087.850	70.70%	3,766.3800	29.30%
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM.	m3k	69,418.25	30,940.0000	17,348.130	48,288.130	69.56%	21,130.1200	30.44%
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM.	m3k	693.78	315.0000	117.700	432.700	62.37%	261.0800	37.63%
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM.	m3k	7,978.45	3,600.0000	2,340.290	5,940.290	74.45%	2,038.1600	25.55%
<b>04</b>	<b>OBRAS DE ARTE Y DRENAJE</b>								
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	18,650.00	5,100.0000	7,650.000	12,750.000	68.36%	5,900.0000	31.64%
<b>05</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>								
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und	18.00	-	-	-	-	18.0000	100.00%
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	Und	30.00	-	-	-	-	30.0000	100.00%
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	Und	12.00	-	-	-	-	12.0000	100.00%
05.11	SEÑALES INFORMATIVAS	Und	8.00	-	-	-	-	8.0000	100.00%
<b>06</b>	<b>IMPACTO AMBIENTAL</b>								
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	1.50	-	-	-	-	1.5000	100.00%
<b>07</b>	<b>EMERGENCIA SANITARIA</b>								
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	g/b	2.00	1.0000	0.250	1.250	62.50%	0.7500	37.50%



ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO :

CONTRATO : N° 008-2020-MISCHLOG  
 INSPECTOR : ING. SMITH JEAN CARLOS OTIMIANO OLIVA  
 CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL LA CHIRA





\*SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANGASH (TUTUARCO), LONG. 7,00 KM. EMP. LI-811 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG. 11,65 KM, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD\*

### CUADRO COMPARATIVO DE AVANCES : PROGRAMADO VS EJECUTADO (CURVA "S") COMPARACION EFECTUADA CON EL CV

PERIODO	VALORIZACIONES DE SERVICIO PROGRAMADA				VALORIZACIONES DE SERVICIO REAL				SITUACION DE SERVICIO	
	CONTRATO ORIGINAL	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)		PRINCIPAL TOTAL	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)	
		PARCIAL	ACUM. (A)	PARCIAL	ACUM.		PARCIAL	ACUMULADO	SERVICIO	%
SET. 2020	45,030.28	45,030.28	3.43%	3.43%	47,577.33	47,577.33	3.62%	3.62%	ADELANTADA	5.66%
OCT. 2020	548,846.40	548,846.40	41.81%	45.24%	469,350.10	516,927.43	35.75%	39.37%	ATRASADA	12.96%
NOV. 2020	505,792.94	1,099,669.62	38.53%	83.76%	366,475.29	883,402.72	27.91%	67.29%	ATRASADA	19.67%
DIC. 2020	213,174.80	1,312,844.42	16.24%	100.00%						
<b>TOTALES</b>	<b>1,312,844.42</b>	<b>1,312,844.42</b>			<b>883,402.72</b>	<b>883,402.72</b>				

NOTAS:  
 1.- Montos que considera costo directo + gastos generales + utilidad, montos sin incluir IGV.  
 2.-En el avance programado se ha considerado el Calendario de Avance Servicio que corresponde al mes de Setiembre

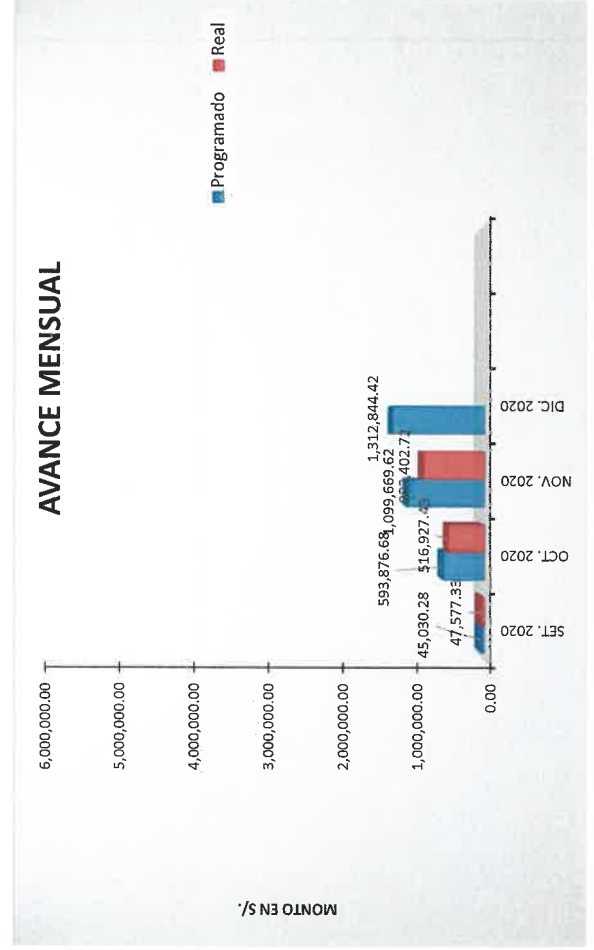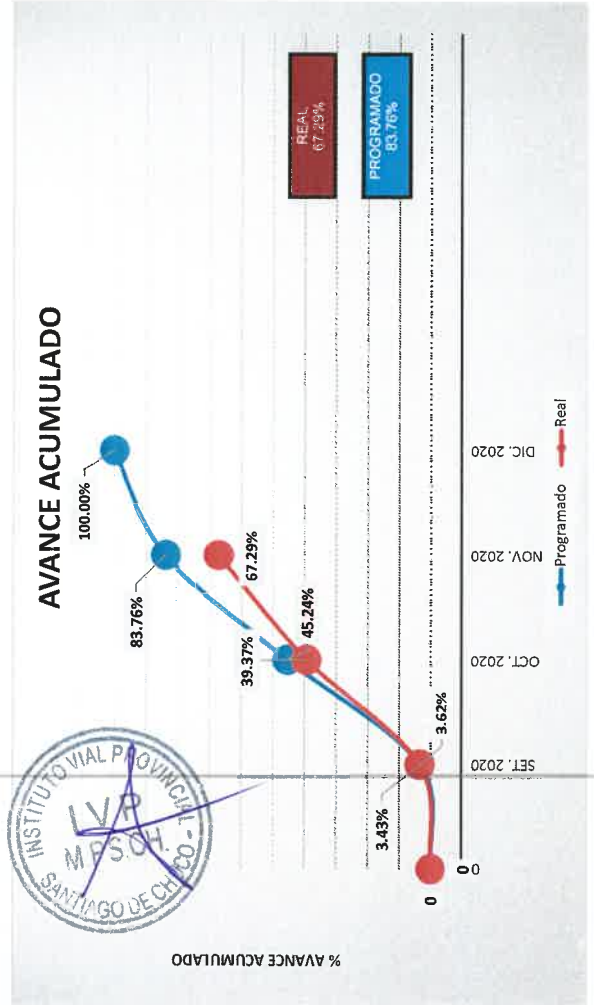

ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG. 7.00 KM; EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA – QUINUAL LONG. 11.65 KM, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"

CONTRATO: : N° 009-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL LA CHIRA



*Instituto Vial Provincial*  
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD



### EVALUACION DEL AVANCE VALORIZADO RESPECTO AL PROGRAMADO

PRESUPUESTO	MONTO TOTAL X PRESUPUESTO	MONTO AVANCE ACUMULADO	
		VALORIZADO	PROGRAMADO
SERVICIO PRINCIPAL	1,312,844.42	883,402.72	1,099,669.62
<b>TOTAL (Sin IGV)</b>	<b>1,312,844.42</b>	<b>883,402.72</b>	<b>1,099,669.62</b>
		<b>67.29%</b>	<b>83.76%</b>

<b>Situación de Obra</b>	$S/.883,402.72 < S/.1,099,669.62 \implies$	<b>Atrasada</b>
		<b>19.667%</b>

#### VERIFICACION SI REQUIERE CALENDARIO ACELERADO (ART. 205 DEL RLCE)

a.- Monto Valorización Acumulado Programado	1,099,669.62
b.- Porcentaje art. 205 del Reglamento.	80%
c.- Monto Tope (80% de a)	879,735.70
d.- Monto Valorización Acumulado Ejecutado	883,402.72

Se tiene que:  
 $(d) > (c) \implies S/.883,402.72 > S/.879,735.70$

#### Conclusion :

Como el monto de la valorización acumulada ejecutada es mayor que el 80% del monto de la valorización acumulada programada, la obra se encuentra dentro del atraso permisible, por lo que no es necesario que el contratista presente el calendario acelerado de avance de obra (CAAO)



ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. LI-115 (DV. CHAGAVARA) - LA CHIRA - L. D. ANCASH (TUTUARCO), LONG, 7.00 KM; EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCUBAMBA - QUINUAL LONG. 11.65 KM, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

SERVICIO:

CONTRATO : N° 009-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR : ING. SMITH JEAN CARLOS OTINIANO OLIVA

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL LA CHIRA



Instituto Vial Provincial  
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD



## RESUMEN DE METRADOS MANTENIMIENTO PERIODICO VALORIZACION N° 03

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO
<b>01</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>		
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	gib	-
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	2.85
<b>02</b>	<b>PAVIMENTOS</b>		
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M.	m3	784.80
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M.	m3	2,898.02
<b>03</b>	<b>TRANSPORTE</b>		
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM.	m3k	3,812.85
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM.	m3k	17,348.13
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM.	m3k	117.70
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM.	m3k	2,340.29
<b>04</b>	<b>OBRAS DE ARTE Y DRENAJE</b>		
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	7,650.00
<b>05</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>		
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Und	-
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	Und	-
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	Und	-
05.11	SEÑALES INFORMATIVAS	Und	-
<b>06</b>	<b>IMPACTO AMBIENTAL</b>		
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0
<b>07</b>	<b>EMERGENCIA SANITARIA</b>		
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gib	0.25



“Año de la Universalización de la Salud”

**INFORME N° 200-2020-JO/IVPSCH/LFGCH**



**A** : ING. RAFAEL K. VALENCIA REBAZA  
GERENTE DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

**DE** : ING. LUIS F. GUTIERREZ CHÁVEZ  
JEFE DE OPERACIONES DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

**ASUNTO** : EVALUACIÓN Y CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N° 03 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. LI-115 (DV. – CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG= 7.000 KM” Y “EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUCOBAMBA – QUINUAL LONG= 11.650 KM” DEL DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.

**REFERENCIA :**

MONITOR DESIGNADO POR IVP	a)	INF. N°020-2020-IVP-MPSCH/CEGB/TA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	b)	INF. N°1300-2020-MPSCH/DIST/SGI
INSPECTOR DE SERVICIO	c)	CARTA N°003-2020/INSPECTOR DE SERVICIO/SJCOO
CONTRATISTA	d)	CARTA N°006-2020/CONSORCIO VIAL LA CHIRA/RL/JQQ

**FECHA** : SANTIAGO DE CHUCO, 21 DE DICIEMBRE DE 2020

*Por medio del presente, le expreso mi cordial saludo y afecto, a su vez presento la VALORIZACIÓN N°03 del SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. LI-115 (DV. – CHAGAVARA) – LA CHIRA – L.D. ANCASH (TUTUARCO) LONG= 7.000 KM” Y “EMP. LI-911 (SITABAMBA) – UCHUCOBAMBA – QUINUAL LONG= 11.650 KM” DEL DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, correspondiente al mes de noviembre (del 01 al 30) de 2020, la cual fue elaborada por el CONSORCIO VIAL LA CHIRA y alcanzada al Inspector de servicio mediante documento de referencia d); este a su vez dio su Conformidad y la ingresó a la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad) con documento de referencia c) para realizar el trámite correspondiente.*

*Para el pago de la VALORIZACIÓN N° 03, se debe contar con la CONFORMIDAD del área responsable (Sub Gerencia de Infraestructura) y posteriormente se dará la APROBACIÓN del área usuaria (Instituto Vial Provincial de Santiago de Chuco), según se estipula los Términos de Referencia del D.U. N° 070-2020 para los Mantenimientos Viales de los caminos vecinales de la provincia de Santiago de Chuco.*

*Dentro de este marco, a su vez contando con la CONFORMIDAD de VALORIZACIÓN N° 03 del área responsable (documento de referencia b); siguiendo el trámite correspondiente; esta Jefatura de Operaciones del IVP de Santiago de Chuco, como parte de sus funciones, realizó la evaluación dicha documentación por medio del Monitor designado, el Ing. Carlos Enrique Geldres Barriga, la cual se detalla en su informe respectivo (documento de referencia a); de esta manera se dará CONFORMIDAD (de no haber observaciones); a fin de dar paso a la evaluación para la APROBACIÓN por parte de su persona.*

**I. INFORME GENERAL:**

**A) INFORMACIÓN TÉCNICA:**



Según lo detallado y analizado en el Informe del Monitor designado, la Sub Gerencia de Infraestructura (área responsable) y del Inspector concerniente a la VALORIZACIÓN N° 03 (del 01 al 30 de noviembre) de la Fase II: MANTENIMIENTO PERIÓDICO del servicio en mención, presentada por el Contratista, se tiene la siguiente información resumida a considerar:

**A) DEL AVANCE EJECUTADO**

Los metrados ejecutados son:

**TRAMO: EMP. LI-115 (DV. - CHAGAVARA) - LA CHIRA - L.D. ANCASH (TUTUARCO)**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATADO	CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS				% EJECUTADO
				ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR EJECUTAR	
<b>1.00</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>							
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	0.50	0.00	0.50	0.50	50.00%
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	7.00	5.00	0.00	5.00	2.00	71.43%
<b>2.00</b>	<b>PAVIMENTOS</b>							
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	981.77	500.00	0.00	500.00	481.77	50.93%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	2,786.11	1,125.00	0.00	1,125.00	1,661.11	40.38%
<b>3.00</b>	<b>TRANSPORTE</b>							
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	4,521.46	1,480.00	0.00	1,480.00	3,041.46	32.73%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	24,415.87	8,740.00	0.00	8,740.00	15,675.87	35.80%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	259.00	105.00	0.00	105.00	154.00	40.54%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	2,978.50	1,200.00	0.00	1,200.00	1,778.50	40.29%
<b>4.00</b>	<b>OBRAS DE ARTE Y DRENAJE</b>							
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	7,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	5,000.00	28.57%
<b>5.00</b>	<b>SEÑALIZACION</b>							
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00%
05.02.	SEÑALES PREVENTIVAS	und	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00%
05.03.	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00%
05.04.	SEÑALES INFORMATIVAS	und	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00%
<b>6.00</b>	<b>IMPACTO AMBIENTAL</b>							
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00%
<b>7.00</b>	<b>EMERGENCIA SANITARIA</b>							
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	0.50	0.00	0.50	0.50	50.00%

**TRAMO: EMP. LI-911 (SITABAMBA) - UCHUCOBAMBA - QUINUAL**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATADO	CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS				% EJECUTADO
				ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR EJECUTAR	
<b>1.00</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>							
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	0.50	0.00	0.50	0.50	50.00%
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	11.65	8.80	2.85	11.65	0.00	100.00%
<b>2.00</b>	<b>PAVIMENTOS</b>							
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	1,712.80	775.00	784.80	1,559.80	153.00	91.07%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	5,232.02	1,875.00	2,898.02	4,773.02	459.00	91.23%
<b>3.00</b>	<b>TRANSPORTE</b>							
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	8,332.77	3,795.00	3,812.85	7,607.85	724.92	91.30%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	45,002.38	22,200.00	17,348.13	39,548.13	5,454.25	87.88%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	434.78	210.00	117.70	327.70	107.08	75.37%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	4,999.95	2,400.00	2,340.29	4,740.29	259.66	94.81%
<b>4.00</b>	<b>OBRAS DE ARTE Y DRENAJE</b>							
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	11,650.00	3,100.00	7,650.00	10,750.00	900.00	92.27%
<b>5.00</b>	<b>SEÑALIZACION</b>							
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00%
05.02.	SEÑALES PREVENTIVAS	und	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00%
05.03.	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00%
05.04.	SEÑALES INFORMATIVAS	und	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00%
<b>6.00</b>	<b>IMPACTO AMBIENTAL</b>							
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0.94	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00%
<b>7.00</b>	<b>EMERGENCIA SANITARIA</b>							
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	0.50	0.25	0.75	0.25	75.00%

Las partidas que se vienen ejecutando a la fecha corresponden a las obras preliminares (movilización y desmovilización de equipos, trazo y replanteo), asimismo, se está ejecutando las partidas de colocación de pavimento (capa nivelante y afirmado) por lo cual se ejecuta a su vez las partidas de transporte de material excedente; también se realizó parte de la partida reconformación de cunetas; finalmente la partida de emergencia sanitaria COVID 19 se ejecutó a un 25%. Todo viene siendo ejecutado conforme a las normas de evaluación, dentro de los lineamientos y Especificaciones Técnicas establecidos en el Plan de Trabajo, elaborado por el Contratista y previamente aprobado por la Entidad.

En cuanto al avance acumulado ejecutado respecto al programado (curva S) tenemos el siguiente resumen:

N° VAL.	MES	PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCE MENSUAL ACUM.	
				EJECUTADO	PROGRAMADO
3	NOVIEMBRE	01/11/2020	30/11/2020	67.28%	83.77%

Se observa un porcentaje de avance NEGATIVO del **-16.49%**, lo cual significa que la ejecución está atrasada, sin embargo, dicho porcentaje es mayor al 80% de lo programado (80.32%) por lo que no supone la elaboración de cronograma acelerado.

**B) DEL MONTO VALORIZADO**

De acuerdo con las actividades ejecutadas se tiene una valorización con la siguiente configuración:

N° Valorización	Valorización Bruta	MONTO A PAGAR	IGV	Valorización del mes
		S/IGV		

N° 01. Septiembre	S/.36,944.64	S/.36,944.64	S/.6,650.04	S/.43,594.68
N° 02. Octubre	S/.397,754.32	S/.397,754.32	S/.71,595.78	S/.469,350.10
N° 03. Noviembre	S/.310,572.28	S/.310,572.28	S/.55,903.01	<b>S/.366,475.29</b>
N° 04. Diciembre	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00

Parcial	S/.745,271.24	S/.745,271.24	S/.134,148.82	S/.879,420.06
---------	---------------	---------------	---------------	---------------

**ADICIONALES**

0	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00
---	---------	---------	---------	---------

<b>Total General</b>	<b>S/.745,271.24</b>	<b>S/.745,271.24</b>	<b>S/.134,148.82</b>	<b>S/.879,420.06</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Se observa que la VALORIZACIÓN N° 03 del mes de octubre corresponde a un monto de **S/. 366,475.29 (inc. IGV)**.

**C) DE LA RETENCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)**

Según la CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍAS del contrato de servicio, estipula una retención del 10% como garantía de FIEL CUMPLIMIENTO del monto contractual total, el cual será retenido de manera particionada de las dos primeras valorizaciones según lo estipula el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado en su artículo 149° "Garantía de fiel cumplimiento", inciso 149.5, para servicios, como se muestra en el siguiente cuadro:

MONTO CONTRACTUAL	RETENCIÓN G.F.C. (10%)	RETENCIÓN EN CADA VAL.	
		VAL. 01 (10% DE VAL.)	VAL. 02 (SALDO)
S/. 1,581,740.26	S/. 158,174.03	S/. 4,757.73	S/. 153,416.30

Por lo cual se tiene el siguiente detalle:

➤ VALORIZACIÓN BRUTA	S/.	310,572.28
➤ IGV (18%)	S/.	55,903.01



➤ VALORIZACIÓN NETA	S/.	366,475.29
➤ RETENCIÓN G.F.V.	S/.	0.00
➤ SALDO A COBRAR	S/.	366,475.29

El saldo a cobrar por la VALORIZACIÓN N° 02 del 01 al 31 del mes de octubre es de **S/. 366,475.29 (TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 29/100 NUEVOS SOLES) incluido el I.G.V.**

D) DE PENALIDADES PRESENTADAS

No se presentó ninguna ocurrencia que suponga la aplicación de PENALIDAD según las estipulaciones del contrato de servicio de en su CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.

III. CONCLUSIONES

Tomando en cuenta todo lo analizado anteriormente, se hace las siguientes conclusiones:

- ❖ La diferencia entre el avance ejecutado respecto al programado arroja un **porcentaje negativo de -16.49%, pero supera el 80% de lo programado.**
- ❖ El saldo a pagar por la VALORIZACIÓN N° 02 del mes de octubre es de **S/. 366,475.29 (TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 29/100 NUEVOS SOLES inc. IGV).**
- ❖ **No se presentaron PENALIDADES.**
- ❖ Se da **CONFORMIDAD** por parte de la oficina de Jefatura de Operaciones del IVP Santiago de Chuco a la VALORIZACIÓN N° 03 del servicio en mención.

IV. RECOMENDACIONES

Se recomienda **APROBAR** la presente VALORIZACIÓN N° 03 por su persona, a fin de realizar el pago correspondiente del CONSORCIO VIAL LA CHIRA, conforme a lo estipulado en el cronograma programado del Plan de Trabajo del servicio y a lo ejecutado en campo. De igual modo, se sugiere seguir las recomendaciones indicadas en el Informe del Monitor designado (documento de referencia a).

*Es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y fines.*

ATENTAMENTE

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE  
SANTIAGO DE CHUCO  
Luis F. Chavez Luis F.  
C.N. 190782  
JEFE DE OPERACIONES
