



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” INFORME N° 1412- 2020-MPSCH/DIST/SGI

RECIBIDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FECHA: 28 DIC. 2020
N° Folios: 461 hora: 11:30
Firma: *[Firma]*
LA RECEPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO INDICA CONFORMIDAD

A : ABOG. JOHN JAIRO CURAY REYES
Administrador de la MPSCH

DE : ING. DAVID IVAN SILVA TORRES
Sub Gerente de Infraestructura – MPSCH

ASUNTO : CONFORMIDAD DE VALORIZACION N° 04 CONTRATISTA – CONTRACTUAL
(TRAMO 04)

REFERENCIA : (01) INFORME N°262-2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH
(02) CARTA N° 008-2020-DRPM/INSP
(03) OBRA: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA HUAYLACA – TAMBILLO EN EL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD." (4.1)
(04) OBRA: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHUADERO EN EL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD " (4.2)
(05) "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN EN EL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD." (4.3)
(06) CONTRATO DE SERVICIO N° 012-2020-MPSCH-LOG

FECHA : Santiago de Chuco, 28 de Diciembre del 2020

Me es sumamente honroso dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo; por otro lado referente al asunto de la presente manifiesto lo siguiente:

I. BASE LEGAL

- Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 27972 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
- Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
- Reglamento Nacional de Edificaciones

II. ANTECEDENTE

- ✓ Mediante el documento de la referencia, **INFORME N°262-2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH**, el Encargada de la División de Supervisión y Liquidación de Obras, con fecha 21 de Diciembre del 2020, da la **CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION N° 04 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO** del contratista “**CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA**”; presentado por el INSPECTOR DE OBRA el Ing. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA INSPECTOR de las obras denominadas: “**MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: HUAYLACA – TAMBILLO EN EL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA**

PROVEIDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO
ADMINISTRACION Y FINANZAS
BASE a: Logística
PARA: Trámite
Reglamento
concorrente
FECHA: 28/12/20 Firma: *[Firma]*





Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”
LIBERTAD.” (4.1); “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINA: **ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHIJADERO** EN EL DISTRITO DE
ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.” (4.2);
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA **ANGASMARCA –
EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN** EN EL DISTRITO DE ANGASMARCA,
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.” (4.3) quien solicita el Pago N°
04 por servicios de ejecución de obra al CONTRATISTA “**CONSORCIO VIAL CRUZ DE
CHUCA.**”

III. ANALISIS FINANCIERO

Se detallan en los cuadros de los tramos valorizados

TRAMOS N°04.01: HUAYLACA – TAMBILLO EN EL DISTRITO DE ANGASMARCA,

VALORIZACION BRUTA	S/. 486,835.48
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (-) SIN IGV	S/. -
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (-) SIN IGV	S/. -
VALORIZACION NETA	S/. 486,835.48
IGV (18%)	S/. 87,630.39
VALORIZACION (INCL. IGV)	S/. 574,465.87
RETENCION DE 10% FIEL CUMPLIMIENTO	

TRAMOS N°04.02: ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHIJADERO EN EL DISTRITO DE ANGASMARCA

VALORIZACION BRUTA	S/. 173,839.12
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (-) SIN IGV	S/. -
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (-) SIN IGV	S/. -
VALORIZACION NETA	S/. 173,839.12
IGV (18%)	S/. 31,291.04
VALORIZACION (INCL. IGV)	S/. 205,130.16
RETENCION DE 10% FIEL CUMPLIMIENTO	

TRAMOS N°04.03: ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN EN EL DISTRITO DE ANGASMARCA

VALORIZACION BRUTA	S/. 47,723.53
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (-) SIN IGV	S/. -
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (-) SIN IGV	S/. -
VALORIZACION NETA	S/. 47,723.53
IGV (18%)	S/. 8,590.23
VALORIZACION (INCL. IGV)	S/. 56,313.76
RETENCION DE 10% FIEL CUMPLIMIENTO	



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019

E-mail: mpsch@terra.com.pe



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

RESUMEN DE LOS TRAMOS VALORIZADOS

VALORIZACION BRUTA	S/. 708,398.13
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (-) SIN IGV	S/. -
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (-) SIN IGV	S/. -
VALORIZACION NETA	S/. 708,398.13
IGV (18%)	S/. 127,511.66
VALORIZACION (INCL. IGV)	S/. 835,909.79
RETENCION DE 10% FIEL CUMPLIMIENTO	

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ La **Valorización Bruta N° 04 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO** del contratista fue por S/. 708,398.13 (SETECIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 13/100 SOLES).
- ✓ Se recomienda en la segunda valorización hacer el descuento por el monto de la **RETENCION DE 10 % GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO ES DE S/. 225,915.59 (DOSCIENTOS VEINTI CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 59/100 SOLES) INCLU IGV**; monto que había de diferencia por retener, en tal sentido informo que ya se ha solicitado la retención total de la garantía del 10% de fiel cumplimiento; se deja a criterio del área la decisión de retención que falte o que no se haya realizado.
- ✓ La Amortización del Adelanto Directo: -
- ✓ La Amortización del Adelanto de Materiales: -
- ✓ Por lo tanto el monto a cancelar al **CONTRATISTA POR CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA VALORIZACION N°04 – POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO**; asciende a S/. 835,909.79 (OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 79/100 SOLES) INCL. IGV; se recomienda hacer la retención de fiel cumplimiento.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y acciones que estime por conveniente, salvo mejor parecer.

Atentamente,

Adjunto:

- Referencias
- Val N°04()
- Digital ()




Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe

INFORME N° 262 – 2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH



A : ING° DAVID IVAN SILVA TORRES
SUB-GERENTE DE INFRAESTRUCTURA MPSCH

DEL : ING. HERMES M. MELENDEZ TAMAYO
JEFE (e) DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

ASUNTO : VALORIZACIÓN DE SERVICIO N°04 – DICIEMBRE 2020

REFERENCIA: a) TRAMO I: "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES HUAYLACA – TAMBILLO Long. 8.120 Km, DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"

TRAMO II: "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LOS CAMINOS VECINALES ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHUADERO. Long. 5.600Km. DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"

TRAMO III: "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN. Long. 13.030 Km. DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"

b) Carta N°008-2020 – DRPM/INSP
c) Carta N°023 – 2020 – JCQA /R.C

FECHA : Santiago de Chuco, 21 de Diciembre del 2020

Es grato dirigirme a Usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo, vistos los documentos de la referencia, el suscrito como Jefe de la División de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco **OTORGA LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN N° 04 - NOVIEMBRE 2020** del Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario **TRAMO I: "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES HUAYLACA – TAMBILLO Long. 8.120 Km, DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD", TRAMO II: "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LOS CAMINOS VECINALES ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHUADERO. Long. 5.600Km. DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD", TRAMO III: "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN. Long. 13.030 Km. DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"** y elaborado por el Contratista **CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA** según Contrato de Servicios N° 012-2020-MPSCH-LOG y aprobado por el Inspector de Obra.

Se informa trabajos valorizados en el periodo Diciembre 2020.

DATOS GENERALES

1.- DENOMINACION

TRAMO I: "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES HUAYLACA – TAMBILLO Long. 8.120 Km, DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD", TRAMO II: "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LOS CAMINOS VECINALES ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHUADERO. Long. 5.600Km. DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD", TRAMO III: "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN. Long. 13.030 Km. DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"

2.- UBICACIÓN

- Caseríos : TRAMO I: Huaylaca – Tambillo
TRAMO II: Angamarca, Cruz de Chuca – Ahijadero
TRAMO III: Angamarca – El Ingenio – Cruz Pampa – Catirin



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



- Distrito : Angasmarca
- Provincia : Santiago de Chuco
- Región : La Libertad

3.- DATOS DEL MANTENIMIENTO:

EJECUTOR

- Proceso de Selección : PES-PROG-04-2020-MPSCH/CS
- Contratista : CONSORCIO CRUZ DE CHUCA
- Representante Legal : Julio Cesar Quipuzcoa Aranda
- Contrato de Servicios : N° 012-2020-MPSCH-LOG.
- Suscripción de Contrato : 28/08/2020
- Modalidad : A Suma Alzada
- Valor Referencial (inc. IGV) : S/ 2'280,100.00
- Monto Contratado (inc. IGV) : S/ 2'280,100.00
- Monto del Tramo (inc. IGV) : S/ 679,317.45
- Factor de Relación : 1.000
- Plazo de Ejecución Inicial : 500 Días Calendarios
- Entrega de Terreno : 29 de Agosto del 2020
- Inicio de Plazo Contractual : 22 de Setiembre del 2020 (Elaboración Plan de Trabajo)
- Fecha Término Programado : 31 de Diciembre del 2020
- Residente de Obra : Ing. Lourdes Azucena Juárez Suarez CIP 202858

TRAMO I: Huaylaca – Tambillo

- Valor Referencial : S/ 1'892,483.01
- Porcentaje Programado : 28.04%
- Porcentaje Programado Acumulado : 58.04%
- Porcentaje Ejecutado : 100.00%
- Porcentaje Ejecutado Acumulado : 100.00%
- Estado del Mantenimiento : Terminado al 100%
- Monto Valorizado : S/ 574,465.87

TRAMO II: Angasmarca, Cruz de Chuca - Ahijadero

- Valor Referencial : S/ 396,183.36
- Porcentaje Programado : 67.40%
- Porcentaje Programado Acumulado : 100.00%
- Porcentaje Ejecutado : 51.78%
- Porcentaje Ejecutado Acumulado : 100.00%
- Estado del Mantenimiento : Terminado al 100%
- Monto Valorizado : S/ 205,130.16

TRAMO III: Angasmarca – El Ingenio – Cruz Pampa – Catirin

- Valor Referencial : S/ 1'110,643.00
- Porcentaje Programado : 6.71%
- Porcentaje Programado Acumulado : 100.00%
- Porcentaje Ejecutado : 6.11%
- Porcentaje Ejecutado Acumulado : 100.00%
- Estado del Mantenimiento : Terminada
- Monto Valorizado : S/ 56,313.76

INSPECTOR

- Inspector : Ing. Daysi Ruth Pianto Mendoza CIP 209150
- Contrato de Inspección de Obra : N° 036-2020-MPSCH-LOG.
- Fecha de Contrato : 28/08/2020
- Plazo de Prestación de Servicio : 120 Días Calendario
- Monto Contratado (inc. IGV) : S/ 25,412.50



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



4.- ANTECEDENTES

- Con fecha 28 de Agosto del 2020 se firma el Contrato de Servicios N°012-2020-MPSCH-LOG del Mantenimiento Periódico y Rutinario **TRAMO I: "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES HUAYLACA – TAMBILLO Long. 8.120 Km, DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"**, **TRAMO II: "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LOS CAMINOS VECINALES ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHIJADERO. Long. 5.600Km. DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"**, **TRAMO III: "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES ANGASMARCA - EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN. Long. 13.030 Km. DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"** con la Empresa Contratista **CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA** por un monto de S/.2'280,100.00 con un plazo de ejecución de 500 días calendario.
- El día 28 de Agosto del 2020 se firma el Contrato de Inspección de Servicio N°004-2020-MPSCH-LOG con el Consultor Ing. Daysi Ruth Pianto Mendoza CIP 209150 por un monto de S/. 25,412.50, con un plazo de ejecución de 120 días calendario.
- Con fecha 29/08/2020 se firma el Acta de Entrega de Terreno con la participación de representantes de todos los involucrados.
- El 22/09/2020 se firma el Acta de Inicio de Obra con una fecha programada de término de servicio del 31 de Diciembre 2020.
- Con fecha 12 de Setiembre 2020, el Inspector recepciona la Carta N°012-2020-CVCH/LAJS-RO con la cual el Contratista **CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA** hace entrega del Plan de Trabajo para su revisión y tramite respectivo
- El Ingeniero Inspector del Servicio mediante Carta N°001-2020- DRPM/INSP del 15 de Setiembre del 2020 ingresa por mesa de partes de la Entidad con Expediente Administrativo N° 4429 el Plan de Trabajo aprobado para su Conformidad.
- Mediante **INFORME N°120-2020-HMMT/DEYP/SGI/MPSCH**, de fecha 18 de Setiembre del 2020 la División de Estudios y Proyectos otorga la Conformidad del Plan de Trabajo y sugiere su aprobación mediante la Resolución Respectiva.
- Con Resolución de Gerencia Municipal N°00312-2020-MPSCH/GM de fecha 28 de Setiembre 2020 de Aprueban el Plan de Trabajo del Mantenimiento Rutinario y Periódico.
- Mediante Carta N°002-2020DRPM/INSP la Ing. Inspector hace llegar la Valorización de Servicio N°01 – Setiembre 2020 incluyendo la Carta N°015-2020-CVCH/LAJS para su revisión y conformidad de pago.
- Mediante Carta N°003-2020DRPM/INSP la Ing. Inspector hace llegar la Valorización de Servicio N°02 – Octubre 2020 incluyendo la Carta N°018-2020-CVCH/LAJS para su revisión y conformidad de pago.
- Mediante Carta N°006-2020DRPM/INSP la Ing. Inspector hace llegar la Valorización de Servicio N°03 – Noviembre 2020 incluyendo la Carta N°020-2020-JCQA/R.C. para su revisión y conformidad de pago.
- Mediante Carta N°008-2020DRPM/INSP la Ing. Inspector hace llegar la Valorización de Servicio N°04 – Diciembre 2020 incluyendo la Carta N°023-2020-JCQA/R.C. para su revisión y conformidad de pago.

5.- DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

- Movilización de Equipos y Maquinaria desde Trujillo a pie de obra y retorno. Se ha trasladado la maquinaria que se describe en el informe del Ing. Inspector.
- Ejecución de partida de Trazo y Replanteo de un tramo de acumulado del 100.00% del metrado de partida.
- Colocación de Material Granular, Emplantillado, Nivelación y Compactado e=15cm en un volumen que representa el 100% del metrado.
- Extracción, selección, carguío y acumulación o apilamiento en zonas estratégicas, de material granular de cantera en el 100% del metrado total.
- En Señalización con la totalidad de Postes Kilométricos, Señales Preventivas, Señales Reglamentarias y Señales Informativas.
- Se ha realizado la Recuperación Ambiental del 100% de áreas ocupadas en los tres Tramos.



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019

E-mail: mpsch@terra.com.pe



- Implementación de protocolos de seguridad y equipamiento con EPPs para todo el personal.

6.-DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICION:

RESUMEN VALORIZACIÓN N° 04 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (Diciembre 2020)

TRAMO I: Huaylaca – Tambillo



VALORIZACIÓN CONTRACTUAL	SIN IGV S/.	0.00	S/. 486,835.48
REINTEGROS (REAJUSTES RECONOCIDOS)	SIN IGV S/.	0.00	S/. 0.00
VALORIZACION BRUTA			S/.486,835.48
AMORTIZACIONES	SIN IGV		S/.0.00 (-)
DEDUCCIONES (DQNC)			S/. 0.00
ADELANTO DIRECTO	S/.	0.00	
ADELANTO PARA MATERIALES	S/.	0.00	
ADELANTO DIRECTO	S/.	0.00	
ADELANTO PARA MATERIALES	S/.	0.00	
VALORIZACION NETA			S/. 486,835.48
I. G. V. 18.00%			S/. 87,630.39
NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA			S/. 574,465.87

SON : QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 87/100 SOLES

RESUMEN VALORIZACIÓN N° 04 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (Diciembre 2020)

TRAMO II: Angasmarca, Cruz de Chuca - Ahijadero

VALORIZACIÓN CONTRACTUAL	SIN IGV S/.	0.00	S/. 173,839.12
REINTEGROS (REAJUSTES RECONOCIDOS)	SIN IGV S/.	0.00	S/. 0.00
VALORIZACION BRUTA			S/.173,839.12
AMORTIZACIONES	SIN IGV		S/.0.00 (-)



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019

E-mail: mpsch@terra.com.pe



DEDUCCIONES (DQNC)	ADELANTO DIRECTO S/. 0.00 ADELANTO PARA MATERIALES S/. 0.00 ADELANTO DIRECTO S/. 0.00 ADELANTO PARA MATERIALES S/. 0.00	S/. 0.00
VALORIZACION NETA		S/. 173,839.12
I. G. V. 18.00%		S/. 31,291.04
NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA		S/. 205,130.16



SON : DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA CON 16/100 SOLES

RESUMEN VALORIZACIÓN N° 04 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (Diciembre 2020)

TRAMO III: Angasmarca – El Ingenio – Cruz Pampa – Catirín

VALORIZACIÓN CONTRACTUAL	SIN IGV S/. 0.00	S/. 47,723.53
REINTEGROS (REAJUSTES RECONOCIDOS)	SIN IGV S/. 0.00	S/. 0.00
VALORIZACION BRUTA		S/. 47,723.53
AMORTIZACIONES	SIN IGV	S/. 0.00 (-)
DEDUCCIONES (DQNC)	ADELANTO DIRECTO S/. 0.00 ADELANTO PARA MATERIALES S/. 0.00 ADELANTO DIRECTO S/. 0.00 ADELANTO PARA MATERIALES S/. 0.00	S/. 0.00
VALORIZACION NETA		S/. 47,723.53
I. G. V. 18.00%		S/. 8,590.23
NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA		S/. 56,313.76

SON : CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE CON 76/100 SOLES



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



TOTAL A CANCELAR POR VALORIZACIÓN DE SERVICIO N°04-DICIEMBRE 2020

VALORIZACIÓN TRAMO I S/. 574,465.87
VALORIZACIÓN TRAMO II S/. 205,130.16
VALORIZACIÓN TRAMO III S/. 56,313.76
TOTAL S/. 835,909.79

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE Y CINCO CON 79/100 SOLES

7- ANALISIS

- Se ha revisado el trámite seguido a los documentos de la referencia generados por el Contratista y el Inspector del Servicio.
- El Informe de Aprobación de la Valorización del Servicio emitido por el Inspector indica que la valorización está de acuerdo con lo ejecutado y cumple con el contenido de documentos e información técnica requerida y necesaria para el cumplimiento de las metas y objetivos del servicio contratado.
- El Ing. Inspector del Servicio, en las conclusiones de su informe, debe ser claro y específico respecto a la aprobación de la Valorización de Servicio correspondiente.
- En el periodo informado, no se han ejecutado trabajos en el Tramo I. No se presenta Valorización.
- El mantenimiento se encuentra en ejecución, con el Tramo III terminado.

8.- RECOMENDACIONES

- Se recomienda al Ing. Residente e Ing Inspector que deben presentar la documentación con el número de ejemplares originales y copias establecidos, contenido en formato digital y con el uso de separadores y la numeración requerida.
- Se recomienda al Ing. Residente e Ing Inspector que deben firmar todos los folios de la Valorización de todos los documentos que se presenten para su trámite. El Representante Legal también debe firmar todos los folios
- Presentar registro fotográfico de la ejecución de las partidas con su respectiva descripción.
- Verificar el cumplimiento de plan de trabajo, especialmente la Adecuación e Implementación de Protocolos ante la Emergencia Sanitaria por el Covid 19.

9.- CONCLUSIÓN

- El Ing. Inspector del Servicio, en su informe, APRUEBA la Valorización de Servicio N°04- Diciembre 2020.
- Luego de su revisión, la Jefatura de la División de Supervisión y Liquidación de Obras de la Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, **OTORGA LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN N°04 – DICIEMBRE 2020** del Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario **TRAMO I: "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES HUAYLACA – TAMBILLO Long. 8.120 Km, DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD", TRAMO II: "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LOS CAMINOS VECINALES ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHUADERO. Long. 5.600Km. DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD", TRAMO III: "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES ANGASMARCA - EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN. Long. 13.030 Km. DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"** y elaborado por el Contratista **CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA** y aprobado por el Inspector de Obra y sugiere su **CANCELACION** en cumplimiento de las cláusulas contractuales.

Es todo cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Germán M. Meléndez Tamayo
CIP. 111401
Jefe División de Supervisión y Liquidaciones
CIP. 111401
Jefe División de Supervisión y Liquidaciones

DAYSY RUTH PIANTO MENDOZA

INGENIERO CIVIL REG. CIP N° 78397

"Año de la universalización de la salud"

CARTA N° 008- 2020 -DRPM/INSP.

SEÑOR : **DR. WILMER FELIPE ANGULO ZAVALA.**
Gerente de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.

ATENCION : **ING. RAFAEL K. VALENCIA REBAZA.**
Gerente de IVP de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

DE : **ING. DAYSY RUTH PIANTO MENDOZA.**
Inspector del Servicio de ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario paquete N° 004



ASUNTO : **ALCANZO VALORIZACION N° 04 DEL CONTRATISTA - MES DE DICIEMBRE 2020 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL PAQUETE N° 004.**

REFERENCIA : **SERVICIOS DE INSPECCION:**

- a) **MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO HUAYLACA – TAMBILLO DEL DISTRITO DE ANGASMARCA PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD (LONG. = 8.120 KM).**
- b) **MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO DEL DISTRITO DE ANGASMARCA PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD (LONG. = 5.600 KM).**
b.1- Carta N° 20 - 2020 – JCQA/RC
- c) **MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN DEL DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD (LONG. = 13.030 KM).**
c.1- Carta N° 20 - 2020 – JCQA/RC

FECHA : Santiago de Chuco, 17 de diciembre del 2020.

Es grato dirigirme a usted en calidad de Inspector del Servicio, con la finalidad de saludarlo cordialmente y a la vez manifestarle con respecto al asunto de la referencia:

1.- INFORMACION GENERAL

EJECUCIÓN DEL SERVICIO

TRAMO 1: **MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO HUAYLACA - TAMBILLO DEL DISTRITO DE ANGASMARCA PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD (LONG.= 8.120 KM).**

Monto del Contrato Mantenimiento Periódico: S/ 574,465.87 inc. el IGV.

TRAMO 2: **MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO DEL DISTRITO DE ANGASMARCA PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD (LONG.= 5.600 KM).**

Monto del Contrato Mantenimiento Periódico: S/ 396,183.36 inc. el IGV.


Daysy Ruth Pianto Mendoza
INGENIERO CIVIL
CIP: 78397

DAYSÍ RUTH PLANTO MENDOZA

INGENIERO CIVIL REG. CIP N° 78397

TRAMO 3: **MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO ANGASMARCA - EL INGENIO – CRUZ PAMPA CATIRIN DEL DISTRITO DE ANGASMARCA PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD (LONG.=13.030 KM).**

Monto del Contrato Mantenimiento Periódico: S/ 921,833.787 inc. el IGV.

2.- INFORMACION ECONOMICA**RESPONSABLE DEL SERVICIO****EJECUTOR:**

Convocatoria del Servicio	:	PES N° 004-2020-MDSCH/CS
Fuente de financiamiento	:	Recursos por Operaciones Oficio de Crédito
Modalidad de Contratación	:	A Suma Alzada
Contrato de Servicio	:	N° 012-2020-MPSCH/LOG
Decreto de Urgencia	:	N° 070-2020
Fecha de Suscripción	:	28/08/2020
Contratista	:	CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA (CORPORACION QUIPUZCOA ARANDA S.A.C. Y ECAN INGENIERIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ECAN INGENIERIA S.R.L.)
Monto Referencial del Servicio	:	S/. 2,280,116.50 inc. el IGV.
Monto del Contrato de Servicio	:	S/. 2,280,100.00 inc. el IGV.
Adelanto Directo	:	No aplica
Fecha Entrega Terreno	:	05-09-2020(Elaboración del Plan de Trabajo)
Plazo de Ejecución	:	120 días calendarios
Fecha de Conformidad de P.T.	:	21-09-2020
Fecha Límite de ejecución	:	31 de Diciembre del 2020
Inicio Plazo de Servicio Contractual	:	22-09-2020
Fecha Término de Servicio Contractual	:	31-12-2020

INSPECCION:

Contrato de Inspección	:	N° 036-2020-MPSCH/LOG
Decreto de Urgencia	:	N° 070-2020
Fecha Contrato Inspección	:	24-08-2020
Plazo Prestación Inspección	:	120 días calendarios


Daysi Ruth Planto Mendoza
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 78397

DAYSY RUTH PLANTO MENDOZA

INGENIERO CIVIL REG. CIP N° 78397

Monto Contrato Inspección : S/. 25,412.50 inc. el IGV

De mi especial consideración:

Por medio del presente tengo a bien dirigirme a Ud., para informarle que el "CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA" presento las siguientes Valorizaciones de los servicios de la referencia correspondiente durante al Mes de Noviembre 2020:

ITEM	SERVICIO	N° VALORIZACION	N° DE CARTA
01	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO HUAYLACA – TAMBILLO DEL DISTRITO DE ANGASMARCA PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD (LONG.= 8.120 KM).	4	Carta N° 23 - 2020 – JCQA/RC
02	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHIJADERO DEL DISTRITO DE ANGASMARCA PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD (LONG.= 5.600 KM).	4	Carta N° 23 - 2020 – JCQA/RC
03	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA – CATIRIN DEL DISTRITO DE ANGASMARCA PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD (LONG.= 13.030 KM).	4	Carta N° 23 - 2020 – JCQA/RC

Luego de proceder con la Inspección In situ de los metrados realmente ejecutados correspondiente al periodo valorizado (01 al 15 de diciembre) se APRUEBAN las valorizaciones presentadas, por lo que a continuación se presentan los metrados realmente ejecutados por cada tramo:




Daysy Ruth Planto Mendoza
INGENIERO CIVIL
CIP: 78397

RESUMEN DE VALORIZACION N° 04
Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 1:SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA - TAMBILLO - LONG.=8.120 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
UBICACIÓN: HUAYLACA - TAMBILLO
MODALIDAD: CONTRATA
RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYS RUTH PIANTO MENDOZA
PPTO CONTRACTUAL: SI 574,465.87 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 28-08-2020
FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-08-2020
FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL S/.	ACUMULADO ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
			COSTO	%	COSTO	%	COSTO	%	COSTO	%
1.00	VALORIZACION (SUB TOTAL SIN/IGV)	486,835.48	0.00	0.00%	486,835.48	100.00%	486,835.48	100.00%	0.00	0.00%
	RUTA 1:SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA - TAMBILLO - LONG.=8.120 Km"	486,835.48	0.00		486,835.48		486,835.48		0.00	
2.00	REAJUSTES NETOS		0.00		0.00		0.00			
	RUTA 1:SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA - TAMBILLO - LONG.=8.120 Km"		0.00		0.00		0.00			
3.00	ADELANTOS (SIN/IGV)	0.00								
	ADELANTO DIRECTO	0.00								
	ADELANTO DE MATERIALES	0.00								
4.00	AMORTIZACIONES	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
	ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
	ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
5.00	GARANTIA	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
	RETENCION DEL 10%	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
6.00	MONTOS APAGAR AL CONTRATISTA	486,835.48	0.00		486,835.48		486,835.48		0.00	
7.00	EN EFECTIVO (VN)	87,630.39	0.00		87,630.39		87,630.39		0.00	
8.00	IGV (18 %)									
	MONTO TOTAL CON I.G.V.	574,465.87	0.00		574,465.87		574,465.87		0.00	
9.00	TOTAL SOLICITADO POR EL CONTRATISTA	574,465.87	0.00		574,465.87		574,465.87		0.00	

DAYSÍ RUTH PLANTO MENDOZA
INGENIERO CIVIL REG. CIP N° 78397

HOJA DE CANCELACION
VALORIZACIÓN N° 04
Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 1: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA - TAMBILLO - LONG.=8.120 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: HUAYLACA - TAMBILLO

MODALIDAD: CONTRATA

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.

RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020

INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSÍ RUTH PLANTO MENDOZA

FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020

PPTO CONTRACTUAL: S/ 574,465.87 (CON IGV)

FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL
VALORIZACION MENSUAL (sin IGV)		S/486,835.48
Valorización de Servicio N° 02: V01 (sin IGV)	S/486,835.48	
Deducción de Reajustes: D		S/0.00
Deducción del Reajuste que No corresponde por Adelanto Directo	S/0.00	
Deducción del Reajuste que No corresponde por Pago a cuenta Materiales N° 01	S/0.00	
VALORIZACION BRUTA: $V_B = V_{01} - D =$		S/486,835.48
Amortización de Adelantos: A		S/0.00
Amortización por Adelanto Directo	S/0.00	
Amortización por Pago a Cuenta Materiales N° 01	S/0.00	
VALORIZACION NETA: $V_N = V_B - A =$		S/486,835.48
COSTO DIRECTO		S/423,335.20
GASTOS GENERALES	10.00%	S/42,333.52
UTILIDAD	5.00%	S/21,166.76
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS: I.G.V.	18.00%	S/87,630.39
MONTO A CANCELAR: $I.G.V. + V_N =$		S/574,465.87

NOTA: RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 10% DE ACUERDO A CONTRATO

A CALCULAR POR LA ENTIDAD

MONTO TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA	S/574,465.87
--	---------------------

SON:

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 87/100 SOLES


Daysi Ruth Planto Mendoza
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 78397

DAYSÍ RUTH PIANTO MENDOZA
INGENIERO CIVIL REG. CIP N° 78397

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 04
Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO - LONG.=5.600 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
UBICACIÓN: ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO
MODALIDAD: CONTRATA
RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSÍ RUTH PIANTO MENDOZA
PPTO CONTRACTUAL: S/ 396,183.36 (CON IG.V)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020
FECHA DE TÉRMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL SI.	ACUMULADO ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
			COSTO	%	COSTO	%	COSTO	%	COSTO	%
1.00	VALORIZACION (SUB TOTAL SIN/IGV)	335,748.61	161,909.49	48.22%	173,839.12	51.78%	335,748.61	100.00%	0.00	0.00%
	RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO - LONG.=5.600 Km"	335,748.61	161,909.49		173,839.12		335,748.61		0.00	
2.00	REAJUSTES NETOS		0.00		0.00		0.00			
	RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO - LONG.=5.600 Km"		0.00		0.00		0.00			
3.00	ADELANTOS (SIN/IGV)	0.00								
	ADELANTO DIRECTO	0.00								
	ADELANTO DE MATERIALES	0.00								
4.00	AMORTIZACIONES	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
	ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
	ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
5.00	GARANTIA	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
	RETENCION DEL 10%	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
6.00	MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA	335,748.61	161,909.49		173,839.12		335,748.61		0.00	
7.00	EN EFECTIVO (VN)	60,434.75	29,143.71		31,291.04		60,434.75		0.00	
8.00	MONTO TOTAL CON I.G.V.	396,183.36	191,053.20		205,130.16		396,183.36		0.00	
9.00	TOTAL SOLICITADO POR EL CONTRATISTA	396,183.36	191,053.20		205,130.16		396,183.36		0.00	

DAYSÍ RUTH PLANTO MENDOZA
INGENIERO CIVIL REG. CIP N° 78397

VALORIZACIÓN N° 04
Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUJADERO - LONG.=5.600 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUJADERO

MODALIDAD: CONTRATA

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.

RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020

INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSÍ RUTH PLANTO MENDOZA

FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020

PPTO CONTRACTUAL: S/ 396,183.36 (CON IGV)

FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL
VALORIZACION MENSUAL (sin IGV)		S/173,839.12
Valorización de Servicio N° 02: V01 (sin IGV)	S/173,839.12	
Deducción de Reajustes: D		S/0.00
Deducción del Reajuste que No corresponde por Adelanto Directo	S/0.00	
Deducción del Reajuste que No corresponde por Pago a cuenta Materiales N° 01	S/0.00	
VALORIZACION BRUTA: $V_B = V_{01} - D =$		S/173,839.12
Amortización de Adelantos: A		S/0.00
Amortización por Adelanto Directo	S/0.00	
Amortización por Pago a Cuenta Materiales N° 01	S/0.00	
VALORIZACION NETA: $V_N = V_B - A =$		S/173,839.12
COSTO DIRECTO		S/151,164.45
GASTOS GENERALES	10.00%	S/15,116.45
UTILIDAD	5.00%	S/7,558.22
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS: I.G.V.	18.00%	S/31,291.04
MONTO A CANCELAR: I.G.V. + $V_N =$		S/205,130.16

NOTA: RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 10% DE ACUERDO A CONTRATO

A CALCULAR POR LA ENTIDAD

MONTO TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA	S/205,130.16
--	---------------------

SON:

DOS CIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA CON 16/100 SOLES



Daysí Ruth Planto Mendoza
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 78397

DAYSÍ RUTH PIANTO MENDOZA
INGENIERO CIVIL REG. CIP N° 78397

RESUMEN DE VALORIZACION N° 04
Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 3: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN - LONG.=13,030 Km

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
UBICACIÓN: ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN
MODALIDAD: CONTRATA
RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSÍ RUTH PIANTO MENDOZA
PPTO CONTRACTUAL: SI/ 921,833.78 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020
FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL SI.	ACUMULADO ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
			COSTO	%	COSTO	%	COSTO	%	COSTO	%
1.00	VALORIZACION (SUB TOTAL SINIGV)	781,215.07	733,491.54	93.89%	47,723.53	6.11%	781,215.07	100.00%	0.00	0.00%
	RUTA 3: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN - LONG.=13,030 Km	781,215.07	733,491.54		47,723.53		781,215.07		0.00	
2.00	REAJUSTES NETOS		0.00		0.00		0.00			
	RUTA 3: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN - LONG.=13,030 Km		0.00		0.00		0.00			
3.00	ADELANTOS (SINIGV)	0.00								
	ADELANTO DIRECTO	0.00								
	ADELANTO DE MATERIALES	0.00								
4.00	AMORTIZACIONES	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
	ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
	ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
5.00	GARANTIA	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
	RETENCION DEL 10%	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
6.00	MONTOS A PAGAR AL CONTRATISTA	781,215.07	733,491.54		47,723.53		781,215.07		0.00	
7.00	EN EFECTIVO (VN)	140,618.71	132,028.48		8,590.23		140,618.71		0.00	
8.00	MONTO TOTAL CON IGV.	921,833.78	865,520.02		56,313.76		921,833.78		0.00	
9.00	TOTAL SOLICITADO POR EL CONTRATISTA	921,833.78	865,520.02		56,313.76		921,833.78		0.00	


Daysi Ruth Pianto Mendoza
INGENIERO CIVIL
CIP: 78397

DAYSÍ RUTH PIANTO MENDOZA

INGENIERO CIVIL REG. CIP N° 78397

HOJA DE CANCELACION

VALORIZACIÓN N° 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 3: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN -
LONG.=13.030 Km

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN

MODALIDAD: CONTRATA

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.

RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020

INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSÍ RUTH PIANTO MENDOZA

FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020

PPTO CONTRACTUAL: S/ 921,833.78 (CON IGV)

FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL
VALORIZACION MENSUAL (sin IGV)		S/47,723.53
Valorización de Servicio N° 02: V01 (sin IGV)	S/47,723.53	
Deducción de Reajustes: D		S/0.00
Deducción del Reajuste que No corresponde por Adelanto Directo	S/0.00	
Deducción del Reajuste que No corresponde por Pago a cuenta Materiales N° 01	S/0.00	
VALORIZACION BRUTA: $V_B = V_{01} - D =$		S/47,723.53
Amortización de Adelantos: A		S/0.00
Amortización por Adelanto Directo	S/0.00	
Amortización por Pago a Cuenta Materiales N° 01	S/0.00	
VALORIZACION NETA: $V_N = V_B - A =$		S/47,723.53
COSTO DIRECTO		S/41,498.72
GASTOS GENERALES	10.00%	S/4,149.88
UTILIDAD	5.00%	S/2,074.93
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS: I.G.V.	18.00%	S/8,590.23
MONTO A CANCELAR: I.G.V. + $V_N =$		S/56,313.76

NOTA: RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 10% DE ACUERDO A CONTRATO

A CALCULAR POR LA ENTIDAD

MONTO TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA

S/56,313.76

SON:

CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE CON 76/100 SOLES

 Daysí Ruth Pianto Mendoza
INGENIERO CIVIL
CIP: 78397

DAYSÍ RUTH PIANTO MENDOZA

INGENIERO CIVIL REG. CIP N° 78397

ITEM	SERVICIO	Monto a Cancelar (Incluido IGV)	% Avance Programado Acumulado	% Avance Ejecutado Acumulado	Estado
1	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO HUAYLACA – TAMBILLO DEL DISTRITO DE ANGASMARCA PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD (LONG.= 8.120 KM).	S/. 574,465.87	100.00%	100.00%	CULMINADA
2	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO DEL DISTRITO DE ANGASMARCA PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD (LONG.= 5.600 KM).	S/. 205,130.16	100.00%	100.00%	CULMINADA

ITEM	SERVICIO	Monto a Cancelar (Incluido IGV)	% Avance Reprogramado Acumulado	% Avance Ejecutado Acumulado	Estado
3	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA CATIRIN DEL DISTRITO DE ANGASMARCA PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD (LONG.=13.030 KM).	S/. 56,313.76	100.00%	100.00%	CULMINADA

POR LO TANTO:

- Corresponde el pago a favor del CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA, correspondiente al Tramo 1: **MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO HUAYLACA - TAMBILLO DEL DISTRITO DE ANGASMARCA PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD (LONG.= 8.120 KM).** La Valorización N° 04 (de 01 al 15 de diciembre) por un monto de S/ 574,465.87 (QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 87/100 SOLES).
- Corresponde el pago a favor del CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA, correspondiente al Tramo 2: **MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO DEL DISTRITO DE ANGASMARCA PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD (LONG.= 5.600 KM).** La Valorización N° 04 (de 01 al 15 de diciembre) por un monto de S/ 205,130.16 (DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA CON 16/100 SOLES).
- Corresponde el pago a favor del CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA, correspondiente al Tramo 3: **MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO ANGASMARCA - EL INGENIO CRUZ PAMPA CATIRIN DEL DISTRITO DE ANGASMARCA PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD (LONG.= 13.030 KM).** La Valorización N° 04 (de 01 al 15 de diciembre) por un monto de S/ 56,313.76 (CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE CON 76/100 SOLES).

Sin otro particular y a la espera de su conformidad a la documentación presentada me despido de Ud.

Atentamente,


 **Daysi Ruth Pianto Mendoza**
INGENIERO CIVIL
CIP: 78397

Ing. DAYSÍ RUTH PIANTO MENDOZA
INSPECTOR DEL SERVICIO

INFORME N° 07 - 2020 – DRPM/INSP (VALORIZACION N° 04)**PERIODO: 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020****1.- DATOS GENERALES:**

Nombre del Servicio:

"RUTA 1: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, HUAYLACA - TAMBILLO LONG. =8.120 KM".

Ubicación Geográfica

Distrito	:	Angasmarcha
Provincia	:	Santiago de Chuco
Región	:	La Libertad

Convocatoria del Servicio	:	PES N° 004-2020-MDSCH/CS
Fuente de financiamiento	:	Recursos por Operaciones Oficio de crédito
Modalidad de Contratación	:	A Suma Alzada
Contrato de Servicio	:	N° 012-2020-MPSCH/LOG
Decreto de Urgencia	:	N° 070-2020
Fecha de Suscripción	:	28/08/2020
Contratista	:	CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA (CORPORACION QUIPUZCOA ARANDA S.A.C. y ECAN INGENIERIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ECAN INGENIERIA S.R.L.)
Monto Referencial del Servicio	:	S/. 2,280,116.50 inc. el IGV.
Monto del Contrato de Servicio	:	S/. 2,280,100.00 inc. el IGV.
Adelanto Directo	:	No aplica
Fecha Entrega Terreno	:	05-09-2020(Elaboración del Plan de Trabajo)
Plazo de Ejecución	:	120 días calendarios
Fecha de Conformidad de P.T.	:	21-09-2020
Fecha de Inicio de Servicio	:	22-09-2020
Fecha Límite de ejecución	:	31 de Diciembre del 2020
Inicio Plazo de Servicio Contractual	:	22-09-2020
Fecha Término de Servicio Contractual	:	31-12-2020
Inspector de Obra	:	Ing. Daysi Ruth Pianto Mendoza Reg. CIP 78397
Residente de Obra	:	Ing. Lourdes Azucena Juárez Suarez Reg. CIP 202858



Daysi Ruth Pianto Mendoza
INGENIERO CIVIL
CIP: 78397

2.- UBICACION GEOGRAFICA:

Coordenadas Geográficas Inicio:

RES-PROC-4-2020-MPSCH/CS-1	HUAYLACA – TAMBILLO LONG 8.120 KM
Norte	: 9106255.63 N
Este	: 822762.99 E
Altitud	: 2920.07 m.s.n.m.

Coordenadas Geográficas Final:

RES-PROC-4-2020-MPSCH/CS-1	HUAYLLACA – TAMBILLO LONG 8.120 KM
Norte	: 9106255.63 N
Este	: 820262.79 E
Altitud	: 3591.41 m.s.n.m.

Ubicación Política:

Departamento	: La Libertad
Provincia	: Santiago de Chuco
Distrito	: Angasmarcha
Localidades	: Huayllaca, Tambillo
Zona	: Sierra
Región natural	: Quechua
Longitud	: 8.120 Km
Código de Ruta	: LI-941
Inicio	: Huayllaca
Fin	: Tambillo

3.- ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO:

Situación del Servicio: "RUTA 1: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, HUAYLACA - TAMBILLO LONG. =8.120 KM", se tiene un avance físico ejecutado para el mes de diciembre al 100.00% lo que se concluye que el servicio esta culminado para el mes de diciembre.

Avance ejecutado acumulado mes anterior	: 0.00 %
Avance ejecutado del 01/12/20 al 15/12/20	: 100.00 %
Avance acumulado total	: 100.00 %
Avance Programado del mes	: 100.00 %
Avance Acumulado Programado	: 100.00 %



4.- MONTO FINANCIERO RUTA 1: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, HUAYLACA – TAMBILLO LONG. =8.120 KM".

El monto Financiero Ruta 1 : **S/ 574,465.87**

COSTO DIRECTO		S/.	423,335.20
GASTOS GENERALES	(10%)	S/.	42,333.52
UTILIDADES	(5%)	S/.	21,166.76
SUB TOTAL		S/.	486,835.48
IGV	(18%)	S/.	87,630.39
VALOR REFERENCIAL		S/.	574,465.87

Son: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 87/100 SOLES.

5.- DESCRIPCION DEL SERVICIO:

- Se realizará el Trazo y replanteo de la Ruta 1, para definir la zona a pavimentar con una longitud de 8.120 km y ancho de superficie 4.00 m.
- Desmovilización de los equipos y maquinarias, mantenimiento del tránsito y seguridad vial, flete y roce y limpieza de vegetación.
- Se realizará la pavimentación que comprende el perfilado y compactado de la subrasante, conformación del material de afirmado base, cumpliendo con las normas de bombeo, peraltes y grado de compactación, así como también las actividades de extracción, zarandeo y transporte del material de afirmado de la cantera.
- Se establece actividades de priorización, estas consideraciones debido a la superficie de rodadura que se presenta en los caminos vecinales:
 - ✓ Cambiar la superficie de rodadura de terreno natural con material seleccionado de cantera de espesor e=15 cm y algunos casos adecuar la subrasante a la sinuosidad de la superficie de la vía existente con una capa nivelante con material de préstamo de espesor e=5cm.
- Transporte de material de afirmado desde las canteras identificadas hacia las diferentes progresivas de la vía, para la conformación de la base de la vía. Así también el transporte del material excedente hacia los botaderos identificados.
- Para las obras de arte y drenaje; comprende el mantenimiento el perfilado y reconfiguración de cunetas de tierra, para el control de agua de precipitación que cae sobre la plataforma de la vía. En cuanto a obras de arte existentes (alcantarillas, badenes y pontones) se realizará el mantenimiento para su conservación y la limpieza para su descolmatación.



Daysi Ruth Planto Mendoza
INGENIERO CIVIL
CIP: 78397

DAYSY RUTH PLANTO MENDOZA

INGENIERO CIVIL REG. CIP N° 78397

Para las actividades previstas para el drenaje longitudinal, se realizarán mantenimiento y limpieza para garantizar el adecuado drenaje de las aguas superficiales de escorrentía evitando daños en la vía.

- En cuanto a la señalización; Se considera la colocación de los Postes kilométricos que serán prefabricados de concreto $F'c=175 \text{ kg/cm}^2$ y para el anclaje del poste se empleará concreto ciclópico $F'c=140 \text{ kg/cm}^2 + 30\%$ de P.M. Y se colocarán las señales preventivas, reglamentarias e Informativas respetándose las normas de señalización y seguridad vial.

- En Impacto Ambiental, actividades necesarias para la mitigación de posibles impactos ambientales negativos, así como cualquier afectación en las zonas de las canteras de material de afirmado que pudieran generarse durante la ejecución del proyecto.

- Emergencia sanitaria; Se han adoptado lineamientos que se tienen que cumplir dentro de un Plan con todas las medidas para contrastar y contener la propagación del COVID-19 en la obra, regulando todas las medidas de seguridad que deben adoptar los trabajadores y que se integran con todas las medidas e indicaciones ya presentes en el Plan de seguridad y salud de la obra.

6.- METAS FÍSICAS:

La meta física que se logrará con la ejecución de la obra:

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO BASE
01.00.	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	GLB	1.00
01.02.	TOPOGRAFIA , TRAZO Y REPLANTEO	KM	8.12
02.00.	PAVIMENTOS		
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	M3	1,729.81
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA ESTABILIZAR E=0.15M	M3	4,411.18
03.00.	TRANSPORTE		
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	M3	7,369.18
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	M3	37,582.83
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	M3	406.00
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	M3	4,669.00
04.00.	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE		
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ML	8,120.00
05.00.	SEÑALIZACION		
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	UND	8.00
05.02.	SEÑALES PREVENTIVAS	UND	10.00
05.03.	SEÑALES REGLAMENTARIAS	UND	6.00
05.04.	SEÑALES INFORMATIVAS	UND	4.00
06.00.	IMPACTO AMBIENTAL		
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	HA	0.65
07.00.	EMERGENCIA SANITARIA		
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	GLB	1.00

DAYSY RUTH PLANTO MENDOZA

INGENIERO CIVIL REG. CIP N° 78397

7.- ASPECTO TECNICO:

Se viene ejecutando las partidas de acuerdo al Plan de Trabajo, se detalla la planilla de Metrados que se han ejecutado hasta la actualidad:

VALORIZACION DE OBRA N°04

HOJA DE METRADOS

Del 01/12/2020 al 15/12/2020

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO	% AVANCE
			BASE	
01.00.	OBRAS PRELIMINARES			
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	100.00%
01.02.	TOPOGRAFIA, TRAZO Y REPALNTEO	KM	8.12	100.00%
02.00	PAVIMENTOS			
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05M	M3	1,729.81	100.00%
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA ESTABILIZAR E= 0.15M	M3	4,411.18	100.00%
03.00	TRANSPORTE			
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	M3	7,369.18	100.00%
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	M3	37,582.83	100.00%
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	M3	406.00	100.00%
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	M3	4,669.00	100.00%
04.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE			
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ML	8,120.00	100.00%
05.00	SEÑALIZACION			
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	UND	8.00	100.00%
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	UND	10.00	100.00%
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	UND	6.00	100.00%
05.04	SEÑALES INFORMATIVAS	UND	4.00	100.00%
06.00	IMPACTO AMBIENTAL			
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	HA	0.65	100.00%
07.00	EMERGENCIA SANITARIA			
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	GLB	1.00	100.00%

b.- Se viene realizando el Análisis de Valorización Mensual N° 04 de las partidas de acuerdo a lo ejecutando para el periodo 01/12/2020 al 15/12/2020 y se detalla lo siguiente:



Daysy Ruth Planto Mendoza
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 78397

VALORIZACION N° 04 – MES DICIEMBRE (01/12/20 AL 15/12/20)

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	PRESUPUESTO BASE		ANTERIOR			AVANCE			ACUMULADO			SALDOS	
			P.U.	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL
			(S/.)	(S/.)											
1	TRABAJOS PRELIMINARES														
1.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	glb	S/	6,622.99	S/	6,622.99	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	6,622.99	100.00%	1.00	6,622.99
1.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	S/	246.28	S/	1,999.79	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.12	1,999.79	100.00%	8.12	1,999.79
2	PAVIMENTOS														
2.01	CAPA INELANTE E=0.05 M	m3	S/	31.79	S/	43,992.27	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,393.84	43,992.27	100.00%	1,393.84	43,992.27
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M	m3	S/	53.84	S/	187,244.75	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3,477.80	187,244.75	100.00%	3,477.80	187,244.75
3	TRANSPORTES														
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	S/	9.67	S/	56,414.49	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5,833.97	56,414.49	100.00%	5,833.97	56,414.49
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM	m3k	S/	1.69	S/	50,283.03	0.00%	0.00	0.00	0.00%	29,753.27	50,283.03	100.00%	29,753.27	50,283.03
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM	m3k	S/	7.85	S/	2,549.68	0.00%	0.00	0.00	0.00%	324.80	2,549.68	100.00%	324.80	2,549.68
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	S/	1.89	S/	6,312.49	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3,735.20	6,312.49	100.00%	3,735.20	6,312.49
4	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE														
4.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	S/	0.60	S/	4,872.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8,120.00	4,872.00	100.00%	8,120.00	4,872.00
5	SEÑALIZACION														
5.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	S/	181.98	S/	1,455.84	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	1,455.84	100.00%	8.00	1,455.84
5.02	SENALES PREVENTIVAS	und	S/	780.46	S/	7,804.60	0.00%	0.00	0.00	0.00%	10.00	7,804.60	100.00%	10.00	7,804.60
5.03	SENALES REGLAMENTARIAS	und	S/	719.42	S/	4,316.52	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6.00	4,316.52	100.00%	6.00	4,316.52
5.04	SENALES INFORMATIVAS	und	S/	528.68	S/	2,106.72	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	2,106.72	100.00%	4.00	2,106.72
6	IMPACTO AMBIENTAL														
6.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	S/	1,343.56	S/	873.31	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.65	873.31	100.00%	0.65	873.31
7	EMERGENCIA SANITARIA														
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	S/	46,486.72	S/	46,486.72	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	46,486.72	100.00%	1.00	46,486.72
COSTO DIRECTO						423,335.20						423,335.20	100.00%		
GASTOS GENERALES						42,333.52						42,333.52			
UTILIDAD						21,166.76						21,166.76			
SUB TOTAL						486,835.48						486,835.48			
IGV						87,630.39						87,630.39			
COSTO TOTAL						574,465.87						574,465.87			

8.- INFORMACION TECNICA:

Longitud	:	8.120 Km.
Superficie de Rodadura	:	Afirmado.
Ancho de Superficie	:	4.00 m.
Altura Promedio	:	3255.740 m.s.n.m.
Radio Minimo en CH	:	15.00 m.
Radio Curvas de Volteo	:	10.00 m.
Peralte Máximo	:	12.00%
Bombeo	:	2.00%
Pendiente Máxima	:	15.30%
Pendiente Mínima	:	0.20%
Espesor de Afirmado	:	0.15 m.
Velocidad Directriz	:	25 km/h.
Perfilado de Cunetas	:	Terreno natural
Hitos Kilométricos	:	08 unidades

9.- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA:**PARTIDAS CONTRACTUALES: FASE II****MANTENIMIENTO PERIÓDICO:****9.1.- TRABAJOS PRELIMINARES:** Se trabajó según metrados ejecutados.

- ✓ MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO: Se valorizo un metrado de 1.00 glb. **(100.00% - S/. 6,622.99)**
- ✓ TRAZO Y REPLANTEO: Se valorizo un metrado de 8.12 km. **(100.00% - S/. 1,999.79)**

9.2.- PAVIMENTOS: Se trabajó según metrados ejecutados.

- ✓ CAPA NIVELANTE E=0.05M: Se valorizo un metrado De 1,383.84 m3 **(100.00% - S/. 43,992.27)**.
- ✓ MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M: Se valorizo un metrado de 3,477.80m3 **(100.00% - S/. 187,244.75)**.

9.3.- TRANSPORTES: Se trabajó según metrados ejecutados.

- ✓ TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1KM: Se valorizo un metrado de 5,833.97 M3K **(100.00% - S/. 56,414.49)**.
- ✓ TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR >1 KM: Se valorizo un metrado de 29,753.27 M3K. **(100.00% - S/. 50,283.03)**.
- ✓ TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM: Se valorizo un metrado de 324.80 M3K **(100.00% - S/. 2,549.68)**.
- ✓ TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE >1 KM: Se valorizo un metrado de 3,735.20 M3K. **(100.00% - S/. 6,312.49)**.

9.4.- OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

- ✓ RECONFORMACION DE CUNETAS: Se valorizo un metrado de 8,120 ml **(100.00% - S/. 4,872.00)**.

9.5.- SEÑALIZACION

Daysy Ruth Planto Mendoza
INGENIERO CIVIL
CIP: 78397

- ✓ INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS: Se valorizo un metrado de 8.00 und (100.00% - S/. 1,455.84).
- ✓ SEÑALES PREVENTIVAS: Se valorizo un metrado de 10.00 und (100.00% - S/. 7,804.60).
- ✓ SEÑALES REGLAMENTARIAS: Se valorizo un metrado de 6.00 und (100.00% - S/. 4,316.52).
- ✓ SEÑALES INFORMATIVAS: Se valorizo un metrado de 4.00 und (100.00% - S/. 2,106.72).

9.6.- IMPACTO AMBIENTAL

- ✓ RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS: Se valorizo un metrado de 0.65 ha (100.00% - S/. 873.31).

9.7.- EMERGENCIA SANITARIA: Se trabajó según metrados ejecutados.

- ✓ EMERGENCIA SANITARIA COVID 19: Se valorizo un metrado de 1.00 glb (100.00% - S/. 46,486.72).

10.- CALIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS EN OBRA:

- Se contó con la maquinaria siguiente: 01 Rodillo Liso, 05 volquetes de 15 m3, 01 Motoniveladora, 01 Retroexcavadora, 01 cisterna de agua y 01 Excavadora sobre oruga para el presente mes de diciembre encontrándose operativa.

11.- SEGURIDAD EN OBRA:

En seguridad de la obra, se cumple con las siguientes medidas de seguridad:

- ✓ Cascos de seguridad para todo el personal, incluyendo Residente de Obra y personal administrativo.
- ✓ En este mes de diciembre del presente año, los trabajadores lograron diferenciar los actos y condiciones inseguras que se presentan en los trabajos que realizan a diario, producto de las charlas de seguridad.
- ✓ Se realizo diferentes señalizaciones de prevención, informativas y reglamentarias requeridas por las distintas actividades en obra con el fin de evitar cualquier daño que pudiera afectar al personal que labora en obra.
- ✓ Los trabajadores conocen los peligros a los que se encuentran expuestos y sus riesgos asociados.
- ✓ Se cumplió con verificar el uso de Equipos de Protección Personal.
- ✓ Se cumplió con verificar que las herramientas y equipos usados estén en buenas condiciones.
- ✓ Para el cierre de este mes se procedió a limpiar y ordenar las diferentes áreas donde se viene realizando las tareas de ejecución de obra.
- ✓ Se implementaron los lineamientos de bioseguridad sanitaria por la actual pandemia, a fin de prevenir posibles contagios por la COVID-19.

12.- CONCLUSIONES:

- ✓ Se determino mediante ensayos de laboratorio las propiedades físicas y mecánicas del suelo, tales como: Granulometría, límites de plasticidad, limite líquido, humedad natural, equivalente de arena, abrasión de ángeles, Proctor modificado, California Bearin Ratio (CBR) y contenido de sales solubles totales. Realizado a la cantera a utilizar para este mantenimiento de camino vecinal.
- ✓ Se realizaron Ensayos de Densidades de Campo cada 50m.
- ✓ Al 15 de diciembre del 2020, el servicio de mantenimiento tiene un avance ejecutado mensual del 100.00% y con un acumulado ejecutado del 100.00%, lo que se concluye que el servicio esta culminado.

13.- ASPECTO ADMINISTRATIVO:

- ✓ Se trabajó de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado.
- ✓ El Ingeniero Residente del Servicio junto con su personal técnico ha elevado su informe a esta Inspectora del Servicio, sobre los documentos a presentar que se viene realizando a la fecha.
- ✓ Se ha verificado la documentación que se debe presentar en la **Valorización N°4.**

Es cuanto Informo a Ud.


 **Daysy Ruth Pianto Mendoza**
INGENIERO CIVIL
CIP: 78397

Ing. DAYSY RUTH PIANTO MENDOZA
INSPECTORA DE SERVICIO

INFORME N° 08 - 2020 – DRPM/INSP (VALORIZACION N° 04)

PERIODO: 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

1.- DATOS GENERALES:

Nombre del Servicio:

"RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO - LONG. =5.600 KM".

Ubicación Geográfica

Distrito : Angasmarca
Provincia : Santiago de Chuco
Región : La Libertad

Convocatoria del Servicio	:	PES N° 004-2020-MDSCH/CS
Fuente de financiamiento	:	Recursos por Operaciones Oficio de crédito
Modalidad de Contratación	:	A Suma Alzada
Contrato de Servicio	:	N° 012-2020-MPSCH/LOG
Decreto de Urgencia	:	N° 070-2020
Fecha de Suscripción	:	28/08/2020
Contratista	:	CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA (CORPORACION QUIPUZCOA ARANDA S.A.C. y ECAN INGENIERIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ECAN INGENIERIA S.R.L.)
Monto Referencial del Servicio	:	S/. 2,280,116.50 inc. el IGV.
Monto del Contrato de Servicio	:	S/. 2,280,100.00 inc. el IGV.
Adelanto Directo	:	No aplica
Fecha Entrega Terreno	:	05-09-2020(Elaboración del Plan de Trabajo)
Plazo de Ejecución	:	120 días calendarios
Fecha de Conformidad de P.T.	:	21-09-2020
Fecha de Inicio de Servicio	:	22-09-2020
Plazo ejecución del Servicio	:	120 días calendarios
Fecha Límite de ejecución	:	31 de Diciembre del 2020
Inspector de Obra	:	Ing. Daysi Ruth Pianto Mendoza Reg. CIP 78397
Residente de Obra	:	Ing. Lourdes Azucena Juárez Suarez Reg. CIP 202858

4.- MONTO FINANCIERO RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHIJADERO - LONG. =5.600 KM".

El monto Financiero Ruta 2 : **S/ 396,183.36**

COSTO DIRECTO		S/.	291,955.31
GASTOS GENERALES	(10%)	S/.	29,195.53
UTILIDADES	(5%)	S/.	14,597.77
SUB TOTAL		S/.	335,748.61
IGV	(18%)	S/.	60,434.75
VALOR REFERENCIAL		S/.	396,183.36

Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 36/100 SOLES.

5.- DESCRIPCION DEL SERVICIO:

- Se realizará el Trazo y replanteo de la Ruta 1, para definir la zona a pavimentar con una longitud de 5.600 km y ancho de superficie 4.00 m.
- Desmovilización de los equipos y maquinarias, mantenimiento del tránsito y seguridad vial, flete y roce y limpieza de vegetación.
- Se realizará la pavimentación que comprende el perfilado y compactado de la subrasante, conformación del material de afirmado base, cumpliendo con las normas de bombeo, peraltes y grado de compactación, así como también las actividades de extracción, zarandeo y transporte del material de afirmado de la cantera.
- Se establece actividades de priorización, estas consideraciones debido a la superficie de rodadura que se presenta en los caminos vecinales:
 - ✓ Cambiar la superficie de rodadura de terreno natural con material seleccionado de cantera de espesor e=15 cm y algunos casos adecuar la subrasante a la sinuosidad de la superficie de la vía existente con una capa nivelante con material de préstamo de espesor e=5cm.
- Transporte de material de afirmado desde las canteras identificadas hacia las diferentes progresivas de la vía, para la conformación de la base de la vía. Así también el transporte del material excedente hacia los botaderos identificados.
- Para las obras de arte y drenaje; comprende el mantenimiento el perfilado y reconfiguración de cunetas de tierra, para el control de agua de precipitación que cae sobre la plataforma de la vía. En cuanto a obras de arte existentes (alcantarillas, badenes y pontones) se realizará el mantenimiento para su conservación y la limpieza para su descolmatación.
- Para las actividades previstas para el drenaje longitudinal, se realizaran mantenimiento y limpieza para garantizar el adecuado drenaje de las agua superficiales de escorrentía evitando daños en la vía.



Daysy Ruth Planto Mendoza
INGENIERO CIVIL
CIP: 78397

DAYSÍ RUTH PIANTO MENDOZA

INGENIERO CIVIL REG. CIP N° 78397

- En cuanto a la señalización; Se considera la colocación de los Postes kilométricos que serán prefabricados de concreto $F'c=175 \text{ kg/cm}^2$ y para el anclaje del poste se empleara concreto ciclópeo $F'c=140 \text{ kg/cm}^2 + 30\%$ de P.M. Y se colocaran las señales preventivas, reglamentarias e Informativas respetándose las normas de señalización y seguridad vial.

- En Impacto Ambiental, actividades necesarias para la mitigación de posibles impactos ambientales negativos, así como cualquier afectación en las zonas de las canteras de material de afirmado que pudieran generarse durante la ejecución del proyecto.

- Emergencia sanitaria; Se han adoptado lineamientos que se tienen que cumplir dentro de un Plan con todas las medidas para contrarstar y contener la propagación del COVID-19 en la obra, regulando todas las medidas de seguridad que deben adoptar los trabajadores y que se integran con todas las medidas e indicaciones ya presentes en el Plan de seguridad y salud de la obra.

6.- METAS FISICAS:

La meta física que se lograra con la ejecución de la obra:

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO BASE
01.00.	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	GLB	1.00
01.02.	TOPOGRAFIA , TRAZO Y REPLANTEO	KM	5.60
02.00.	PAVIMENTOS		
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	M3	1,253.91
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA ESTABILIZAR E=0.15M	M3	2,744.42
03.00.	TRANSPORTE		
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	M3	4,798.00
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	M3	4,469.80
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	M3	280.00
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	M3	3,220.00
04.00.	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE		
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ML	5,600.00
05.00.	SEÑALIZACION		
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	UND	5.00
05.02.	SEÑALES PREVENTIVAS	UND	10.00
05.03.	SEÑALES REGLAMENTARIAS	UND	4.00
05.04.	SEÑALES INFORMATIVAS	UND	2.00
06.00.	IMPACTO AMBIENTAL		
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	HA	0.45
07.00.	EMERGENCIA SANITARIA		
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	GLB	1.00

VALORIZACION N° 04 -- MES DICIEMBRE (01/12/20 AL 15/12/20)

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRESUPUESTO BASE		ANTERIOR		AVANCE		ACUMULADO		SALDOS	
				P.U.	PARCIAL								
				(S/.)	(S/.)	METRADO	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	METRADO	PARCIAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES				4,887.30		3,433.24		1,754.06		4,887.30		0.00
1.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	glb	1.00	S/ 3,508.13	S/ 3,508.13	0.50	1,754.07	50.00%	1,754.06	1.00	3,508.13	100.00%	0.00
1.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	5.60	S/ 246.28	S/ 1,379.17	5.60	1,379.17	100.00%	0.00	5.60	1,379.17	100.00%	0.00
2	PAVIMENTOS				155,978.82		89,692.55		66,386.27		155,978.82		0.00
2.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	1,003.13	S/ 31.83	S/ 31,929.63	570.00	18,143.10	56.82%	13,786.53	1,003.13	31,929.63	100.00%	0.00
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M	m3	2,270.30	S/ 54.64	S/ 124,049.19	1,307.64	71,449.45	57.60%	52,598.74	2,270.30	124,049.19	100.00%	0.00
3	TRANSPORTES				77,963.19		27,988.14		49,965.05		77,963.19		0.00
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	3,928.12	S/ 9.67	S/ 37,984.92	2,014.00	19,475.38	51.27%	1,914.12	3,928.12	37,984.92	100.00%	0.00
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM	m3k	20,033.39	S/ 1.69	S/ 33,856.43	3,965.78	6,752.97	19.95%	27,103.56	20,033.39	33,856.43	100.00%	0.00
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM	m3k	224.00	S/ 7.85	S/ 1,758.40	114.85	901.57	51.27%	856.83	224.00	1,758.40	100.00%	0.00
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	2,576.00	S/ 1.69	S/ 4,353.44	513.80	868.32	19.95%	3,485.12	2,576.00	4,353.44	100.00%	0.00
4	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				3,472.00		1,880.00		1,612.00		3,472.00		0.00
4.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	5,600.00	S/ 0.62	S/ 3,472.00	3,000.00	1,880.00	53.57%	1,612.00	5,600.00	3,472.00	100.00%	0.00
5	SEÑALIZACION				12,646.54		0.00		12,646.54		12,646.54		0.00
5.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	5.00	S/ 181.98	S/ 909.90	0.00	0.00	0.00%	909.90	5.00	909.90	100.00%	0.00
5.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	10.00	S/ 780.46	S/ 7,804.60	0.00	0.00	0.00%	7,804.60	10.00	7,804.60	100.00%	0.00
5.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	4.00	S/ 719.42	S/ 2,877.68	0.00	0.00	0.00%	2,877.68	4.00	2,877.68	100.00%	0.00
5.04	SEÑALES INFORMATIVAS	und	2.00	S/ 526.68	S/ 1,053.36	0.00	0.00	0.00%	1,053.36	2.00	1,053.36	100.00%	0.00
6	IMPACTO AMBIENTAL				604.60		0.00		604.60		604.60		0.00
6.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0.45	S/ 1,343.56	S/ 604.60	0.00	0.00	0.00%	604.60	0.45	604.60	100.00%	0.00
7	EMERGENCIA SANITARIA				36,413.86		18,206.93		18,206.93		36,413.86		0.00
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	S/ 36,413.86	S/ 36,413.86	0.50	18,206.93	50.00%	18,206.93	1.00	36,413.86	100.00%	0.00
COSTO DIRECTO													
GASTOS GENERALES													
UTILIDAD													
SUB TOTAL													
IGV													
COSTO TOTAL													
		10.00%			291,955.31		140,790.86	48.22%	161,164.45		291,955.31	100.00%	0.00
		5.00%			29,195.53		14,079.09		15,116.44		29,195.53		0.00
					14,597.77		7,039.54		7,558.23		14,597.77		0.00
					336,748.61		161,909.49		173,839.12		336,748.61		0.00
		18.00%			60,434.75		29,143.71		31,291.04		60,434.75		0.00
					396,183.36		191,053.20		205,130.16		396,183.36		0.00

8.- INFORMACION TECNICA:

Longitud	:	5.600 Km.
Superficie de Rodadura	:	Afirmado.
Ancho de Superficie	:	4.00 m.
Altura Promedio	:	2926.00 m.s.n.m.
Radio Minimo en CH	:	15.00 m.
Radio Curvas de Volteo	:	10.00 m.
Peralte Máximo	:	12.00%
Bombeo	:	2.00%
Pendiente Máxima	:	15.30%
Pendiente Mínima	:	0.20%
Espesor de Afirmado	:	0.15 m.
Velocidad Directriz	:	25 km/h.
Perfilado de Cunetas	:	Terreno natural
Hitos Kilométricos	:	05 unidades

9.- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA:

PARTIDAS CONTRACTUALES: FASE II

I.-MANTENIMIENTO PERIÓDICO:

9.1.- TRABAJOS PRELIMINARES: Se trabajó según metrados ejecutados.

- ✓ MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO: Se valorizo un metrado de 0.50 glb. **(50.00% - S/. 1,754.06)**

9.2.- PAVIMENTOS: Se trabajó según metrados ejecutados.

- ✓ CAPA NIVELANTE E=0.05M: Se valorizo un metrado de 433.13 m3 **(43.18% - S/. 13,786.53).**
- ✓ MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M: Se valorizo un metrado de 962.66 m3 **(42.40% - S/. 52,599.74).**

9.3.- TRANSPORTES: Se trabajó según metrados ejecutados.

- ✓ TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1KM: Se valorizo un metrado de 1,914.12 M3K **(48.73% - S/. 18,509.54).**
- ✓ TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR >1 KM: Se valorizo un metrado de 16,037.61 M3K. **(80.05% - S/. 27,103.56).**
- ✓ TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM: Se valorizo un metrado de 109.15 M3K **(48.73% - S/. 856.83).**
- ✓ TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE >1 KM: Se valorizo un metrado de 2,062.2 M3K. **(80.05% - S/. 3,485.12).**

9.4.- OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

- ✓ RECONFORMACION DE CUNETAS: Se valorizo un metrado 2,600 ml **(46.43% - S/. 1,612.00).**

9.5.- SEÑALIZACION

- ✓ INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS: Se valorizo un metrado de 5.00 und **(100.00% - S/. 909.90).**
- ✓ SEÑALES PREVENTIVAS: Se valorizo un metrado de 10.00 und **(100.00% - S/. 7,804.60).**
- ✓ SEÑALES REGLAMENTARIAS: Se valorizo un metrado de 4.00 und **(100.00% - S/. 2,877.68).**
- ✓ SEÑALES INFORMATIVAS: Se valorizo un metrado de 2.00 und **(100.00% - S/. 1,053.36).**

9.6.- IMPACTO AMBIENTAL

- ✓ RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS: Se valorizo un metrado de 0.45 ha **(100.00% - S/. 604.60).**

9.7.- EMERGENCIA SANITARIA: Se trabajó según metrados ejecutados.

- ✓ EMERGENCIA SANITARIA COVID 19: Se valorizo un metrado de 0.50 glb **(50.00% - S/. 18,206.93).**

10.- CALIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS EN OBRA:

- Se contó con la maquinaria siguiente: 01 Rodillo Liso, 05 volquetes de 15 m3, 01 Motoniveladora, 01 Retroexcavadora, 01 cisterna de agua y 01 Excavadora sobre oruga para el presente mes de Noviembre encontrándose operativa.

11.- SEGURIDAD EN OBRA:

En seguridad de la obra, se cumple con las siguientes medidas de seguridad:

- ✓ Cascos de seguridad para todo el personal, incluyendo Residente de Obra y personal administrativo.
- ✓ En este mes de noviembre del presente año, los trabajadores lograron diferenciar los actos y condiciones inseguras que se presentan en los trabajos que realizan a diario, producto de las charlas de seguridad.
- ✓ Se realizo diferentes señalizaciones de prevención, informativas y reglamentarias requeridas por las distintas actividades en obra con el fin de evitar cualquier daño que pudiera afectar al personal que labora en obra.
- ✓ Los trabajadores conocen los peligros a los que se encuentran expuestos y sus riesgos asociados.
- ✓ Se cumplió con verificar el uso de Equipos de Protección Personal.
- ✓ Se cumplió con verificar que las herramientas y equipos usados estén en buenas condiciones.
- ✓ Para el cierre de este mes se procedió a limpiar y ordenar las diferentes áreas donde se viene realizando las tareas de ejecución de obra.

DAYSY RUTH PLANTO MENDOZA

INGENIERO CIVIL REG. CIP N° 78397

- ✓ Se implementaron los lineamientos de bioseguridad sanitaria por la actual pandemia, a fin de prevenir posibles contagios por la COVID-19.

12.- CONCLUSIONES:

- ✓ Se determino mediante ensayos de laboratorio las propiedades físicas y mecánicas del suelo, tales como: Granulometría, límites de plasticidad, límite líquido, humedad natural, equivalente de arena, abrasión de ángeles, Proctor modificado, California Bearin Ratio (CBR) y contenido de sales solubles totales. Realizado a la cantera a utilizar para este mantenimiento de camino vecinal.
- ✓ Se realizaron Ensayos de Densidades de Campo cada 50m.
- ✓ Al 15 de diciembre del 2020, el servicio de mantenimiento tiene un avance ejecutado mensual del 51.78% y con un acumulado ejecutado del 100.00%, frente a un avance mensual programado de 67.40% y un acumulado programado del 100.00%. Encontrándose el servicio Culminada al 100.00%.

13.- ASPECTO ADMINISTRATIVO:

- ✓ Se trabajó de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado.
- ✓ El Ingeniero Residente del Servicio junto con su personal técnico ha elevado su informe a esta Inspectora del Servicio, sobre los documentos a presentar que se viene realizando a la fecha.
- ✓ Se ha verificado la documentación que se debe presentar en la **Valorización N° 04.**

Es cuanto Informo a Ud.



Daysy Ruth Planto Mendoza
INGENIERO CIVIL
CIP: 78397

Ing. DAYSY RUTH PLANTO MENDOZA
INSPECTORA DE SERVICIO

INFORME N° 09 - 2020 – DRPM/INSP

PERIODO: 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

1.- DATOS GENERALES:

Nombre del Servicio:

"RUTA 3: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, ANGASMARCA - EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN - LONG. =13.030 KM".

Ubicación Geográfica

Distrito	:	Angasmarca
Provincia	:	Santiago de Chuco
Región	:	La Libertad

Convocatoria del Servicio	:	PES N° 004-2020-MDSCH/CS
Fuente de financiamiento	:	Recursos por Operaciones Oficio de crédito
Modalidad de Contratación	:	A Suma Alzada
Contrato de Servicio	:	N° 012-2020-MPSCH/LOG
Decreto de Urgencia	:	N° 070-2020
Fecha de Suscripción	:	28/08/2020
Contratista	:	CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA (CORPORACION QUIPUZCOA ARANDA S.A.C. y ECAN INGENIERIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ECAN INGENIERIA S.R.L.)
Monto Referencial del Servicio	:	S/. 2,280,116.50 inc. el IGV.
Monto del Contrato de Servicio	:	S/. 2,280,100.00 inc. el IGV.
Adelanto Directo	:	No aplica
Fecha Entrega Terreno	:	05-09-2020(Elaboración del Plan de Trabajo)
Plazo de Ejecución	:	120 días calendarios
Fecha de Conformidad de P.T.	:	21-09-2020
Fecha de Inicio de Servicio	:	22-09-2020
Plazo ejecución del Servicio	:	120 días calendarios
Fecha Límite de ejecución	:	31 de Diciembre del 2020
Inspector de Obra	:	Ing. Daysi Ruth Pianto Mendoza Reg. CIP 78397
Residente de Obra	:	Ing. Lourdes Azucena Juárez Suarez Reg. CIP 202858



Daysi Ruth Pianto Mendoza
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 78397

DAYSÍ RUTH PLANTO MENDOZA

INGENIERO CIVIL REG. CIP N° 78397

2.- UBICACION GEOGRAFICA:

Coordenadas Geográficas Inicial:

RES-PROC-4-2020-MPSCH/CS-1	ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN LONG 13.030 KM
Norte	: 9099730 N
Este	: 824514 E
Altitud	: 3300 m.s.n.m.

Coordenadas Geográficas Final:

RES-PROC-4-2020-MPSCH/CS-1	ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN LONG 13.030 KM
Norte	: 9096654 N
Este	: 819814 E
Altitud	: 3300 m.s.n.m.

Ubicación Política:

Departamento	: La Libertad
Provincia	: Santiago de Chuco
Distrito	: Angasmarca
Localidades	: Angasmarca, El Ingenio, Cruz Pampa, Catirin
Zona	: Sierra
Región natural	: Quechua
Longitud	: 13.030 Km
Código de Ruta	: R131026
Inicio	: Angasmarca
Fin	: Catirin

3.- ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO:

Situación del Servicio: "RUTA 3: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, ANGASMARCA - EL INGENIO – CRUZ PAMPA - CATIRIN - LONG. =13.030 KM", se tiene un avance ejecutado para el mes de diciembre del 6.11% siendo un avance acumulado ejecutado del 100.00%.

Avance ejecutado acumulado mes anterior	: 93.89 %
Avance ejecutado del 01/12/20 al 15/12/20	: 6.11 %
Avance Acumulado Total ejecutado	: 100.00 %
Avance Programado del mes	: 6.71 %
Avance Acumulado Programado	: 100.00 %



DAYSÍ RUTH PIANTO MENDOZA

INGENIERO CIVIL REG. CIP N° 78397

4.- MONTO FINANCIERO RUTA 3: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN - LONG. =13.030 KM”.El monto Financiero Ruta 3 : **S/ 921,833.78**

COSTO DIRECTO		SI.	679,317.45
GASTOS GENERALES	(10%)	SI.	67,931.75
UTILIDADES	(5%)	SI.	33,965.87
SUB TOTAL		SI.	781,215.07
IGV	(18%)	SI.	140,618.71
VALOR REFERENCIAL		SI.	921,833.78

Son: NOVECIENTOS VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 78/100 SOLES.

5.- DESCRIPCION DEL SERVICIO:

- Se realizará el Trazo y replanteo de la Ruta 3, para definir la zona a pavimentar con una longitud de 13.030 km y ancho de superficie 4.00 m.
 - Desmovilización de los equipos y maquinarias, mantenimiento del tránsito y seguridad vial, flete y roce y limpieza de vegetación.
 - Se realizará la pavimentación que comprende el perfilado y compactado de la subrasante, conformación del material de afirmado base, cumpliendo con las normas de bombeo, peraltes y grado de compactación, así como también las actividades de extracción, zarandeo y transporte del material de afirmado de la cantera.
 - Se establece actividades de priorización, estas consideraciones debido a la superficie de rodadura que se presenta en los caminos vecinales:
 - ✓ Cambiar la superficie de rodadura de terreno natural con material seleccionado de cantera de espesor e=15 cm y algunos casos adecuar la subrasante a la sinuosidad de la superficie de la vía existente con una capa nivelante con material de préstamo de espesor e=5cm.
 - Transporte de material de afirmado desde las canteras identificadas hacia las diferentes progresivas de la vía, para la conformación de la base de la vía. Así también el transporte del material excedente hacia los botaderos identificados.
 - Para las obras de arte y drenaje; comprende el mantenimiento el perfilado y reconfiguración de cunetas de tierra, para el control de agua de precipitación que cae sobre la plataforma de la vía. En cuanto a obras de arte existentes (alcantarillas, badenes y pontones) se realizará el mantenimiento para su conservación y la limpieza para su descolmatación.
- Para las actividades previstas para el drenaje longitudinal, se realizarán mantenimiento y limpieza para garantizar el adecuado drenaje de las agua superficiales de escorrentía evitando daños en la vía.



Daysi Ruth Pianto Mendoza
INGENIERO CIVIL
CIP: 78397

DAYSÍ RUTH PIANTO MENDOZA

INGENIERO CIVIL REG. CIP N° 78397

- En cuanto a la señalización; Se considera la colocación de los Postes kilométricos que serán prefabricados de concreto $F'c=175 \text{ kg/cm}^2$ y para el anclaje del poste se empleara concreto ciclópeo $F'c=140 \text{ kg/cm}^2 + 30\%$ de P.M. Y se colocaran las señales preventivas, reglamentarias e Informativas respetándose las normas de señalización y seguridad vial.

- En Impacto Ambiental, actividades necesarias para la mitigación de posibles impactos ambientales negativos, así como cualquier afectación en las zonas de las canteras de material de afirmado que pudieran generarse durante la ejecución del proyecto.

- Emergencia sanitaria; Se han adoptado lineamientos que se tienen que cumplir dentro de un Plan con todas las medidas para contrarrestar y contener la propagación del COVID-19 en la obra, regulando todas las medidas de seguridad que deben adoptar los trabajadores y que se integran con todas las medidas e indicaciones ya presentes en el Plan de seguridad y salud de la obra.

6.- METAS FISICAS:

La meta física que se lograra con la ejecución de la obra:

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO BASE
01.00.	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	GLB	1.00
01.02.	TOPOGRAFIA , TRAZO Y REPLANTEO	KM	13.03
02.00.	PAVIMENTOS		
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	M3	2,275.91
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA ESTABILIZAR E=0.15M	M3	5,786.42
03.00.	TRANSPORTE		
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	M3k	9,674.79
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	M3K	49,341.44
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	M3K	521.20
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	M3K	5,993.80
04.00.	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE		
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ML	13,030.00
05.00.	SEÑALIZACION		
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	UND	13.00
05.02.	SEÑALES PREVENTIVAS	UND	40.00
05.03.	SEÑALES REGLAMENTARIAS	UND	8.00
05.04.	SEÑALES INFORMATIVAS	UND	4.00
06.00.	IMPACTO AMBIENTAL		
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	HA	1.05
07.00.	EMERGENCIA SANITARIA		
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	GLB	1.00

7.- ASPECTO TECNICO:

- a.- Se viene ejecutando las partidas de acuerdo al Plan de Trabajo, se detalla la planilla de Metrados que se han ejecutado hasta la actualidad:

CONTROL DE METRADOS DEL SERVICIO N°04				
Del 01/12/2020 al 15/12/2020				
PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO	% AVANCE
			BASE	
01.00.	OBRAS PRELIMINARES			
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	100.00%
01.02.	TOPOGRAFIA, TRAZO Y REPALNTEO	KM	13.03	100.00%
02.00	PAVIMENTOS			
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05M	M3	2,275.91	100.00%
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA ESTABILIZAR E= 0.15M	M3	5,786.42	100.00%
03.00	TRANSPORTE			
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	M3K	9,674.79	100.00%
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	M3K	49,341.44	100.00%
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	M3K	521.20	100.00%
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	M3K	5,993.80	100.00%
04.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE			
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ML	13,030.00	100.00%
05.00	SEÑALIZACION			
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	UND	13.00	100.00%
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	UND	40.00	100.00%
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	UND	8.00	100.00%
05.04	SEÑALES INFORMATIVAS	UND	4.00	100.00%
06.00	IMPACTO AMBIENTAL			
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	HA	1.05	100.00%
07.00	EMERGENCIA SANITARIA			
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	GLB	1.00	100.00%

- b.- Se viene realizando el Análisis de Valorización Mensual N° 04 de las partidas de acuerdo a lo ejecutando para el periodo 01/12/2020 al 15/12/2020 y se detalla lo siguiente:



Daysy Ruth Planto Mendoza
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 78397

VALORIZACION N° 04 – MES DICIEMBRE (01/12/20 AL 15/12/20)

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	PRESUPUESTO BASE		ANTERIOR				AVANCE				SALDOS			
			P.U.	PARCIAL	METRADO	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%
			(S/.)	(S/.)												
1	TRABAJOS PRELIMINARES			11,407.36			11,407.36									
1.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	gib	S/ 8,198.32	S/ 8,198.32	1.00	1.00	8,198.32	100.00%	-	-	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	S/ 246.26	S/ 3,209.03	13.03	13.03	3,209.03	100.00%	-	-	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
2	PAVIMENTOS			388,612.21			388,612.21									
2.01	CAPA INVIOLANTE E=0.05 M	m3	S/ 31.83	S/ 72,442.22	2,275.91	2,275.91	72,442.22	100.00%	-	-	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M	m3	S/ 54.64	S/ 316,169.99	5,786.42	5,786.42	316,169.99	100.00%	-	-	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
3	TRANSPORTES			202,436.18			202,436.18									
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	S/ 10.07	S/ 97,425.14	9,674.79	9,674.79	97,425.14	100.00%	-	-	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM	m3k	S/ 1.82	S/ 89,801.42	49,341.44	49,341.44	89,801.42	100.00%	-	-	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM	m3k	S/ 8.25	S/ 4,299.90	521.20	4,299.90	521.20	100.00%	-	-	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	S/ 1.82	S/ 10,908.72	5,993.80	10,908.72	5,993.80	100.00%	-	-	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
4	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE			8,078.60			8,078.60									
4.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	S/ 0.62	S/ 8,078.60	13,030.00	8,078.60	8,078.60	100.00%	-	-	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
5	SEÑALIZACION			41,498.72			41,498.72									
5.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	S/ 182.72	S/ 2,375.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	13.00	2,375.36	100.00%	13.00	2,375.36	0.00	0.00	0.00%
5.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	S/ 781.37	S/ 31,254.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	40.00	31,254.80	100.00%	40.00	31,254.80	0.00	0.00	0.00%
5.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	S/ 720.23	S/ 5,761.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	8.00	5,761.84	100.00%	8.00	5,761.84	0.00	0.00	0.00%
5.04	SEÑALES INFORMATIVAS	und	S/ 526.68	S/ 2,106.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	4.00	2,106.72	100.00%	4.00	2,106.72	0.00	0.00	0.00%
6	IMPACTO AMBIENTAL			1,410.74			1,410.74									
6.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	S/ 1,343.56	S/ 1,410.74	1.05	1,410.74	1,410.74	100.00%	-	-	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
7	EMERGENCIA SANITARIA			26,874.66			26,874.66									
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gib	S/ 25,874.65	S/ 25,874.65	1.00	25,874.65	25,874.65	100.00%	-	-	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
COSTO DIRECTO																
	GASTOS GENERALES	10.00%		679,317.46			637,818.73	93.89%			6.11%		41,498.72		679,317.46	0.00
	UTILIDAD	5.00%		67,931.75			63,781.87						4,149.88		67,931.75	0.00
	SUB TOTAL			33,965.87			31,890.94						2,074.93		33,965.87	0.00
	IGV			781,216.07			733,491.64						47,723.63		781,216.07	0.00
	COSTO TOTAL	18.00%		140,618.71			132,028.48						8,590.23		140,618.71	0.00
				921,833.78			866,520.02						55,313.76		921,833.78	0.00

DAYSÍ RUTH PIANTO MENDOZA

INGENIERO CIVIL REG. CIP N° 78397

8.- INFORMACION TECNICA:

Longitud	:	13.030 Km.
Superficie de Rodadura	:	Afirmado.
Ancho de Superficie	:	4.00 m.
Altura Promedio	:	3300 m.s.n.m.
Radio Minimo en CH	:	15.00 m.
Radio Curvas de Volteo	:	10.00 m.
Peralte Máximo	:	12.00%
Bombeo	:	2.00%
Pendiente Máxima	:	15.30%
Pendiente Mínima	:	0.20%
Espesor de Afirmado	:	0.15 m.
Velocidad Directriz	:	25 km/h.
Perfilado de Cunetas	:	Terreno natural
Hitos Kilométricos	:	14 unidades

9.- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA:**PARTIDAS CONTRACTUALES: FASE II****9.5.- SEÑALIZACION**

- ✓ INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS: Se valorizo un metrado de 13.00 und (**100.00% - S/. 2,375.36**).
- ✓ SEÑALES PREVENTIVAS: Se valorizo un metrado de 40.00 und (**100.00% - S/. 31,254.80**).
- ✓ SEÑALES REGLAMENTARIAS: Se valorizo un metrado de 8.00 und (**100.00% - S/. 5,761.84**).
- ✓ SEÑALES INFORMATIVAS: Se valorizo un metrado de 4.00 und (**100.00% - S/. 2,106.72**).

10.- SEGURIDAD EN OBRA:

En seguridad de la obra, se cumple con las siguientes medidas de seguridad:

- ✓ Cascos de seguridad para todo el personal, incluyendo Residente de Obra y personal administrativo.
- ✓ En este mes de noviembre del presente año, los trabajadores lograron diferenciar los actos y condiciones inseguras que se presentan en los trabajos que realizan a diario, producto de las charlas de seguridad.
- ✓ Se realizo diferentes señalizaciones de prevención, informativas y reglamentarias requeridas por las distintas actividades en obra con el fin de evitar cualquier daño que pudiera afectar al personal que labora en obra.
- ✓ Los trabajadores conocen los peligros a los que se encuentran expuestos y sus riesgos asociados.
- ✓ Se cumplió con verificar el uso de Equipos de Protección Personal.
- ✓ Se cumplió con verificar que las herramientas y equipos usados estén en buenas condiciones.



Daysi Ruth Pianto Mendoza
INGENIERO CIVIL
CIP: 78397

- ✓ Para el cierre de este mes se procedió a limpiar y ordenar las diferentes áreas donde se viene realizando las tareas de ejecución de obra.
- ✓ Se implementaron los lineamientos de bioseguridad sanitaria por la actual pandemia, a fin de prevenir posibles contagios por la COVID-19.

12.- CONCLUSIONES:

- ✓ Se determino mediante ensayos de laboratorio las propiedades físicas y mecánicas del suelo, tales como: Granulometría, límites de plasticidad, límite líquido, humedad natural, equivalente de arena, abrasión de ángeles, Proctor modificado, California Bearin Ratio (CBR) y contenido de sales solubles totales. Realizado a la cantera a utilizar para este mantenimiento de camino vecinal.
- ✓ Se realizaron Ensayos de Densidades de Campo cada 50m.
- ✓ Al 15 de diciembre del 2020, el servicio de mantenimiento tiene un avance ejecutado mensual del 6.11% y con un acumulado ejecutado del 100.00%, lo que se concluye que el servicio esta culminado al 100.00%.

13.- ASPECTO ADMINISTRATIVO:

- ✓ Se trabajó de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado.
- ✓ El Ingeniero Residente del Servicio junto con su personal técnico ha elevado su informe a esta Inspectora del Servicio, sobre los documentos a presentar que se viene realizando a la fecha.
- ✓ Se ha verificado la documentación que se debe presentar en la **Valorización N° 04.**

Es cuanto Informo a Ud.


 **Daysy Ruth Pianto Mendoza**
INGENIERO CIVIL
CIP: 78397

Ing. DAYSY RUTH PIANTO MENDOZA
INSPECTORA DE SERVICIO



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

"Año de la Universalización de la Salud"

000416

CARTA N° 23-2020-JCQA/ R.C

A : ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA
INSPECTORA

DE : Sr. JULIO CESAR QUIPUZCOA ARANDA
REPRESENTANTE DEL CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

ASUNTO : PRESENTO VALORIZACIÓN N°04

REFERENCIA : EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES
TRAMOS: "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO LONG = 5.600 KM" -
"HUAYLACA - TAMBILLO - LONG. = 8.120 Km" - DISTRITO DE ANGASMARCA -
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

FECHA : Santiago de Chuco, 15 de diciembre del 2020

Por medio del presente tengo a bien dirigirme a Ud. para saludarlo y a la vez aprovecho la oportunidad para presentarle La valorización n°04 del servicio de la referencia, para que pueda ser revisado.

Sin otro particular me suscribo, esperando la atención a la presente.

Atentamente:

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
[Firma]
Julio Cesar Quipuzcoa Aranda
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN

Adjunto:

- Valorización n°04

Recibido 16/12/20
[Firma]
Daisy Ruth Pianto Mendoza
INGENIERO CIVIL
CIP: 76357



000415

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Carta N° 026-2020-CVCCH/LAJS-R.S

Sr.: SR. JULIO CESAR QUIPUZCOA QUEZADA
REPRESENTANTE DEL CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

Att. ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
RESIDENTE DEL SERVICIO

Asunto: INFORME MENSUAL N° 04

Referencia: SERVICIO: EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LOS CAMINOS
VECINALES TRAMOS "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO LONG = 5.600
KM" - "HUAYLACA - TAMBILLO - LONG.=8.120 Km" - DISTRITO DE ANGASMARCA -
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

Fecha: Angasmarca, 15 de diciembre del 2020


De mi especial consideración:

Saludo atentamente y al mismo tiempo cumplo con hacer entrega del informe mensual N° 04, correspondiente al periodo del 01 al 15 de Diciembre del 2020, en donde describe todas las actividades realizadas a la vez informando que ha tenido el avance físico del servicio en los tramos: RUTA N° 01 "Huaylaca - Tambillo - Long. = 8.120 km" y RUTA N° 02 "Angasmarca - Cruz de Chuca - Ahijadero Long = 5.600 km"

Se les presenta los documentos correspondientes para los trámites pertinentes, se recomienda se dé trámite para su revisión, conformidad y/o aprobación correspondiente para que continúe su respectivo tramite, salvo mejor parecer.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para testimoniarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima.

Atte.


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio Cesar Quipuzcoa Aranda
DNI N° 19631091
REPRESENTANTE COMUN

R: 15/12/2020
H: 2:10pm



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO

SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



SERVICIO: EJECUCION DEL ITEM PAQUETE DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES
TRAMO: "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8.120 KM", - "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO LONG = 5.600 KM" - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG = 13.030 KM" - DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.



UBICACIÓN:

REGION : LA LIBERTAD
 PROVINCIA : SANTIAGO DE CHUCO
 DISTRITO : ANGASMARCA
 CASERIOS : Huaylaca - Tambillo
 Angasmarca - Cruz de Chuca - Ahijadero
 Angasmaraca - El ingenio - Cruz pampa - Catirin

Daysi Ruth Pianto Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP N° 78397

Lourdes Azucena Juárez Suárez
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 202858

INFORME MENSUAL N° 04

DICIEMBRE - 2020

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
 Julio César Quiroz Aranda
 DNI N° 10531091
 REPRESENTANTE COMUN

EJECUTA: CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
 RESIDENTE : ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
 INSPECTOR : ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA


INFORME MENSUAL N° 04




000413

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

INDICE


CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Quirozco Aranda
DNI N° 18631091
REPRESENTANTE COMUN


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858


 Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397




CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

INDICE

- ❖ CARTA DE LA EMPRESA DIRIGIDA AL INSPECTOR.
- ❖ FICHA TÉCNICA.
- ❖ FACTURA DEL CONTRATISTA.
- ❖ INFORME DE RESIDENTE.
- ❖ RESUMEN DE VALORIZACIÓN MENSUAL.
- ❖ CONTROL DE METRADOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS.
- ❖ SUSTENTO DE METRADOS.
- ❖ ANÁLISIS DE VALORIZACIÓN MENSUAL.
- ❖ AMORTIZACIÓN DE SER EL CASO.
- ❖ HOJA DE CANCELACIÓN.
- ❖ CUADRO COMPARATIVO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO – EJECUTADO -PAGADO.
- ❖ CUADRO DE BARRAS Y CURVA S.
- ❖ CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO.
- ❖ PROGRAMACIÓN DE OBRA PERT-CPM Y GANT
- ❖ PANEL FOTOGRÁFICO.
- ❖ ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
- ❖ ACTA DE INICIO DE SERVICIO.
- ❖ COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO Y/O EMPRESA.
- ❖ COPIA DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE SERVICIO.
- ❖ CUADERNO DE OCURRENCIAS.
- ❖ COPIAS DE CERTIFICADO DE HABILIDAD DE EQUIPO TÉCNICO.
- ❖ ANEXOS:
 - COPIA DE CARTA DE RETENCIÓN DEL 10%.
 - COPIA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
 - INFORME MENSUAL DE ING. DE SEGURIDAD.
 - REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES.
 - PLANTILLA ELECTRÓNICA.
 - SEGUROS SCTR.
 - INFORME TOPOGRAFICO
 - INFORME DE SUELOS.
 - INFORME DE MECÁNICA DE SUELOS (CANTERAS).
 - PRUEBAS DE LABORATORIO.
 - INFORME DE SEÑALIZACIÓN
 - INFORME DE DRENAJE
 - INFORME DE PAVIMENTOS
 - INFORME DE ZONAS CRÍTICAS.
 - ACTAS (DE SER EL CASO).
 - PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19.


 Daysi Ruth Pianto Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP N° 78397


 Lourdes Azucena Juárez Suárez
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

 Julio César Quirozco Aranda
 DWT N° 15531091
 REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

FICHA TÉCNICA


Daysi Ruth Panto Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP N° 78397


Lourdes Azucena Juárez Suárez
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 202858


CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Quirozcos Aranda
 DNI N° 19631081
 REPRESENTANTE COMUN

EJECUCION DEL ITEM PAQUETE DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES
 TRAMO: "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8.120 KM", - "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUJADERO LONG = 5.600 KM" - "ANGASMARCA - EL INGENIO -
 CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG = 13.030 KM" - DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

FICHA TECNICA

I.- GENERALIDADES

Nombre del Proyecto

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO:
 "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8.120 KM", - "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA -
 AHIJADERO LONG = 5.600 KM" - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN
 LONG = 13.030 KM" - DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO -
 LA LIBERTAD.

Ubicación

: HUAYLACA - TAMBILLO
 ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO
 ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN

II.- DATOS GENERALES


1. Sistema de Contratación	: SUMA ALZADA	
2. Contrato de Servicio	: Procedimiento Especial de Selección N° 004-2020-MPSCH/CS.	
3. Modalidad	: CONTRATA	
4. Contratista	: CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA	
5. Monto Referencial (con IGV)	: S/. 1,892,483.01	
6. Monto Contratado (con IGV)	: S/. 1,892,483.01	
7. Factor de Relación	: 1.00000	
8. Plazo de Ejecución	: 120	(Días Calendarios)
9. Monto Adelanto Directo (con IGV)	: S/. 0.00	
10. Fecha entrega adelanto directo	:	
11. Monto adelanto materiales (con IGV)	: S/. 0.00	
12. Fecha entrega adelanto materiales	:	
13. Fecha entrega de terreno	: 29-ago.-20	
14. Fecha contractual inicio de servicio	: 22-sep.-20	
15. Fecha contractual termino de servicio	: 31-dic.-20	
16. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento		
Entidad Financiera	:	
Vigencia hasta	:	


III.- EQUIPO TECNICO

INGENIERO RESIDENTE

: Ing. Lourdes Azucena Juárez Suarez
 CIP N° 202858


 Daysi Ruth Planto Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP N° 78397


 Lourdes Azucena Juárez Suarez
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 202858


 CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
 Julio César Quirozosa Aranda
 DNI N° 19821091
 REPRESENTANTE COMUN

FICHA TECNICA

I.- GENERALIDADES

Nombre del Proyecto : RUTA 1:SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA – TAMBILLO - LONG.=8.120 Km"

Ubicación : HUAYLACA – TAMBILLO

II.- DATOS GENERALES

1. Sistema de Contratación	: SUMA ALZADA	
2. Contrato de Servicio	: Procedimiento Especial de Selección N° 004-2020-MPSCH/CS.	
3. Modalidad	: CONTRATA	
4. Contratista	: CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA	
5. Monto Referencial (con IGV)	: S/. 692,128.00	
6. Monto Contratado (con IGV)	: S/. 692,128.00	
7. Factor de Relación	: 1.00000	
8. Plazo de Ejecución	: 120	(Días Calendarios)
9. Monto Adelanto Directo (con IGV)	: S/. 0.00	
10. Fecha entrega adelanto directo	:	
11. Monto adelanto materiales (con IGV)	: S/. 0.00	
12. Fecha entrega adelanto materiales	:	
13. Fecha entrega de terreno	: 29-ago.-20	
14. Fecha contractual inicio de servicio	: 22-sep.-20	
15. Fecha contractual termino de servicio	: 31-dic.-20	
16. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento		
Entidad Financiera	:	
Vigencia hasta	:	

III.- EQUIPO TECNICO

INGENIERO RESIDENTE : Ing. Lourdes Azucena Juarez Suarez
CIP N° 202858


Daysi Ruth Pinto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

Julio César Qupuzcoa Aranda
DNI N° 19821051
REPRESENTANTE COMUN

FICHA TECNICA

I.- GENERALIDADES

Nombre del Proyecto

RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO - LONG.=5.600
Km"

Ubicación

ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO

II.- DATOS GENERALES

- | | | |
|---|---|--------------------|
| 1. Sistema de Contratación | : SUMA ALZADA | |
| 2. Contrato de Servicio | : Procedimiento Especial de Selección N° 004-2020-MPSCH/CS. | |
| 3. Modalidad | : CONTRATA | |
| 4. Contratista | : CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA | |
| 5. Monto Referencial (con IGV) | : S/. 396,183.36 | |
| 6. Monto Contratado (con IGV) | : S/. 396,183.36 | |
| 7. Factor de Relación | : 1.00000 | |
| 8. Plazo de Ejecución | : 120 | (Días Calendarios) |
| 9. Monto Adelanto Directo (con IGV) | : S/. 0.00 | |
| 10. Fecha entrega adelanto directo | : | |
| 11. Monto adelanto materiales (con IGV) | : S/. 0.00 | |
| 12. Fecha entrega adelanto materiales | : | |
| 13. Fecha entrega de terreno | : 29-ago.-20 | |
| 14. Fecha contractual inicio de servicio | : 22-sep.-20 | |
| 15. Fecha contractual termino de servicio | : 31-dic.-20 | |
| 16. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento | | |
| Entidad Financiera | : | |
| Vigencia hasta | : | |

III.- EQUIPO TECNICO

INGENIERO RESIDENTE

: Ing. Lourdes Azucena Juarez Suarez
CIP N° 202858



Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 75397

Lourdes Azucena Juarez Suarez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio Cesar Quiroz Aranda
DNI N° 10631091
REPRESENTANTE COMUN

FICHA TECNICA

I.- GENERALIDADES

Nombre del Proyecto : RUTA 3: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN - LONG.=13.030 Km

Ubicación : ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN

II.- DATOS GENERALES

1. Sistema de Contratación	: SUMA ALZADA	
2. Contrato de Servicio	: Procedimiento Especial de Selección N° 004-2020-MPSCH/CS.	
3. Modalidad	: CONTRATA	
4. Contratista	: CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA	
5. Monto Referencial (con IGV)	: S/. 1,110,643.00	
6. Monto Contratado (con IGV)	: S/. 1,110,643.00	
7. Factor de Relación	: 1.00000	
8. Plazo de Ejecución	: 120	(Días Calendarios)
9. Monto Adelanto Directo (con IGV)	: S/. 0.00	
10. Fecha entrega adelanto directo	:	
11. Monto adelanto materiales (con IGV)	: S/. 0.00	
12. Fecha entrega adelanto materiales	:	
13. Fecha entrega de terreno	: 29-ago.-20	
14. Fecha contractual inicio de servicio	: 22-sep.-20	
15. Fecha contractual termino de servicio	: 31-dic.-20	
16. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento		
Entidad Financiera	:	
Vigencia hasta	:	

III.- EQUIPO TECNICO

INGENIERO RESIDENTE : Ing. Lourdes Azucena Juarez Suarez
CIP N° 202858

Lourdes Azucena Juarez Suarez
Lourdes Azucena Juarez Suarez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio Cesar Quimbucua Aranda
Julio Cesar Quimbucua Aranda
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN

Daysi Ruth Pinto Mendoza
Daysi Ruth Pinto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

FACTURA DEL CONTRATISTA

PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020



Daysi Ruth Panto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Quirozco Aranda
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN

EJECUCION DEL ITEM PAQUETE DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES
TRAMO: "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8.120 KM", - "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO LONG = 5.600 KM" - "ANGASMARCA - EL INGENIO -
CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG = 13.030 KM" - DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

FACTORA



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

INFORME DEL INGENIERO RESIDENTE PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

[Signature]
Eduardo Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

[Signature]
Daysi Ruth Panto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
[Signature]
Julio César Quiroz Aranda
DNI N° 19621091
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

INFORME MENSUAL DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO

Periodo: del 01 al 15 de Diciembre del 2020

SERVICIO:

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL LOS CAMINOS VECINALES DE LOS TRAMOS:
"ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO LONG = 5.600 KM" - "HUAYLACA – TAMBILLO
LONG= 8.120 KM" - "ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN - LONG.=13.030
Km" - DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

1. DATOS GENERALES

1.1. ANTECEDENTES

1.1.1. NUMERO CONCURSO

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 004-2020-MPSCH/CS – SEGUNDA
CONVOCATORIA

1.1.2. DENOMINACION Y NÚMERO DE CONTRATO

Denominación:

Contrato del Servicio: EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL LOS
CAMINOS VECINALES DE LOS TRAMOS: "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA -
AHIJADERO LONG = 5.600 KM" - "HUAYLACA – TAMBILLO LONG= 8.120 KM" -
"ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN - LONG.=13.030 Km" -
DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.
CONTRATO DE SERVICIO N° 012-2020-MPSCH-LOG.

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio Cesar Quirozco Aranda
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN

1.1.3. FINANCIAMIENTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

1.1.4. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo a las Bases del
Concurso.

1.1.5. MONTO DEL VALOR REFERENCIAL

S/. 574,465.87 Soles. – HUAYLACA – TAMBILLO LONG= 8.120 KM

S/. 396,183.36 Soles - ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO LONG = 5.600 KM

S/. 921,833.79 Soles. – ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN - LONG.=13.030 Km

1.1.6. MONTO CONTRATADO

S/. 574,465.87 Soles. – HUAYLACA – TAMBILLO LONG= 8.120 KM

Daisy Ruth Panto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

EJECUCION DEL ITEM PAQUETE DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES
TRAMO: "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8.120 KM", - "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO LONG = 5.600 KM" - "ANGASMARCA - EL INGENIO -
CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG = 13.030 KM" - DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

S/. 396,183.36 Soles - ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO LONG = 5.600 KM

S/. 921,833.79 Soles. - ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN - LONG.=13.030 Km

1.1.7. FACTOR DE RELACION

F.R. = 1.00

1.1.8.FECHA DE INICIO DEL SERVICIO

22 de Setiembre del 2020

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio Cesar Quirozco Aranda
DNI N° 18531091
REPRESENTANTE COMUN

1.2. UBICACIÓN:

Distrito	:	Angasmarca
Provincia	:	Santiago de Chuco
Región	:	La Libertad

1.3. ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

1.4. CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

1.5. RESIDENTE DE OBRA:

ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
CIP N° 202858

Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

1.6. INSPECTOR DE OBRA:

ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA
CIP N° 78397

1.7. PERIODO DEL INFORME:

El periodo del presente Informe Mensual corresponde al periodo de trabajo entre el 01 al 15 de Diciembre del 2020.



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

1.8. DESCRIPCION DE LA OBRA:

De acuerdo al presupuesto de la obra, la ejecución del mantenimiento periódico comprende las siguientes partidas realizadas durante el mes de Diciembre:

RUTA 1: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA – TAMBILLO - LONG.=8.120 KM"

1	TRABAJOS PRELIMINARES
1.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
1.02	TRAZO Y REPLANTEO
2	PAVIMENTOS
2.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M
3	TRANSPORTES
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM
4	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
4.01	RECONFORMACION DE CUNETAS
5	SEÑALIZACION
5.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS
5.02	SEÑALES PREVENTIVAS
5.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS
5.04	SEÑALES INFORMATIVAS
6	IMPACTO AMBIENTAL
6.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS
7	EMERGENCIA SANITARIA
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

 Julio Cesar Cuzco Aranda
 DNI N° 19531091
 REPRESENTANTE COMUN

Lourdes Azucena Juarez Suarez
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 202858

Daysi Ruth Ciano Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP N° 78397

RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHIJADERO - LONG. = 5.600 KM"

1	TRABAJOS PRELIMINARES
1.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
2	PAVIMENTOS
2.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M
3	TRANSPORTES
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM
4	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
4.01	RECONFORMACION DE CUNETAS

EJECUCION DEL ITEM PAQUETE DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES
 TRAMO: "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8.120 KM", - "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO LONG = 5.600 KM" - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG = 13.030 KM" - DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

5	SEÑALIZACION
5.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS
5.02	SEÑALES PREVENTIVAS
5.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS
5.04	SEÑALES INFORMATIVAS
6	IMPACTO AMBIENTAL
6.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS
7	EMERGENCIA SANITARIA
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

RUTA 3: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN - LONG.=13.030 KM

1	TRABAJOS PRELIMINARES	CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
1.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	Julio César Capuzcoa Aranda
1.02	TRAZO Y REPLANTEO	DNI N° 18531021 REPRESENTANTE COMUN
2	PAVIMENTOS	
2.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M	
3	TRANSPORTES	
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM	
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM	
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	
4	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	
4.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	
5	SEÑALIZACION	
5.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	Lourdes Azucena Juárez Suárez
5.02	SEÑALES PREVENTIVAS	ING. CIVIL
5.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	R. CIP. N° 202858
5.04	SEÑALES INFORMATIVAS	
6	IMPACTO AMBIENTAL	
6.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	
7	EMERGENCIA SANITARIA	
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	Daysi Ruth Piarito Mendoza ING. CIVIL CIP N° 78397

1.9. OCURRENCIAS Y CONSULTAS.

El servicio se viene ejecutando de acuerdo al cronograma con la fecha de inicio del servicio, verificándose que el ritmo de avance, el servicio se encuentra culminado al 100%.

2.0 NORMAS APLICABLES

El Servicio de mantenimiento periódico y rutinario deberá tener en cuenta **OBLIGATORIAMENTE** la versión vigente de la siguiente normativa:



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

1. TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demás normas modificatorias.
2. Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivación económica y atención de la población a través de la inversión pública y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida por el COVID-19.
3. Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudación de las actividades: "Mantenimientos, Mejoramiento y Conservación Rutinarios y Periódicos de Vías Nacionales, Departamentales y Locales"
4. Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19".
5. Resolución Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ámbito del sector Transportes y Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo Sanitario Sectorial para la ejecución de los trabajos de conservación vial en prevención del COVID-19.
6. Resolución Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones técnicas generales para construcción EG-2013.
7. Resolución Directoral N° 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras – Conservación vial.
8. Resolución Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versión a marzo 2014 del Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservación Vial.
9. Resolución Directoral N° 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vías de suelos, geología, geotecnia y pavimentos – Sección Suelos y Pavimentos.
10. Resolución Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial, aprobado por Resolución Directoral N° 008-2014-MTC/14, el documento denominado "Parte IV del Manual de Carreteras de Mantenimiento de Conservación Vial".
11. Resolución Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo de Materiales.
12. Resolución Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial.

El servicio tendrá en cuenta las actualizaciones o modificaciones que se hagan a la normatividad indicada.


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202358


CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Tapuzcoa Aranda
DNI N° 18531091
REPRESENTANTE COMUN




Daysi Ruth Pizarro Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

3.0 UBICACIÓN DEL CAMINO VECINAL

ruta 1: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA – TAMBILLO - LONG.=8.120 Km"



Ubicación Geográfica:

RUTA 1	PROGRESIVA	COORDENADAS		ALTITUD
		NORTE	ESTE	m.s.n.m
HUAYLACA	0+000 KM	9102480	822763	3300
TAMBILLO	8+120 KM	9106256	820263	3300

Fuente: TDR-004-2020


Ubicación Política:

Departamento : La Libertad
 Provincia : Santiago de Chuco
 Distrito : Angasmarca
 Localidades : Huaylaca, Tambillo
 Zona : Sierra
 Región natural : Quechua
 Longitud : 8.120 Km
 Código de Ruta : LI-941
 Inicio : Huaylaca
 Fin : Tambillo



Daysi Ruth Panto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397


 Lourdes Azucena Juárez Suárez
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 202658


 CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
 Julio Cesar Chupuzcoa Aranda
 DNI N° 19531091
 REPRESENTANTE COMUN

EJECUCION DEL ITEM PAQUETE DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES
 TRAMO: "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8.120 KM", - "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO LONG = 5.600 KM" - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG = 13.030 KM" - DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.



000397

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHIJADERO - LONG.=5.600 Km"



Ubicación Geográfica:

RUTA 2	PROGRESIVA	COORDENADAS		ALTITUD m.s.n.m
		NORTE	ESTE	
ANGASMARCA	0+000 KM	9100162	824328	3300
AHIJADERO	5+600 KM	9104351	824613	3300

Fuente: TDR-004-2020

Ubicación Política:

Departamento : La Libertad
Provincia : Santiago de Chuco
Distrito : Angasmarca
Localidades : Angasmarca, Cruz de Chuca, Ahijadero
Zona : Sierra
Región natural : Quechua
Longitud : 5.600 Km
Código de Ruta : R131025
Inicio : Angasmarca
Fin : Ahijadero

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Aranda
DNI N° 71091
REPRESENTANTE COMUN

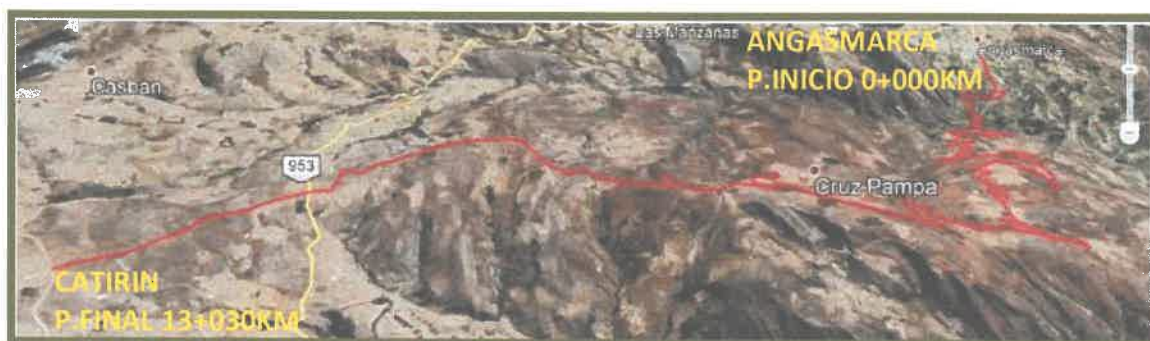
Daysi Ruth Pinto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

EJECUCION DEL ITEM PAQUETE DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES
TRAMO: "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8.120 KM", - "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO LONG = 5.600 KM" - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG = 13.030 KM" - DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

ruta 3: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN - LONG.=13.030 Km



Ubicación Geográfica:

RUTA 3	PROGRESIVA	COORDENADAS		ALTITUD m.s.n.m
		NORTE	ESTE	
ANGASMARCA	0+000 KM	9099730	824514	3300
CATIRIN	13+030 KM	9096654	819814	3300

Fuente: TDR-004-2020

Ubicación Política:

Departamento : La Libertad
 Provincia : Santiago de Chuco
 Distrito : Angasmarca
 Localidades : Angasmarca, El Ingenio, Cruz Pampa, Catirín
 Zona : Sierra
 Región natural : Quechua
 Longitud : 13.030 Km
 Código de Ruta : R131026
 Inicio : Angasmarca
 Fin : Catirín

Lourdes Azucena Juárez Suárez
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

 Julio César Cupuzcoa Aranda
 DNI N° 19531091
 REPRESENTANTE COMUN

Daysi Ruth Piantto Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP N° 78397

4.0 OBJETIVO

Describir las pautas, actividades y procedimientos técnicos de la valorización n°04 del 01 al 15 de diciembre del servicio de mantenimiento periódico de los caminos vecinales "HUAYLACA – TAMBILLO - LONG.=8.120 Km" , "ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA –

EJECUCION DEL ITEM PAQUETE DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES
 TRAMO: "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8.120 KM", - "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO LONG = 5.600 KM" - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG = 13.030 KM" - DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

AHIJADERO - LONG.=5.600 Km" y "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN - LONG.=13.030 Km".

Mantener las condiciones de la infraestructura vial de los caminos vecinales "HUAYLACA - TAMBILLO - LONG.=8.120 Km", "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO - LONG.=5.600 Km" y "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN - LONG.=13.030 Km", intervención que permitirá asegurar la conectividad vial terrestre de modo adecuado y seguro, desarrollando condiciones de, continuidad, fluidez y seguridad, manteniendo la infraestructura vial existente, reduciendo costos operativos vehiculares y tiempos de viaje en beneficio de la población.

5.0 ALCANCE DEL SERVICIO A CONTRATAR

El proyecto contempla las siguientes metas:

Louises Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

RUTA 1: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA - TAMBILLO - LONG.=8.120 Km"

ANÁLISIS DE VALORIZACION MENSUAL																		
VALORIZACIÓN N° 04																		
Del 01 al 16 de DICIEMBRE DEL 2020																		
RUTA 1:SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA - TAMBILLO - LONG.=8.128 Km"																		
ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO																
UBICACIÓN:		HUAYLACA - TAMBILLO																
MODALIDAD:		CONTRATA																
RESIDENTE DE SERVICIO:		ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ																
INSPECTOR DE SERVICIO:		ING. DAISY RUTH PANDO MENDOZA																
PPD CONTRATUAL:		S/ 574,465.87 (CON IGV)																
PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.																		
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020																		
FECHA DE INICIO DE SERVICIO:22-08-2020																		
FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020																		
ITEM	DESCRIPCIONES	UNID	METRADO	PRESUPUESTO BASE			ATENCIE									SALDOS		
				P.T.	PARCIAL	(%)	ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO					
							METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
1	TRABAJOS PRELIMINARES				8,822.76			8,822.76			8,822.76		8,822.76		8,822.76			
1.01	MOTILIZACIÓN Y DESMOTILIZACIÓN DE EQUIPO	gr	1.00	S/ 6,822.98	S/ 6,822.98	0.00	0.00	0.00%	1.00	6,822.98	100.00%	1.00	6,822.98	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.02	TRAZADO Y REPLANTEO	km	8.12	S/ 246.28	S/ 1,999.79	0.00	0.00	0.00%	8.12	1,999.79	100.00%	8.12	1,999.79	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
2	PAVIMENTOS				231,237.82			231,237.82			231,237.82		231,237.82		231,237.82			
2.01	CAPA INMEDIATA E=0.05 M	m3	1,383.84	S/ 31.79	S/ 43,982.27	0.00	0.00	0.00%	1,383.84	43,982.27	100.00%	1,383.84	43,982.27	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M	m3	3,477.80	S/ 53.84	S/ 187,244.75	0.00	0.00	0.00%	3,477.80	187,244.75	100.00%	3,477.80	187,244.75	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
3	TRANSPORTES				115,559.89			115,559.89			115,559.89		115,559.89		115,559.89			
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	5,633.97	S/ 9.67	S/ 54,414.48	0.00	0.00	0.00%	5,633.97	54,414.48	100.00%	5,633.97	54,414.48	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM	m3k	28,753.27	S/ 1.89	S/ 54,281.80	0.00	0.00	0.00%	28,753.27	54,281.80	100.00%	28,753.27	54,281.80	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM	m3k	324.89	S/ 7.85	S/ 2,546.98	0.00	0.00	0.00%	324.89	2,546.98	100.00%	324.89	2,546.98	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	3,735.29	S/ 1.69	S/ 6,312.49	0.00	0.00	0.00%	3,735.29	6,312.49	100.00%	3,735.29	6,312.49	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
4	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				4,872.00			4,872.00			4,872.00		4,872.00		4,872.00			
4.01	RECONFORMACIÓN DE CUNETAS	ml	8,120.00	S/ 0.60	S/ 4,872.00	0.00	0.00	0.00%	8,120.00	4,872.00	100.00%	8,120.00	4,872.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
5	SEÑALIZACIÓN				15,083.48			15,083.48			15,083.48		15,083.48		15,083.48			
5.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	8.00	S/ 181.98	S/ 1,455.84	0.00	0.00	0.00%	8.00	1,455.84	100.00%	8.00	1,455.84	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
5.02	SENALES PREVENTIVAS	und	10.00	S/ 780.46	S/ 7,804.60	0.00	0.00	0.00%	10.00	7,804.60	100.00%	10.00	7,804.60	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
5.03	SENALES REGLAMENTARIAS	und	6.00	S/ 719.42	S/ 4,316.52	0.00	0.00	0.00%	6.00	4,316.52	100.00%	6.00	4,316.52	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
5.04	SENALES INFORMATIVAS	und	4.00	S/ 528.68	S/ 2,114.72	0.00	0.00	0.00%	4.00	2,114.72	100.00%	4.00	2,114.72	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
6	IMPACTO AMBIENTAL				873.31			873.31			873.31		873.31		873.31			
6.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0.65	S/ 1,343.96	S/ 873.31	0.00	0.00	0.00%	0.65	873.31	100.00%	0.65	873.31	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
7	EMERGENCIA SANITARIA				46,486.72			46,486.72			46,486.72		46,486.72		46,486.72			
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gr	1.00	S/ 46,486.72	S/ 46,486.72	0.00	0.00	0.00%	1.00	46,486.72	100.00%	1.00	46,486.72	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
COSTO DIRECTO					473,335.25	0.00	0.00%			473,335.25	100.00%		473,335.25	100.00%	0.00	0.00%		
GASTOS GENERALES				10.00%	47,333.52	0.00				47,333.52			47,333.52		0.00			
UTILIDAD				5.00%	21,166.76	0.00				21,166.76			21,166.76		0.00			
SUB TOTAL					486,835.48	0.00				486,835.48			486,835.48		0.00			
IGV				18.00%	87,630.39	0.00				87,630.39			87,630.39		0.00			
COSTO TOTAL					574,465.87	0.00				574,465.87			574,465.87		0.00			

EJECUCIÓN DEL ÍTEM PAQUETE DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES
TRAMO: "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8.120 KM", - "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO LONG = 5.600 KM" - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG = 13.030 KM" - DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.



Daysi Ruth Pando Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

Julio César Ruiz Aranda
DNI N° 41831091
REPRESENTANTE COMUN



000394

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

5.1 CONTROL ECONÓMICO DE LA OBRA

El Presupuesto Contratado, para el servicio de ejecución del mantenimiento periódico de los caminos vecinales "HUAYLACA – TAMBILLO - LONG.=8.120 Km"

CONTROL DE VALORIZACIONES DE OBRA:

El avance acumulado contractual, incluye IGV de la Valorización N° 04 es el siguiente:

Total Valorización N° 04	S/.	574,465.87
Total Valorización Acumulada	S/.	574,465.87
Monto Total Contractual	S/.	574,465.87
Porcentaje de Avance Valorización N° 04		100.00 %
Porcentaje de Avance Acumulado		100.00%

RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHIJADERO - LONG.=5.600 Km"

ANÁLISIS DE VALORIZACION MENSUAL VALORIZACIÓN N° 04 Del 01 al 16 de DICIEMBRE DEL 2020																	
RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHUADERO -LONG.=5.600 Km"																	
ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO															
UNICACIÓN:		ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO															
MODALIDAD:		CONTRATA															
RESIDENTE DE SERVICIO:		ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ															
INSPECTOR DE SERVICIO:		ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA															
PPTO CONTRACTUAL:		S/ 395,183.36 (CON IGV)															
PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 180 días cal.																	
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-06-2019																	
FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 23-09-2020																	
FECHA DE TÉRMINO DE SERVICIO: 31-12-2020																	
PARTIDA	DESCRIPCION	UNO	METRADO	PRESUPUESTO BASE		AVANCE									SALDOS		
				P.E. (S/.)	PARCIAL (S/.)	ENTRADOR			ACTUAL			ACUMULADO			METRADO	PARCIAL	%
						METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%			
1	TRABAJOS PRELIMINARES				4,887.32		1,754.00			1,754.00			4,887.32		0.00		
1.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	gb	1.00	S/ 3,508.13	S/ 3,508.13	0.00	1,754.00	50.00%	0.50	1,754.00	50.00%	1.00	3,508.13	100.00%	0.00	0.00	0.00%
1.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	5.60	S/ 248.29	S/ 1,379.17	5.00	1,379.17	100.00%		0.00	0.00%	5.60	1,379.17	100.00%	0.00	0.00	0.00%
2	PAVIMENTOS				118,979.25		85,392.55			85,392.55			118,979.25		0.00		
2.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	1,003.13	S/ 31.83	S/ 31,929.51	570.00	18,143.10	56.82%	433.13	13,786.53	43.18%	1,003.13	31,929.51	100.00%	0.00	0.00	0.00%
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMAO E=0.15 M	m3	2,270.30	S/ 54.64	S/ 124,049.18	1,307.64	71,449.43	57.02%	962.66	52,999.74	42.42%	2,270.30	124,049.18	100.00%	0.00	0.00	0.00%
3	TRANSPORTES				77,883.18		37,896.14			37,896.14			77,883.18		0.00		
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	3,828.12	S/ 9.67	S/ 37,884.02	1,014.00	19,475.38	51.27%	1,914.12	18,508.54	48.73%	3,828.12	37,884.02	100.00%	0.00	0.00	0.00%
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	20,033.39	S/ 1.69	S/ 33,856.43	3,966.70	6,732.87	19.95%	16,067.61	27,103.39	80.05%	20,033.39	33,856.43	100.00%	0.00	0.00	0.00%
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	224.00	S/ 7.85	S/ 1,758.40	114.00	901.51	51.27%	109.15	856.83	48.73%	224.00	1,758.40	100.00%	0.00	0.00	0.00%
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	2,676.00	S/ 1.89	S/ 4,354.44	513.00	888.32	19.96%	2,062.20	3,466.12	80.04%	2,676.00	4,354.44	100.00%	0.00	0.00	0.00%
4	OBRAS DE ARTE Y OBRAS				3,472.30		1,880.00			1,880.00			3,472.30		0.00		
4.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	5,600.00	S/ 0.62	S/ 3,472.00	3,000.00	1,880.00	53.57%	2,600.00	1,612.00	46.43%	5,600.00	3,472.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%
5	SEÑALIZACION				12,643.54		5.00			5.00			12,643.54		0.00		
5.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	5.00	S/ 181.98	S/ 909.90	0.00	0.00	0.00%	5.00	909.90	100.00%	5.00	909.90	100.00%	0.00	0.00	0.00%
5.02	SENALES PREVENTIVAS	und	10.00	S/ 789.46	S/ 7,894.60	0.00	0.00	0.00%	10.00	7,894.60	100.00%	10.00	7,894.60	100.00%	0.00	0.00	0.00%
5.03	SENALES REGLAMENTARIAS	und	4.00	S/ 719.42	S/ 2,877.68	0.00	0.00	0.00%	4.00	2,877.68	100.00%	4.00	2,877.68	100.00%	0.00	0.00	0.00%
5.04	SENALES INFORMATIVAS	und	2.00	S/ 526.88	S/ 1,053.76	0.00	0.00	0.00%	2.00	1,053.30	100.00%	2.00	1,053.30	100.00%	0.00	0.00	0.00%
6	IMPACTO AMBIENTAL				594.80		0.45			0.45			594.80		0.00		
6.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0.45	S/ 1,343.56	S/ 594.80	0.00	0.00	0.00%	0.45	594.80	100.00%	0.45	594.80	100.00%	0.00	0.00	0.00%
7	EMERGENCIA SANITARIA				36,413.85		18,206.93			18,206.93			36,413.85		0.00		
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gb	1.00	S/ 36,413.85	S/ 36,413.85	0.50	18,206.93	50.00%	0.50	18,206.93	50.00%	1.00	36,413.85	100.00%	0.00	0.00	0.00%
COSTO DIRECTO					291,855.31		149,790.88	48.22%		151,164.43	51.77%		291,855.31	100.00%		0.00	0.00%
GASTOS GENERALES				10.00%	29,185.53		14,979.09			15,116.44			29,185.53			0.00	
UTILIDAD				5.00%	14,597.77		7,039.54			7,558.23			14,597.77			0.00	
SUB TOTAL					335,748.61		181,809.49			173,839.12			335,748.61			0.00	
IGV				18.00%	60,434.75		29,143.71			31,291.04			60,434.75			0.00	
COSTO TOTAL					396,183.36		191,053.20			205,130.16			396,183.36			0.00	

5.2 CONTROL ECONÓMICO DE LA OBRA

El Presupuesto Contratado, para el servicio de ejecución del mantenimiento periódico de los caminos vecinales "ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHIJADERO - LONG.=5.600 Km"

EJECUCIÓN DEL ÍTEM PAQUETE DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES
TRAMO: "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8.120 KM", - "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO LONG = 5.600 KM" - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG = 13.030 KM" - DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202658



Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Quispe Aranda
DNI N° 19831091
REPRESENTANTE COMÚN



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

000393

CONTROL DE VALORIZACIONES DE OBRA:

El avance acumulado contractual, incluye IGV de la Valorización N° 04 es el siguiente:

Total Valorización N° 04	S/.	205,130.16
Total Valorización Acumulada	S/.	396,183.36
Monto Total Contractual	S/.	396,183.36
Porcentaje de Avance Valorización N° 04		100.00%
Porcentaje de Avance Acumulado		100.00%

RUTA 3: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN - LONG.=13.030 Km

ANÁLISIS DE VALORIZACION MENSUAL																		
VALORIZACION N° 04																		
Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020																		
RUTA 3: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN - LONG.=13.030 Km																		
ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO																
UBICACION:		ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN																
MODALIDAD:		CONTRATA																
RECIPIENTE DE SERVICIO:		ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ GUARIZ																
INSPECTOR DE SERVICIO:		ING. DAYSI RUTH MENDOZA																
PPPO CONTRACTUAL:		S/ 921,833.78 (CON IGV)																
PLAZO CONTRACTUAL DE SERVICIO: 120 días																		
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020																		
FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020																		
FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020																		
PARTIDA	DESCRIPCION	UNID	METRADO	PRESUPUESTO BASE		AVANCE										SALDOS		
				P.C.	PARTIAL	ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDOS			
				(S/.)	(S/.)	METRADO	PARTIAL	%	METRADO	PARTIAL	%	METRADO	PARTIAL	%	METRADO	PARTIAL	%	
1	TRABAJO PRELIMINAR																	
1.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	gr	1.00	S/ 8,198.32	S/ 8,198.32	1.00	8,198.32	100.00%	-	0.00	0.00%	1.00	8,198.32	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	13.03	S/ 3,209.03	S/ 3,209.03	13.03	3,209.03	100.00%	-	0.00	0.00%	13.03	3,209.03	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
2	PAVIMENTOS																	
2.01	CAPA INELASTANTE E=0.05 M	m3	2,275.91	S/ 31.83	S/ 72,442.22	2,275.91	72,442.22	100.00%	-	0.00	0.00%	2,275.91	72,442.22	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFRANCO E=0.15 M	m3	5,769.42	S/ 54.64	S/ 315,169.99	5,769.42	315,169.99	100.00%	-	0.00	0.00%	5,769.42	315,169.99	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
3	TRANSPORTES																	
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	9,674.79	S/ 10.07	S/ 97,425.14	9,674.79	97,425.14	100.00%	-	0.00	0.00%	9,674.79	97,425.14	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	49,341.44	S/ 1.82	S/ 89,801.42	49,341.44	89,801.42	100.00%	-	0.00	0.00%	49,341.44	89,801.42	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	521.20	S/ 8.25	S/ 4,296.90	521.20	4,296.90	100.00%	-	0.00	0.00%	521.20	4,296.90	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	5,993.80	S/ 1.82	S/ 10,908.72	5,993.80	10,908.72	100.00%	-	0.00	0.00%	5,993.80	10,908.72	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
4	OBRAS DE ARTE Y OBRERIA																	
4.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	13,030.00	S/ 0.62	S/ 8,078.60	13,030.00	8,078.60	100.00%	-	0.00	0.00%	13,030.00	8,078.60	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
5	SEÑALIZACION																	
5.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	13.00	S/ 182.72	S/ 2,375.36	13.00	2,375.36	100.00%	13.00	2,375.36	100.00%	13.00	2,375.36	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
5.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	40.00	S/ 781.57	S/ 31,254.80	40.00	31,254.80	100.00%	40.00	31,254.80	100.00%	40.00	31,254.80	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
5.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	8.00	S/ 720.23	S/ 5,761.84	8.00	5,761.84	100.00%	8.00	5,761.84	100.00%	8.00	5,761.84	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
5.04	SEÑALES INFORMATIVAS	und	4.00	S/ 265.66	S/ 2,165.27	4.00	2,165.27	100.00%	4.00	2,165.27	100.00%	4.00	2,165.27	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
6	IMPACTO AMBIENTAL																	
6.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	1.05	S/ 1,343.96	S/ 1,410.74	1.05	1,410.74	100.00%	-	0.00	0.00%	1.05	1,410.74	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
7	EMERGENCIA SANITARIA																	
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gr	1.00	S/ 25,874.65	S/ 25,874.65	1.00	25,874.65	100.00%	-	0.00	0.00%	1.00	25,874.65	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
COSTO DIRECTO					678,317.45		678,317.45	99.89%		41,498.72	6.11%	678,317.45	100.00%		0.00		0.00%	
GASTOS GENERALES				10.00%	67,831.75		67,831.75			4,149.88		67,831.75			0.00			
UTILIDAD				5.00%	33,965.87		33,965.87			2,074.93		33,965.87			0.00			
SUB TOTAL					781,215.07		781,215.07			47,723.63		781,215.07			0.00			
IGV				18.00%	140,618.71		140,618.71			8,590.23		140,618.71			0.00			
COSTO TOTAL					921,833.78		921,833.78			56,313.76		921,833.78			0.00			

5.3 CONTROL ECONÓMICO DE LA OBRA

El Presupuesto Contratado, para el servicio de ejecución del mantenimiento periódico de los caminos vecinales "ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN - LONG.=13.030 Km" CONTROL DE VALORIZACIONES DE OBRA:

El avance acumulado contractual, incluye IGV de la Valorización N° 04 es el siguiente:

Total Valorización N° 04	S/.	56,313.76
Total Valorización Acumulada	S/.	921,833.78

EJECUCIÓN DEL ÍTEM PAQUETE DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES
TRAMO: "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8.120 KM", - "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHJADERO LONG = 5.600 KM" - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG = 13.030 KM" - DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858



Daysi Ruth Pinto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Chiriquiza Aranda
DNI N° 10651091
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

Monto Total Contractual	S/.	921,833.78
Porcentaje de Avance Valorización N° 04		100.00%
Porcentaje de Avance Acumulado		100.00%

6.0 PLAZO DE LA OBRA

El plazo contractual para el mantenimiento periódico y rutinario incluye el plan de trabajo; para el mantenimiento periódico es de 120 días calendarios, se inició el 22 de Septiembre del 2020 y termina el 20 de Enero del 2021, en el transcurso del presente periodo de ejecución de obra el contratista no ha solicitado ampliación de plazo contractual (Art° 169 y 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.-Reglamento D. S. N° 350-2015-EF.- Ley N° 30225 y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1341 y D.S. N° 056-2017-EF.

CONTROL DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS AVANCE DE OBRA EJECUTADO (Art° 173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) Reglamento D. S. N° 350-2015-EF.- Ley N° 30225 y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1341 y D.S. N° 056-2017-EF.

7.0 ADELANTOS OTORGADOS AL CONTRATISTA


En concordancia con el Contrato y Art. 155° y 156° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.S. N° 350-2015-EF.- Ley N° 30225 y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1341 y D.S. N° 056-2017-EF. No se ha otorgado al Contratista un adelanto directo equivalente al 10 % del monto del Contrato, con precios al mes de septiembre del 2020.

8.0 ADELANTOS EN MATERIALES

En concordancia con el Contrato y Art. 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado D. S. N° 350-2015-EF.- Ley N° 30225 y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1341 y D.S. N° 056-2017-EF. y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1341 y D.S. N° 056-2017-EF., la Empresa Contratista CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA No ha solicitado el adelanto para materiales, equivalente al 00.00 % del monto del Contrato, equivalente a S/. 00,00

9.0 CONTROL DE RETENCIONES 10% DEL MONTO DEL CONTRATO

(Art° 126°.-Ley N° 30225 – D.S. N° 350 – 2015 – EF y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1341 y D.S. N° 056-2017-EF.) En las Valorizaciones se le va a retener el 10% de monto del Contrato teniendo en cuenta que el contratista no presenta Carta Fianza por la suma: S/. 228,010.00 (Doscientos Veinte y ocho Mil Doscientos Veintiséis con 47/100 Soles) al Contratista en atención a la **CLÁUSULA SÉTIMA (garantías) del contrato.**


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858




Daysi Ruth Pinto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397


CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio Cesar Quirozco Aranda
DNI N° 10531091
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

10.0 ACCIONES EJECUTADAS

Durante el periodo de ejecución del servicio del 01 de diciembre al 15 de diciembre del 2020, al cierre de la presente Valorización por Servicio de Mantenimiento Periódico se ejecutaron los siguientes trabajos:

ruta 1: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA – TAMBILLO - LONG.=8.120 Km"

PARTIDAS CONTRACTUALES: FASE II

I.-MANTENIMIENTO PERIÓDICO:

1.- TRABAJOS PRELIMINARES: Se trabajó según metrados ejecutados.

- ✓ MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO: Se valorizo un metrado de 1.00 glb. (100.00% - S/. 6,622.99)
- ✓ TRAZO Y REPLANTEO: Se valorizo un metrado de 8.12 km. (100.00% - S/. 1,999.79)

2.- PAVIMENTOS: Se trabajó según metrados ejecutados.

- ✓ CAPA NIVELANTE E=0.05M: Se valorizo un metrado De 1,383.84 m3 (100.00% - S/. 43,992.27).
- ✓ MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M: Se valorizo un metrado de 3,477.80m3 (100.00% - S/. 187,244.75).

3.- TRANSPORTES: Se trabajó según metrados ejecutados.

- ✓ TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1KM: Se valorizo un metrado de 5,833.97 M3K (100.00% - S/. 56,414.49).
- ✓ TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR >1 KM: Se valorizo un metrado de 29,753.27 M3K. (100.00% - S/. 50,283.03).
- ✓ TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM: Se valorizo un metrado de 324.80 M3K (100.00% - S/. 2,549.68).
- ✓ TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE >1 KM: Se valorizo un metrado de 3,735.20 M3K. (100.00% - S/. 6,312.49).

4.- OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

- ✓ RECONFORMACION DE CUNETAS: Se valorizo un metrado de 8,120 ml (100.00% - S/. 4,872.00).

5.- SEÑALIZACION

- ✓ INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS: Se valorizo un metrado de 8.00 und (100.00% - S/. 1,455.84).
- ✓ SEÑALES PREVENTIVAS: Se valorizo un metrado de 10.00 und (100.00% - S/. 7,804.60).

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio Cesar Cruzcocha Aranda
DNI N° 18531091
REPRESENTANTE COMUN

Juan Carlos Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858



Daysi Ruth Rianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397



000390

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

- ✓ SEÑALES REGLAMENTARIAS: Se valorizo un metrado de 6.00 und (100.00% - S/. 4,316.52).
- ✓ SEÑALES INFORMATIVAS: Se valorizo un metrado de 4.00 und (100.00% - S/. 2,106.72).

6.- IMPACTO AMBIENTAL

- ✓ RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS: Se valorizo un metrado de 0.65 ha (100.00% - S/. 873.31).

7.- EMERGENCIA SANITARIA: Se trabajó según metrados ejecutados.

- ✓ EMERGENCIA SANITARIA COVID 19: Se valorizo un metrado de 1.00 glb (100.00% - S/. 46,486.72).

RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHIJADERO – LONG.=5.600 Km

PARTIDAS CONTRACTUALES: FASE II

I.-MANTENIMIENTO PERIÓDICO:



Daysi Ruth Panto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

1.- TRABAJOS PRELIMINARES: Se trabajó según metrados ejecutados.

- ✓ MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO: Se valorizo un metrado de 0.50 glb. (50.00% - S/. 1,754.06)

2.- PAVIMENTOS: Se trabajó según metrados ejecutados.

- ✓ CAPA NIVELANTE E=0.05M: Se valorizo un metrado de 433.13 m3 (43.18% - S/. 13,786.53).
- ✓ MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M: Se valorizo un metrado de 962.66 m3 (42.40% - S/. 52,599.74).

3.- TRANSPORTES: Se trabajó según metrados ejecutados.

- ✓ TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1KM: Se valorizo un metrado de 1,914.12 M3K (48.73% - S/. 18,509.54).
- ✓ TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR >1 KM: Se valorizo un metrado de 16,037.61 M3K. (80.05% - S/. 27,103.56).
- ✓ TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM: Se valorizo un metrado de 109.15 M3K (48.73% - S/. 856.83).
- ✓ TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE >1 KM: Se valorizo un metrado de 2,062.2 M3K. (80.05% - S/. 3,485.12).

4.- OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

- ✓ RECONFORMACION DE CUNETAS: Se valorizo un metrado 2,600 ml (46.43% - S/. 1,612.00).

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP N° 262858

EJECUCION DEL ITEM PAQUETE DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES
TRAMO: "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8.120 KM", - "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO LONG = 5.600 KM" - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG = 13.030 KM" - DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Campuzosa Aranda
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

5.- SEÑALIZACION

- ✓ INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS: Se valorizo un metrado de 5.00 und (100.00% - S/. 909.90).
- ✓ SEÑALES PREVENTIVAS: Se valorizo un metrado de 10.00 und (100.00% - S/. 7,804.60).
- ✓ SEÑALES REGLAMENTARIAS: Se valorizo un metrado de 4.00 und (100.00% - S/. 2,877.68).
- ✓ SEÑALES INFORMATIVAS: Se valorizo un metrado de 2.00 und (100.00% - S/. 1,053.36).

6.- IMPACTO AMBIENTAL

- ✓ RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS: Se valorizo un metrado de 0.45 ha (100.00% - S/. 604.60).

7.- EMERGENCIA SANITARIA: Se trabajó según metrados ejecutados.

- ✓ EMERGENCIA SANITARIA COVID 19: Se valorizo un metrado de 0.50 glb (50.00% - S/. 18,206.93).

RUTA 3: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN - LONG.=13.030 Km

PARTIDAS CONTRACTUALES: FASE II

I.-MANTENIMIENTO PERIÓDICO:

5.- SEÑALIZACION

- ✓ INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS: Se valorizo un metrado de 13.00 und (100.00% - S/. 2,375.36).
- ✓ SEÑALES PREVENTIVAS: Se valorizo un metrado de 40.00 und (100.00% - S/. 31,254.80).
- ✓ SEÑALES REGLAMENTARIAS: Se valorizo un metrado de 8.00 und (100.00% - S/. 5,761.84).
- ✓ SEÑALES INFORMATIVAS: Se valorizo un metrado de 4.00 und (100.00% - S/. 2,106.72).

11.0 CONTROL DE CAMPO

Actualmente se está trabajando según planos, especificaciones técnicas y metrados del Expediente Técnico (Plan de Trabajo); así como también ordenes emitidas por el suscrito y correcciones cuando la situación ameritaba, tal como puede verse en el cuaderno de ocurrencias.

Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio Cesar Cipuzcoa Aranda
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

12.0 CONTROL DE MATERIALES

Se utiliza material granular de cantera; que cumpla con los requisitos técnicos para material de base gradación del MTC y ensayos de plasticidad, límite líquido, índice de plasticidad, ensayos proctor, ensayo CBR, Ensayos realizados en laboratorio certificado.

13.0 AVANCE FISICO POR PARTIDAS

El avance por partidas se detalla en los respectivos informes mensuales.

14.0 ESTADO DE AVANCE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

ESTADO DE AVANCE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FISICO VALORIZADO – EJECUTADO REALIZADO EN LA RUTA 1:

Avance Físico Programado	:	100.00 %
Avance Físico Ejecutado	:	100.00%

El servicio de acuerdo al cronograma valorizado de avance Físico programado del servicio 100.00 % acumulado y el avance físico Ejecutado se encuentra al 100.00%, del avance del servicio.

ESTADO DE AVANCE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FISICO VALORIZADO – EJECUTADO REALIZADO EN LA RUTA 2:

Avance Físico Programado	:	67.40 %
Avance Físico Ejecutado	:	51.78 %

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio Cesar Quintana Aranda
DNI N° 10531091
REPRESENTANTE COMUN

El servicio de acuerdo al cronograma valorizado de avance Físico programado del servicio 67.40 % acumulado y el avance físico Ejecutado se encuentra al 51.78 %, del avance del servicio.

ESTADO DE AVANCE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FISICO VALORIZADO – EJECUTADO REALIZADO EN LA RUTA 3:

Avance Físico Programado	:	6.71%
Avance Físico Ejecutado	:	6.11 %

Daysi Ruth Nanto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

El servicio de acuerdo al cronograma valorizado de avance Físico programado del servicio 6.71 % acumulado y el avance físico Ejecutado se encuentra al 6.11 %, del avance del servicio.

15.0 CONTROL DE ALMACEN DE OBRA

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

A la fecha se viene registrando el ingreso y salida de materiales al almacén en obra.



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL

PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020


 Daysi Ruth Pianto Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP N° 78397


 Lourdes Azucena Juárez Suárez
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 202558

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

 Julio César Quiroz Aranda
 DNI N° 19521091
 REPRESENTANTE COMUN

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 04 - GENERAL

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8.120 KM", - "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO LONG = 5.600 KM", - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG = 13.030 KM", - DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: "HUAYLACA - TAMBILLO" "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO" - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN"

MODALIDAD: CONTRATA

RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ

INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA

PPTO CONTRACTUAL: S/ 1,892,483.01 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020

FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020

FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL S/.	ACUMULADO ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
			COSTO	%	COSTO	%	COSTO	%	COSTO	%
1.00	VALORIZACION (SUB TOTAL SIN/IGV) EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8.120 KM", - "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO LONG = 5.600 KM", - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG = 13.030 KM", - DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.	1,603,799.16	895,401.03	55.83%	708,398.13	44.17%	1,603,799.16	100.00%	0.00	0.00%
2.00	REAJUSTES NETOS EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8.120 KM", - "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO LONG = 5.600 KM", - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG = 13.030 KM", - DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.	1,603,799.16	895,401.03		708,398.13		1,603,799.16		0.00	
3.00	ADELANTOS (SINI/IGV) ADELANTO DIRECTO ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00		0.00		0.00			
4.00	AMORTIZACIONES ADELANTO DIRECTO ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
5.00	GARANTIA RETENCION DEL 10%	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
6.00	MONTOS A PAGAR AL CONTRATISTA	1,603,799.16	895,401.03		708,398.13		1,603,799.16		0.00	
7.00	EN EFECTIVO (VN)	288,683.85	161,172.19		127,511.66		288,683.85		0.00	
8.00	IGV (18 %)	1,892,483.01	1,056,573.22		835,909.79		1,892,483.01		0.00	
9.00	TOTAL SOLICITADO POR EL CONTRATISTA	1,892,483.01	1,056,573.22		835,909.79		#####		0.00	


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 20235C

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

Julio César Quirozco Aranda
DNI N° 19831091
REPRESENTANTE COMUN


Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

002385

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 1:SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA - TAMBILLO - LONG.#8.120 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: HUAYLACA - TAMBILLO

MODALIDAD: CONTRATA

RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ

INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA

PPTO CONTRACTUAL: S/ 574,465.87 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 28-08-2020
FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020
FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL SI.	ACUMULADO ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
			COSTO	%	COSTO	%	COSTO	%	COSTO	%
1.00	VALORIZACION (SUB TOTAL SIN/IGV)	486,835.48	0.00	0.00%	486,835.48	100.00%	486,835.48	100.00%	0.00	0.00%
	RUTA 1:SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA - TAMBILLO - LONG.#8.120 Km"	486,835.48	0.00		486,835.48		486,835.48		0.00	
2.00	REAJUSTES NETOS		0.00		0.00		0.00			
	RUTA 1:SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA - TAMBILLO - LONG.#8.120 Km"		0.00		0.00		0.00			
3.00	ADELANTOS (SIN/IGV)	0.00								
	ADELANTO DIRECTO	0.00								
	ADELANTO DE MATERIALES	0.00								
4.00	AMORTIZACIONES	0.00			0.00		0.00		0.00	
	ADELANTO DIRECTO	0.00			0.00		0.00		0.00	
	ADELANTO DE MATERIALES	0.00			0.00		0.00		0.00	
5.00	GARANTIA	0.00			0.00		0.00		0.00	
	RETENCION DEL 10%	0.00			0.00		0.00		0.00	
6.00	MONTOS A PAGAR AL CONTRATISTA	486,835.48	0.00		486,835.48		486,835.48		0.00	
7.00	EN EFECTIVO (VN)	87,630.39	0.00		87,630.39		87,630.39		0.00	
	IGV (18 %)	574,465.87	0.00		574,465.87		574,465.87		0.00	
8.00	MONTO TOTAL CON I.G.V.	574,465.87			574,465.87		574,465.87		0.00	
9.00	TOTAL SOLICITADO POR EL CONTRATISTA	574,465.87	0.00		574,465.87		574,465.87		0.00	


Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397


CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Quiroz Aranda
CIP N° 194308
REPRESENTANTE COMUN

002384

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO - LONG.=5.600 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO

MODALIDAD: CONTRATA

RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ


INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA

PPTO CONTRACTUAL: S/ 396,183.36 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020
FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL S/.	ACUMULADO ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
			COSTO	%	COSTO	%	COSTO	%	COSTO	%
1.00	VALORIZACION (SUB TOTAL SIN/IGV) RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO - LONG.=5.600 Km"	335,748.61	161,909.49	48.22%	173,839.12	51.79%	335,748.61	100.00%	0.00	0.00%
2.00	REAJUSTES NETOS RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO - LONG.=5.600 Km"	335,748.61	161,909.49		173,839.12		335,748.61		0.00	
3.00	ADELANTOS (SIN/IGV) ADELANTO DIRECTO ADELANTO DE MATERIALES	0.00 0.00 0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
4.00	AMORTIZACIONES ADELANTO DIRECTO ADELANTO DE MATERIALES	0.00 0.00 0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
5.00	GARANTIA RETENCION DEL 10%	0.00 0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
6.00	MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA	335,748.61	161,909.49		173,839.12		335,748.61		0.00	
7.00	EN EFECTIVO (VN)	60,434.75	29,143.71		31,291.04		60,434.75		0.00	
8.00	IGV (18 %)	396,183.36	191,053.20		205,130.16		396,183.36		0.00	
9.00	MONTO TOTAL CON I.G.V.	396,183.36	191,053.20		205,130.16		396,183.36		0.00	
	TOTAL SOLICITADO POR EL CONTRATISTA									


Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 208856


CONSORCIO MAL CRUZ DE CHUCA
Julio Cesar Quiroz Aranda
DNI N° 19631991
REPRESENTANTE COMUN

002383

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 3: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN - LONG = 13.030 Km

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 UBICACIÓN: ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN
 MODALIDAD: CONTRATA
 RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
 INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA
 PPTO CONTRACTUAL: S/ 921,833.78 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 28-08-2020
 FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020
 FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL S/.	ACUMULADO ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
			COSTO	%	COSTO	%	COSTO	%	COSTO	%
1.00	VALORIZACION (SUB TOTAL SINIGV)	781,215.07	733,491.54	93.89%	47,723.53	6.11%	781,215.07	100.00%	0.00	0.00%
	RUTA 3: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN - LONG = 13.030 Km	781,215.07	733,491.54		47,723.53		781,215.07		0.00	
2.00	REAJUSTES NETOS		0.00		0.00		0.00			
	RUTA 3: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN - LONG = 13.030 Km		0.00		0.00		0.00			
3.00	ADELANTOS (SINI/IGV)	0.00								
	ADELANTO DIRECTO	0.00								
	ADELANTO DE MATERIALES	0.00								
4.00	AMORTIZACIONES	0.00								
	ADELANTO DIRECTO	0.00								
	ADELANTO DE MATERIALES	0.00								
5.00	GARANTIA	0.00								
	RETENCION DEL 10%	0.00								
6.00	MONTOS A PAGAR AL CONTRATISTA	781,215.07	733,491.54		47,723.53		781,215.07		0.00	
7.00	EN EFECTIVO (VN)	140,618.71	132,028.48		8,590.23		140,618.71		0.00	
8.00	IGV (18 %)	921,833.78	865,520.02		56,313.76		921,833.78		0.00	
9.00	TOTAL SOLICITADO POR EL CONTRATISTA	921,833.78	865,520.02		56,313.76		921,833.78		0.00	


 Lourdes Azucena Juarez Suarez
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 202858


 Daysi Ruth Pianto Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP N° 78397


 CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
 Julio Cesar Chiriquiza Ayanda
 DNI N° 19531091
 REPRESENTANTE CONIUN



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

CONTROL DE METRADOS Y ACTIVIDADES EJECUTADOS PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020



Daysi Ruth Pianta Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

Leirides Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202850

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Quiroz Aranda
DNI N° 19831081
REPRESENTANTE COMUN

CONTROL DE METRADOS

VALORIZACIÓN N° 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 1:SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA - TAMBILLO - LONG.=8.120 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: HUAYLACA - TAMBILLO

MODALIDAD: CONTRATA

RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ

INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA

PPTO CONTRACTUAL: SI 574,465.87 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020

FECHA DE INICIO DE SERVICIO:22-09-2020

FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO BASE	METRADOS EJECUTADOS			% AVANCE	SALDO METRADO
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
1 TRABAJOS PRELIMINARES								
1.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	gib	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00
1.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	8.12	0.00	8.12	8.12	100.00%	0.00
2 PAVIMENTOS								
2.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	1383.84	0.00	1,383.84	1383.84	100.00%	0.00
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M	m3	3477.80	0.00	3,477.80	3477.80	100.00%	0.00
3 TRANSPORTES								
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	5833.97	0.00	5,833.97	5833.97	100.00%	0.00
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM	m3k	29753.27	0.00	29,753.27	29753.27	100.00%	0.00
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM	m3k	324.80	0.00	324.80	324.80	100.00%	0.00
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	3735.20	0.00	3,735.20	3735.20	100.00%	0.00
4 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE								
4.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	8120.00	0.00	8,120.00	8120.00	100.00%	0.00
5 SEÑALIZACION								
5.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	8.00	0.00	8.00	8.00	100.00%	0.00
5.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	10.00	0.00	10.00	10.00	100.00%	0.00
5.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	6.00	0.00	6.00	6.00	100.00%	0.00
5.04	SEÑALES INFORMATIVAS	und	4.00	0.00	4.00	4.00	100.00%	0.00
6 IMPACTO AMBIENTAL								
6.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0.65	0.00	0.65	0.65	100.00%	0.00
7 EMERGENCIA SANITARIA								
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gib	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00


Daysi Ruth Pianto Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP N° 78397


Lourdes Azucena Juarez Suarez
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
JULIO CESAR OLIVEROS ARANDA
 R. CIP. N° 19837891
 REPRESENTANTE COMUN

000380

CONTROL DE METRADOS

VALORIZACIÓN N° 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUJADERO - LONG.=5,600 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUJADERO

MODALIDAD: CONTRATA

RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ

INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA

PPTO CONTRACTUAL: S/ 396,183.36 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020

FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020

FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO BASE	METRADOS EJECUTADOS		% AVANCE	SALDO METRADO
				ANTERIOR	ACTUAL		
1 TRABAJOS PRELIMINARES							
1.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	gib	1.00	0.50	0.50	100.00%	0.00
1.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	5.60	5.60	-	100.00%	0.00
2 PAVIMENTOS							
2.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	1003.13	570.00	433.13	100.00%	0.00
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M	m3	2270.30	1,307.64	962.66	100.00%	0.00
3 TRANSPORTES							
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	3928.12	2,014.00	1,914.12	100.00%	0.00
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM	m3k	20033.39	3,995.78	16,037.61	100.00%	0.00
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM	m3k	224.00	114.85	109.15	100.00%	0.00
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	2576.00	513.80	2,062.20	100.00%	0.00
4 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE							
4.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	5600.00	3,000.00	2,600.00	100.00%	0.00
5 SEÑALIZACION							
5.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	5.00	0.00	5.00	100.00%	0.00
5.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	10.00	0.00	10.00	100.00%	0.00
5.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	4.00	0.00	4.00	100.00%	0.00
5.04	SEÑALES INFORMATIVAS	und	2.00	0.00	2.00	100.00%	0.00
6 IMPACTO AMBIENTAL							
6.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0.45	0.00	0.45	100.00%	0.00
7 EMERGENCIA SANITARIA							
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gib	1.00	0.50	0.50	100.00%	0.00

Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Quirozco Araña
DNI N° 19831091
REPRESENTANTE COMUN

0000379

CONTROL DE METRADOS

VALORIZACIÓN N° 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 3: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN - LONG.=13.030 Km

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
UBICACIÓN: ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN
MODALIDAD: CONTRATA
RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA
PPTO CONTRACTUAL: S/ 921,833.78 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-08-2020
FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO BASE	METRADOS EJECUTADOS		% AVANCE	SALDO METRADO
				ANTERIOR	ACTUAL		
1 TRABAJOS PRELIMINARES							
1.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	gib	1.00	1.00	-	100.00%	0.00
1.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	13.03	13.03	-	100.00%	0.00
2 PAVIMENTOS							
2.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	2275.91	2,275.91	-	100.00%	0.00
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M	m3	5786.42	5,786.42	-	100.00%	0.00
3 TRANSPORTES							
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	9674.79	9,674.79	-	100.00%	0.00
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM	m3k	49341.44	49,341.44	-	100.00%	0.00
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM	m3k	521.20	521.20	-	100.00%	0.00
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	5993.80	5,993.80	-	100.00%	0.00
4 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE							
4.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	13030.00	13,030.00	-	100.00%	0.00
5 SEÑALIZACION							
5.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	13.00	0.00	13.00	100.00%	0.00
5.02	SENALES PREVENTIVAS	und	40.00	0.00	40.00	100.00%	0.00
5.03	SENALES REGLAMENTARIAS	und	8.00	0.00	8.00	100.00%	0.00
5.04	SENALES INFORMATIVAS	und	4.00	0.00	4.00	100.00%	0.00
6 IMPACTO AMBIENTAL							
6.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	1.05	1.05	-	100.00%	0.00
7 EMERGENCIA SANITARIA							
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gib	1.00	1.00	-	100.00%	0.00

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio Cesar Chiriquiza Aranda
CIP N° 78397
REPRESENTANTE COMUN

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

000078



000377

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

SUSTENTO DE METRADOS

PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020



Daysi Ruth Plante Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Quiroz Aranda
DNI N° 19631091
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

SUSTENTO DE METRADOS

PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 1: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA – TAMBILLO - LONG.=8.120 Km"


Daysi Ruth Panto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

Julio César Olapuzcoa Aranda
DNI N° 19821091
REPRESENTANTE COMUN

SUSTENTO DE METRADOS

VALORIZACIÓN N° 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 1:SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA - TAMBILLO - LONG.=8.120 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 UBICACIÓN: HUAYLACA - TAMBILLO
 MODALIDAD: CONTRATA
 RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
 INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA
 PPTO CONTRACTUAL: S/ 574,465.87 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
 FECHA DE INICIO DE SERVICIO:22-09-2020
 FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	METRADO ANTERIOR	METRADO EJECUTADO	METRADO ACUMULADO	% ACUMULADO
1	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	glb	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00%
1.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	8.12	0.00	8.12	8.12	100.00%


 Daysi Ruth Pianto Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP N° 78397


 Lourdes Azucena Juárez Suárez
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 209858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCO

 Julio César Quirozosa Aranda
 DNI N° 10631091
 REPRESENTANTE COMUN

000375

SUSTENTO DE METRADOS

VALORIZACIÓN Nº 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 1:SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA – TAMBILLO - LONG.=8.120 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: HUAYLACA – TAMBILLO

MODALIDAD: CONTRATA

RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ

INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA

PPTO CONTRACTUAL: S/ 574,465.87 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020

FECHA DE INICIO DE SERVICIO:22-09-2020

FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	METRADO ANTERIOR	METRADO EJECUTADO	METRADO ACUMULADO	% ACUMULADO
2	PAVIMENTOS						
2.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	1,383.84	0.00	1,383.84	1,383.84	100.00%

Progresiva		Longitud	Ancho Promedio	Espesor	Area	Area S/A	Area Total	Vol. Total
Inicio	Final	m	m	m	m ²	m ²	m ²	m ³
00+000	01+000	1,000.00	3.80	0.05	3,800.00	0.00	3,800.00	172.73
01+000	02+000	1,000.00	3.80	0.05	3,800.00	0.00	3,800.00	172.73
02+000	03+000	1,000.00	3.80	0.05	3,800.00	0.00	3,800.00	172.73
03+000	04+000	1,000.00	3.80	0.05	3,800.00	0.00	3,800.00	172.73
04+000	05+000	1,000.00	3.80	0.05	3,800.00	0.00	3,800.00	172.73
05+000	06+000	1,000.00	3.80	0.05	3,800.00	0.00	3,800.00	172.73
06+000	07+000	1,000.00	3.80	0.05	3,800.00	0.00	3,800.00	172.73
07+000	08+000	1,000.00	3.50	0.05	3,500.00	0.00	3,500.00	159.09
08+000	08+120	120.00	3.50	0.05	420.00	0.00	420.00	15.66
SUB TOTAL		8,120.00			30,520.00	0.00	30,520.00	1,383.84


Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIF Nº 78397


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. Nº 202858


CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCO
Julio César Quiroz Aranda
ING. CIVIL Nº 19631091
REPRESENTANTE COMÚN

000374

SUSTENTO DE METRADOS

VALORIZACIÓN N° 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

ruta 1:SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA – TAMBILLO - LONG.=8.120 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: HUAYLACA – TAMBILLO

MODALIDAD: CONTRATA

RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ

INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA

PPTO CONTRACTUAL: SI 574,465.87 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020

FECHA DE INICIO DE SERVICIO:22-09-2020

FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	METRADO ANTERIOR	METRADO EJECUTADO	METRADO ACUMULADO	% ACUMULADO
2	PAVIMENTOS						
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M	m3	3477.80	0.00	3477.80	3477.80	100.00%

Progresiva		Longitud m	Ancho Promedio m	Espesor m	Area m²	Area S/A m²	Area Total m²	Vol. Total m³
Inicio	Final							
00+000	01+000	1,000.00	3.80	0.15	3,800.00	0.00	3,800.00	435.11
01+000	02+000	1,000.00	3.80	0.15	3,800.00	0.00	3,800.00	435.11
02+000	03+000	1,000.00	3.80	0.15	3,800.00	0.00	3,800.00	435.11
03+000	04+000	1,000.00	3.80	0.15	3,800.00	0.00	3,800.00	435.11
04+000	05+000	1,000.00	3.80	0.15	3,800.00	0.00	3,800.00	435.11
05+000	06+000	1,000.00	3.80	0.15	3,800.00	0.00	3,800.00	435.11
06+000	07+000	1,000.00	3.80	0.15	3,800.00	0.00	3,800.00	435.11
07+000	08+000	1,000.00	3.50	0.15	3,500.00	0.00	3,500.00	383.90
08+000	08+120	120.00	3.50	0.15	420.00	0.00	420.00	48.09
SUB TOTAL		8,120.00			30,520.00	0.00	30,520.00	3,477.80

TOTAL 3,477.80



Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCU
Julio Cesar Oqupuzoa Aranda
ING. CIVIL
REPRESENTANTE COMUN

000073

SUSTENTO DE METRADOS

VALORIZACIÓN N° 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 1: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "HUAYLACA - TAMBILLO - LONG - 8.120 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: HUAYLACA - TAMBILLO

MODALIDAD: CONTRATA

RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUÁREZ SUÁREZ

INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSÍ RUTH PIANTO MENDOZA

PPTO CONTRACTUAL: S/ 574,463.87 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020
FECHA DE TÉRMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO ANTERIO	METRADO EJECUTADO	METRADO ACUMULADO	% ACUMULADO
3	TRANSPORTES					
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	5833.97	5833.97	5833.97	100.00%
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM	m3k	29753.27	29753.27	29753.27	100.00%

INICIO (km)	FIN (km)	Código Cantera	Ubicación de Canteras (km)	Participación %	Acceso (km)	D.L.P. 120.00 m (km)	Distancia (km)	Longitud (m)	Ancho (m)	Área (m²)	Plazoletas 3% (m3)	Sobre ancho 3% (m²)	Espesor (m)	Volumen (m³)	Momento (m².km)	D<=1km (m³.km)	D>=1km (m³.km)
00+000	01+000	C-1	1.00	100.00%	0.300	0.12	0.50	1,000.00	3.80	3,800.00	114.00	114.00	0.20	805.60	402.80	402.80	0.00
01+000	02+000	C-1	1.00	100.00%	0.300	0.12	1.00	1,000.00	3.80	3,800.00	114.00	114.00	0.20	805.60	805.60	805.60	0.00
02+000	03+000	C-1	1.00	100.00%	0.300	0.12	3.50	1,000.00	3.80	3,800.00	114.00	114.00	0.20	805.60	2,819.60	805.60	2,014.00
03+000	04+000	C-1	1.00	100.00%	0.300	0.12	9.00	1,000.00	3.80	3,800.00	114.00	114.00	0.20	805.60	7,250.40	805.60	6,444.80
04+000	05+000	C-1	1.00	100.00%	0.300	0.12	8.50	1,000.00	3.80	3,800.00	114.00	114.00	0.20	805.60	8,847.60	805.60	6,042.00
05+000	06+000	C-1	1.00	100.00%	0.300	0.12	8.00	1,000.00	3.80	3,800.00	114.00	114.00	0.20	805.60	6,444.80	805.60	5,639.20
06+000	07+000	C-1	1.00	100.00%	0.300	0.12	7.50	1,000.00	3.80	3,800.00	114.00	114.00	0.20	805.60	6,042.00	805.60	5,236.40
07+000	08+000	C-1	1.00	100.00%	0.300	0.12	7.00	1,000.00	3.50	3,500.00	105.00	105.00	0.20	742.00	5,194.00	508.53	3,887.15
08+000	08+120	C-1	1.00	100.00%	0.300	0.12	6.50	120.00	3.50	420.00	12.60	12.60	0.20	89.04	578.76	89.04	489.72
LONGITUD TOTAL DE AFIRMADO												32,351.20	6470.24		36385.56	5833.97	29,753.27
												8,120.00		Dist.Mediana (km):		5.62	


Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202856

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Quiroz Aranda
R. CIP. N° 19821001
REPRESENTANTE COMÚN

000372

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	METRADO ANTERIO R	METRADO EJECUTADO	METRADO ACUMULADO	% ACUMULADO
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM	m3k	324.80	0.00	324.80	324.80	100.00%

Descripción	Dimensiones		Sub-Total
	Volumen (m3.)	Coef. Espunj.	
0+000 KM AL 4+000 KM	5,833.97	1.25	324.80
TOTAL			324.80

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	METRADO ANTERIO R	METRADO EJECUTADO	METRADO ACUMULADO	% ACUMULADO
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	3735.20	0.00	3735.20	3735.20	100.00%

Descripción	Dimensiones		Sub-Total
	Volumen (m3.)	Coef. Espunj.	
0+000 KM AL 4+000 KM	29,753.27	1.25	3735.20
TOTAL			3,735.20


 Daysi Ruth Pianti Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP N° 78397


 Lourdes Azucena Juárez Suárez
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCR
 JULIO César Quiroz Aranda
 DNI N° 16531091
 REPRESENTANTE COMUN

SUSTENTO DE METRADOS

VALORIZACIÓN N° 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 1:SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA - TAMBILLO - LONG.=8.120 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: HUAYLACA - TAMBILLO

MODALIDAD: CONTRATA

RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ

INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA

PPTO CONTRACTUAL: S/ 574,465.87 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020

FECHA DE INICIO DE SERVICIO:22-09-2020

FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	METRADO ANTERIOR	METRADO EJECUTADO	METRADO ACUMULADO	% ACUMULADO
4	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE						
4.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	8120.00	0.00	8120.00	8120.00	100.00%

Progresiva		Lado Izquierdo		Lado Derecho	
Inicio (Km.)	Final (Km.)	Longitud (m)	Sección	Longitud (m)	Sección
0+000	1+000			1000.00	Tipo I
1+000	2+000			1000.00	Tipo I
2+000	3+000			1000.00	Tipo I
3+000	4+000			1000.00	Tipo I
4+000	5+000			1000.00	Tipo I
5+000	6+000			1000.00	Tipo I
6+000	7+000			1000.00	Tipo I
7+000	8+000			1000.00	Tipo I
8+000	8+120			120.00	Tipo I
Sub Total :		Tipo I =	0	Tipo I =	8,120
Total =		8,120.00			

Item	Descripción	Metrado	Und.
04.01	Reconformación de Cunetas (Sin revestir)	8,120.00	ml

CONSORCIO VIA/CRUZ DE CHUCA
Julio Cesar Azuara Aranda
DNI N° 19537094
REPRESENTANTE COMUN

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP: N° 208858

Daysi Ruth Panto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

0000370

SUSTENTO DE METRADOS
VALORIZACIÓN N° 04
Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 1:SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA -- TAMBILLO - LONG.=8.120 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
UBICACIÓN: HUAYLACA - TAMBILLO
MODALIDAD: CONTRATA
RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA
PPTO CONTRACTUAL: S/ 574,465.87 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
FECHA DE INICIO DE SERVICIO:22-09-2020
FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	METRADO		METRADO	%	
				ANTERIOR	EJECUTADO		ACUMULADO	ACUMULADO
5	SEÑALIZACION							
5.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	8.00	0.00	8.00	8.00		100.00%
5.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	10.00	0.00	10.00	10.00		100.00%
5.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	6.00	0.00	6.00	6.00		100.00%
5.04	SEÑALES INFORMATIVAS	und	4.00	0	4.00	4.00		100.00%


Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202856

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

Julio César Quiroz Aranda
DIRECCIÓN 1931091
REPRESENTANTE COMUN

000359

SUSTENTO DE METRADOS

VALORIZACIÓN N° 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 1:SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA – TAMBILLO - LONG.=8.120 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 UBICACIÓN: HUAYLACA – TAMBILLO
 MODALIDAD: CONTRATA
 RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
 INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA
 PPTO CONTRACTUAL: SI 574,465.87 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
 FECHA DE INICIO DE SERVICIO:22-09-2020
 FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	METRADO ANTERIOR	METRADO EJECUTADO	METRADO ACUMULADO	%
6	IMPACTO AMBIENTAL						
6.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0.65	0.00	0.65	0.65	100.00%
7	EMERGENCIA SANITARIA						
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00%


 Daysi Ruth Pianto Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP N° 78387


 Lourdes Azucena Juárez Suárez
 ING. CIVIL
 R. CIP N° 202350

CONSORCIO VAL CRUZ DE CHUCUITA
 Julio César Ortiz Arce
 DNI N° 16537091
 REPRESENTANTE COMUN

000368




CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA


SUSTENTO DE METRADOS

PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA –
AHIJADERO - LONG.=5.600 Km"


 Daysi Ruth Plazo Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

Julio César Quirozco Aranda
DNI N° 19631091
REPRESENTANTE COMUN

SUSTENTO DE METRADOS

VALORIZACIÓN N° 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020


ruta 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO - LONG.=5.600 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 UBICACIÓN: ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO
 MODALIDAD: CONTRATA
 RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
 INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA
 PPTO CONTRACTUAL: S/ 396,183.36 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
 FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020
 FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	METRADO ANTERIOR	METRADO EJECUTADO	METRADO ACUMULADO	% ACUMULADO
1	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	glb	1.00	0.50	0.50	1.00	100.00%
1.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	5.60	5.60	0.00	5.60	100.00%


 Daysi Ruth Pianto Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP N° 78397


 Lourdes Azucena Juárez Suárez
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 209858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

 Julio César Quiroz Aranda
 DNI N° 16831081
 REPRESENTANTE COMUN

000366

SUSTENTO DE METRADOS

VALORIZACIÓN N° 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO - LONG=5,600 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO

MODALIDAD: CONTRATA

RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ

INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA

PPTO CONTRACTUAL: S/ 396,183.36 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020

FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020

FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	METRADO ANTERIOR	METRADO EJECUTADO	METRADO ACUMULADO	% ACUMULADO
2	PAVIMENTOS						
2.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	1,003.13	570.00	433.13	1,003.13	100.00%

Progresiva	Longitud		Ancho Promedio	Espesor	Area m ²	Area S/A m ²	Area Total m ²	Vol. Total m ³
	Inicio	Final						
03+000	04+000	1,000.00	3.50	0.05	3,500.00	0.00	3,500.00	175.00
04+000	05+000	1,000.00	3.50	0.05	3,500.00	0.00	3,500.00	175.00
05+000	05+600	600.00	3.50	0.05	2,100.00	0.00	2,100.00	83.13
SUB TOTAL		2,600.00			9,100.00	0.00	9,100.00	433.13


Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 18397


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCO

Julio César Quiroz Aranda
CIP N° 19331001
REPRESENTANTE COMUN

000365

SUSTENTO DE METRADOS

VALORIZACIÓN N° 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO - LONG.=5.600 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO

MODALIDAD: CONTRATA

RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ

INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA

PPTO CONTRACTUAL: S/ 396,183.36 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020

FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020


FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	METRADO ANTERIOR	METRADO EJECUTADO	METRADO ACUMULADO	%
2	PAVIMENTOS						
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M	m3	2270.30	1307.64	962.66	2270.30	100.00%

Progresiva		Longitud	Ancho Promedio	Espesor	Area	Area S/A	Area Total	Vol. Total
Inicio	Final	m	m	m	m ²	m ²	m ²	m ³
03+000	04+000	1,000.00	3.50	0.15	3,500.00	0.00	3,500.00	390.88
04+000	05+000	1,000.00	3.50	0.15	3,500.00	0.00	3,500.00	390.88
05+000	05+600	600.00	3.50	0.15	2,100.00	0.00	2,100.00	180.90
SUB TOTAL		2,600.00			9,100.00	0.00	9,100.00	962.66

TOTAL 962.66


Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
JULIO César Quiroz Aranda
DIRECCIÓN DE VIAL
REPRESENTANTE COMUN

000364

SUSTENTO DE METRADOS

VALORIZACIÓN N° 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

ruta 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO - LONG.=5,800 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
UBICACIÓN: ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO
MODALIDAD: CONTRATA
RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA
PPTO CONTRACTUAL: S/ 398,183.38 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020
FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	METRADO ANTERO	METRADO EJECUTADO	METRADO ACUMULADO	% ACUMULADO
3	TRANSPORTES						
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	3928.12	2014.00	1914.12	3928.12	100.00%
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM	m3k	20033.39	3985.78	16037.61	20033.39	100.00%

INICIO (km)	FIN (km)	Código Cantera	Ubicación de Canteras (km)	Participación %	Acceso (km)	D.L.P. 120.00 m (km)	Distancia (km)	Longitud (m)	Ancho (m)	Área (m²)	Plazoleas 3% (m³)	Sobre ancho 3% (m²)	Espesor (m)	Volumen (m³)	Momento (m³-km)	D<=1km (m³-km)	D>1km (m³-km)
03+000	04+000	C-1	1.00	100.00%	2.000	0.12	3.50	1,000.00	3.50	3,500.00	105.00	105.00	0.20	742.00	2,597.00	742.00	4,600.40
04+000	05+000	C-1	1.00	100.00%	2.000	0.12	4.50	1,000.00	3.50	3,500.00	105.00	105.00	0.20	742.00	3,339.00	742.00	6,440.56
05+000	05+800	C-1	1.00	100.00%	2.000	0.12	5.50	600.00	3.50	2,100.00	63.00	63.00	0.20	445.20	2,448.60	430.12	4,996.65
LONGITUD TOTAL DE AFIRMADO										2,900.00	9,846.00			1925.20	8384.80	1914.12	19037.51
															4.35		


Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 208858


CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCO
Julio César Quiroz Aranda
DNI N° 19631091
REPRESENTANTE COMUN

000863

ITEM	DESCRIPCION					UNIDAD	METRADO	METRADO ANTERIO R	METRADO EJECUTADO	METRADO ACUMULADO	%
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM					m3k	224.00	114.85	109.15	224.00	100.00%

Descripción		Dimensiones		Sub-Total	transp D<=1km
0+000 KM AL 4+000 KM	Volumen (m3.)	Coef. Esponj.	1.25		
	1,914.12			2392.65	109.15
				TOTAL	109.15

ITEM	DESCRIPCION					UNIDAD	METRADO	METRADO ANTERIO R	METRADO EJECUTADO	METRADO ACUMULADO	%
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM					m3k	2576.00	513.80	2062.20	2576.00	100.00%

Descripción		Dimensiones		Sub-Total	transp D>1km
0+000 KM AL 4+000 KM	Volumen (m3.)	Coef. Esponj.	1.25		
	16,037.61			20047.01	2062.20
				TOTAL	2,062.20


 Daysi Ruth Plunio Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP N° 78397


 Lourdes Azucena Juárez Suárez
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 209858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

 Julio Cesar Quiroz Aranda
 DNI N° 19831091
 REPRESENTANTE COMUN

002362

SUSTENTO DE METRADOS

VALORIZACIÓN N° 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO - LONG.=5.600 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 UBICACIÓN: ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO
 MODALIDAD: CONTRATA
 RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
 INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA
 PPTO CONTRACTUAL: S/ 396,183.36 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
 FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020
 FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	METRADO ANTERIOR	METRADO EJECUTADO	METRADO ACUMULADO	%
4	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE						
4.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	5600.00	3000.00	2600.00	5600.00	100.00%

Progresiva		Lado Izquierdo		Lado Derecho	
Inicio (Km.)	Final (Km.)	Longitud (m)	Sección	Longitud (m)	Sección
3+000	4+000			1000.00	Tipo I
4+000	5+000			1000.00	Tipo I
5+000	5+600			600.00	Tipo I
Sub Total :		Tipo I =	0	Tipo I =	2,600
Total =		2,600.00			

Ítem	Descripción	Metrado	Und.
04.01	Reconformación de Cunetas (Sin revestir)	2,600.00	ml

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
 JULIO CASAR QUIMPERO ARANDA
 DNI N° 10031093
 REPRESENTANTE COMÚN

Loures Azucena Juárez Suarez
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 202358

Daysi Ruth Pianto Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP N° 78397

000361

SUSTENTO DE METRADOS

VALORIZACIÓN N° 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020


RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO - LONG.#5.600 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 UBICACIÓN: ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO
 MODALIDAD: CONTRATA
 RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
 INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA
 PPTO CONTRACTUAL: S/ 396,183.36 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
 FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-08-2020
 FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO ANTERIOR	METRADO EJECUTADO	METRADO ACUMULADO	% ACUMULADO
5	SEÑALIZACIÓN					
5.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	5.00	5.00	5.00	100.00%
5.02	SENALES PREVENTIVAS	und	10.00	10.00	10.00	100.00%
5.03	SENALES REGLAMENTARIAS	und	4.00	4.00	4.00	100.00%
5.04	SENALES INFORMATIVAS	und	2.00	2.00	2.00	100.00%


 Daysi Ruth Pianto Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP N° 78397


 Lourdes Azucena Juárez Suárez
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 202858


 CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
 Cesar Quirozosa Aranda
 REPRESENTANTE COMUN

000360

SUSTENTO DE METRADOS

VALORIZACIÓN N° 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHIJADERO - LONG.=5,600 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO

MODALIDAD: CONTRATA

RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ

INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA

PPTO CONTRACTUAL: S/ 396,183.36 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020

FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020

FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	METRADO ANTERIOR	METRADO EJECUTADO	METRADO ACUMULADO	% ACUMULADO
6	IMPACTO AMBIENTAL						
6.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0.45	0.00	0.45	0.45	100.00%
7	EMERGENCIA SANITARIA						
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gib	1.00	0.50	0.50	1.00	100.00%


Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

Julio César Chiriquiza Aranda
CIP N° 1953091
REPRESENTANTE COMUN

0000359




000358

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

SUSTENTO DE METRADOS


PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

RUTA 3: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ANGASMARCA – EL
INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN - LONG.=13.030 Km


Loides Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858




Daysi Ruth Piantó Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

Julio Cesar Quipuzcoa Aranda
DNI N° 49531091
REPRESENTANTE COMUN


EJECUCION DEL ITEM PAQUETE DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES
TRAMO: "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8.120 KM", - "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO LONG = 5.600 KM" - "ANGASMARCA - EL INGENIO -
CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG = 13.030 KM" - DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.


SUSTENTO DE METRADOS**VALORIZACIÓN N° 04****Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020**

RUTA 3: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN -
LONG.=13.030 Km

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO**UBICACIÓN:** ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN**MODALIDAD:** CONTRATA**RESIDENTE DE SERVICIO:** ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ**INSPECTOR DE SERVICIO:** ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA**PPTO CONTRACTUAL:** S/ 921,833.78 (CON IGV)**PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO:** 120 días cal.**FECHA DE ENTREGA DE TERRENO:** 29-08-2020**FECHA DE INICIO DE SERVICIO:** 22-09-2020**FECHA DE TERMINO DE SERVICIO:** 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	METRADO	METRADO	METRADO	% ACUMULADO
				ANTERIOR	EJECUTADO	ACUMULADO	
5	SEÑALIZACION						
5.01	STALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	13.00	0.00	13.00	13.00	100.00%
5.02	SENALES PREVENTIVAS	und	40.00	0.00	40.00	40.00	100.00%
5.03	SENALES REGLAMENTARIAS	und	8.00	0.00	8.00	8.00	100.00%
5.04	SENALES INFORMATIVAS	und	4.00	0	4.00	4.00	100.00%


 Lourdes Azucena Juárez Suárez
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 202858


 CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
 Julio Cesar Guzmán Aranda
 DNI N° 19531091
 REPRESENTANTE COMUN


 Daysi Ruth Pianto Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP N° 78397



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

ANÁLISIS DE VALORIZACIÓN MENSUAL

PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020



Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Quirozco Aranda
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN

ANALISIS DE VALORIZACION MENSUAL VALORIZACION N° 04 - GENERAL Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8.120 KM", - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG = 13.030 KM" - DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: "HUAYLACA - TAMBILLO" "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO" - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN"

MODALIDAD: CONTRATA

RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ

INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA

PPTO CONTRACTUAL: S/1,892,483.01 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 28-08-2020

FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020

FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRESUPUESTO BASE		ANTERIOR		ACTUAL		AVANCE DE LA RUTA N° 01, RUTA N° 02 Y RUTA N° 03		ACUMULADO		SALDOS	
				P.U. (S/)	PARCIAL (S/)	METRADO	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	%
1	TRABAJOS PRELIMINARES				24,917.42		14,540.59	10,376.84	24,917.42			24,917.42		0.00	
1.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	glb	3.00	S/	6,109.81	S/	1,50	1,50	8,377.05	54.30%	1,50	18,329.43	100.00%	0.00	0.00%
1.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	26.75	S/	246.28	S/	18.63	8.12	1,999.79	69.64%	8.12	6,587.99	100.00%	0.00	0.00%
2	PAVIMENTOS				775,850.73		478,204.76	297,632.29	775,850.73			775,850.73		0.00	
2.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	4,662.88	S/	31.82	S/	2,845.91	1,816.97	57,778.80	61.05%	1,816.97	4,662.88	100.00%	0.00	0.00%
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M	m3	11,534.52	S/	54.40	S/	7,094.06	4,440.46	239,844.49	61.77%	4,440.46	11,534.52	100.00%	0.00	0.00%
3	TRANSPORTES				395,936.00		230,433.32	166,514.74	395,936.00			395,936.00		0.00	
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	19,436.88	S/	9.88	S/	11,688.79	7,748.09	74,924.03	60.87%	7,748.09	19,436.88	100.00%	0.00	0.00%
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM	m3k	99,128.10	S/	1.75	S/	53,337.22	45,790.88	77,386.59	55.66%	45,790.88	99,128.10	100.00%	0.00	0.00%
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM	m3k	1,070.00	S/	8.08	S/	636.05	433.95	3,406.51	60.16%	433.95	1,070.00	100.00%	0.00	0.00%
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	12,305.00	S/	1.77	S/	6,507.60	5,797.40	9,797.61	54.07%	5,797.40	12,305.00	100.00%	0.00	0.00%
4	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				16,317.50		9,938.60	6,484.00	16,317.50			16,317.50		0.00	
4.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	26,750.00	S/	0.61	S/	16,030.00	10,720.00	6,484.00	60.91%	10,720.00	26,750.00	100.00%	0.00	0.00%
5	SEÑALIZACION				69,828.14		0.00	69,828.14	69,828.14			69,828.14		0.00	
5.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	26.00	S/	182.35	S/	0.00	26.00	4,741.10	0.00%	26.00	4,741.10	100.00%	0.00	0.00%
5.02	SENALES PREVENTIVAS	und	60.00	S/	781.07	S/	0.00	60.00	46,864.20	0.00%	60.00	46,864.20	100.00%	0.00	0.00%
5.03	SENALES REGLAMENTARIAS	und	18.00	S/	719.78	S/	0.00	18.00	12,956.04	0.00%	18.00	12,956.04	100.00%	0.00	0.00%
5.04	SENALES INFORMATIVAS	und	10.00	S/	526.68	S/	0.00	10.00	5,266.80	0.00%	10.00	5,266.80	100.00%	0.00	0.00%
6	IMPACTO AMBIENTAL				2,888.65		1,410.74	1,477.91	2,888.65			2,888.65		0.00	
6.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.15	S/	1,343.56	S/	1.05	1.10	1,477.91	48.84%	1.10	2,888.65	100.00%	0.00	0.00%
7	EMERGENCIA SANITARIA				108,869.52		44,081.58	64,693.65	108,869.52			108,869.52		0.00	
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	3.00	S/	36,289.84	S/	1.50	1.50	64,693.65	40.49%	1.50	108,869.52	100.00%	0.00	0.00%
COSTO DIRECTO					1,394,607.96		778,609.59	615,998.37	1,394,607.96	55.83%		1,394,607.96	100.00%	0.00	0.00%
GASTOS GENERALES					139,460.80		77,860.96	61,599.84	139,460.80			139,460.80		0.00	
UTILIDAD					69,730.40		38,930.48	30,799.92	69,730.40			69,730.40		0.00	
SUB TOTAL					1,603,799.16		895,401.03	708,398.13	1,603,799.16			1,603,799.16		0.00	
IGV					288,683.85		161,172.19	127,511.66	288,683.85			288,683.85		0.00	
COSTO TOTAL					1,892,483.01		#####	835,909.79	1,892,483.01			1,892,483.01		0.00	

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VAL CRUZ DE CHUCA
Julio Cesar Chupazova Aranda
ING. CIVIL
R. CIP. N° 78397

Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
R. CIP. N° 78397

002355

ANALISIS DE VALORIZACION MENSUAL

VALORIZACION Nº 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 1: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA - TAMBILLO - LONG.#8, 120 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
UBICACIÓN: HUAYLACA - TAMBILLO
MODALIDAD: CONTRATA
RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYS RUTH PIANTO MENDOZA
PPTO CONTRACTUAL: SI 574,465.87 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-09-2020
FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020
FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRESUPUESTO BASE		ANTERIOR		AVANCE		ACUMULADO		SALDOS	
				P.U.	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	METRADO	PARCIAL
				(S/.)	(S/.)								
1	TRABAJOS PRELIMINARES				8,622.78		0.00		8,622.78		8,622.78		0.00
1.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	gib	1.00	S/ 6,622.99	S/ 6,622.99	0.00	0.00%	1.00	6,622.99	1.00	6,622.99	0.00	0.00%
1.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	8.12	S/ 246.28	S/ 1,999.79	0.00	0.00%	8.12	1,999.79	8.12	1,999.79	0.00	0.00%
2	PAVIMENTOS				231,237.02		0.00		231,237.02		231,237.02		0.00
2.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	1,383.84	S/ 31.79	S/ 43,992.27	0.00	0.00%	1,383.84	43,992.27	1,383.84	43,992.27	0.00	0.00%
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M	m3	3,477.80	S/ 53.84	S/ 187,244.75	0.00	0.00%	3,477.80	187,244.75	3,477.80	187,244.75	0.00	0.00%
3	TRANSPORTES				115,559.69		0.00		115,559.69		115,559.69		0.00
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	5,833.97	S/ 9.87	S/ 58,414.49	0.00	0.00%	5,833.97	58,414.49	5,833.97	58,414.49	0.00	0.00%
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM	m3k	29,753.27	S/ 1.69	S/ 50,283.03	0.00	0.00%	29,753.27	50,283.03	29,753.27	50,283.03	0.00	0.00%
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM	m3k	324.80	S/ 7.85	S/ 2,549.68	0.00	0.00%	324.80	2,549.68	324.80	2,549.68	0.00	0.00%
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	3,735.20	S/ 1.69	S/ 6,312.49	0.00	0.00%	3,735.20	6,312.49	3,735.20	6,312.49	0.00	0.00%
4	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				4,872.00		0.00		4,872.00		4,872.00		0.00
4.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	8,120.00	S/ 0.60	S/ 4,872.00	0.00	0.00%	8,120.00	4,872.00	8,120.00	4,872.00	0.00	0.00%
5	SEÑALIZACION				15,683.68		0.00		15,683.68		15,683.68		0.00
5.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	8.00	S/ 181.98	S/ 1,455.84	0.00	0.00%	8.00	1,455.84	8.00	1,455.84	0.00	0.00%
5.02	SENALES PREVENTIVAS	und	10.00	S/ 780.46	S/ 7,804.60	0.00	0.00%	10.00	7,804.60	10.00	7,804.60	0.00	0.00%
5.03	SENALES REGLAMENTARIAS	und	6.00	S/ 719.42	S/ 4,316.52	0.00	0.00%	6.00	4,316.52	6.00	4,316.52	0.00	0.00%
5.04	SENALES INFORMATIVAS	und	4.00	S/ 528.68	S/ 2,114.72	0.00	0.00%	4.00	2,114.72	4.00	2,114.72	0.00	0.00%
6	IMPACTO AMBIENTAL				873.31		0.00		873.31		873.31		0.00
6.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0.65	S/ 1,343.56	S/ 873.31	0.00	0.00%	0.65	873.31	0.65	873.31	0.00	0.00%
7	EMERGENCIA SANITARIA				46,486.72		0.00		46,486.72		46,486.72		0.00
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gib	1.00	S/ 46,486.72	S/ 46,486.72	0.00	0.00%	1.00	46,486.72	1.00	46,486.72	0.00	0.00%
COSTO DIRECTO					423,335.20		0.00%		423,335.20		423,335.20		0.00%
GASTOS GENERALES					42,333.52		0.00		42,333.52		42,333.52		0.00
UTILIDAD					21,166.76		0.00		21,166.76		21,166.76		0.00
SUB TOTAL					486,835.48		0.00		486,835.48		486,835.48		0.00
IGV					87,630.39		0.00		87,630.39		87,630.39		0.00
COSTO TOTAL					574,465.87		0.00		574,465.87		574,465.87		0.00


Days Ruth Panto Mendoza
ING. CIVIL
CIP Nº 78397


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP Nº 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
JULIO CESAR QUINTANA ARANDA
CIP Nº 1081
REPRESENTANTE COMUN
000354

ANALISIS DE VALORIZACION MENSUAL

VALORIZACION N° 04


Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHLADERO - LONGO - 5,600 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
UBICACION: ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHLADERO
MODALIDAD: CONTRATA
RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIAATO MENDOZA
PPTO CONTRACTUAL: S/ 396,183.36 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-09-2020
FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020
FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	PRESUPUESTO BASE		METRADO	ANTERIOR		AVANCE		ACUMULADO		SALDOS	
			P.U. (S/.)	PARCIAL		METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES			4,887.30		3,133.24			1,754.06		4,887.30		0.00
1.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	dlb	S/ 3,508.13	S/ 3,508.13	1.00	0.50	1,754.07	50.00%	0.50	1,754.06	50.00%	1.00	3,508.13
1.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	S/ 246.28	S/ 1,379.17	5.60	5.60	1,379.17	100.00%	-	0.00	0.00%	5.60	1,379.17
2	PAVIMENTOS			155,978.82		89,592.65			66,386.27		155,978.82		0.00
2.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	S/ 31.83	S/ 31,929.83	1,003.13	570.00	18,143.10	56.82%	433.13	13,786.53	43.18%	1,003.13	31,929.83
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M	m3	S/ 54.64	S/ 124,049.19	2,270.30	1,307.64	71,449.45	57.60%	962.66	52,539.74	42.40%	2,270.30	124,049.19
3	TRANSPORTES			77,863.19		27,868.14			49,995.06		77,863.19		0.00
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	S/ 9.87	S/ 37,984.92	3,928.12	2,014.00	19,475.38	51.27%	1,914.12	18,509.54	48.73%	3,928.12	37,984.92
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM	m3k	S/ 1.69	S/ 33,856.43	20,033.39	3,995.78	6,752.87	19.95%	16,037.61	27,103.56	80.05%	20,033.39	33,856.43
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM	m3k	S/ 7.85	S/ 1,758.40	224.00	114.85	901.57	51.27%	109.15	856.83	48.73%	224.00	1,758.40
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	S/ 1.69	S/ 4,383.44	2,576.00	513.80	868.32	19.95%	2,062.20	3,485.12	80.05%	2,576.00	4,383.44
4	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE			3,472.00		1,860.00			1,612.00		3,472.00		0.00
4.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	S/ 0.62	S/ 3,472.00	5,600.00	3,000.00	1,860.00	53.57%	2,600.00	1,612.00	46.43%	5,600.00	3,472.00
5	SEÑALIZACION			12,646.54		0.00			12,646.54				0.00
5.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	S/ 181.98	S/ 909.90	5.00	0.00	0.00	0.00%	5.00	909.90	100.00%	5.00	909.90
5.02	SENALES PREVENTIVAS	und	S/ 780.46	S/ 7,804.60	10.00	0.00	0.00	0.00%	10.00	7,804.60	100.00%	10.00	7,804.60
5.03	SENALES REGLAMENTARIAS	und	S/ 719.42	S/ 2,877.38	4.00	0.00	0.00	0.00%	4.00	2,877.68	100.00%	4.00	2,877.68
5.04	SENALES INFORMATIVAS	und	S/ 526.68	S/ 1,053.36	2.00	0.00	0.00	0.00%	2.00	1,053.36	100.00%	2.00	1,053.36
6	IMPACTO AMBIENTAL			604.60		0.00			604.60				0.00
6.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	S/ 1,343.56	S/ 604.60	0.45	0.00	0.00	0.00%	0.45	604.60	100.00%	0.45	604.60
7	EMERGENCIA SANITARIA			36,413.86		18,208.93			18,208.93				0.00
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	dlb	S/ 36,413.86	S/ 36,413.86	1.00	0.50	18,208.93	50.00%	0.50	18,208.93	50.00%	1.00	36,413.86
COSTO DIRECTO													
GASTOS GENERALES		10.00%		291,955.31		#####	48.22%		151,184.45	51.78%		291,955.31	100.00%
UTILIDAD		5.00%		29,195.53		14,079.09			15,116.44			29,195.53	0.00
SUB TOTAL				14,597.77		7,039.54			7,558.23			14,597.77	0.00
IGV				335,748.61		#####			173,839.12			335,748.61	0.00
COSTO TOTAL		18.00%		60,434.75		29,143.71			31,291.04			60,434.75	0.00
				396,183.36		#####			205,130.16			396,183.36	0.00


Daysi Ruth Panto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 269353

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
JULIO CESAR GUERRA ARANDA
DNI/N° 18431091
REPRESENTANTE COMUN

000353

ANÁLISIS DE VALORIZACIÓN MENSUAL

VALORIZACIÓN N° 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 3: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATRIN - LONG. = 13,030 Km

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
UBICACIÓN: ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATRIN

CONTRATA

MODALIDAD: RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ

INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA

PPTO CONTRACTUAL: S/ 921,833.78 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020
FECHA DE TÉRMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO	PRESUPUESTO BASE		ANTERIOR		AVANCE		ACUMULADO		SALDOS	
				P.U. (S/.)	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	METRADO	PARCIAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES				11,407.35		11,407.35		0.00		11,407.35		0.00
1.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO	gib	1.00	S/ 8,198.32	S/ 8,198.32	1.00	8,198.32	1.00	0.00%	1.00	8,198.32	1.00	0.00%
1.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	13.03	S/ 246.28	S/ 3,209.03	13.03	3,209.03	13.03	0.00%	13.03	3,209.03	13.03	0.00%
2	PAVIMENTOS				388,612.21		388,612.21		0.00		388,612.21		0.00
2.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	2,275.91	S/ 31.83	S/ 72,442.22	2,275.91	72,442.22	2,275.91	0.00%	2,275.91	72,442.22	2,275.91	0.00%
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M	m3	5,786.42	S/ 54.64	S/ 316,169.99	5,786.42	316,169.99	5,786.42	0.00%	5,786.42	316,169.99	5,786.42	0.00%
3	TRANSPORTES				202,435.18		202,435.18		0.00		202,435.18		0.00
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	9,674.79	S/ 10.07	S/ 97,425.14	9,674.79	97,425.14	9,674.79	0.00%	9,674.79	97,425.14	9,674.79	0.00%
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM	m3k	49,341.44	S/ 1.82	S/ 89,801.42	49,341.44	89,801.42	49,341.44	0.00%	49,341.44	89,801.42	49,341.44	0.00%
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM	m3k	521.20	S/ 8.25	S/ 4,299.90	521.20	4,299.90	521.20	0.00%	521.20	4,299.90	521.20	0.00%
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	5,993.80	S/ 1.82	S/ 10,908.72	5,993.80	10,908.72	5,993.80	0.00%	5,993.80	10,908.72	5,993.80	0.00%
4	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				8,078.60		8,078.60		0.00		8,078.60		0.00
4.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	13,030.00	S/ 0.62	S/ 8,078.60	13,030.00	8,078.60	13,030.00	0.00%	13,030.00	8,078.60	13,030.00	0.00%
5	SEÑALIZACIÓN				41,498.72		41,498.72		0.00		41,498.72		0.00
5.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	13.00	S/ 182.72	S/ 2,375.36	13.00	2,375.36	13.00	0.00%	13.00	2,375.36	13.00	0.00%
5.02	SENALES PREVENTIVAS	und	40.00	S/ 781.37	S/ 31,254.80	40.00	31,254.80	40.00	0.00%	40.00	31,254.80	40.00	0.00%
5.03	SENALES REGLAMENTARIAS	und	8.00	S/ 720.23	S/ 5,761.84	8.00	5,761.84	8.00	0.00%	8.00	5,761.84	8.00	0.00%
5.04	SENALES INFORMATIVAS	und	4.00	S/ 526.68	S/ 2,106.72	4.00	2,106.72	4.00	0.00%	4.00	2,106.72	4.00	0.00%
6	IMPACTO AMBIENTAL				1,410.74		1,410.74		0.00		1,410.74		0.00
6.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	1.05	S/ 1,343.56	S/ 1,410.74	1.05	1,410.74	1.05	0.00%	1.05	1,410.74	1.05	0.00%
7	EMERGENCIA SANITARIA				25,874.65		25,874.65		0.00		25,874.65		0.00
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gib	1.00	S/ 25,874.65	S/ 25,874.65	1.00	25,874.65	1.00	0.00%	1.00	25,874.65	1.00	0.00%
COSTO DIRECTO					679,317.45		637,818.73		41,498.72		679,317.45		0.00
GASTOS GENERALES					67,931.75		63,781.87		4,148.88		67,931.75		0.00
UTILIDAD		10.00%			33,965.87		31,890.94		2,074.93		33,965.87		0.00
SUB TOTAL		5.00%			781,215.07		733,491.54		47,723.53		781,215.07		0.00
IGV		18.00%			140,618.71		132,028.48		8,590.23		140,618.71		0.00
COSTO TOTAL					921,833.78		865,520.02		56,313.78		921,833.78		0.00

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858CONSORCIO VAL CRUZ VECINARIA
Julio Cesar Churruariza Ayanda
DNI N° 16331091
REPRESENTANTE COMUNDaisy Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

000352





CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

HOJA DE CANCELACIÓN

PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020


 Daysi Ruth Piantto Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP N° 78397


 Lourdes Azucena Juárez Suárez
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

 Julio César Quirozco Aranda
 DNI N° 17531091
 REPRESENTANTE COMUN

HOJA DE CANCELACION
VALORIZACIÓN N° 04 - GENERAL
Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8.120 KM", - "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO LONG = 5.600 KM" - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG = 13.030 KM" - DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: "HUAYLACA - TAMBILLO" "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO" - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN"

MODALIDAD: CONTRATA

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.

RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020

INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA

FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020

PPTO CONTRACTUAL: S/ 1,892,483.01 (CON IGV)

FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL
VALORIZACION MENSUAL (sin IGV)		S/708,398.13
Valorización de Servicio N° 02: V01 (sin IGV)	S/708,398.13	
Deducción de Reajustes: D		S/0.00
Deducción del Reajuste que No corresponde por Adelanto Directo	S/0.00	
Deducción del Reajuste que No corresponde por Pago a cuenta Materiales N° 01	S/0.00	
VALORIZACION BRUTA: $V_B = V_{01} - D =$		S/708,398.13
Amortización de Adelantos: A		S/0.00
Amortización por Adelanto Directo	S/0.00	
Amortización por Pago a Cuenta Materiales N° 01	S/0.00	
VALORIZACION NETA: $V_N = V_B - A =$		S/708,398.13
COSTO DIRECTO		S/615,998.37
GASTOS GENERALES	10.00%	S/61,599.84
UTILIDAD	5.00%	S/30,799.92
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS: I.G.V.	18.00%	S/127,511.66
MONTO A CANCELAR: $I.G.V. + V_N =$		S/835,909.79

NOTA: RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 10% DE ACUERDO A CONTRATO


A CALCULAR POR LA ENTIDAD

MONTO TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA	S/835,909.79
--	---------------------

SON:

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 79/100 SOLES


 Lourdes Azucena Juarez Suarez
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 202356


 CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
 Julio Cesar Ampuzcoa Arendu
 DNI N° 19631091
 REPRESENTANTE COMUN



 Daysi Ruth Pianto Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP N° 78397

HOJA DE CANCELACION

VALORIZACIÓN N° 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 1:SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA - TAMBILLO - LONG.=8.120 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: HUAYLACA - TAMBILLO

MODALIDAD: CONTRATA

RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ

INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA

PPTO CONTRACTUAL: S/ 574,465.87 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020

FECHA DE INICIO DE SERVICIO:22-09-2020

FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL
VALORIZACION MENSUAL (sin IGV)		S/486,835.48
Valorización de Servicio N° 02: V01 (sin IGV)	S/486,835.48	
Deducción de Reajustes: D		S/0.00
Deducción del Reajuste que No corresponde por Adelanto Directo	S/0.00	
Deducción del Reajuste que No corresponde por Pago a cuenta Materiales N° 01	S/0.00	
VALORIZACION BRUTA: $V_B = V_{01} - D =$		S/486,835.48
Amortización de Adelantos: A		S/0.00
Amortización por Adelanto Directo	S/0.00	
Amortización por Pago a Cuenta Materiales N° 01	S/0.00	
VALORIZACION NETA: $V_N = V_B - A =$		S/486,835.48
COSTO DIRECTO		S/423,335.20
GASTOS GENERALES	10.00%	S/42,333.52
UTILIDAD	5.00%	S/21,166.76
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS: I.G.V.	18.00%	S/87,630.39
MONTO A CANCELAR: $I.G.V. + V_N =$		S/574,465.87

NOTA: RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 10% DE ACUERDO A CONTRATO


A CALCULAR POR LA ENTIDAD

MONTO TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA	S/574,465.87
---------------------------------------	--------------

SON:

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 87/100 SOLES


 Daysi Ruth Pianto Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP N° 78397


 Lourdes Azucena Juárez Suárez
 ING. CIVIL
 R. CIP-N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCO

 Julio César Quirozosa Aranda
 INI N° 19337001
 REPRESENTANTE COMUN

000349

HOJA DE CANCELACION

VALORIZACIÓN Nº 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO - LONG.-5.600 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 UBICACIÓN: ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO
 MODALIDAD: CONTRATA
 RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
 INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA
 PPTO CONTRACTUAL: S/ 396,183.36 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
 FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020
 FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL
VALORIZACION MENSUAL (sin IGV)		S/173,839.12
Valorización de Servicio Nº 02: V01 (sin IGV)	S/173,839.12	
Deducción de Reajustes: D		S/0.00
Deducción del Reajuste que No corresponde por Adelanto Directo	S/0.00	
Deducción del Reajuste que No corresponde por Pago a cuenta Materiales Nº 01	S/0.00	
VALORIZACION BRUTA: $V_B = V_{01} - D =$		S/173,839.12
Amortización de Adelantos: A		S/0.00
Amortización por Adelanto Directo	S/0.00	
Amortización por Pago a Cuenta Materiales Nº 01	S/0.00	
VALORIZACION NETA: $V_N = V_B - A =$		S/173,839.12
COSTO DIRECTO		S/151,164.45
GASTOS GENERALES	10.00%	S/15,116.45
UTILIDAD	5.00%	S/7,558.22
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS: I.G.V.	18.00%	S/31,291.04
MONTO A CANCELAR: $I.G.V. + V_N =$		S/205,130.16

NOTA: RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 10% DE ACUERDO A CONTRATO
 A CALCULAR POR LA ENTIDAD

MONTO TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA	S/205,130.16
---------------------------------------	--------------

SON: DOS CIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA CON 16/100 SOLES


 Daysi Ruth Pianto Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP Nº 78397


 Lourdes Azucena Juárez Suárez
 ING. CIVIL
 R. CIP. Nº 202353


 CONEJO VIAL CRUZ DE CHUCA
 JULIA CESAR ORTIZ ARANDA
 DN/ Nº 1983908
 REPRESENTANTE COMUN

000348

HOJA DE CANCELACION
VALORIZACIÓN N° 04
Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

ruta 3: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN - LONG.=13.030 Km

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN

MODALIDAD: CONTRATA

RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ

INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA

PPTO CONTRACTUAL: S/ 921,833.78 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020

FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020

FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL
VALORIZACION MENSUAL (sin IGV)		S/47,723.53
Valorización de Servicio N° 02: V01 (sin IGV)	S/47,723.53	
Deducción de Reajustes: D		S/0.00
Deducción del Reajuste que No corresponde por Adelanto Directo	S/0.00	
Deducción del Reajuste que No corresponde por Pago a cuenta Materiales N° 01	S/0.00	
VALORIZACION BRUTA: $V_B = V_{01} - D =$		S/47,723.53
Amortización de Adelantos: A		S/0.00
Amortización por Adelanto Directo	S/0.00	
Amortización por Pago a Cuenta Materiales N° 01	S/0.00	
VALORIZACION NETA: $V_N = V_B - A =$		S/47,723.53
COSTO DIRECTO		S/41,498.72
GASTOS GENERALES	10.00%	S/4,149.88
UTILIDAD	5.00%	S/2,074.93
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS: I.G.V.	18.00%	S/8,590.23
MONTO A CANCELAR: I.G.V. + $V_N =$		S/56,313.76

NOTA: RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 10% DE ACUERDO A CONTRATO

A CALCULAR POR LA ENTIDAD

MONTO TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA	S/56,313.76
--	--------------------

SON:

CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE CON 76/100 SOLES


 Lourdes Azucena Juárez Suárez
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 202858


 CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
 Julio César Quiroz Aranda
 DNI N° 10531091
 REPRESENTANTE COMÚN


 Daysi Ruth Pianto Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP N° 78397




CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

CUADRO COMPARATIVO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO - EJECUTADO - PAGADO

PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020


 Daysi Ruth Plante Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP N° 78397


 Lourdes Azucena Juárez Suárez
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

 Julio César Quiroz Aranda
 DNI N° 9531091
 REPRESENTANTE COMUN

CUADRO COMPARATIVO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO - EJECUTADO-PAGADO

VALORIZACIÓN N° 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 1:SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA - TAMBILLO - LONG =8.120 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: HUAYLACA - TAMBILLO

MODALIDAD: CONTRATA

RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ

INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA

PPTO CONTRACTUAL: S/ 674,466.87 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020

FECHA DE INICIO DE SERVICIO:22-09-2020

FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO BASE			PROGRAMADO			EJECUTADO			AVANCE	
		UND	METRADO	P.U. (S/.)	PARCIAL (S/.)	METRADO	PARCIAL	METRADO	PARCIAL		METRADO	ESTADO
1	OBRAS PRELIMINARES				8,622.78		8,622.78		8,622.78			
1.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	qlb	1.00	S/ 6,622.99	S/ 6,622.99	1.00	6,622.99	1.00	6,622.99	100.00%	1.00	CULMINADO
1.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	8.12	S/ 246.28	S/ 1,999.79	8.12	1,999.79	8.12	1,999.79	100.00%	8.12	CULMINADO
2	PAVIMENTOS				231,237.02		231,237.02		231,237.02			
2.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	1,383.84	S/ 31.79	S/ 43,992.27	1,383.84	43,992.27	1,383.84	43,992.27	100.00%	1,383.84	CULMINADO
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M	m3	3,477.80	S/ 53.84	S/ 187,244.75	3,477.80	187,244.75	3,477.80	187,244.75	100.00%	3,477.80	CULMINADO
3	TRANSPORTES				115,559.69		115,559.69		115,559.69			
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	5,833.97	S/ 9.67	S/ 56,414.49	5,833.97	56,414.49	5,833.97	56,414.49	100.00%	5,833.97	CULMINADO
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM	m3k	29,753.27	S/ 1.69	S/ 50,283.03	29,753.27	50,283.03	29,753.27	50,283.03	100.00%	29,753.27	CULMINADO
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM	m3k	324.80	S/ 7.85	S/ 2,549.68	324.80	2,549.68	324.80	2,549.68	100.00%	324.80	CULMINADO
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	3,735.20	S/ 1.69	S/ 6,312.49	3,735.20	6,312.49	3,735.20	6,312.49	100.00%	3,735.20	CULMINADO
4	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				4,872.00		4,872.00		4,872.00			
4.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	8,120.00	S/ 0.60	S/ 4,872.00	8,120.00	4,872.00	8,120.00	4,872.00	100.00%	8,120.00	CULMINADO
5	SEÑALIZACION				15,683.68		15,683.68		15,683.68			
5.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	8.00	S/ 181.98	S/ 1,455.84	8.00	1,455.84	8.00	1,455.84	100.00%	8.00	CULMINADO
5.02	SENALES PREVENTIVAS	und	10.00	S/ 780.46	S/ 7,804.60	10.00	7,804.60	10.00	7,804.60	100.00%	10.00	CULMINADO
5.03	SENALES REGLAMENTARIAS	und	6.00	S/ 719.42	S/ 4,316.52	6.00	4,316.52	6.00	4,316.52	100.00%	6.00	CULMINADO
5.04	SENALES INFORMATIVAS	und	4.00	S/ 526.68	S/ 2,106.72	4.00	2,106.72	4.00	2,106.72	100.00%	4.00	CULMINADO
6	IMPACTO AMBIENTAL				873.31		873.31		873.31			
6.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0.65	S/ 1,343.56	S/ 873.31	0.65	873.31	0.65	873.31	100.00%	0.65	CULMINADO
7	EMERGENCIA SANITARIA				46,486.72		46,486.72		46,486.72			
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	qlb	1.00	S/ 46,486.72	S/ 46,486.72	1.00	46,486.72	1.00	46,486.72	100.00%	1.00	CULMINADO
COSTO DIRECTO					423,336.20		423,336.20		423,336.20			
GASTOS GENERALES		10.00%			42,333.52		42,333.52		42,333.52			
UTILIDAD		5.00%			21,166.76		21,166.76		21,166.76			
SUB TOTAL					486,836.48		486,836.48		486,836.48			
IGV		18.00%			87,630.39		87,630.39		87,630.39			
COSTO TOTAL					674,466.87		674,466.87		674,466.87	100.00%	100.00%	CULMINADO



 Daysi Ruth Pianto Mendoza

 ING. CIVIL

 CIP N° 78397



 Lourdes Azucena Juárez Suárez

 ING. CIVIL

 R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA



 JUNIO 2019

 DNI N° 19831091

 REPRESENTANTE COMUN

000345

CUADRO COMPARATIVO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO - EJECUTADO-PAGADO

VALORIZACIÓN Nº 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO - LONG.-5.600 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 UBICACIÓN: ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO
 MODALIDAD: CONTRATA
 RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
 INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA
 PPTO CONTRACTUAL: SI 396,183.36 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
 FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-08-2020
 FECHA DE TÉRMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO BASE				PROGRAMADO			EJECUTADO			AVANCE	
		UND	METRADO	P.U. (S/.)	PARCIAL (S/.)	METRADO	PARCIAL		METRADO	PARCIAL		METRADO	ESTADO
1	OBRAS PRELIMINARES				4,687.30		2,306.73			1,754.06			
1.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO	glb	1.00	S/ 3,508.13	S/ 3,508.13		0.50	1,754.07	0.50	1,754.06	50.00%		CULMINADO
1.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	5.60	S/ 246.28	S/ 1,379.17		2.24	551.67	0.00	-	0.00%		CULMINADO
2	PAVIMENTOS				156,978.82		46,793.66			66,386.27			
2.01	CAPA NIVELANTE E-0.05 M	m3	1,003.13	S/ 31.83	S/ 31,929.63	300.94	9,578.89	30.00%	433.13	13,786.53	43.18%	1,003.13	CULMINADO
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA APÍRMADO F-0.15 M	m3	2,270.30	S/ 54.64	S/ 124,049.19	681.09	37,214.76	30.00%	962.66	52,599.74	42.40%	2,270.30	CULMINADO
3	TRANSPORTES				77,963.19		23,386.96			49,955.06			
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	3,928.12	S/ 9.67	S/ 37,984.92	1,178.44	11,395.48	30.00%	1914.12	18,509.54	48.73%	3,928.12	CULMINADO
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM	m3k	20,033.39	S/ 1.69	S/ 33,856.43	6,010.02	10,156.93	30.00%	16,037.61	27,103.56	80.05%	20,033.39	CULMINADO
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM	m3k	224.00	S/ 7.85	S/ 1,758.40	67.20	527.52	30.00%	109.15	866.83	48.73%	224.00	CULMINADO
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	2,576.00	S/ 1.69	S/ 4,353.44	772.80	1,306.03	30.00%	2,062.20	3,485.12	80.05%	2,576.00	CULMINADO
4	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				3,472.00		694.40			1,612.00			
4.01	RECONFORMACIÓN DE CUNETAS	ml	5,600.00	S/ 0.62	S/ 3,472.00	1,120.00	694.40	20.00%	2,600.00	1,612.00	46.43%	5,600.00	CULMINADO
6	SEÑALIZACIÓN				12,645.64		3,793.66			12,645.64			
5.01	INSTALACIÓN DE POSTES KILOMÉTRICOS	und	5.00	S/ 181.98	S/ 909.90	1.50	272.97	30.00%	5.00	909.90	100.00%	5.00	CULMINADO
5.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	10.00	S/ 780.46	S/ 7,804.60	3.00	2,341.38	30.00%	10.00	7,804.60	100.00%	10.00	CULMINADO
5.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	4.00	S/ 719.42	S/ 2,877.68	1.20	863.30	30.00%	4.00	2,877.68	100.00%	4.00	CULMINADO
5.04	SEÑALES INFORMATIVAS	und	2.00	S/ 526.68	S/ 1,053.36	0.60	316.01	30.00%	2.00	1,053.36	100.00%	2.00	CULMINADO
6	IMPACTO AMBIENTAL				604.60		0.00			604.60			
6.01	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ÁREAS OCUPADAS	ha	0.45	S/ 1,343.56	S/ 604.60	0.00	0.00	0.00%	0.45	604.60	100.00%	0.45	CULMINADO
7	EMERGENCIA SANITARIA				36,413.86		18,206.93			18,206.93			
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	S/ 36,413.86	S/ 36,413.86	0.50	18,206.93	50.00%	0.50	18,206.93	50.00%	1.00	CULMINADO
COSTO DIRECTO					291,966.31		96,180.33			151,164.45			
GASTOS GENERALES		10.00%			29,196.63		9,618.03			15,116.45			
UTILIDAD		5.00%			14,597.77		4,759.02			7,558.22			
SUB TOTAL					336,748.61		109,457.38			173,839.12			
IGV		18.00%			60,434.75		19,702.33			31,291.04			
COSTO TOTAL					396,183.36		129,159.70	32.60%		205,130.16	51.76%	100.00%	CULMINADO


 Daysi Ruth Pianto Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP Nº 78397


 Lourdes Azucena Juárez Suárez
 ING. CIVIL
 R. CIP. Nº 202853


 CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
 Julio Cesar Cipusaca Aranda
 DNI Nº 19631061
 REPRESENTANTE COMUN

000344

CUADRO COMPARATIVO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO - EJECUTADO-PAGADO

VALORIZACIÓN N° 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 3: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN - LONG.=13.030 Km

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
UBICACIÓN: ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN
MODALIDAD: CONTRATA
RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA
PPTO CONTRACTUAL: SI 921,833.78 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020
FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO BASE			REPROGRAMADO			EJECUTADO			AVANCE	
		UND	METRADO	P.U. (S/.)	PARCIAL (S/.)	METRADO	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	METRADO	METRADO	ESTADO
1	OBRAS PRELIMINARES				11,407.35		4,099.16					
1.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	glb	1.00	8,198.32	S/ 8,198.32	0.50	4,099.16	0.00	-	0.00	1.00	CULMINADO
1.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	13.03	246.28	S/ 3,209.03	0.00	0.00	0.00	-	0.00	13.03	CULMINADO
2	PAVIMENTOS				388,612.21		0.00					
2.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	2,275.91	31.83	S/ 72,442.22	0.00	0.00	0.00	-	0.00	2,275.91	CULMINADO
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M	m3	5,786.42	54.64	S/ 316,169.99	0.00	0.00	0.00	-	0.00	5,786.42	CULMINADO
3	TRANSPORTES				202,435.18		0.00					
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	9,674.79	10.07	S/ 97,425.14	0.00	0.00	0.00	-	0.00	9,674.79	CULMINADO
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM	m3k	49,341.44	1.82	S/ 89,801.42	0.00	0.00	0.00	-	0.00	49,341.44	CULMINADO
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM	m3k	521.20	8.25	S/ 4,299.90	0.00	0.00	0.00	-	0.00	521.20	CULMINADO
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	5,993.80	1.82	S/ 10,908.72	0.00	0.00	0.00	-	0.00	5,993.80	CULMINADO
4	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				8,078.60		0.00					
4.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	13,030.00	0.62	S/ 8,078.60	0.00	0.00	0.00	-	0.00	13,030.00	CULMINADO
5	SEÑALIZACION				41,498.72		41,498.72					
5.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	13.00	182.72	S/ 2,375.36	13.00	2,375.36	13.00	2375.36	13.00	13.00	CULMINADO
5.02	SENALES PREVENTIVAS	und	40.00	781.37	S/ 31,254.80	40.00	31,254.80	40.00	31,254.80	40.00	40.00	CULMINADO
5.03	SENALES REGLAMENTARIAS	und	8.00	720.23	S/ 5,761.84	8.00	5,761.84	8.00	5,761.84	8.00	8.00	CULMINADO
5.04	SENALES INFORMATIVAS	und	4.00	526.68	S/ 2,106.72	4.00	2,106.72	4.00	2,106.72	4.00	4.00	CULMINADO
6	IMPACTO AMBIENTAL				1,410.74		0.00					
6.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	1.05	1,343.56	S/ 1,410.74	0.00	0.00	0.00	-	0.00	1.05	CULMINADO
7	EMERGENCIA SANITARIA				25,874.65		0.00					
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	25,874.65	S/ 25,874.65	0.00	0.00	0.00	-	0.00	1.00	CULMINADO
COSTO DIRECTO					679,317.45		45,597.87					
GASTOS GENERALES		10.00%			67,931.75		4,559.79					
UTILIDAD		5.00%			33,965.87		2,279.89					
SUB TOTAL					781,215.07		52,437.55					
IGV		18.00%			140,618.71		9,438.75					
COSTO TOTAL					921,833.78		61,876.30				100.00%	CULMINADO

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCO
Julio Cesar Ojeda Aranda
DNI N° 18631091
REPRESENTANTE COMUN

Loures Azucena Juarez Suarez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202856

Dayis Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

000343



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

CUADRO DE BARRAS Y CURVAS

PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020



Daysi Ruth Pianta Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

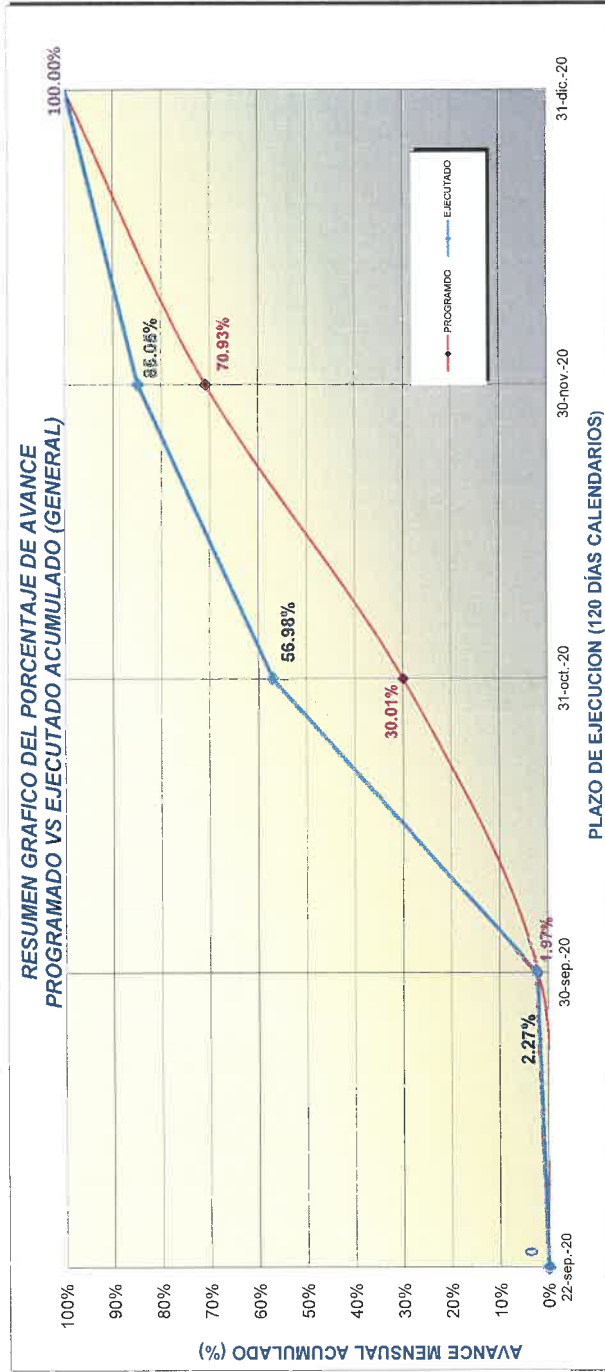
CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Quirozcos Aranda
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN

CURVA S (Porcentual)
VALORIZACIÓN N° 04
Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8.120 KM", - "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHLADERO LONG = 5.600 KM" - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG = 13.030 KM" - DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 UBICACIÓN: "HUAYLACA - TAMBILLO" "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHLADERO" - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN"
 MODALIDAD: CONTRATA
 RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
 INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA
 PPTO CONTRACTUAL: SI 1,892,483.01 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
 FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020
 FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020



Lourdes Azucena Juárez Suárez
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 202353

CONSORCIO AL CRUZ DE CHUCA
Julio Cesar Campuzosa Aranda
 DNI N° 18931091
 REPRESENTANTE COMÚN

Daysi Ruth Pianto Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP N° 78397

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

PERIODO	MONTOS (Incl IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL Si.	ACUMUL. Si.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Del 22-sep.-20 al 30-sep.-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Del 1-oct.-20 al 31-oct.-20	18,137.45	18,137.45	1.97%	1.97%
Del 1-nov.-20 al 30-nov.-20	258,446.29	276,583.74	28.04%	30.01%
Del 1-dic.-20 al 31-dic.-20	774,409.75	1,050,993.49	40.92%	70.93%
TOTAL	841,489.52	1,892,483.01	29.07%	100.00%

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

PERIODO	MONTOS (Incl IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL Si.	ACUMUL. Si.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Del 22-sep.-20 al 30-sep.-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Del 1-oct.-20 al 31-oct.-20	20,944.13	20,944.13	2.27%	2.27%
Del 1-nov.-20 al 30-nov.-20	504,337.30	525,281.43	54.71%	56.98%
Del 1-dic.-20 al 15-dic.-20	531,291.79	1,056,573.22	28.07%	85.05%
TOTAL	835,909.79	1,892,483.01	14.95%	100.00%

000341

CURVA S (Financiero)

VALORIZACIÓN N° 04 - GENERAL

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8.120 KM", - "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO LONG = 5.600 KM" - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG = 13.030 KM" - DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: "HUAYLACA - TAMBILLO" - "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO" - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN"

MODALIDAD: CONTRATA

RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ

INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA

PPTO CONTRACTUAL: S/ 1,892,483.01 (CON IGV)

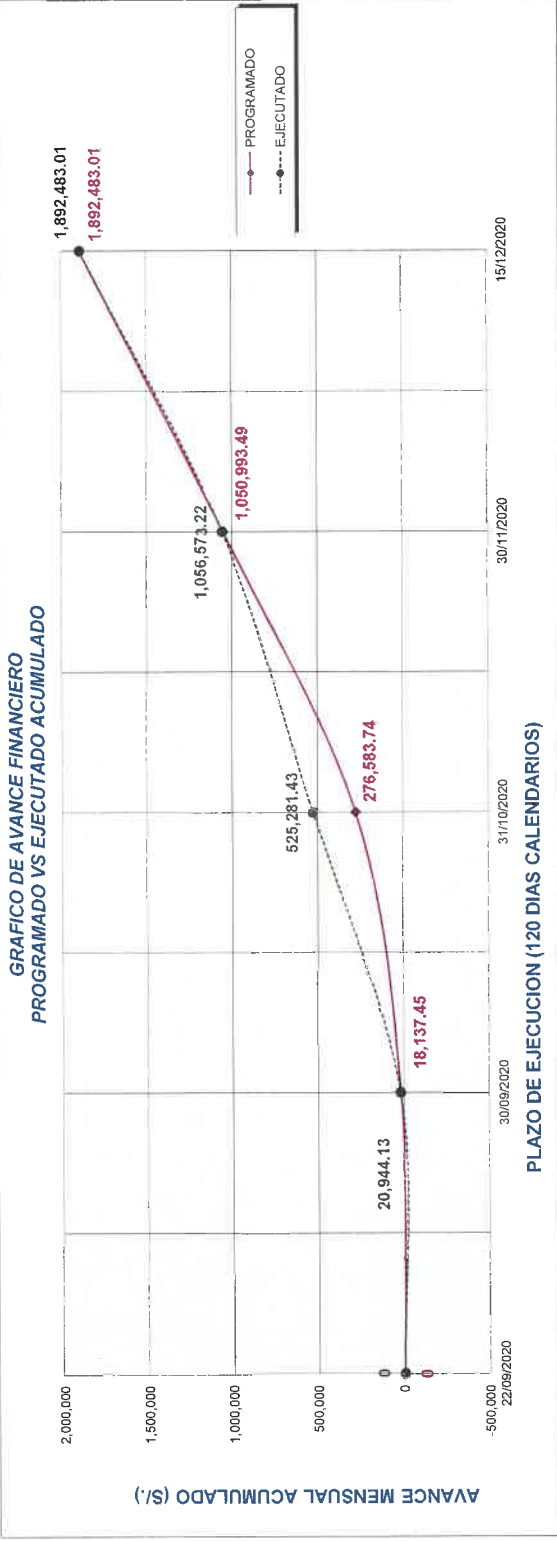
PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020

FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020

FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

GRAFICO DE AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO VS EJECUTADO ACUMULADO



ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
JULIO CESAR AMPUZCOA ARANDA
DNI N° 19831091
REPRESENTANTE COMUN

DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA
ING. CIVIL
CIP N° 78397

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (INC/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
	S/.	S/.	%	%
22/08/2020	0.00	0	0	0
30/09/2020	20,944.13	20,944.13	2.27%	2.27%
31/10/2020	504,337.30	525,281.43	54.71%	56.98%
30/11/2020	531,291.79	1,056,573.22	28.07%	85.05%
15/12/2020	835,909.79	1,892,483.01	14.95%	100.00%
TOTAL	1,892,483.01		100.00%	

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

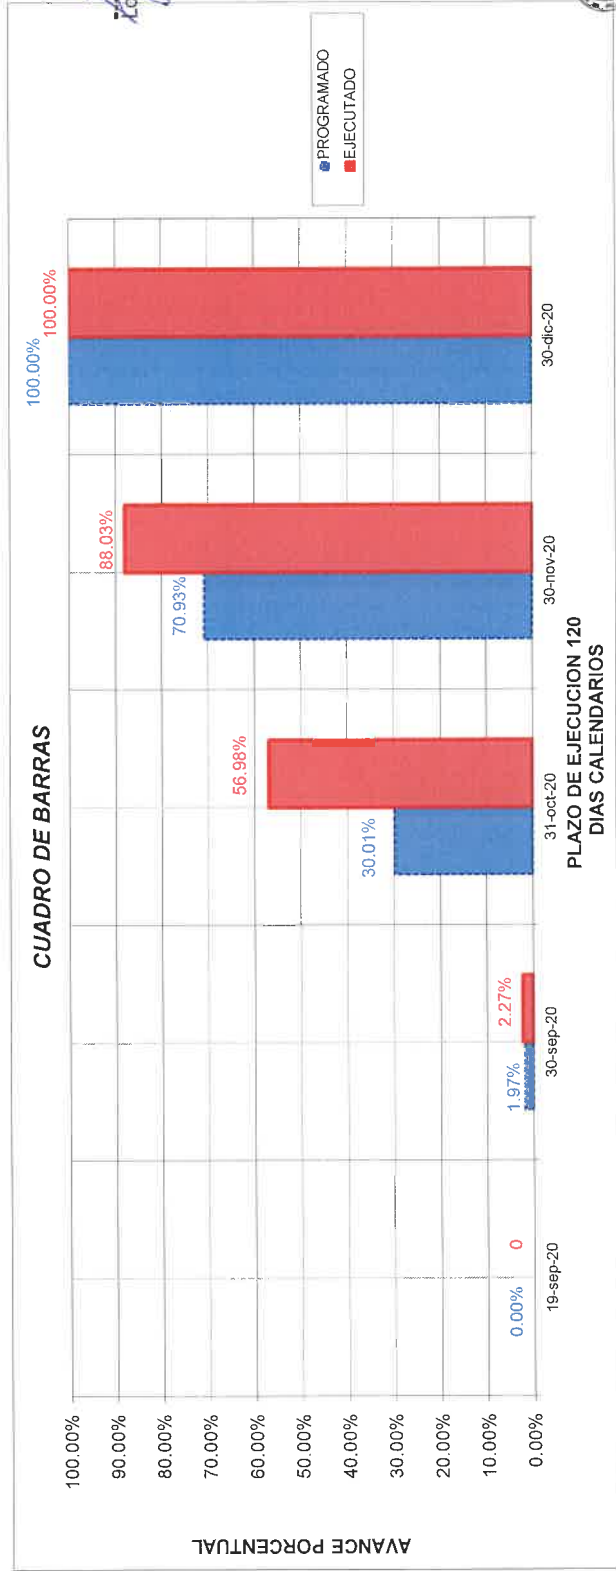
MES	MONTOS (INC/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
	S/.	S/.	%	%
22/08/2020	0	0	0	0
30/09/2020	18,137.45	18,137.45	1.97%	1.97%
31/10/2020	258,446.29	276,583.74	28.04%	30.01%
30/11/2020	774,409.75	1,050,993.49	40.92%	70.93%
31/12/2020	841,489.52	1,892,483.01	29.07%	100.00%
TOTAL	1,892,483.01		100.00%	

000340

CUADRO DE BARRAS VALORIZACIÓN N° 04 - GENERAL Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8.120 KM", - "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUJADERO LONG = 5.600 KM" - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG = 13.030 KM" - DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 UBICACIÓN: "HUAYLACA - TAMBILLO" "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUJADERO" - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN"
 MODALIDAD: CONTRATA
 RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
 INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA
 PPTO CONTRACTUAL: S/ 1,892,483.01 (CON IGTV)
 PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
 FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020
 FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020



[Signature]
 Lourdes Azucena Juárez Suárez
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 202353

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
[Signature]
 Julio Cesar Tupuzcoa Ayarida
 CNI N° 19631001
 REPRESENTANTE COMÚN

[Signature]
 Daysi Ruth Pianto Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP N° 78397

VALORIZACION EJECUTADO

VALORIZACION	MONTOS (Inc IGTV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	(Inc IGTV) ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
19-sep-20	0.00	0.00	0.00	0
30-sep-20	S/ 20,944.13	S/ 20,944.13	2.27%	2.27%
31-oct-20	S/ 504,337.30	S/ 525,281.43	54.71%	56.98%
30-nov-20	S/ 531,291.79	S/ 1,056,573.22	28.07%	88.03%
15-dic-20	S/ 835,909.79	S/ 1,892,483.01	14.95%	100.00%
TOTAL	#####	#####	100.00%	

VALORIZACION PROGRAMADO

VALORIZACION	MONTOS (Inc IGTV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	(Inc IGTV) ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
19-sep-20	0	0	0	0
30-sep-20	S/ 18,137.45	S/ 18,137.45	1.97%	1.97%
31-oct-20	S/ 258,446.29	S/ 276,583.74	28.04%	30.01%
30-nov-20	S/ 774,409.75	S/ 1,050,993.49	40.92%	70.93%
30-dic-20	S/ 841,489.52	S/ 1,892,483.01	29.07%	100.00%
TOTAL	1,892,483.01		100.00%	

Situación del Servicio con Respecto al Avance Acumulado Ejecutado VS Acumulado Programado

Adelantada en (%) CULMINADA
 Atrasada en (%)

000339



000338

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA


CUADRO DE BARRAS Y CURVA S

PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 1:SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA – TAMBILLO - LONG.=8.120 Km"



Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858


CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Quirozco Aranda
DNI N° 19831091
REPRESENTANTE COMUN

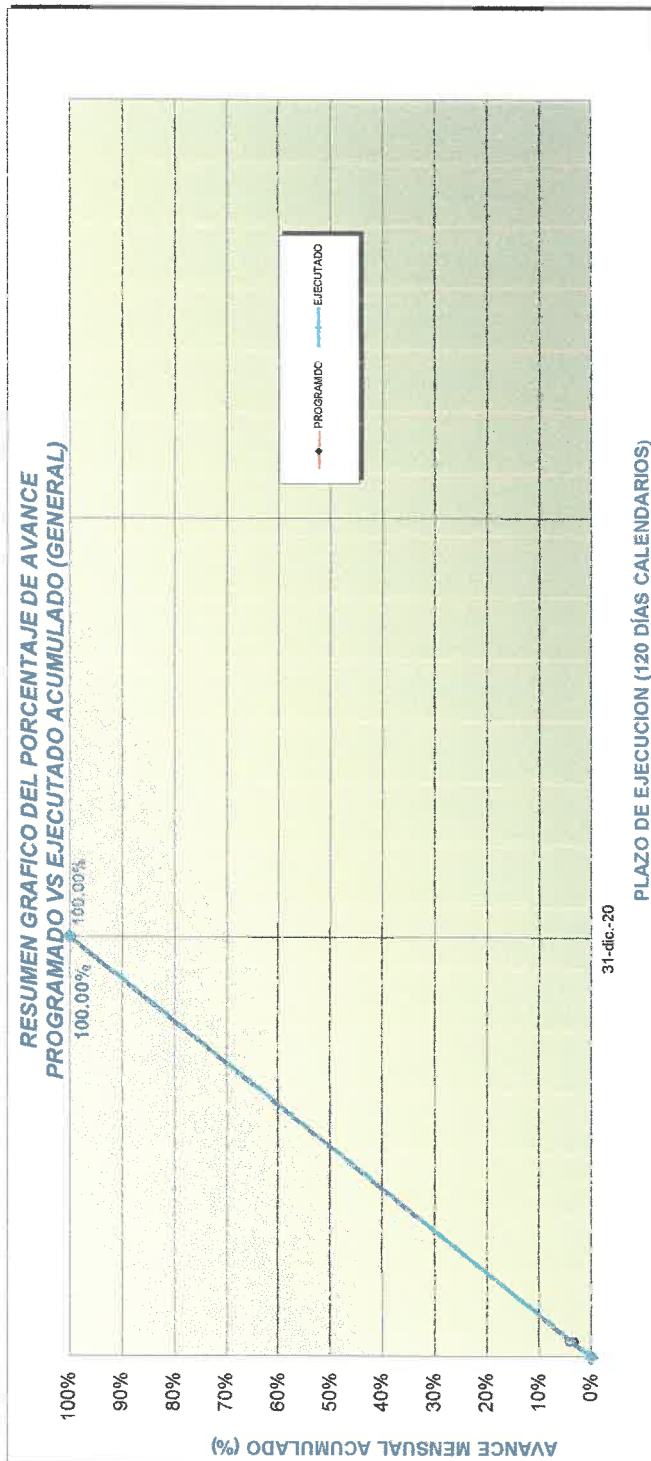
CURVA S (Porcentual) VALORIZACIÓN Nº 03

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 1:SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA - TAMBILLO - LONG =8.120 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
UBICACIÓN: HUAYLACA - TAMBILLO
MODALIDAD: CONTRATA
RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA
PPTO CONTRACTUAL: S/ 574,465.87 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020
FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020



Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS					
PERIODO	MONTOS (Inc/IGV)		PORCENTAJES		
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.	
Del 1-dic-20 al 31-Dic-20	S/. 574,465.87	574,465.87	0.00%	100.00%	0.00%
TOTAL	574,465.87		0.00%		

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS					
PERIODO	MONTOS (Inc/IGV)		PORCENTAJES		
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.	
Del 1-dic-20 al 15-Dic-20	S/. 574,465.87	574,465.87	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL	574,465.87		100.00%		100.00%

CONSORCIO VAL CRUZ DE CHUCO
Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

000337

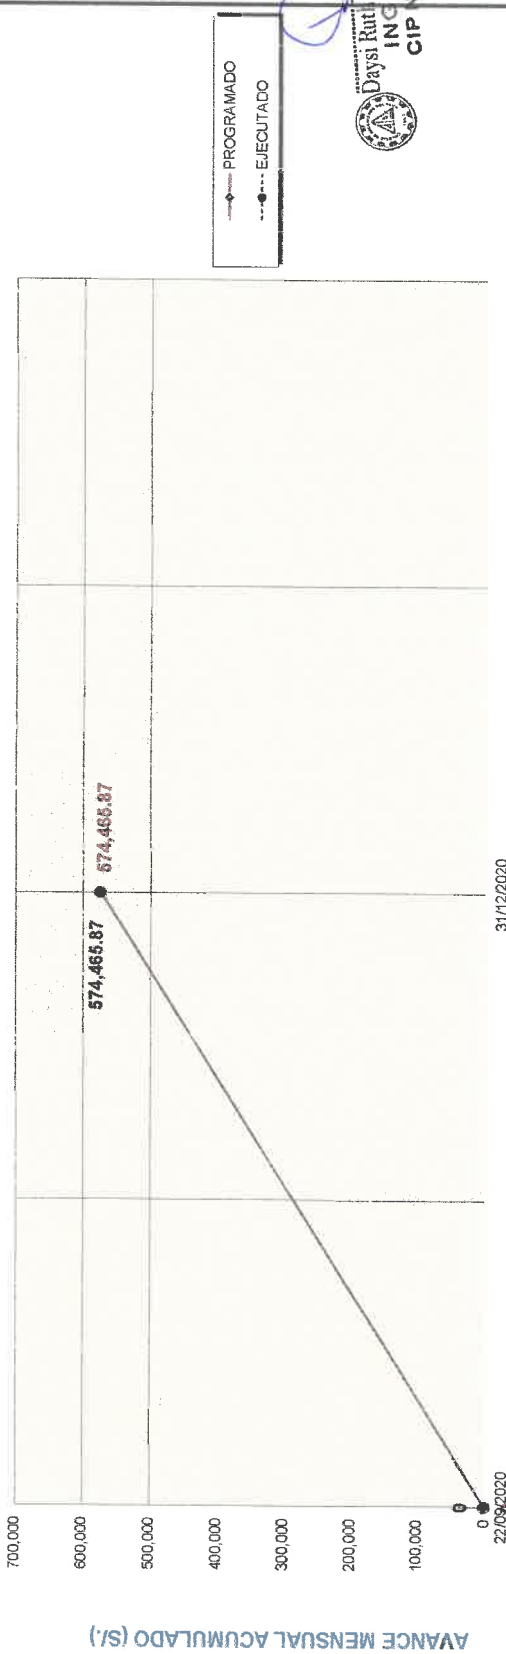
CURVA S (Financiero)
VALORIZACIÓN N° 04
Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 1: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA - TAMBILLO - LONG.=8.120 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 UBICACIÓN: HUAYLACA - TAMBILLO
 MODALIDAD: CONTRATA
 RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUÁREZ SUÁREZ
 INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA
 PPTO CONTRACTUAL: S/ 574,465.87 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
 FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020
 FECHA DE TÉRMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

GRÁFICO DE AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO VS EJECUTADO ACUMULADO



DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA
 ING. CIVIL
 CIP N° 78397

PLAZO DE EJECUCIÓN (120 DÍAS CALENDARIOS)

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (INC/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22/09/2020	0	0	0	0
31/12/2020	574,465.87	574,465.87	100.00%	100.00%
TOTAL	574,465.87		100.00%	

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (INC/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22/09/2020	0.00	0	0	0
15/12/2020	574,465.87	574,465.87	100.00%	100.00%
TOTAL	574,465.87		100.00%	

LOURDES AZUCENA JUÁREZ SUÁREZ
 ING. CIVIL
 R. CIP N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCO
 JULIO CESAR OLIVERA ARANDA
 INGENIERO EN CARRETERAS
 REPRESENTANTE COMÚN

000336

CUADRO DE BARRAS

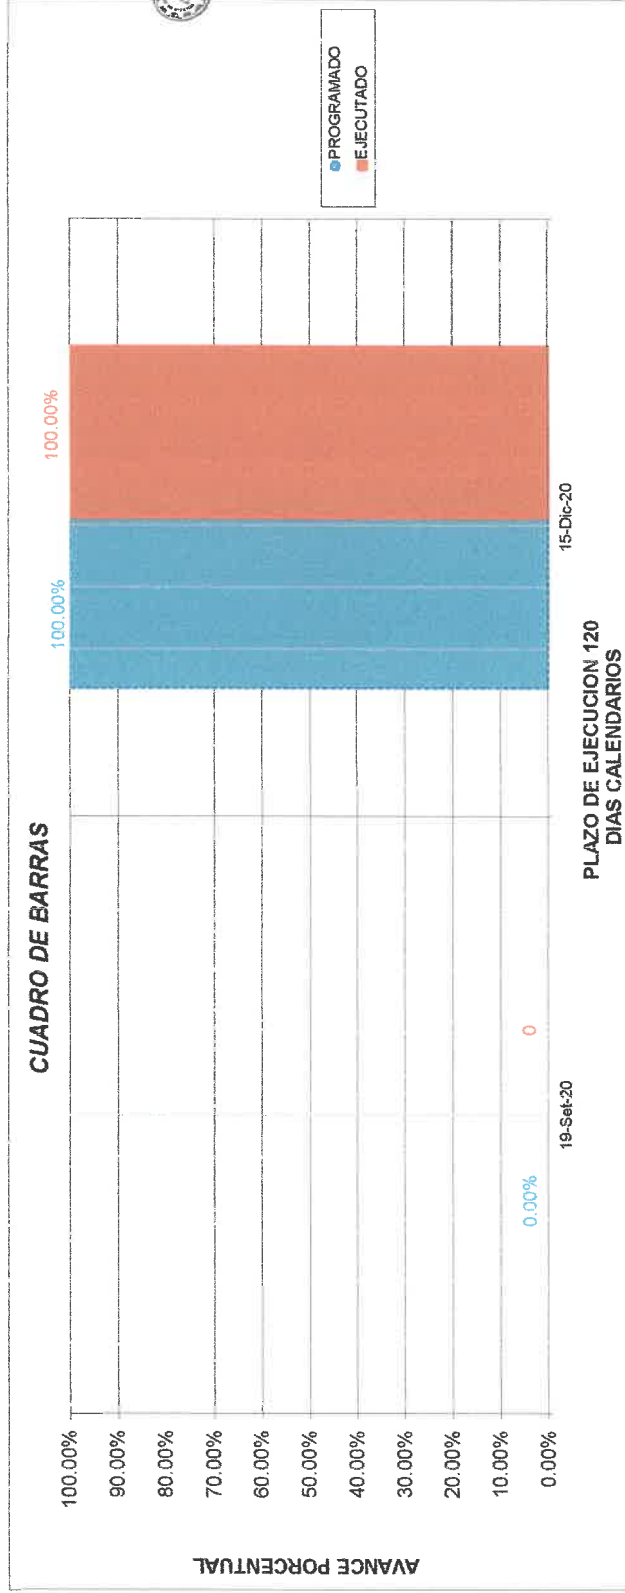
VALORIZACIÓN N° 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 1: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA - TAMBILLO - LONG=8,120 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 UBICACIÓN: HUAYLACA - TAMBILLO
 MODALIDAD: CONTRATA
 RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUÁREZ SUÁREZ
 INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA
 PPTO CONTRACTUAL: S/ 574,465.87 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
 FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020
 FECHA DE TÉRMINO DE SERVICIO: 31-12-2020



Daysi Ruth Pianto Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP N° 78397

VALORIZACION PROGRAMADO

VALORIZACION	MONTOS (Inc IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
19-Sep-20	0	0	0	0
15-Dic-20	S/ 574,465.87	S/ 574,465.87	100.00%	100.00%
TOTAL	574,465.87		100.00%	

Situación de la Obra con Respecto al Avance Acumulado Ejecutado VS Acumulado Programado
 Adelantada en (%) CULMINADA
 Atrasada en (%)

VALORIZACION EJECUTADO

VALORIZACION	MONTOS (Inc IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
19-Sep-20	0.00	0	0.00	0
15-Dic-20	S/ 574,465.87	S/ 574,465.87	100.00%	100.00%
TOTAL	574,465.87		100.00%	

Lourdes Azucena Juárez Suárez
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 202353

CONSORCIO VIAL CHUCO DE CHUCO
 Julio César Quirozco Atanda
 R. CIP. N° 19937001
 REPRESENTANTE COMÚN

000335



000334

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA


CUADRO DE BARRAS Y CURVA S

PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA –
AHIJADERO - LONG.=5.600 Km"



Daysi Ruth Pianta Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

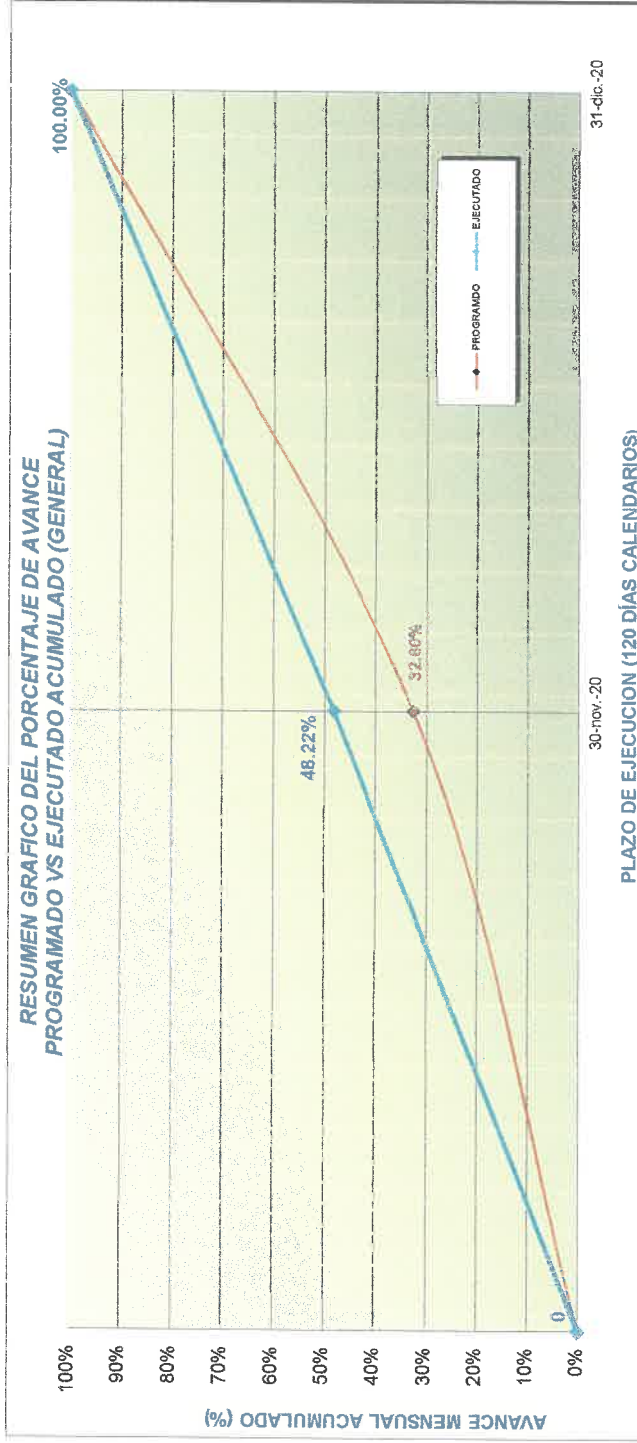
CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Quiroz Aranda
R. CIP. N° 1931091
REPRESENTANTE COMUN

CURVA S (Porcentual)
VALORIZACIÓN N° 04
Del 01 al 15 de NOVIEMBRE DEL 2020

RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO - LONG.-5.600 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 UBICACIÓN: ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO
 MODALIDAD: CONTRATA
 RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
 INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA
 PPTO CONTRACTUAL: S/ 396,183.36 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
 FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020
 FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020



Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS					
PERIODO	MONTOS (incl IGV)		PORCENTAJES		
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %	
Del 22-sep-20 al 30-Nov-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
Del 1-nov-20 al 31-Dic-20	129,159.71	129,159.71	32.60%	32.60%	
	267,023.65	396,183.36	67.40%	67.40%	
TOTAL	396,183.36		100.00%		

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS					
PERIODO	MONTOS (incl IGV)		PORCENTAJES		
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %	
Del 22-sep-20 al 30-Nov-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
Del 1-nov-20 al 15-Dic-20	191,063.20	191,063.20	48.22%	48.22%	
	205,130.16	396,193.36	51.78%	100.00%	
TOTAL	396,193.36		100.00%		

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858
CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Cepazco Aranda
ONI N° 19631091
REPRESENTANTE COMUN

0000333

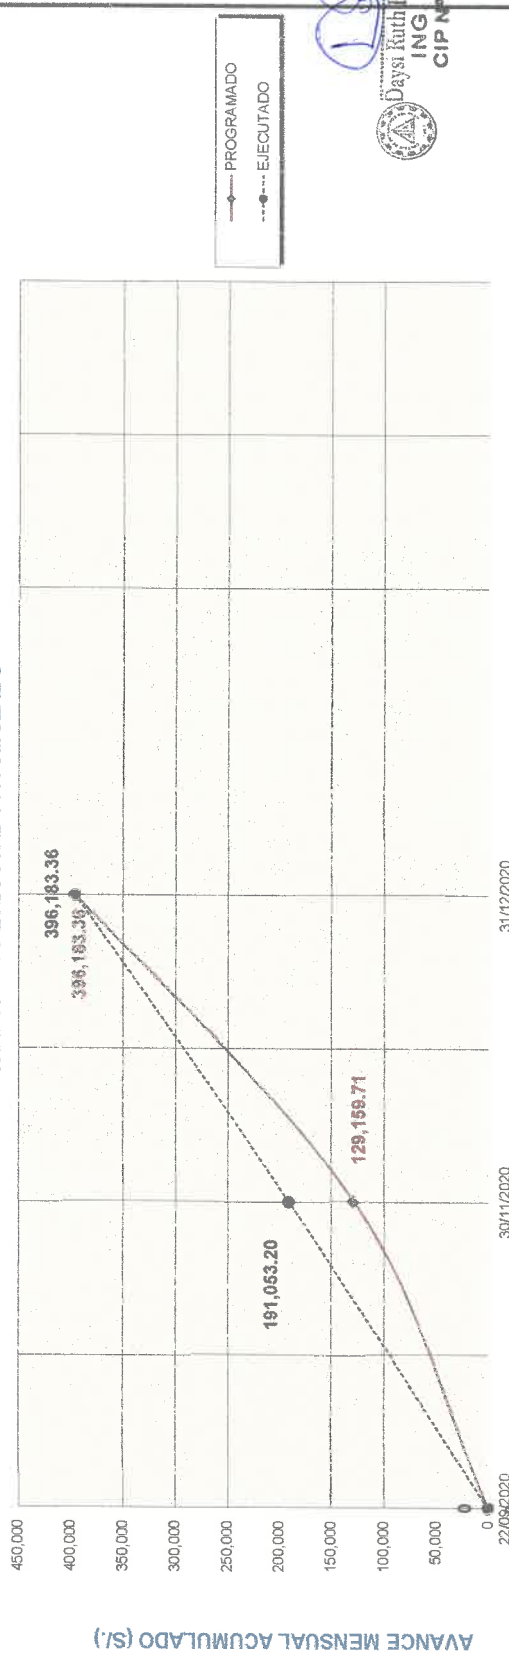
CURVA S (Financiero)
VALORIZACIÓN N° 04
Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO - LONG=5.600 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 UBICACIÓN: ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO
 MODALIDAD: CONTRATA
 RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
 INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA
 PPTO CONTRACTUAL: S/ 396,183.36 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
 FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020
 FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

GRAFICO DE AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO VS EJECUTADO ACUMULADO



Daysi Ruth Pianto Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP N° 78397

PLAZO DE EJECUCION (120 DIAS CALENDARIOS)

MONTO VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Incl. IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22/09/2020	0	0	0	0
30/11/2020	129,159.71	129,159.71	32.60%	32.60%
31/12/2020	267,023.65	396,183.36	67.40%	100.00%
TOTAL	396,183.36		100.00%	

MONTO VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (Incl. IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22/09/2020	0.00	0	0	0
30/11/2020	191,053.20	191,053.20	48.22%	48.22%
15/12/2020	205,130.16	396,183.36	51.78%	100.00%
TOTAL	396,183.36		100.00%	

Lourdes Azucena Juarez Suarez
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 202853

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
 JULIO CESAR CORTIZO ARANDA
 DNI N° 18831081
 REPRESENTANTE COMUN

000332

CUADRO DE BARRAS

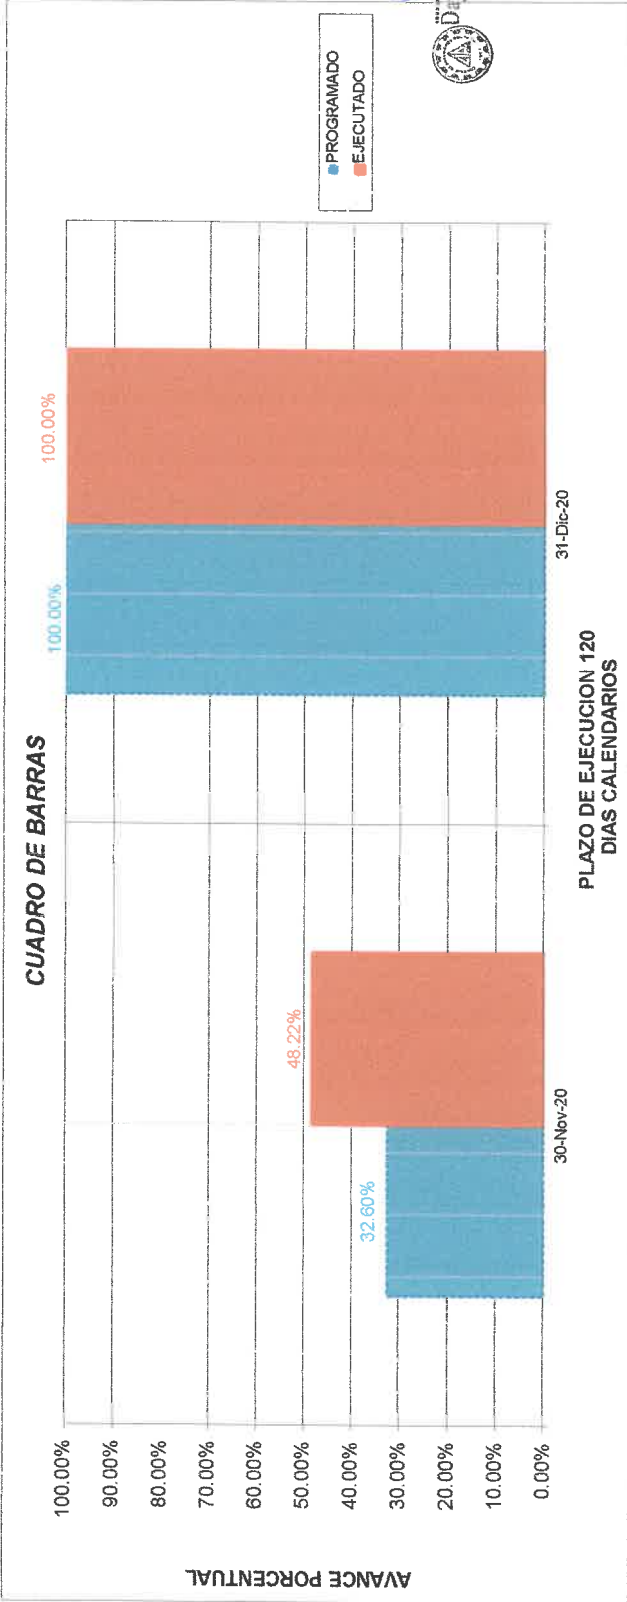
VALORIZACIÓN Nº 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO - LONG.=5.600 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
UBICACIÓN: ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO
MODALIDAD: CONTRATA
RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUÁREZ SUÁREZ
INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA
PPTO CONTRACTUAL: S/ 396,183.36 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020
FECHA DE TÉRMINO DE SERVICIO: 31-12-2020



Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP Nº 78397

VALORIZACION PROGRAMADO

VALORIZACION	MONTOS (Inc IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
30-Nov-20	S/ 129,159.71	S/ 129,159.71	32.60%	32.60%
31-Dic-20	S/ 267,023.65	S/ 396,183.36	67.40%	100.00%
TOTAL	396,183.36		100.00%	

Situación de la Obra con Respecto a Avance Acumulado Ejecutado VS Acumulado Programado

Adelantada en (%) CULMINADA

Atrasada en (%)

VALORIZACION EJECUTADO

VALORIZACION	MONTOS (Inc IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
30-Nov-20	S/ 191,053.20	S/ 191,053.20	48.22%	48.22%
15-Dic-20	S/ 205,130.16	S/ 396,183.36	51.78%	100.00%
TOTAL	396,183.36		100.00%	

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP Nº 202358

CONSorcio VIAL CRUZ DE CHUCA
JULIO CESAR OQUIPUNZA ARAÑGA
DNI Nº 19531091
REPRESENTANTE COMÚN



000330

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

CUADRO DE BARRAS Y CURVAS

PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

RUTA 3: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ANGASMARCA – EL
INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN - LONG.=13.030 Km


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

Julio César Quiroz Aranda
DNI N° 5531091
REPRESENTANTE COMUN



Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

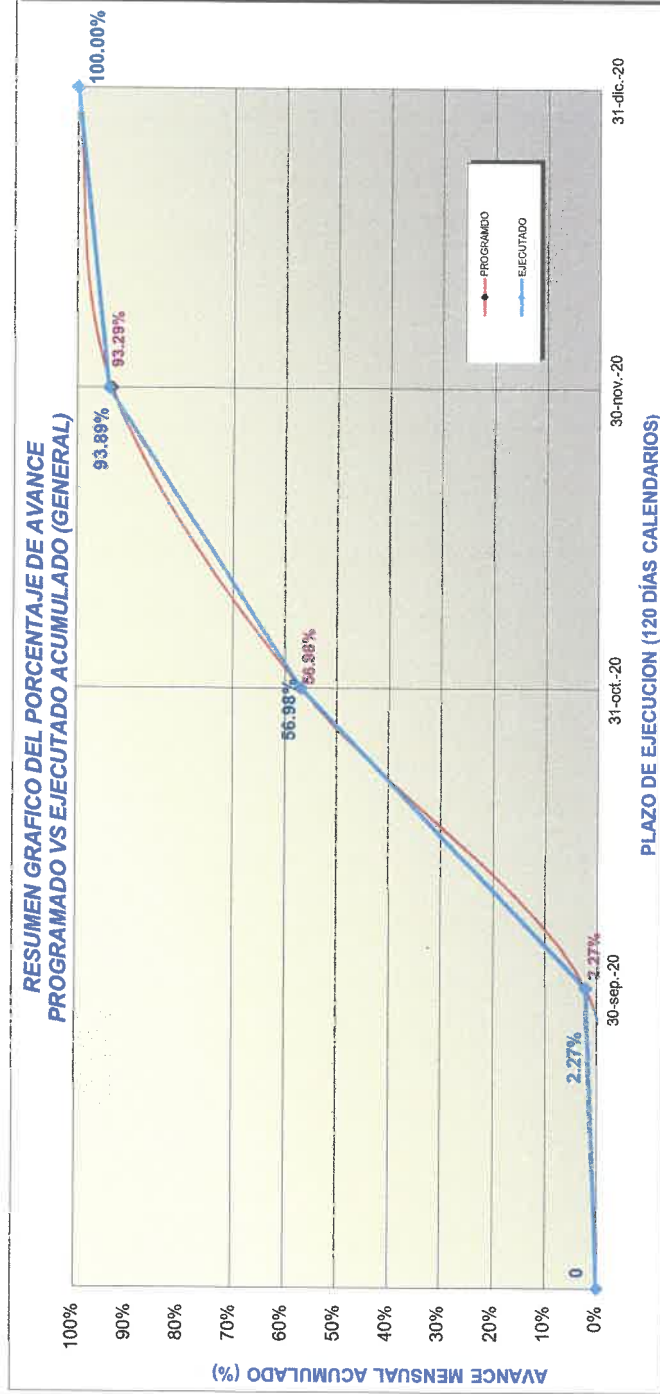
EJECUCION DEL ITEM PAQUETE DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES
TRAMO: "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8.120 KM", - "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO LONG = 5.600 KM" - "ANGASMARCA - EL INGENIO -
CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG = 13.030 KM" - DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

CURVA S (Porcentual) VALORIZACIÓN N° 04 Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 3: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN - LONG.=13.030 Km

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
UBICACIÓN: ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN
MODALIDAD: CONTRATA
RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA
PPTO CONTRACTUAL: S/ 921,833.78 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020
FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020



Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

Lourdes Azucena Juarez Suarez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

MONTOS VALORIZADOS REPROGRAMADOS

PERIODO	MONTOS (incl IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Del 22-sep.-20 al 30-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Del 1-oct.-20 al 31-Oct-20	20,944.13	20,944.13	2.27%	2.27%
Del 1-nov.-20 al 30-Nov-20	504,337.30	525,281.43	54.71%	56.98%
Del 1-dic.-20 al 31-Dic-20	334,676.05	859,957.48	36.31%	93.29%
TOTAL	921,833.78	921,833.78	100.00%	100.00%

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

PERIODO	MONTOS (incl IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Del 22-sep.-20 al 30-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Del 1-oct.-20 al 31-Oct-20	20,944.13	20,944.13	2.27%	2.27%
Del 1-nov.-20 al 30-Nov-20	504,337.30	525,281.43	54.71%	56.98%
Del 1-dic.-20 al 31-Dic-20	340,238.59	865,520.02	36.91%	93.89%
TOTAL	921,833.78	921,833.78	100.00%	100.00%

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUGA
ING. CIVIL
R. CIP. N° 19991693
REPRESENTANTE COMUN

000029

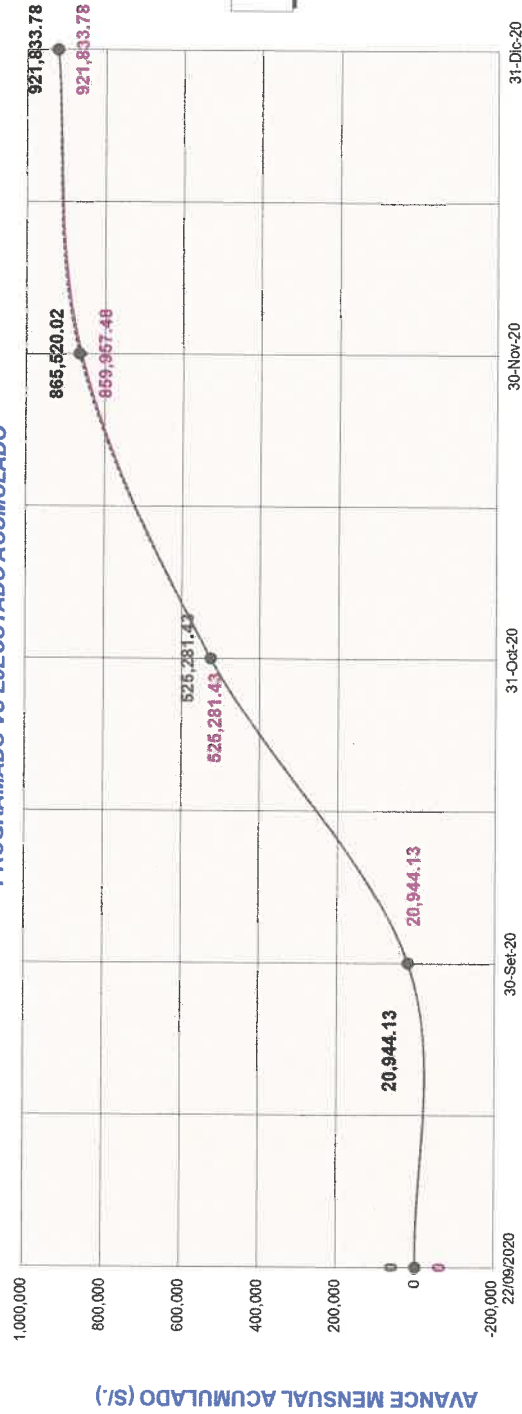
CURVA S (Financiero)
VALORIZACIÓN N° 04
Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 3: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN - LONG=13.030 Km

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 UBICACIÓN: ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN
 MODALIDAD: CONTRATA
 RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
 INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH HANCO MENDOZA
 PPTO CONTRACTUAL: S/ 921,833.78 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
 FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020
 FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

GRAFICO DE AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO VS EJECUTADO ACUMULADO



AVANCE MENSUAL ACUMULADO (S./)

[Signature]
 Lourdes Azucena Juárez Suárez
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 202858

[Signature]
 Daysi Ruth Hanco Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP N° 78397

PLAZO DE EJECUCION (120 DIAS CALENDARIOS)

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (incl IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
	S/.	S/.	%	%
22/09/2020	0	0	0	0
30/09/2020	20,944.13	20,944.13	2.27%	2.27%
31/10/2020	504,337.30	525,281.43	54.71%	56.98%
30/11/2020	334,676.05	859,957.48	36.31%	93.29%
31/12/2020	61,876.30	921,833.78	6.71%	100.00%
TOTAL	921,833.78		100.00%	

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (incl IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
	S/.	S/.	%	%
22/09/2020	0.00	0	0	0
30-Sep-20	20,944.13	20,944.13	2.27%	2.27%
31-Oct-20	504,337.30	525,281.43	54.71%	56.98%
30-Nov-20	340,238.59	865,520.02	36.91%	93.89%
31-Dic-20	56,313.76	921,833.78	6.11%	100.00%
TOTAL	921,833.78		100.00%	

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCO
[Signature]
 Julio César Quiroz Atanda
 DNI N° 18531091
 REPRESENTANTE COMUN

000028

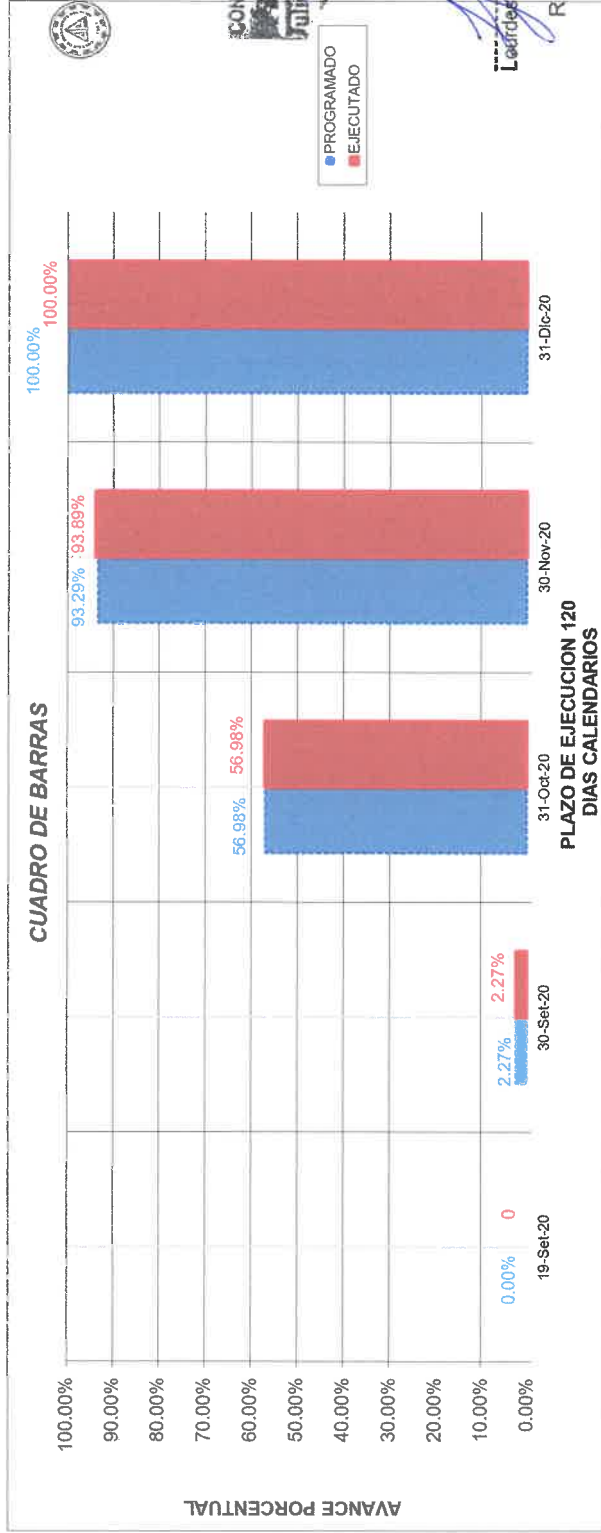
CUADRO DE BARRAS VALORIZACIÓN N° 04 Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 3: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN - LONG.=13.030 Km

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
UBICACIÓN: ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN
MODALIDAD: CONTRATA
RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA
PPTO CONTRACTUAL: S/ 921,833.78 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-08-2020
FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020


Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397




CONSOFCO VIAL CRUZ DE CHUCA
ING. CIVIL
CIP N° 19831081
REPRESENTANTE COMUN


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

VALORIZACION REPROGRAMADO

VALORIZACION	MONTOS (Inc IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
19-Sep-20	S/ 0	S/ 0	0	0
30-Sep-20	S/ 20,944.13	S/ 20,944.13	2.27%	2.27%
31-Oct-20	S/ 504,337.30	S/ 525,281.43	54.71%	56.98%
30-Nov-20	S/ 334,676.05	S/ 859,957.48	36.31%	93.29%
31-Dic-20	S/ 61,876.30	S/ 921,833.78	6.71%	100.00%
TOTAL	921,833.78	921,833.78	100.00%	100.00%

Situación del Servicio con Respecto al Avance Acumulado Ejecutado vs Acumulado Programado

Adelantada en (%)
Atrasada en (%)

VALORIZACION EJECUTADO

VALORIZACION	MONTOS (Inc IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
19-Sep-20	S/ 0.00	S/ 0	0.00%	0
30-Sep-20	S/ 20,944.13	S/ 20,944.13	2.27%	2.27%
31-Oct-20	S/ 504,337.30	S/ 525,281.43	54.71%	56.98%
30-Nov-20	S/ 340,238.59	S/ 865,520.02	36.91%	93.89%
31-Dic-20	S/ 56,313.76	S/ 921,833.78	6.11%	100.00%
TOTAL	921,833.78	921,833.78	100.00%	100.00%


000327



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020


 Daysi Ruth Pinto Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP N° 78397


 Lourdes Azucena Juárez Suárez
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 202858


CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
 Julio César Quirozco Aranda
 DNI N° 19531091
 REPRESENTANTE COMUN

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO

VALORIZACIÓN N° 04 - GENERAL

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

EJECUCION DEL ITEM PAQUETE DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8.120 KM" - "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO LONG = 5.600 KM" - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG = 13.030 KM" - DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: "HUAYLACA - TAMBILLO" "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO" - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN"

MODALIDAD: CONTRATA

RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LÓURDES AZUCENA JUÁREZ SUÁREZ

INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYS RUTH PIATTO MENDOZA

PPTO CONTRACTUAL: S/1,892,483.01 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020
FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRESUPUESTO BASE			(SEPTIEMBRE)			(OCTUBRE)			(NOVIEMBRE)			(DICIEMBRE)		
				P.U. (S/.)	PARCIAL (S/.)		22	al	30	METRADO	PARCIAL	%	01	al	30	METRADO	PARCIAL	%
1	TRABAJOS PRELIMINARES				24,917.42													
1.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO	glb	3.00	S/ 6,109.81	S/ 18,329.43		0.67	4,099.16	22.36%	0.00	0.00	0.00%	0.96	5853.23	31.93%	1.37	8377.05	45.70%
1.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	26.75	S/ 246.28	S/ 6,587.99		2.61	641.81	9.74%	5.21	1,283.61	19.48%	7.45	1835.28	27.86%	11.48	2827.29	42.92%
2	PAVIMENTOS				775,850.73													
2.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	4,652.88	S/ 31.82	S/ 148,372.84		0.00	0.00%	0.00%	682.99	21,732.67	14.65%	1,994.67	60288.44	40.63%	2,085.22	68351.73	44.72%
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0	m3	11,534.52	S/ 54.40	S/ 627,477.89		0.00	0.00%	0.00%	1,743.58	94,851.00	15.12%	4,752.46	256533.75	41.20%	5,038.48	274093.14	43.68%
3	TRANSPORTES				395,936.00													
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	19,436.68	S/ 9.88	S/ 192,936.37		0.00	0.00%	0.00%	2,958.25	29,227.54	15.22%	8,055.98	79593.07	41.45%	8,422.65	83215.76	43.33%
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM	m3k	98,128.10	S/ 1.75	S/ 171,474.18		0.00	0.00%	0.00%	15,394.53	26,940.43	15.53%	41,724.53	73017.92	42.09%	42,009.04	73515.83	42.38%
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM	m3k	1,070.00	S/ 8.08	S/ 8,645.60		0.00	0.00%	0.00%	159.65	1,289.97	14.92%	437.80	3537.45	40.92%	472.55	3818.18	44.16%
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	12,305.00	S/ 1.77	S/ 21,779.85		0.00	0.00%	0.00%	1,848.94	3,272.62	15.03%	5,052.05	8942.14	41.08%	5,404.01	9565.09	43.92%
4	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				16,317.50													
4.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	28,750.00	S/ 0.61	S/ 16,317.50		0.00	0.00%	0.00%	5,297.44	3,231.44	19.80%	9,084.52	5541.56	33.96%	12,368.04	7544.50	46.24%
5	SEÑALIZACIÓN				69,828.14													
5.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	26.00	S/ 182.35	S/ 4,741.10		0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	14.52	2648.33	55.86%	11.48	2092.77	44.14%
5.02	SENALES PREVENTIVAS	und	60.00	S/ 781.07	S/ 46,864.20		0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	43.01	33596.18	71.69%	16.99	13268.02	28.31%
5.03	SENALES REGLAMENTARIAS	und	18.00	S/ 719.76	S/ 12,956.04		0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	9.20	6625.14	51.14%	8.80	6330.90	48.86%
5.04	SENALES INFORMATIVAS	und	10.00	S/ 526.88	S/ 5,268.80		0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.60	2422.73	46.00%	5.40	2844.07	54.00%
6	IMPACTO AMBIENTAL				2,888.65													
6.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.15	S/ 1,343.56	S/ 2,888.65		0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.05	1410.74	48.84%	1.10	1477.91	51.16%
7	EMERGENCIA SANITARIA				108,869.52													
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	3.00	S/ 36,289.84	S/ 108,869.52		0.24	8,624.88	7.92%	0.24	8,624.88	7.92%	0.74	26831.82	24.65%	1.76	64787.94	59.51%
	COSTO DIRECTO				1,394,607.96													
	GASTOS GENERALES (10%)	10.00%			139,460.80													
	UTILIDADES (5%)	5.00%			69,730.40													
	SUB TOTAL				1,603,799.16													
	IGV (18%)				288,683.85													
	COSTO TOTAL				1,892,483.01													
	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA																	
	AVANCE DE OBRA ACUMULADO %																	

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
ING. CIVIL
CIP N° 78397

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
ING. CIVIL
CIP N° 78397

ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO

VALORIZACIÓN N° 04 - GENERAL

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

EJECUCION DEL ITEM PAQUETE DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8,120 KM", - "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO LONG = 5,600 KM", - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG = 13,030 KM", - DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 UBICACIÓN: "HUAYLACA - TAMBILLO" "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO" - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN"
 MODALIDAD: CONTRATA
 RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
 INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DARYS RUTH PANTO MENDOZA
 PPTO CONTRACTUAL: S/ 1,892,483.01 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
 FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020
 FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRESUPUESTO BASE		(SEPTIEMBRE)		(OCTUBRE)		(NOVIEMBRE)		(DICIEMBRE)				
				P.U. (S/.)	PARCIAL (S/.)	19 al 30	%	01 al 31	%	01 al 30	%	01 al 17	%			
1	TRABAJOS PRELIMINARES				24,917.42											
1.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	gib	3.00	6,109.81	18,329.43	4,099.16	50.00%	0.00	0.00%	1.00	5853.23	31.93%	1.50	8377.05	45.70%	
1.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	26.75	246.28	6,587.99	985.12	30.70%	1600.82	49.89%	8.13	2002.26	30.39%	8.12	1999.79	30.36%	
2	PAVIMENTOS				775,850.73											
2.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	4662.88	31.82	148,372.84	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2845.91	90585.32	61.05%	1816.97	57778.80	38.94%	
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M	m3	11534.52	54.40	627,477.89	0.00	0.00%	3587.53	196022.64	62.00%	3506.53	191596.80	30.53%	4440.46	239844.49	38.22%
3	TRANSPORTES				395,936.00											
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	19436.88	9.88	192,036.37	0.00	0.00%	6767.04	68144.09	69.95%	4921.75	48756.42	25.39%	7748.09	74924.03	39.02%
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM	m3k	99128.10	1.75	173,474.18	0.00	0.00%	48939.56	89070.00	99.19%	4397.66	7464.29	4.31%	45790.88	77386.59	44.61%
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM	m3k	1070.00	8.08	8,645.60	0.00	0.00%	4222.94	3469.26	81.15%	213.11	1712.22	19.80%	433.95	3406.51	39.40%
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	12305.00	1.77	21,779.85	0.00	0.00%	3058.72	5566.87	51.03%	3448.88	6210.17	28.51%	5797.40	9797.61	44.98%
4	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				16,317.50											
4.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	26750.00	0.61	16,317.50	16,030.00	0.00%	0.00	0.00%	16030.00	9938.60	60.91%	10720.00	6484.00	39.74%	
5	SEÑALIZACION				69,828.14											
5.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	26.00	182.35	4,741.10	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	26.00	4741.10	100.00%	
5.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	60.00	781.07	46,864.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	60.00	46864.00	100.00%	
5.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	18.00	719.78	12,956.04	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	18.00	12956.04	100.00%	
5.04	SEÑALES INFORMATIVAS	und	10.00	526.68	5,266.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	10.00	5266.80	100.00%	
6	IMPACTO AMBIENTAL				2,888.65											
6.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.15	1,343.56	2,888.65	1.05	0.00%	0.00	0.00%	1.05	1410.74	48.84%	1.10	1477.91	51.16%	
7	EMERGENCIA SANITARIA				108,869.52											
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gib	3.00	36,289.84	108,869.52	0.40	0.00%	7762.40	30.00%	0.80	25969.32	23.85%	1.50	64693.65	59.42%	
COSTO DIRECTO					1,394,607.96	15,434.14		371,656.08		391,519.37		615,998.37				
GASTOS GENERALES (10%)					139,460.80	1,543.41		37,166.61		39,151.95		61,599.84				
UTILIDADES (5%)					69,730.40	771.71		18,582.80		19,575.97		30,799.92				
SUB TOTAL					1,603,799.16	17,749.26		427,404.49		450,247.29		708,398.13				
IGV (18%)					288,683.85	3,194.87		76,932.81		81,044.50		127,511.66				
COSTO TOTAL					1,892,483.01	20,944.13	2.27%	504,337.30		531,291.79		835,909.79		14.95%		
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA														100.00%		
AVANCE DE OBRA ACUMULADO %						2.27%		56.98%		85.05%						

Lourdes Azucena Juárez Suárez
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Darys Ruth Panto Mendoza
 DARYS RUTH PANTO MENDOZA
 R. CIP. N° 16631081
 REPRESENTANTE COMUN

Darys Ruth Panto Mendoza
 DARYS RUTH PANTO MENDOZA
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 78297




000323

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

RUTA 1: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA – TAMBILLO - LONG.=8.120 Km"



Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858


CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Olupuzcoa Aranda
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO

VALORIZACIÓN N° 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 1: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA - TAMBILLO - LONG. 8.120 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: HUAYLACA - TAMBILLO

MODALIDAD: CONTRATA

RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUÁREZ SUÁREZ

INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA

PPTO CONTRACTUAL: S/ 574,466.87 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020

FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020

FECHA DE TÉRMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRESUPUESTO BASE		(DICIEMBRE)	
				P. U. (S/.)	PARCIAL (S/.)	METRADO	01 al 31 PARCIAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES				8,622.78		
1.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO	glb	1.00	S/ 6,622.99	S/ 6,622.99	1.00	6,622.99
1.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	8.12	S/ 246.28	S/ 1,999.79	8.12	1,999.79
2	PAVIMENTOS				231,237.02		
2.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	1,383.84	S/ 31.79	S/ 43,992.27	1,383.84	43,992.27
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFRIMADO E=0	m3	3,477.80	S/ 53.84	S/ 187,244.75	3,477.80	187,244.75
3	TRANSPORTES				115,559.69		
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	5,833.97	S/ 9.67	S/ 56,414.49	5,833.97	56,414.49
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM	m3k	29,753.27	S/ 1.69	S/ 50,283.03	29,753.27	50,283.03
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM	m3k	324.80	S/ 7.85	S/ 2,549.68	324.80	2,549.68
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	3,735.20	S/ 1.69	S/ 6,312.49	3,735.20	6,312.49
4	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				4,872.00		
4.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	8,120.00	S/ 0.60	S/ 4,872.00	8,120.00	4,872.00
5	SEÑALIZACIÓN				15,683.68		
5.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	8.00	S/ 181.58	S/ 1,455.84	8.00	1,455.84
5.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	10.00	S/ 780.46	S/ 7,804.60	10.00	7,804.60
5.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	6.00	S/ 719.42	S/ 4,316.52	6.00	4,316.52
5.04	SEÑALES INFORMATIVAS	und	4.00	S/ 526.68	S/ 2,106.72	4.00	2,106.72
6	IMPACTO AMBIENTAL				873.31		
6.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0.85	S/ 1,343.56	S/ 873.31	0.85	873.31
7	EMERGENCIA SANITARIA				46,486.72		
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	S/ 46,486.72	S/ 46,486.72	1.00	46,486.72
COSTO DIRECTO					423,336.20		423,336.20
GASTOS GENERALES (10%)					42,333.52		42,333.52
UTILIDADES (5%)					21,166.76		21,166.76
SUB TOTAL					486,835.48		486,835.48
IGV (18%)					87,630.39		87,630.39
COSTO TOTAL					574,466.87		574,466.87
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA							
AVANCE DE OBRA ACUMULADO %							100.00%

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCO

JULIO CESAR QUIPUZCOA ARANDA
DNI N° 19637001
REPRESENTANTE COMUNLourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858Daisy Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO

VALORIZACIÓN N° 04
Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 1: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA - TAMBILLO - LONG = 8.120 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: HUAYLACA - TAMBILLO

MODALIDAD: CONTRATA

RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ

INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA

PPTO CONTRACTUAL: SI 574,465.87 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020

FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-08-2020

FECHA DE TÉRMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	PRESUPUESTO BASE		DICIEMBRE	
			METRADO	P.U. (S/.)	PARCIAL (S/.)	%
1	TRABAJOS PRELIMINARES				8,622.78	
1.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO	glb	1.00	6,622.99	6,622.99	100.00%
1.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	8.12	246.28	1,999.79	100.00%
2	PAVIMENTOS				231,237.02	
2.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m ³	1383.84	31.79	43,992.27	100.00%
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M	m ³	3477.80	53.84	187,244.75	100.00%
3	TRANSPORTES				115,559.69	
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m ³ k	5833.97	9.87	56,414.49	100.00%
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM	m ³ k	29753.27	1.69	50,283.03	100.00%
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM	m ³ k	324.80	7.85	2,549.68	100.00%
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m ³ k	3735.20	1.69	6,312.49	100.00%
4	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				4,872.00	
4.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	8120.00	0.60	4,872.00	100.00%
5	SERIALIZACION				15,683.88	
5.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	8.00	181.98	1,455.84	100.00%
5.02	SENALES PREVENTIVAS	und	10.00	780.46	7,804.60	100.00%
5.03	SENALES REGLAMENTARIAS	und	6.00	719.42	4,316.52	100.00%
5.04	SENALES INFORMATIVAS	und	4.00	526.68	2,106.72	100.00%
6	IMPACTO AMBIENTAL				873.31	
6.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0.65	1,343.56	873.31	100.00%
7	EMERGENCIA SANITARIA				46,486.72	
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	46,486.72	46,486.72	100.00%
COSTO DIRECTO					423,335.20	
GASTOS GENERALES (10%)					42,333.52	
UTILIDADES (5%)					21,166.76	
SUB TOTAL					486,835.48	
IGV (18%)					87,630.39	
COSTO TOTAL					574,465.87	
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA					100.00%	
AVANCE DE OBRA ACUMULADO %					100.00%	

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCO

Julio César Ruizpazosa Aranda
DNI N° 15531091
REPRESENTANTE COMUN

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202855

Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397



000320

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

**ruta 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
ROUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA –
AHIJADERO - LONG.=5.600 Km"**



Daysi Ruth Pianta Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Quirozco Aranda
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO

VALORIZACIÓN N° 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO - LONG =5.600 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO

MODALIDAD: CONTRATA

RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ

INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYS RUTH PIANZO MENDOZA

PPTO CONTRACTUAL: S/ 396,183.38 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 28-08-2020
FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020
FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRESUPUESTO BASE		(NOVIEMBRE)		(DICIEMBRE)	
				P.U.	PARCIAL	01 al 30	01 al 31	01 al 31	01 al 31
				(S/.)	(S/.)	METRADO	PARCIAL	METRADO	PARCIAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES				4,887.30				
1.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	gib	1.00	S/ 3,508.13	S/ 3,508.13	0.50	1754.07	0.50	1754.08
1.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	5.60	S/ 246.28	S/ 1,379.17	2.24	551.67	3.36	827.50
2	PAVIMENTOS				155,978.82				
2.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	1,003.13	S/ 31.83	S/ 31,929.63	300.94	9578.89	702.19	22,350.74
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0	m3	2,270.30	S/ 54.64	S/ 124,049.19	681.09	37214.76	1589.21	86634.43
3	TRANSPORTES				77,953.19				
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	3,928.12	S/ 9.67	S/ 37,984.92	1178.44	11395.48	2749.68	26588.44
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM	m3k	20,033.39	S/ 1.69	S/ 33,856.43	6010.02	10156.93	14023.37	23699.50
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM	m3k	224.00	S/ 7.85	S/ 1,758.40	67.20	527.52	156.80	1230.88
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	2,576.00	S/ 1.69	S/ 4,353.44	772.80	1306.03	1803.20	3047.41
4	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				3,472.00				
4.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	m	5,600.00	S/ 0.62	S/ 3,472.00	1120.00	684.40	4480.00	2777.80
5	SEÑALIZACION				12,645.54				
5.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	5.00	S/ 181.98	S/ 909.90	1.50	272.97	3.50	636.93
5.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	10.00	S/ 780.46	S/ 7,804.60	3.00	2341.38	7.00	5463.22
5.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	4.00	S/ 719.42	S/ 2,877.68	1.20	863.30	2.80	2014.38
5.04	SEÑALES INFORMATIVAS	und	2.00	S/ 526.68	S/ 1,053.36	0.60	316.01	1.40	737.35
6	IMPACTO AMBIENTAL				604.60				
6.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0.45	S/ 1,343.56	S/ 604.60	0.00	0.00	0.45	604.60
7	EMERGENCIA SANITARIA				38,413.86				
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gib	1.00	S/ 36,413.86	S/ 36,413.86	0.50	18206.93	0.50	18206.93
COSTO DIRECTO					291,955.31		96,180.33		186,774.98
GASTOS GENERALES (10%)					29,195.53		9,518.03		19,677.50
UTILIDADES (5%)					14,597.77		4,759.02		9,838.75
SUB TOTAL					335,748.61		109,457.38		226,291.23
IGV (18%)					60,434.75		19,702.33		40,732.42
COSTO TOTAL					396,183.36		129,159.71		267,023.65
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA							32.60%		67.40%
AVANCE DE OBRA ACUMULADO %							32.60%		100.00%


Days Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 76397


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
E.

Jorge César Tapuzcoa Aranda
DM N° 19631001
REPRESENTANTE COMUN

000319

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO

VALORIZACIÓN N° 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO - LONG.=6.800 Km"

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO

MODALIDAD: CONTRATA

RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUÁREZ SUÁREZ

INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA

PPTO CONTRACTUAL: S/ 396,183.36 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020

FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020

FECHA DE TÉRMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO	PRESUPUESTO BASE		(NOVIEMBRE)		(DICIEMBRE)	
				P.U. (S/.)	PARCIAL (S/.)	METRADO	%	01 al 30	01 al 17
1	TRABAJOS PRELIMINARES				4,887.30				
1.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO	glb	1.00	3,508.13	3,508.13	0.50	50.00%	1754.07	0.50
1.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	5.60	246.28	1,379.17	5.60	100.00%	1379.17	0.00
2	PAVIMENTOS				155,978.82				
2.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	1003.13	31.83	31,929.63	570.00	56.82%	18143.10	433.13
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M	m3	2270.30	54.64	124,049.19	1307.64	57.60%	71449.45	962.66
3	TRANSPORTES				77,953.19				
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	3928.12	9.67	37,984.92	2014.00	51.27%	19475.38	1914.12
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	20033.39	1.69	33,856.43	3995.78	19.95%	6752.87	16037.61
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM	m3k	224.00	7.85	1,758.40	114.85	51.27%	901.57	109.15
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	2576.00	1.69	4,353.44	513.80	19.95%	868.32	2062.20
4	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				3,472.00				
4.01	RECONFORMACIÓN DE CUNETAS	ml	5600.00	0.62	3,472.00	3000.00	53.57%	1860.00	2600.00
5	SEÑALIZACIÓN				12,645.54				
5.01	INSTALACIÓN DE POSTES KILOMÉTRICOS	und	5.00	181.98	909.90	0.00	0.00%	0.00	5.00
5.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	10.00	780.46	7,804.60	0.00	0.00%	0.00	10.00
5.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	4.00	719.42	2,877.68	0.00	0.00%	0.00	4.00
5.04	SEÑALES INFORMATIVAS	und	2.00	526.68	1,053.36	0.00	0.00%	0.00	2.00
6	IMPACTO AMBIENTAL				604.60				
6.01	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ÁREAS OCUPADAS	ha	0.45	1,343.56	604.60	0.00	0.00%	0.00	0.45
7	EMERGENCIA SANITARIA				36,413.86				
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	36,413.86	36,413.86	0.50	50.00%	18206.93	0.50
COSTO DIRECTO					291,955.31	140,790.86			151,164.45
GASTOS GENERALES (10%)					29,195.53				15,116.45
UTILIDADES (5%)					14,597.77				7,558.22
SUB TOTAL					335,748.61	161,908.49			173,839.12
IGV (18%)					60,434.75	29,143.71			31,291.04
COSTO TOTAL					396,183.36	191,052.20			205,130.16
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA						48.22%			51.78%
AVANCE DE OBRA ACUMULADO %									100.00%

Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
JULIO Cesar Quiroz Aranda
CIP N° 1631091
REPRESENTANTE COMUN

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

000318



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

**RUTA 3: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ANGASMARCA – EL
INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN - LONG.=13.030 Km**

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Quirozco Aranda
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUM

Leodes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

Daysi Ruth Panto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO

VALORIZACIÓN N° 04

Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 3: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN - LONG.=13.030 Km

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
UBICACIÓN: ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN
MODALIDAD: CONTRATA
RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANO MENDOZA
PPTO CONTRACTUAL: S/ 921,833.78 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020
FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRESUPUESTO BASE		(SEPTIEMBRE)		(OCTUBRE)		(NOVIEMBRE)		(DICIEMBRE)	
				P.U. (S/.)	PARCIAL (S/.)	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%
1	TRABAJOS PRELIMINARES				11,407.35								
1.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	gib	1.00	8,198.32	8,198.32	0.50	4,099.16	0.00	0.00	0.50	4,099.16	0.00	0.00
1.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	13.03	246.28	3,209.03	4.00	985.12	30.70%	1600.82	2.53	623.09	0.00%	0.00
2	PAVIMENTOS				388,612.21								
2.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	2275.91	31.83	72,442.22	0.00	0.00	0.00%	0.00	2275.91	72,442.22	0.00%	0.00
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M	m3	5786.42	54.84	316,189.99	0.00	0.00	0.00%	196022.64	2188.89	120147.35	0.00%	0.00
3	TRANSPORTES				202,435.18								
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	9674.79	10.07	97,425.14	0.00	0.00	0.00%	68144.09	2907.75	29281.04	0.00%	0.00
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM	m3k	49341.44	1.82	89,801.42	0.00	0.00	0.00%	89070.00	401.88	731.42	0.00%	0.00
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM	m3k	521.20	8.25	4,299.90	0.00	0.00	0.00%	3489.26	98.26	810.85	0.00%	0.00
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	5993.80	1.82	10,908.72	0.00	0.00	0.00%	5566.87	2935.08	5341.85	0.00%	0.00
4	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				8,078.60								
4.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	13030.00	0.62	8,078.60	0.00	0.00	0.00%	0.00	13030.00	8078.60	0.00%	0.00
5	SEÑALIZACION				41,498.72								
5.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	13.00	182.72	2,375.36	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	13.00	2375.36
5.02	SENALES PREVENTIVAS	und	40.00	781.37	31,254.80	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	40.00	31254.80
5.03	SENALES REGLAMENTARIAS	und	8.00	720.23	5,761.84	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	8.00	5761.84
5.04	SENALES INFORMATIVAS	und	4.00	526.88	2,106.72	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	4.00	2106.72
6	IMPACTO AMBIENTAL				1,410.74								
6.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	1.05	1,343.56	1,410.74	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.05	1410.74	0.00%	0.00
7	EMERGENCIA SANITARIA				25,874.65								
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gib	1.00	25,874.65	25,874.65	0.40	10,349.86	40.00%	7762.40	0.30	7762.39	0.00%	0.00
	COSTO DIRECTO				679,317.45		15,434.14		371,656.08		250,728.51		41,498.72
	GASTOS GENERALES (10%)				67,931.75		1,543.41		37,165.61		25,072.85		4,149.87
	UTILIDADES (5%)				33,965.87		771.71		18,582.80		12,536.43		2,074.94
	SUB TOTAL				781,215.07		17,749.26		427,404.49		288,337.79		47,723.53
	IGV (18%)				140,618.71		3,194.87		76,932.81		51,900.80		8,590.24
	COSTO TOTAL				921,833.78		20,944.13		504,337.30		340,238.59		56,313.76
	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA						2.27%		54.71%		36.91%		6.11%
	AVANCE DE OBRA ACUMULADO %						2.27%		56.98%		93.89%		100.00%

Lourdes Azucena Juarez Suarez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VAL CRUZ DE CHUCA
Julio Cesar Ramirez Aranda
ING. CIVIL
R. CIP. N° 16531091
REPRESENTANTE COMUN

Daysi Ruth PIANO MENDOZA
ING. CIVIL
CIP N° 78397

000316

CRONOGRAMA DE AVANCE DE SERVICIO REPROGRAMADO VALORIZACIÓN N° 04 Del 01 al 15 de DICIEMBRE DEL 2020

RUTA 3: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN – LONG.=13.030 Km

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
UBICACIÓN: ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN
MODALIDAD: CONTRATA
RESIDENTE DE SERVICIO: ING. LOURDES AZUCENA JUAREZ SUAREZ
INSPECTOR DE SERVICIO: ING. DAYSI RUTH PIANTA MENDOZA
PPTO CONTRACTUAL: S/ 921,833.78 (CON IGV)

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DEL SERVICIO: 120 días cal.
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 29-08-2020
FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 22-09-2020
FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 31-12-2020

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRESUPUESTO BASE		(SEPTIEMBRE)		(OCTUBRE)		(NOVIEMBRE)		(DICIEMBRE)	
				P.U. (S/.)	PARCIAL (S/.)	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES				11,407.35								
1.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	gib	1.00	S/ 8,198.32	S/ 8,198.32	0.50	4,099.16	50.00%	-	0.00	0.00%	0.50	4,099.16
1.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	13.03	S/ 246.28	S/ 3,209.03	4.00	985.12	30.70%	6.50	1,800.82	49.88%	0.00	0.00
2	PAVIMENTOS				388,612.21								
2.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	2,275.91	S/ 31.83	S/ 72,442.22	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	0.00%	0.00	0.00
2.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=	m3	5,786.42	S/ 54.64	S/ 316,189.99	0.00	0.00	0.00%	3,587.53	196,022.84	62.00%	0.00	0.00
3	TRANSPORTES				202,435.18								
3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	9,674.79	S/ 10.07	S/ 97,425.14	0.00	0.00	0.00%	6,767.04	68,144.09	69.95%	0.00	0.00
3.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM	m3k	49,341.44	S/ 1.82	S/ 89,801.42	0.00	0.00	0.00%	48,939.56	89,070.00	99.19%	0.00	0.00
3.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM	m3k	521.20	S/ 8.25	S/ 4,299.90	0.00	0.00	0.00%	422.94	3,489.26	81.15%	0.00	0.00
3.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	5,993.80	S/ 1.82	S/ 10,908.72	0.00	0.00	0.00%	3,058.72	5,566.87	51.03%	0.00	0.00
4	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				8,078.60								
4.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	13,030.00	S/ 0.62	S/ 8,078.60	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	0.00%	0.00	0.00
5	SEÑALIZACION				41,498.72								
5.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	13.00	S/ 182.72	S/ 2,375.36	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	0.00%	0.00	0.00
5.02	SENALES PREVENTIVAS	und	40.00	S/ 781.37	S/ 31,254.80	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	0.00%	0.00	0.00
5.03	SENALES REGLAMENTARIAS	und	8.00	S/ 720.23	S/ 5,761.84	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	0.00%	0.00	0.00
5.04	SENALES INFORMATIVAS	und	4.00	S/ 526.68	S/ 2,106.72	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	0.00%	0.00	0.00
6	IMPACTO AMBIENTAL				1,410.74								
6.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	1.05	S/ 1,343.56	S/ 1,410.74	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	0.00%	0.00	0.00
7	EMERGENCIA SANITARIA				25,874.65								
7.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gib	1.00	S/ 25,874.65	S/ 25,874.65	0.40	10,349.86	40.00%	0.30	7,762.40	30.00%	0.00	0.00
	COSTO DIRECTO				679,317.45		15,434.14			371,656.08			45,597.87
	GASTOS GENERALES (10%)	10.00%			67,931.75		1,543.41			37,165.61			4,559.78
	UTILIDADES (5%)	5.00%			33,965.87		771.71			18,582.80			2,279.89
	SUB TOTAL				781,215.07		17,749.26			427,404.49			52,437.55
	IGV (18%)	18.00%			140,618.71		3,194.87			76,932.81			9,436.75
	COSTO TOTAL				921,833.78		20,944.13			504,337.30			61,876.30
	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA						2.27%			54.71%			6.71%
	AVANCE DE OBRA ACUMULADO %						2.27%			93.29%			100.00%

Loures Azucena Juarez Suarez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio Cesar Ochoa Aranda
ING. CIVIL
DNI N° 18531091
REPRESENTANTE COMUN

Daysi Ruth Pianta Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78387

000315




CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

PROGRAMACIÓN DE OBRA PERT-CPM Y GANT

PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020


 Daysi Ruth Pianta Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP N° 78397


 Lourdes Azucena Juárez Suárez
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

 Julio Cesar Chupuzcoa Aranda
 DNI N° 19531091
 REPRESENTANTE COMUN

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8.120 KM", - "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO LONG = 5.600 KM" - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAIPA - CATIRIN LONG = 13.030 KM"									
Id	EDT	Nombre	Duración	agosto 2020	septiembre 2020	octubre 2020	noviembre 2020	enero 2021	
1	INICIO	0 días							
2	1	MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL "ANGASMARCA-EL INGENIO-CRUZ PAIPA-CATIRIN LONG= 13.030 KM"	50 días						
3	1.1	TRABAJOS PRELIMINARES	20 días						
4	1.1.1	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO	7 días						
5	1.1.2	TOPOGRAFÍA, TRAZO Y REPLANTEO	20 días						
6	1.2	PAVIMENTOS	30 días						
7	1.2.1	CAPA NIVELANTE E = 0.05M	30 días						
8	1.2.2	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA ESTABILIZADO E=0.15M	30 días						
9	1.3	TRANSPORTE	30 días						
10	1.3.1	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1	25 días						
11	1.3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR /	25 días						
12	1.3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA	25 días						
13	1.3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR	25 días						
14	1.4	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	2 días						
15	1.4.1	RECONFORMACIÓN DE CUNETAS	2 días						
16	1.5	SEÑALIZACIÓN	15 días						
17	1.5.1	INSTALACIÓN DE POSTES KILOMETRICOS	15 días						
18	1.5.2	SEÑALES PREVENTIVAS	15 días						
19	1.5.3	SEÑALES REGLAMENTARIAS	15 días						
20	1.5.4	SEÑALES INFORMATIVAS	15 días						
21	1.6	IMPACTO AMBIENTAL	5 días						
22	1.6.1	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ÁREAS OCUPAD/	5 días						
23	1.7	EMERGENCIA SANITARIA	50 días						
24	1.7.1	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	50 días						
25		FIN	0 días						
26	INICIO	0 días							
27	2	MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL "ANGASMARCA-CRUZ DE CHUCA-AHUADERO LONG= 5.600"	32 días						
28	2.1	TRABAJOS PRELIMINARES	20 días						
29	2.1.1	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO	7 días						
30	2.1.2	TOPOGRAFÍA, TRAZO Y REPLANTEO	20 días						
31	2.2	PAVIMENTOS	12 días						
32	2.2.1	CAPA NIVELANTE E = 0.05M	12 días						
33	2.2.2	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA ESTABILIZADO E=0.15M	12 días						
34	2.3	TRANSPORTE	12 días						
35	2.3.1	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1	12 días						

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

01/10/20

11/11
11/11

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio Cesar Quiroz Aranda
ING. CIVIL
R. CIP. N° 78397

Dayvi Rudi Panto Mendoza
ING. CIVIL
R. CIP. N° 78397

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
División	Hito	Hito inactivo	Resumen inactivo	Resumen manual	Fecha limite	Tareas críticas	División crítica	Progreso	
Resumen	Resumen del proyecto	Tarea manual	Resumen inactivo	Resumen manual	Fecha limite	Tareas críticas	División crítica	Progreso	
				solo el comienzo					
				solo fin					
				Tareas externas					

PROYECTO:
INICIO: 18/09/2020
FIN: 31/12/2020

000312

000330

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8.120 KM", - "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUADERO LONG = 5.600 KM", - "ANGASMARCA - CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG = 13.030 KM"

Id.	EDT	Nombre	Duración	agosto 2020	septiembre 2020	octubre 2020	noviembre 2020	diciembre 2020	enero 2021
36	2.3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR 12 días							
37	2.3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 12 días							
38	2.3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR 12 días							
39	2.4	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	2 días						
40	2.4.1	RECONFORMACIÓN DE CUNETAS	2 días						
41	2.5	SEÑALIZACIÓN	15 días						
42	2.5.1	INSTALACIÓN DE POSTES KILOMÉTRICOS	15 días						
43	2.5.2	SEÑALES PREVENTIVAS	15 días						
44	2.5.3	SEÑALES REGLAMENTARIAS	15 días						
45	2.5.4	SEÑALES INFORMATIVAS	15 días						
46	2.6	IMPACTO AMBIENTAL	5 días						
47	2.6.1	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ÁREAS OCUPAD/ 5 días							
48	2.7	EMERGENCIA SANITARIA	32 días						
49	2.7.1	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	15 días						
50		FIN	0 días						
51		INICIO	0 días						
52	3	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8.120 KM"	42 días						
53	3.1	TRABAJOS PRELIMINARES	20 días						
54	3.1.1	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO	7 días						
55	3.1.2	TOPOGRAFÍA, TRAZO Y REPLANTEO	20 días						
56	3.2	PAVIMENTOS	20 días						
57	3.2.1	CAPA NIVELANTE E = 0.05M	15 días						
58	3.2.2	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA ESTABILIZADO E=0.15M	20 días						
59	3.3	TRANSPORTE	25 días						
60	3.3.1	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1	20 días						
61	3.3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR 1	20 días						
62	3.3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 días							
63	3.3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR 20 días							
64	3.4	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	2 días						
65	3.4.1	RECONFORMACIÓN DE CUNETAS	2 días						
66	3.5	SEÑALIZACIÓN	17 días						
67	3.5.1	INSTALACIÓN DE POSTES KILOMÉTRICOS	17 días						
68	3.5.2	SEÑALES PREVENTIVAS	17 días						
69	3.5.3	SEÑALES REGLAMENTARIAS	17 días						
70	3.5.4	SEÑALES INFORMATIVAS	17 días						
71	3.6	IMPACTO AMBIENTAL	5 días						
72	3.6.1	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ÁREAS OCUPAD/ 5 días							

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

CONSEJO VIAL CRUZ DE CHILCA
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

Daysi Ruth Pinto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

Julio César Quiroga Aranda
DNI N° 89631001
REPRESENTANTE COMUN

PROYECTO:	Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
INICIO: 18/09/2020	División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
FIN: 31/12/2020	Resumen	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo fin	División crítica	
		solo duración	Tareas externas	Progreso	

#	EDT	Nombre	Duración
73	3.7	EMERGENCIA SANITARIA	18 días
74	3.7.1	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	16 días
75		FIN	0 días

dicembre 2020

noviembre 2020

octubre 2020

septiembre 2020

agosto 2020

18 días
16 días
0 días

31/12

[Handwritten signature]

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCRA
CALLE 1558 (PUERTO CRUZ) ARIAZO
TEL: 05 475 1230
CENTRO DE TRABAJO COMUNITARIO

ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA


 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 78397
 Daysi Ruth Pardo Mendoza

ING. CIVIL
R. CIP. N° 202898

Progreso manual

Hito externo

Informe de resumen manual

umen manual

o el comienzo

fin

areas externas

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Tarea

División

—lito

Resumen

Resumen

PROYECTO:

NICIO: 18/09/2020

FIN: 31/12/2020



000310


CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

PANEL FOTOGRAFICO

PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020


Daisy Ruth Pianta Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858


CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Quirozcoza Aranda
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMÚN

EJECUCION DEL ITEM PAQUETE DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES
TRAMO: "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8.120 KM", - "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHIJADERO LONG = 5.600 KM" - "ANGASMARCA - EL INGENIO -
CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG = 13.030 KM" - DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

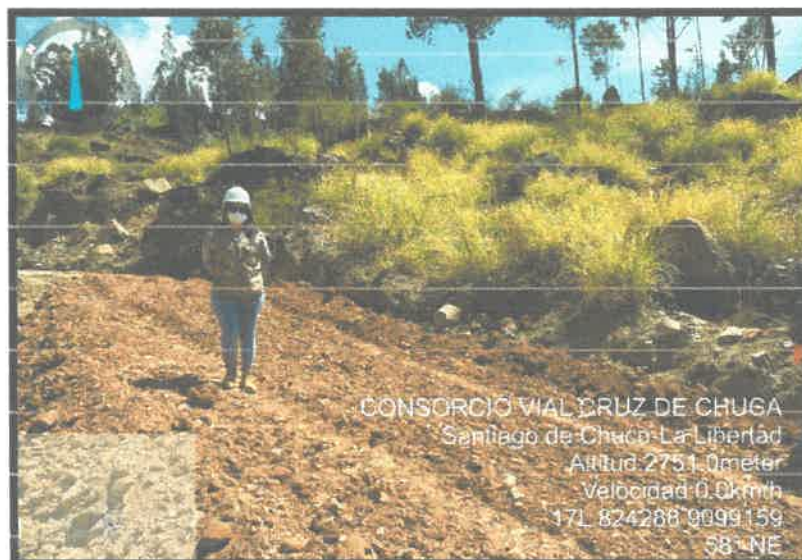


Foto N°01: Conformación de plataforma con espesor de 0.20cm, punto crítico en el km 1+100 Sector El Ingenio.

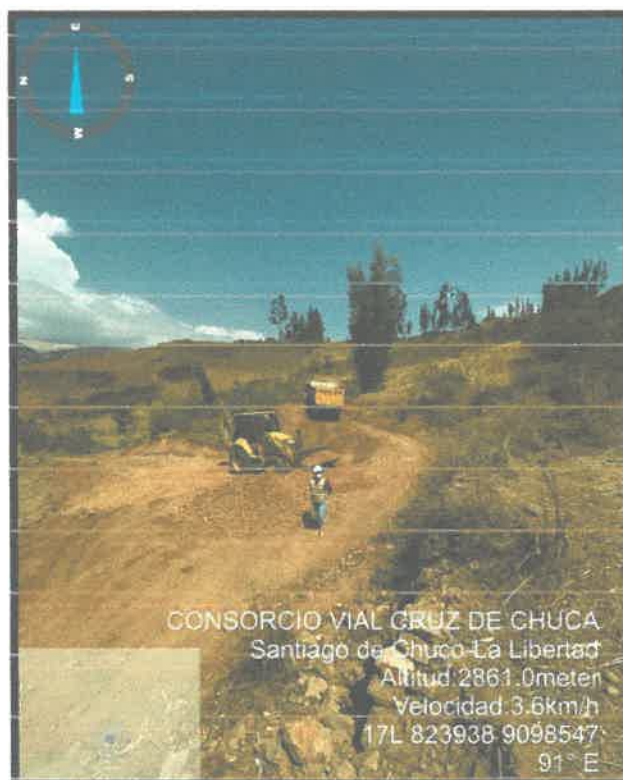


Foto N°02: Verificación de material insitu en la vía a ejecutar.



Daysi Ruth Panto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202358

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Guipuzcoa Aranda
DNI N° 19631091
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA



Foto N°03: Compactación de Ptaforma.



Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Quirozco Aranda
DNI N° 40531091
REPRESENTANTE COMUN

Foto N°04: Junto al Ing. De Seguridad visitando cantera y verificando señalización preventiva.

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202358



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

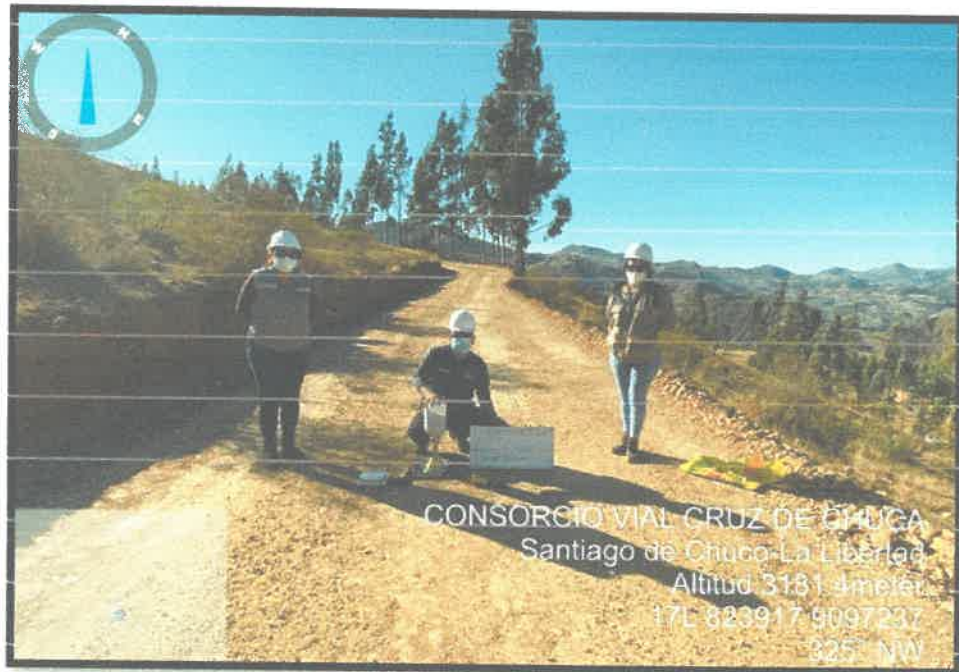


Foto N°05: Presencia de la Ing. Residente con la ing. Inspectora realizando los respectivos controles de calidad del afirmado (densidad de campo)



Daysi Ruth Panto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio Cesar Chupuzcoa Aranda
DNI N° 19631091
REPRESENTANTE COMUN

Foto N°06: Vigías en la salida e ingreso de la cantera.

Juanes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202358



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA



Foto N°7: Ingeniero de Seguridad, cumpliendo con el protocolo Covid, toma de temperatura al personal de trabajo.



[Signature]
Gourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

[Signature]
Daisy Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

Foto N°8: Conformación de cunetas con motoniveladora.

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
[Signature]
Julio César Quiroz Aranda
ONI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN

EJECUCION DEL ITEM PAQUETE DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES
TRAMO: "HUAYLACA - TAMBILLO LONG = 8.120 KM", - "ANGASMARCA - CRUZ DE CHUCA - AHUJADERO LONG = 5.800 KM" - "ANGASMARCA - EL INGENIO - CRUZ PAMPA - CATIRIN LONG = 13.030 KM" - DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.




CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO


 Daisy Ruth Plando Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202853


CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Quiroz Aranda
DAI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA






**ruta 1: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA – TAMBILLO - LONG.=8.120 Km"**


Daisy Ruth Panto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202658


CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Chipuzcoa Aranda
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN

“ACTA DE ENTREGA DE TERRENO”

Servicio	MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: “HUAYLACA – TAMBILLO LONG= 8.120 KM”; “ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHIJADERO LONG= 5.600 KM” Y “ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN LONG= 13.030 KM”, DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	 Lourdes Azucena Juárez Suárez ING. CIVIL R. CIP. N° 202858
Tramo	“HUAYLACA – TAMBILLO” LONG = 8.120 KM	
Provincia	SANTIAGO DE CHUCO	
Distrito	ANGASMARCA	
Entidad Contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)	 CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA Julio César Quirozco Aranda DNI N° 19531091 PRESENTANTE COMUN
Empresa Ejecutora	CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION QUIPUZCOA ARANDA S.A.C.)	
N.º de Contrato	CONTRATO DE SERVICIO N.º 012-2020-MPSCH-LOG	 Daysi Ruth Pianto Mendoza ING. CIVIL CIP N° 78397
Fecha de Contrato	28/08/2020	
Modalidad	SUMA ALZADA	
Monto Presupuestado	S/. 692,132.56 soles Inc. (I.G.V.)	
Monto Contractual	S/. 692,128.00 soles Inc. (I.G.V.)	
Inspector de Servicio	Ing. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA	 Ing. David Iván Silva Torres SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA CIP N° 63635
Plazo de Ejecución	PLAN DE TRABAJO: 20 D.C. MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C. MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C. INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C. TOTAL: 505 DÍAS CALENDARIOS (sujeto a fecha de contrato)	 Lourdes Azucena Juárez Suárez ING. CIVIL R. CIP. N° 202858
Fecha de Culminación	31/12/2021	 CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA Julio César Quirozco Aranda DNI N° 19531091 REPRESENTANTE COMUN

En el caserío Tambillo, distrito de Angasmarca, provincia de Santiago de Chuco – La libertad, siendo las 3:00 p.m. del 29 de agosto del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza con CIP. N° 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N° 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N° 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Ing. Daysi Ruth Pianto Mendoza con CIP N° 78397; y por último, por parte del Contratista la Ing. Lourdes Azucena Juárez Suárez con CIP N° 202858 como Residente de servicio y el Sr. Julio César Quirozco Aranda con DNI N° 19531091, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL EL CRUZ DE CHUCA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION QUIPUZCOA ARANDA S.A.C.). A fin de realizar la **ENTREGA DE TERRENO** del tramo: **“HUAYLACA – TAMBILLO”** con una longitud de **8.120 km**.


Este acto protocolar tiene por finalidad hacer la entrega de la ruta mencionada en todo su recorrido físico para la recolección de información necesaria y de esta manera hacer la elaboración del **PLAN DE TRABAJO** de la ruta, que es parte de la FASE I del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y formatos (anexos) estipulados en los Términos de Referencia del D.U. N° 070-2020 presentados para la contratación.


Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: “HUAYLACA – TAMBILLO LONG= 8.120 KM”; “ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHIJADERO LONG= 5.600 KM” Y**

"ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN LONG= 13.030 KM", DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Siendo las 3:30 p.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para dar inicio a la elaboración del Plan de Trabajo y continuar con los procedimientos posteriores para dar inicio a la FASE II y III (mantenimiento periódico y rutinario) del servicio. Del mismo día, se da por concluida el acto de **ENTREGA DE TERRENO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.

AREA USUARIA


Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 190782



Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 218511

AREA RESPONSABLE



Ing. David Iván Silva Torres
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
CIP N° 63635
Ing. David Iván Silva Torres
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH
CIP N° 63635




Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397


CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Quipuzcoa Aranda
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN

EMPRESA EJECUTORA



Ing. Lourdes Azucena Juárez Suárez
Residente de Servicio
CIP N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

Sr. Julio César Quipuzcoa Quezada
Representante Común de CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
DNI N° 19531091

INSPECTOR



Ing. Daysi Ruth Pianto Mendoza
Inspector del Servicio
CIP N° 78397


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858




CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

**RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA –
AHIJADERO - LONG.=5.600 Km"**


Daysi Ruth Plante Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858


CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Quirozcoza Aranda
DNI N° 19531081
REPRESENTANTE COM. IN

“ACTA DE ENTREGA DE TERRENO”

Servicio MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: “HUAYLACA – TAMBILLO LONG= 8.120 KM”; “ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHIJADERO LONG= 5.600 KM” Y “ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN LONG= 13.030 KM”, DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Tramo “ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHIJADERO” LONG = 5.600 KM
Provincia SANTIAGO DE CHUCO
Distrito ANGASMARCA

Entidad Contratante MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)
Empresa Ejecutora CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION QUIPUZCOA ARANDA S.A.C.)

N.º de Contrato CONTRATO DE SERVICIO N.º 012-2020-MPSCH-LOG
Fecha de Contrato 28/08/2020

Modalidad SUMA ALZADA
Monto Presupuestado S/. 477,332.80 soles Inc. (I.G.V.)

Monto Contractual S/. 477,329.00 soles Inc. (I.G.V.)
Inspector de Servicio Ing. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA
Plazo de Ejecución PLAN DE TRABAJO: 20 D.C.

Mantenimiento Periódico: 120 D.C.
Mantenimiento Rutinario: 360 D.C.
INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C.

TOTAL: 505 DÍAS CALENDARIOS (sujeto a fecha de contrato)
Fecha de Culminación 31/12/2021

Ing. Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

Julio César Quipuzcoa Aranda
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMÚN

En el caserío Tambillo, distrito de Angasmarca, provincia de Santiago de Chuco – La libertad, siendo las 3:00 p.m. del 29 de agosto del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza con CIP. N° 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N° 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N° 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Ing. Daysi Ruth Pianto Mendoza con CIP N° 78397; y por último, por parte del Contratista la Ing. Lourdes Azucena Juárez Suárez con CIP N° 202858 como Residente de servicio y el Sr. Julio César Quipuzcoa Quezada con DNI N° 19531091, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL EL CRUZ DE CHUCA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION QUIPUZCOA ARANDA S.A.C.). A fin de realizar la **ENTREGA DE TERRENO** del tramo: “ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHIJADERO” con una longitud de 5.600 km.


Este acto protocolar tiene por finalidad hacer la entrega de la ruta mencionada en todo su recorrido físico para la recolección de información necesaria y de esta manera hacer la elaboración del **PLAN DE TRABAJO** de la ruta, que es parte de la FASE I del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y formatos (anexos) estipulados en los Términos de Referencia del D.U. N° 070-2020 presentados para la contratación.


Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: “HUAYLACA – TAMBILLO LONG= 8.120 KM”; “ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHIJADERO LONG= 5.600 KM” Y**

"ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN LONG= 13.030 KM", DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Siendo las 3:30 p.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para dar inicio a la elaboración del Plan de Trabajo y continuar con los procedimientos posteriores para dar inicio a la FASE II y III (mantenimiento periódico y rutinario) del servicio. Del mismo día, se da por concluida el acto de **ENTREGA DE TERRENO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.

AREA USUARIA


Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 190782



Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 218511

AREA RESPONSABLE



MUNICIPIO PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

Ing. David Iván Silva Torres
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
CIP N° 63635


Ing. David Iván Silva Torres
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH
CIP N° 63635


CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Quipuzcoa Aranda
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN

EMPRESA EJECUTORA


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

Ing. Lourdes Azucena Juárez Suárez
Residente de Servicio
CIP N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

Julio César Quipuzcoa Aranda
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN

Sr. Julio César Quipuzcoa Quezada
Representante Común de CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
DNI N° 19531091

INSPECTOR



Daysi Ruth Pianto Mendoza
INGENIERO CIVIL
CIP: 78397

Ing. Daysi Ruth Pianto Mendoza
Inspector del Servicio
CIP N° 78397


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858




Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

ACTA DE INICIO DE SERVICIO


Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Quiroz Aranda
DNI N° 49531091
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

RUTA 1: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "HUAYLACA – TAMBILLO - LONG.=8.120 Km"


Daysi Ruth Piantó Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

Julio César Quiroz Aranda
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN

“ACTA DE INICIO DE SERVICIO”

Servicio

MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO Y PERIODICO DEL CAMINO VECINAL:
“HUAYLACA – TAMBILLO LONG= 8.120 KM”; “ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHIJADERO LONG= 5.600 KM” Y “ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN LONG= 13.030 KM”, DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Tramo

“HUAYLACA – TAMBILLO” LONG = 8.120 KM

Provincia

SANTIAGO DE CHUCO

Distrito

ANGASMARCA

Entidad Contratante

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)

Empresa Ejecutora

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION QUIPUZCOA ARANDA S.A.C.)

N.º de Contrato

CONTRATO DE SERVICIO N.º 012-2020-MPSCH-LOG

Fecha de Contrato

28/08/2020

Modalidad

SUMA ALZADA

Monto Presupuestado

S/. 692,132.56 soles Inc. (I.G.V.)

Monto Contractual

S/. 692,128.00 soles Inc. (I.G.V.)

Inspector de Servicio

Ing. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA

Aprobación Plan de Trabajo

RESOLUCIÓN GERENCIAL N.º 152-2020-MPSCH/GM

Fecha de Aprobación

21/09/2020

Fecha de Inicio

22/09/2020

Plazo de Ejecución

MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C. (sujeto a fecha de contrato)

MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C.

INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C.

Fecha de Culminación

31/12/2021

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Quipuzcoa Aranda
DNI N.º 19531091
REPRESENTANTE COMUN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. David Iván Silva Torres
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
CIP N.º 63635

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N.º 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julio César Quipuzcoa Aranda
DNI N.º 19531091
REPRESENTANTE COMUN

En el caserío Tambillo, distrito de Angasmarca, provincia de Santiago de Chuco – La libertad, siendo las 3:00 p.m. del 22 de septiembre del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza con CIP. N.º 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N.º 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH, el Ing. Frank Renato Gutiérrez Contreras con CIP N.º 225088 como monitor designado del servicio intervenido (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N.º 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Ing. Daysi Ruth Pianto Mendoza con CIP N.º 78397; asimismo, representando a Provías Descentralizado está el Ing. Gabriel Omar Panta Cossio con CIP N.º 192701 encargado de Monitoreo y Seguimiento y el Ing. Bach. Eduardo Rafael Príncipe León con DNI N.º 46839109 como Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento; finalmente, por parte del Contratista Ing. Lourdes Azucena Juárez Suárez con CIP N.º 202858 como Residente de servicio y el Sr. Julio César Quipuzcoa Quezada con DNI N.º 19531091, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL CRUZ CHUCA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION QUIPUZCOA ARANDA S.A.C.). A fin de realizar el **INICIO DE SERVICIO** del tramo: “HUAYLACA – TAMBILLO” con una longitud de 8.120 km.

Este acto protocolar tiene por finalidad dar inicio a la ejecución de las actividades de **MANTENIMIENTO PERIÓDICO** de la ruta mencionada en todo su recorrido físico correspondiente a la FASE II del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y partidas estipulados en el Plan de Trabajo previamente aprobado por la Entidad.


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N.º 202858


Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N.º 78397

Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO Y PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: "HUAYLACA – TAMBILLO LONG= 8.120 KM"; "ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHIJADERO LONG= 5.600 KM" Y "ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN LONG= 13.030 KM", DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**

Siendo las 5:30 p.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas acorde con el Plan de Trabajo, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para empezar la ejecución del Mantenimiento Periódico. Del mismo día, se da por concluido el acto de **INICIO DE SERVICIO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.

AREA USUARIA


Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 190782


Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 218511



Frank Renato Gutiérrez Contreras
ING. CIVIL
R. CIP. N° 225088


Ing. Frank Renato Gutiérrez Contreras
Monitor Designado del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 70737

AREA RESPONSABLE


Ing. David Iván Silva Torres
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
CIP N° 63635

Ing. David Iván Silva Torres
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH
CIP N° 63635


Julio César Quirozco Aranda
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN


Lourdes Azuaga Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858


Daysi Ruth Planto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

REPRESENTANTES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD



Gabriel Omar Panta Cossio
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 192701

Ing. Gabriel Omar Panta Cossio
Monitoreo y Seguimiento a Mantenimiento Vial
Provincia de Santiago de Chuco
CIP N° 192701



Eduardo R. Príncipe León
ANALISTA Y REGISTRADOR DEL MONITOREO
Y SEGUIMIENTO A MANTENIMIENTO VIAL
PROV. SANTIAGO DE CHUCO

Ing. Bach. Eduardo Rafael Príncipe León
Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento
Provincia de Santiago de Chuco
DNI N° 46839109

EMPRESA EJECUTORA


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

Ing. Lourdes Azucena Juárez Suárez
Residente de Servicio
CIP N° 202858


CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

Julio César Quipezcoa Aranda
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN


Sr. Julio César Quipezcoa Quezada
Representante Común de CONSORCIO VIAL SUCCHA
DNI N° 19531091

INSPECTOR


 Daysi Ruth Pianto Mendoza
INGENIERO CIVIL
CIP: 78397

Ing. Daysi Ruth Pianto Mendoza
Inspector del Servicio
CIP N° 78397


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

Julio César Quipezcoa Aranda
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMUN


 Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397




070293

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

RUTA 2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA –
AHIJADERO - LONG.=5.600 Km"


 Daysi Ruth Panto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

Julio César Quiroz Aranda
DNI N° 79531091
REPRESENTANTE COMUN

“ACTA DE INICIO DE SERVICIO”

Servicio

MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO Y PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: “HUAYLACA – TAMBILLO LONG= 8.120 KM”; “ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHIJADERO LONG= 5.600 KM” Y “ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN LONG= 13.030 KM”, DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Tramo

“ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHIJADERO” LONG = 5.600 KM SANTIAGO DE CHUCO

Provincia

ANGASMARCA

Distrito

Entidad Contratante

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)

Empresa Ejecutora

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION QUIPUZCOA ARANDA S.A.C.)

N.º de Contrato

CONTRATO DE SERVICIO N.º 012-2020-MPSCH-LOG

Fecha de Contrato

28/08/2020

Modalidad

SUMA ALZADA

Monto Presupuestado

S/. 477,332.80 soles Inc. (I.G.V.)

Monto Contractual

S/. 477,329.00 soles Inc. (I.G.V.)

Inspector de Servicio

Ing. DAYSI RUTH PIANTO MENDOZA

Aprobación Plan de Trabajo

RESOLUCIÓN GERENCIAL N.º 152-2020-MPSCH/GM

Fecha de Aprobación

21/09/2020

Fecha de Inicio

22/09/2020

Plazo de Ejecución

MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C. (sujeto a fecha de contrato)

MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C.

INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C.

Fecha de Culminación

31/12/2021

En el caserío Tambillo, distrito de Angasmarca, provincia de Santiago de Chuco – La libertad, siendo las 3:00 p.m. del 22 de septiembre del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza con CIP. N.º 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N.º 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH, el Ing. Frank Renato Gutiérrez Contreras con CIP N.º 225088 como monitor designado del servicio intervenido (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N.º 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Ing. Daysi Ruth Pianto Mendoza con CIP N.º 78397; asimismo, representando a Provias Descentralizado está el Ing. Gabriel Omar Panta Cossio con CIP N.º 192701 encargado de Monitoreo y Seguimiento y el Ing. Bach. Eduardo Rafael Príncipe León con DNI N.º 46839109 como Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento; finalmente, por parte del Contratista Ing. Lourdes Azucena Juárez Suárez con CIP N.º 202858 como Residente de servicio y el Sr. Julio César Quiquiza Aranda con DNI N.º 19531091, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL CRUZ CHUCA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION QUIPUZCOA ARANDA S.A.C.). A fin de realizar el **INICIO DE SERVICIO** del tramo: **“ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHIJADERO”** con una longitud de **5.600 km.**

Este acto protocolar tiene por finalidad dar inicio a la ejecución de las actividades de **MANTENIMIENTO PERIÓDICO** de la ruta mencionada en todo su recorrido físico correspondiente a la FASE II del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y partidas estipulados en el Plan de Trabajo previamente aprobado por la Entidad.




Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N.º 78397

Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N.º 202858


Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO Y PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: "HUAYLACA – TAMBILLO LONG= 8.120 KM"; "ANGASMARCA – CRUZ DE CHUCA – AHIJADERO LONG= 5.600 KM" Y "ANGASMARCA – EL INGENIO – CRUZ PAMPA – CATIRIN LONG= 13.030 KM", DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**

Siendo las 5:30 p.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas acorde con el Plan de Trabajo, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para empezar la ejecución del Mantenimiento Periódico. Del mismo día, se da por concluido el acto de **INICIO DE SERVICIO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.


AREA USUARIA




Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 190782




Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 218511


Frank Renato Gutiérrez Contreras
ING. CIVIL
R. CIP. N° 225088

Ing. Frank Renato Gutiérrez Contreras
Monitor Designado del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 70737


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

AREA RESPONSABLE



Ing. David Iván Silva Torres
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
CIP N° 63635

Ing. David Iván Silva Torres
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH
CIP N° 63635


CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
Julián César Quiroz Aranda
DNI N° 19831001
REPRESENTANTE COMUN


Daysi Ruth Panto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

REPRESENTANTES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD



Gabriel Omar Panta Cossio
INGENIERO CIVIL
R. CIP. N° 192701

Ing. Gabriel Omar Panta Cossio
Monitoreo y Seguimiento a Mantenimiento Vial
Provincia de Santiago de Chuco
CIP N° 192701



Eduardo R. Príncipe León
ANALISTA Y REGISTRADOR DE MONITOREO
Y SEGUIMIENTO A MANTENIMIENTO VIAL

Ing. Bach. Eduardo Rafael Príncipe León
Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento
Provincia de Santiago de Chuco
DNI N° 46839109

EMPRESA EJECUTORA


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

Ing. Lourdes Azucena Juárez Suárez
Residente de Servicio
CIP N° 202858

CONSORCIO VIAL DE CHUCA

Julio César Quipuzcoa Aranda
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMÚN

Sr. Julio César Quipuzcoa Quezada
Representante Común de CONSORCIO VIAL SUCCHA
DNI N° 19531091

INSPECTOR






Daysi Ruth Pianto Mendoza
INGENIERO CIVIL
CIP: 78397

Ing. Daysi Ruth Pianto Mendoza
Inspector del Servicio
CIP N° 78397




Daysi Ruth Pianto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCU

Julio César Quipuzcoa Aranda
DNI N° 19531091
REPRESENTANTE COMÚN


Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858



CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA

COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO Y/O EMPRESA.



Daysi Ruth Pinto Mendoza
ING. CIVIL
CIP N° 78397

[Signature]
Lourdes Azucena Juárez Suárez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 202858

CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA
[Signature]
Julio César Quiroz Coa Aranda
DNI N° 19831091
REPRESENTANTE COMUN
