



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco


PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

INFORME N° 1442 - 2020-MPSCH/DIST/SGI



A : ING. RAFAEL K. VALENCIA REBAZA
Gerente de IVP de la MPSCH

DE : ING. DAVID IVAN SILVA TORRES
Sub Gerente de Infraestructura – MPSCH

ASUNTO : CONFORMIDAD DE VALORIZACION N° 04 CONTRATISTA – CONTRACTUAL
(TRAMO 08)

REFERENCIA : (01) INFORME N°282-020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH
(02) CARTA N° 014-2020-AJDL-C
(03) OBRA: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: EMP – PE – 3N VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD." (8.1)
(04) OBRA: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO – TIERRA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD." (8.2)
(05) CONTRATO DE SERVICIO N° 007-2020-MPSCH-LOG

FECHA : Santiago de Chuco, 25 de Diciembre del 2020

Me es sumamente honroso dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo; por otro lado referente al asunto de la presente manifiesto lo siguiente:

I. BASE LEGAL

- Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 27972 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
- Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
- Reglamento Nacional de Edificaciones

II. ANTECEDENTE

- ✓ Mediante el documento de la referencia, **INFORME N°282-2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH**, el Encargada de la División de Supervisión y Liquidación de Obras, con fecha 22 de Diciembre del 2020, da la **CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION N° 04 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO** del contratista "CONSORCIO VIAL CALIFORNIA"; presentado por el INSPECTOR DE OBRA el Ing. ALEX JAVIER DIAZ LEON de las obras denominadas: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: EMP – PE – 3N VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD." (8.1); "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL





Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"
CAMINO VECINA: CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO – TIERRA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD." (8.2) quien solicita el Pago N° 04 por servicios de ejecución de obra al CONTRATISTA "CONSORCIO VIAL CALIFORNIA"

III. ANALISIS

Se detallan en los cuadros de los tramos valorizados

TRAMOS N°8.01: CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO – TIERRA

VALORIZACION BRUTA	S/. 468,864.70
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (-) SIN IGV	S/. -
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (-) SIN IGV	S/. -
VALORIZACION NETA	S/. 468,864.70
IGV (18%)	S/. 84,395.64
VALORIZACION (INCL. IGV)	S/. 553,260.34
RETENCION DE 10% FIEL CUMPLIMIENTO	

TRAMOS N°8.02: EMP – PE – 3N VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA

VALORIZACION BRUTA	S/. 47,595.63
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (-) SIN IGV	S/. -
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (-) SIN IGV	S/. -
VALORIZACION NETA	S/. 47,595.63
IGV (18%)	S/. 8,567.22
VALORIZACION (INCL. IGV)	S/. 56,162.85
RETENCION DE 10% FIEL CUMPLIMIENTO	

COSTO GLOBAL DE TODO EL SERVICIO

VALORIZACION BRUTA	S/. 516,460.33
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (-) SIN IGV	S/. -
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (-) SIN IGV	S/. -
VALORIZACION NETA	S/. 516,460.33
IGV (18%)	S/. 92,962.86
VALORIZACION (INCL. IGV)	S/. 609,423.19
RETENCION DE 10% FIEL CUMPLIMIENTO	Se retuvo todo
MONTO TOTAL	S/. 609,423.19

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO
Ing. David Leon Sibaja Torres
SOLUCIONEROS DE INFRAESTRUCTURA



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019

E-mail: mpsch@terra.com.pe



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ La **Valorización Bruta N° 04 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO** del contratista fue por S/. 516,460.33 (QUINIENTOS DIESICEIS MIL CUAOTRCIENTOS SESENTA CON 33/100 SOLES).
- ✓ Se recomendó que se haga **RETENCION DE 10 % GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO ES POR EL MONTO DE S/. 172,400.00 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES) INCLU IGV**; en las primeras valorizaciones.
- ✓ La Amortización del Adelanto Directo: -
- ✓ La Amortización del Adelanto de Materiales: -
- ✓ Por lo tanto el monto a cancelar al **CONTRATISTA POR CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA VALORIZACION N°04 – POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO**; asciende a S/. 609,423.19 (SEISCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTI TRES CON 19/100 SOLES) INCL. IGV; se recomienda hacer la retención de fiel cumplimiento.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y acciones que estime por conveniente, salvo mejor parecer.

Atentamente,

Adjunto:

- Referencias
- Val N°04()
- Digital ()


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. David Ivan Silva Torres
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



INFORME N° 282 - 2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH



A : ING° DAVID IVAN SILVA TORRES
SUB-GERENTE DE INFRAESTRUCTURA MPSCH

DEL : ING. HERMES M. MELENDEZ TAMAYO
JEFE (e) DIVISIÓN DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

ASUNTO : VALORIZACIÓN DE SERVICIO N°04 – DICIEMBRE 2020

REFERENCIA: a) TRAMO I: "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES EMP.PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA - Long. 4.330 Km. DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"

TRAMO II: "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES CALIFORNIA - LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO – TIERRA NEGRA- Long. 15.906 Kms. DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"

b) Carta N°014 - 2020 – AJDL-C

c) Carta N°008-2020-CONSORCIO VIAL CALIFORNIA/RL/EGD

FECHA : Santiago de Chuco, 21 de Diciembre del 2020

Es grato dirigirme a Usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo, vistos los documentos de la referencia, el suscrito como Jefe de la División de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco **OTORGA LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN N° 04- DICIEMBRE 2020** del Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS: EMP.PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA - Long. 4.330 Km. – CALIFORNIA - LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO – TIERRA NEGRA- Long. 15.906 Kms. DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD" y elaborado por el Contratista **CONSORCIO VIAL CALIFORNIA** según Contrato de Servicios N° 009-2020-MPSCH-LOG y aprobado por el Inspector de Obra.

Se informa trabajos valorizados en el periodo del 01 al 30 de Noviembre 2020.

DATOS GENERALES

1.- DENOMINACION

TRAMO I: "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES EMP.PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA - Long. 4.330 Km. DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"

TRAMO II: "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES CALIFORNIA - LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO – TIERRA NEGRA- Long. 15.906 Kms. DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"

2.- UBICACIÓN

- Caseríos : Tramo I: Villa Cruz de Algallama, Paccha Parte Alta,
Tramo II: California, Los Ángeles, La Cruz de Ashiquino, Mal Paso, Tierra Negra.
- Distrito : Santa Cruz de Chuca.
- Provincia : Santiago de Chuco.
- Región : La Libertad

3.- DATOS DEL MANTENIMIENTO:





Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019

E-mail: mpsch@terra.com.pe

EJECUTOR

- Proceso de Selección : PES-PROG-008-2020-MPSCH/CS
- Contratista : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
- Representante Legal : Edgar Gómez Domínguez
- Contrato de Servicios : N° 016-2020-MPSCH-LOG.
- Suscripción de Contrato : 28/08/2020
- Modalidad : A Suma Alzada
- Valor Referencial (inc. IGV) : S/ 1'724,000.00
- Monto Contratado (inc. IGV) : S/ 1'724,000.00
- Monto del Tramo (inc. IGV) : S/ 306181.00 - S/ 1'124,739.00
- Factor de Relación : 1.000
- Fuente de Financiamiento : MTC –Provias – D. U. N°070-2020
- Plazo de Ejecución Inicial : 500 Días Calendarios
- Entrega de Terreno : 05 de Setiembre del 2020
- Inicio de Plazo Contractual : 05 de Setiembre del 2020 (Elaboración Plan de Trabajo)
- Inicio de Plazo Fase II : 22 de Setiembre 2020
- Fecha Término Programado : 31 de Diciembre del 2021
- Residente de Obra : Ing. Quelvín Julio Quipuzcoa Alayo CIP 110887

TRAMO I: CALIFORNIA, LOS ÁNGELES, LA CRUZ DE ASHIQUINO, MAL PASO, TIERRA NEGRA.

- Porcentaje Programado : 27.87%
- Porcentaje Programado Acumulado : 100.00%
- Porcentaje Ejecutado : 49.19%
- Porcentaje Ejecutado Acumulado : 100.00%
- Estado del Mantenimiento : Terminado
- Monto Valorizado : S/ 553,260.34

TRAMO II: VILLA CRUZ DE ALGALLAMA, PACCHA PARTE ALTA,

- Porcentaje Programado : 30.236%
- Porcentaje Programado Acumulado : 100.00%
- Porcentaje Ejecutado : 18.34%
- Porcentaje Ejecutado Acumulado : 100.00%
- Estado del Mantenimiento : Terminado
- Monto Valorizado : S/ 56,162.86

INSPECTOR

- Inspector : Ing. Alex Javier Díaz León CIP 126547
- Contrato de Inspección de Obra : N° 028-2020-MPSCH-LOG.
- Fecha de Contrato : 24/08/2020
- Plazo de Prestación de Servicio : 120 Días Calendario
- Monto Contratado (inc. IGV) : S/ 19,224.20

4.- ANTECEDENTES

- Con fecha 28 de Agosto del 2019 se firma el Contrato de Servicios N°016-2020-MPSCH-LOG del Mantenimiento Periódico y Rutinario "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS: EMP.PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA - Long. 4.330 Km. – CALIFORNIA - LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO – TIERRA NEGRA- Long. 15.906 Kms. DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD" con la Empresa Contratista CONSORCIO VIAL CALIFORNIA por un monto total de S/. 1'724,000.00 y con un presupuesto por tramos de S/306181.00 y S/ 1'124,739.00, con un plazo de ejecución de 500 días calendario.
- El día 24 de Agosto del 2020 se firma el Contrato de Inspección de Servicio N°028-2020-MPSCH-LOG con el Consultor Ing. Alex Javier Díaz León CIP 126547 por un monto de S/. 19,224.20, con un plazo de ejecución de 120 días calendario.
- Con fecha 05/09/2020 se firma el Acta de Entrega de Terreno con la participación de representantes de todos los involucrados.





Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019

E-mail: mpsch@terra.com.pe

- El 22/09/2020 se firma el Acta de Inicio de Obra (Fase II) con una fecha programada de término de servicio del 31 de Diciembre 2020.
- Con fecha 12 de Setiembre 2020, el Inspector recepciona la Carta N°003-2020-CONSORCIO VIAL CALIFORNIA/RL/EGD con la cual el Contratista CONSORCIO VIAL CALIFORNIA hace entrega del Plan de Trabajo para su revisión y tramite respectivo
- El Ingeniero Inspector del Servicio mediante Informe N°006-2020-AJDL-C del 15 de Setiembre del 2020 ingresa por mesa de partes de la Entidad con Expediente Administrativo N° 4430 el Plan de Trabajo aprobado para su Conformidad.
- Mediante INFORME N°121-2020-HMMT/DEYP/SGI/MPSCH, de fecha 25 de Setiembre del 2020 la División de Estudios y Proyectos otorga la Conformidad del Plan de Trabajo y sugiere su aprobación mediante la Resolución Respectiva.
- Con Resolución de Gerencia Municipal N°00312-2020-MPSCH/GM de fecha 28 de Setiembre 2020 de Aprueban el Plan de Trabajo del Mantenimiento Rutinario y Periódico.
- Mediante Carta N°008-2020-AJDL-C el Ing. Inspector hace llegar la Valorización de Servicio N°01 – Setiembre 2020 incluyendo la Carta N°003-2020-CONSORCIO VIAL CALIFORNIA/RL/EGD del 05/10/2020, para su revisión y conformidad de pago.
- Mediante Carta N°010-2020-AJDL-C el Ing. Inspector hace llegar la Valorización de Servicio N°02 – Octubre 2020 incluyendo la Carta N°005-2020-CONSORCIO VIAL CALIFORNIA/RL/EGD del 05/11/2020, para su revisión y conformidad de pago.
- Mediante Carta N°013-2020-AJDL-C el Ing. Inspector hace llegar la Valorización de Servicio N°03 – Noviembre 2020 incluyendo la Carta N°007-2020-CONSORCIO VIAL CALIFORNIA/RL/EGD del 30/11/2020, para su revisión y conformidad de pago.
- Mediante Carta N°014-2020-AJDL-C el Ing. Inspector hace llegar la Valorización de Servicio N°04 – Diciembre 2020 incluyendo la Carta N°008-2020-CONSORCIO VIAL CALIFORNIA/RL/EGD, para su revisión y conformidad de pago.



5.- DESCRIPCION DE APRTIDAS DEL MANTENIMIENTO REALIZADAS EN LOS 02 TRAMOS

- Movilización de Equipos y Maquinaria desde Trujillo a pie de obra. Se ha trasladado la maquinaria que se describe en el informe del Ing. Inspector.
- Ejecución de partida de Trazo y Replanteo acumulando el 100% del tramo con el uso de equipo topográfico completo y dejando monumentados BMs y niveles.
- Colocación de una Capa Nivelante de e=5 cm en un volumen que representa el 100 % del Metrado total.
- Colocación de Material Granular, Emplantillado, Nivelación y Compactado e=15cm de 11,460 m3 que representa el 100% del metrado.
- Extracción, selección, carguío y acumulación o apilamiento en zonas estratégicas, de material granular de cantera en un aproximado de 32,600 m3 que representa el 100% del metrado total.
- Eliminación de Material Excedente a botaderos autorizados en un volumen de 102,800 m3 que representa el 100% aprox. del total.
- Conformación y Perfilado de Cunetas con maquinaria y mano de obra en tramo de 10,500 ml, acumulando que es el 100% de la longitud total.
- En Señalización con la totalidad de Postes Kilométricos, Señales Preventivas, Señales Reglamentarias y Señales Informativas consideradas.
- Se ha realizado la Recuperación Ambiental del 100% de áreas ocupadas en el Tramo.
- Implementación de protocolos de seguridad y equipamiento con EPPs para todo el personal.

6.-DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICION:



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



RESUMEN VALORIZACIÓN N° 04 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (Diciembre 2020)

TRAMO I: CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA



VALORIZACIÓN CONTRACTUAL (TRAMO I)	SIN IGV		S/. 468,864.70
REINTEGROS (REAJUSTES RECONOCIDOS)	S/. SIN IGV	0.00	S/. 0.00
VALORIZACION BRUTA			S/.468,864.70
AMORTIZACIONES	SIN IGV		S/.0.00 (-)
DEDUCCIONES (DQNC)	S/. SIN IGV	0.00	S/. 0.00
ADELANTO DIRECTO	S/. SIN IGV	0.00	
ADELANTO PARA MATERIALES	S/. SIN IGV	0.00	
ADELANTO DIRECTO	S/. SIN IGV	0.00	
ADELANTO PARA MATERIALES	S/. SIN IGV	0.00	
VALORIZACION NETA			S/. 468,864.70
I. G. V. 18.00%			S/. 84,395.64
NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA			S/. 553,260.34

SON : QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 34/100 SOLES

RESUMEN VALORIZACIÓN N° 04 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (Diciembre 2020)

TRAMO II: EMP.PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA

VALORIZACIÓN CONTRACTUAL (TRAMO II)	SIN IGV		S/. 47,595.63
REINTEGROS (REAJUSTES RECONOCIDOS)	S/. SIN IGV	0.00	S/. 0.00
VALORIZACION BRUTA			S/.47,595.63
AMORTIZACIONES	SIN IGV		S/.0.00 (-)
ADELANTO DIRECTO	S/. SIN IGV	0.00	



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



DEDUCCIONES (DQNC)	ADELANTO PARA MATERIALES	S/.	0.00	S/.	0.00
	ADELANTO DIRECTO	S/.	0.00		
	ADELANTO PARA MATERIALES	S/.	0.00		
VALORIZACION NETA				S/.	47,595.83
I. G. V. 18.00%				S/.	8,567.22
NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA				S/.	56,162.85

SON : CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 86/100 SOLES

7.- TOTAL A CANCELAR POR VALORIZACIÓN DE SERVICIO N°02 – OCTUBRE 2020

TRAMO I: CALIFORNIA-LOS ANGELES-LA CRUZ ASHIQUINO-MAL PASO-TIERRA NEGRA	S/.	553,260.34
TRAMO II : VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA	S/.	56,162.85

TOTAL A CANCELAR VALORIZACIÓN DE SERVICIO N°02 – OCTUBRE 2020 S/ 609,423.19

SON: SEISCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 19/100 SOLES

8.- ANALISIS

- Se ha revisado el trámite seguido a los documentos de la referencia generados por el Contratista y el Inspector del Servicio.
- El Informe de Aprobación de la Valorización del Servicio emitido por el Inspector indica que la valorización está de acuerdo con lo ejecutado y cumple con el contenido de documentos e información técnica requerida y necesaria para el cumplimiento de las metas y objetivos del servicio contratado.
- El Ing. Inspector del Servicio, en las conclusiones de su informe, debe ser claro y específico respecto a la aprobación de la Valorización de Servicio correspondiente.
- El mantenimiento se encuentra en ejecución.

9.- RECOMENDACIONES

- Se recomienda al Ing. Residente e Ing Inspector que deben presentar la documentación con el número de ejemplares originales y copias establecidos, contenido en formato digital y con el uso de separadores y la numeración requerida.
- Se recomienda al Ing. Residente e Ing Inspector que deben firmar todos los folios de la Valorización de todos los documentos que se presenten para su trámite. El Representante Legal también debe firmar todos los folios.
- Presentar todos los Análisis de Materiales y pruebas de campo requeridos (Estudio de Canteras, CBR, Densidad de Campo, etc) realizados en un laboratorio que cuente con autorización de INDECOPI.
- Presentar registro fotográfico de la ejecución de las partidas con su respectiva descripción.
- Verificar el cumplimiento de plan de trabajo, especialmente la Adecuación e Implementación de Protocolos ante la Emergencia Sanitaria por el Covid 19.



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe

10.- CONCLUSIONES

- El Ing. Inspector del Servicio, en su informe, APRUEBA la Valorización de Servicio N°04 - Diciembre 2020 e INFORMA SU TERMINACION.
- Luego de su revisión, la Jefatura de la División de Supervisión y Liquidación de Obras de la Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, **OTORGA LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN N°04 – DICIEMBRE 2020** del Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario “**MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS: EMP.PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA - Long. 4.330 Km. – CALIFORNIA - LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO – TIERRA NEGRA- Long. 15.906 Kms. DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD**” y elaborado por el Contratista **CONSORCIO VIAL CALIFORNIA** y aprobado por el Inspector de Obra y sugiere su **CANCELACION** en cumplimiento de las cláusulas contractuales.

Es todo cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Hermes M. Meléndez Tamayo
Ing. Hermes M. Meléndez Tamayo
CIP. 111401
Jefe División de Supervisión y Liquidaciones

ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

Año de la Universalización de la Salud

Santiago de Chuco, 21 de Diciembre del 2020

CARTA N° 014 - 2020 – AJDL-C

Sr: DR. FELIPE WILMER ANGULO ZAVALETA.
Gerente de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.

Asunto: ALCANZO VALORIZACIÓN N° 04 – DEL CONTRATISTA “CONSORCIO VIAL CALIFORNIA”.

Referencia: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: “EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA LONG=4.330KM”, - “CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM” – DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

Tengo a bien dirigirme a usted en calidad de inspector para saludarlo cordialmente y a la vez alcanzarle la valorización N° 04 presentado por el contratista “CONSORCIO VIAL CALIFORNIA” referente al “SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: “EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA LONG=4.330KM”, - “CALIFORNIA -LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM” – DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD”; correspondiente al mes de diciembre del presente año.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para testimoniarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO
MESA DE PARTES
N° Exp: 7234
21 DIC. 2020
N° Folios: 273 + 2 copias
Hora: 5:43 Firma: [Signature]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO
GERENCIA MUNICIPAL
PROVEIDO
PASE a: INFRAESTRUCTURA VIAL
PARA: SU ATENCIÓN PREVIA
REVISADO
FECHA: 22.12.20 FIRMADO: [Signature]
ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547



ALEX JAVIER DIAZ LEON

INGENIERO CIVIL

REG. CIP N° 126547

"Año de la universalización de la salud"

272

INFORME N° 007 – 2020 –AJDL/INSP

A : **ING. RAFAEL K. VALENCIA REBAZA.**
Gerente de IVP de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.

DE : **ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON.**
Inspector del servicio de ejecución del Mantenimiento Periódico.

ASUNTO : **VALORIZACIÓN N° 04 DEL CONTRATISTA**

REFERENCIA : **SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA LONG=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" – DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD**

FECHA : Santiago de Chuco 21 de diciembre del 2020

Mediante el presente tengo a bien de alcanzarle el pronunciamiento al informe mensual del contratista referente a la Valorización N° 04 del: "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA LONG=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" – DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD", detallando lo siguiente:

I. ANTECEDENTES.

- a) Conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local.
- b) La Ley Orgánica de Municipalidades señala que las municipalidades provinciales y distritales, dentro del marco de las competencias y funciones específicas, son competentes para promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales.
- c) Mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprobó la reanudación de las actividades: "Mantenimientos, Mejoramiento y Conservación Rutinarios y Periódicos de Vías Nacionales, Departamentales y Locales" y de acuerdo a lo señalado en el numeral 1.2 del Artículo 1 del mencionado decreto supremo, las referidas actividades se encuentran autorizadas para su reanudación de forma automática, una vez que las personas jurídicas que realizan dichas labores registren su "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.
- d) Con Decreto de Urgencia N° 070-2020 se dictó medidas destinadas a generar empleo para la ejecución de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional, departamental y vecinal a efectos de establecer medidas necesarias, en materia económica y financiera, que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, los

ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

Dirección: Mz. E Lote 23 Urb. San Miguel – Trujillo – La Libertad
Celular: 947428923
email: alex_jdsp@hotmail.com

ALEX JAVIER DIAZ LEON

INGENIERO CIVIL

REG. CIP N° 126547

27

Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco de sus competencias, la ejecución de acciones oportunas para la reactivación de la actividad económica, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento periódico y rutinario de las vías nacionales, departamentales y vecinales. Los trabajos de mantenimiento proyectado facilitan el traslado de los productos agropecuarios de las zonas a intervenir, hasta los centros de consumo, permitiendo garantizar el abastecimiento de los productos a consecuencia de la Emergencia Sanitaria generada por el brote del Coronavirus (COVID-19).

- e) El Decreto de Urgencia N° 070-2020 014-2019 estableció, entre otras, medidas que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco de sus competencias, la ejecución de acciones oportunas, en el marco de la emergencia sanitaria generada por el pandemia COVID-19, para la reactivación de la actividad económica a nivel nacional y atención a la población, fomentando trabajo local a través de mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento periódico y rutinario de las vías departamentales y vecinales.
- f) Al respecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 del D.U. N° 070- 2020, numeral 21.3, los Titulares de los pliegos habilitados en la presente transferencia de partidas aprueban mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 21.1, a nivel programático, dentro de los cuales se registran el desagregado del **INSPECTOR**, quien estará a cargo de Monitorear y evaluar la calidad técnica del servicio, considerando al plan de trabajo como documento técnico de calidad del servicio.
- g) En ese sentido, la presencia del Inspector, es prioritario y como profesional competente para Monitorear y evaluar la calidad técnica del servicio mediante las actividades programadas en el Plan de Trabajo de cada uno de los caminos vecinales priorizados por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, en el marco del D.U. N° 070-2020.
- h) El objetivo como profesional es Inspeccionar, controlar, Fiscalizar y verificar la ejecución de las actividades de mantenimiento vial dando cumplimiento al Plan de Trabajo aprobado por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, en el marco del D.U. N° 070-2020.

II. DATOS GENERALES DEL SERVICIO:

1. Nombre del Servicio

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA LONG=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" – DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD",

2. Ubicación

Región : LA LIBERTAD

Provincia : SANTIAGO DE CHUCO

Distrito : SANTA CRUZ DE CHUCA

Caserío : VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA - CALIFORNIA -LOS ANGELES


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

ALEX JAVIER DIAZ LEON

INGENIERO CIVIL

REG. CIP N° 126547

270

3. Proceso De Adjudicación del Servicio

PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 008-2020-MPSCH/CS

4. Fuente de financiamiento

Recursos por operaciones oficiales de crédito (ROOC)

5. Modalidad Contratación

a Suma Alzada

6. Contrato de Servicio

N° 016-2020-MPSCH/LOG

7. Decreto de Urgencia

N° 070-2020

8. Fecha de Suscripción

28 de agosto del 2020

9. Ejecutor De Servicio

CONSORCIO VIAL CALIFORNIA

Conformado por:

CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.

RUC: 20568073658

ECAN INGENIERIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ECAN INGENIERIA S.R.L.

RUC: 20600813715

Representante Legal: Sr. Edgar Gomez Dominguez

10. Residente De Obra

ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO

11. Monto Contratado Para La Ejecución Del Servicio

S/. 1,724,000.00 (Un millón Setecientos Veinticuatro mil con 00/100 Soles). inc el IGV.

12. Fecha Entrega Terreno

29 de agosto del 2020 (Elaboración del Plan de Trabajo)

13. Fecha de Conformidad de Plan de Trabajo

21 de Setiembre del 2020

14. Fecha de Inicio de Servicio

22 de Setiembre del 2020

15. Plazo de Ejecución

120 DIAS CALENDARIOS



ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

261

16. Fecha Límite de ejecución

31 de Diciembre del 2020

DATOS DE INSPECCIÓN

17. Contrato Inspección

N° 028 – 2020 – MPSCH-LOG.

18. Fecha Contrato Inspección

24 de Agosto 2020

19. Inspector del Servicio

ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON

Ingeniero Civil con Reg. CIP N° 126547

20. Monto Contratado Para La Inspección del Servicio

S/. 19,224.20 (Diecinueve mil Doscientos Veinticuatro con 20/100 Soles).

21. Plazo Prestación Inspección

120 días calendarios

III. DE LA PRESENTACIÓN DE LA VALORIZACION

Mediante la Carta N° 0008-CONSORCIO VIAL CALIFORNIA, de fecha 16 de diciembre, la empresa CONSORCIO VIAL CALIFORNIA, con representante legal Sr. Edgar Gomez Dominguez, realizo la entrega de la Valorización N° 04 SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA LONG=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" – DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD, a mi persona en calidad de INSPECTOR para su evaluacion y posteriormente su aprobacion.

IV. ESTADO FÍSICO DEL SERVICIO

El Avance Físico del servicio nos refleja un avance ejecutado de 42.59%, en el periodo comprendido para el mes de Diciembre del 2020, en comparación al 28.36% del Avance Programado Mensual; además se hace mención que el avance ejecutado Acumulado 100 %, contra el avance programado acumulado que es de 100 %, por lo tanto, nos indica la culminación de las actividades programadas.



ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

ALEX JAVIER DIAZ LEON

INGENIERO CIVIL

REG. CIP N° 126547

Cuadro de Avance de Obra

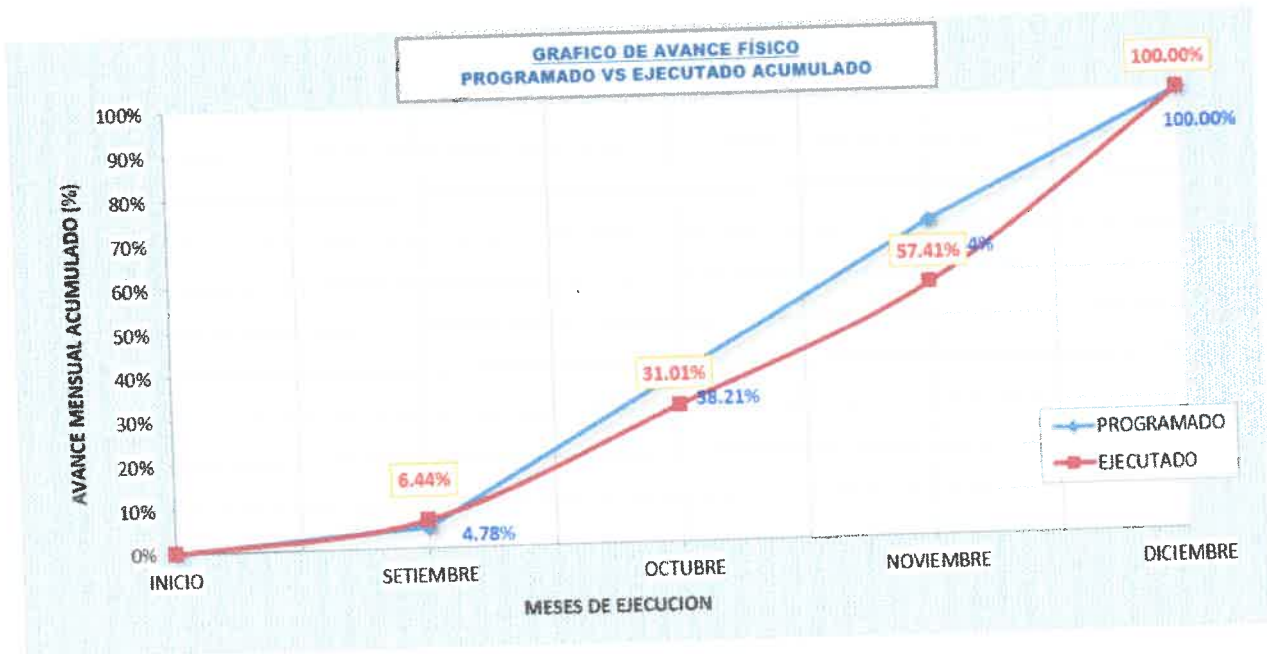

1. SITUACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra culminado; documentado en los datos de la ficha de control del avance programado vigente, el avance programado acumulado es de 100 %, y el ejecutado acumulado 100%.

COMENTARIOS:

La obra se viene desarrollando con normalidad desde el 22 de setiembre del 2020.

2. LABORES EFECTUADAS POR EL INSPECTOR EN EL PRESENTE PERIODO

- Verificación de la desmovilización de equipos y maquinaria a obra.
- Verificación de los trabajos de trazo y replanteo.
- Inspección de los trabajos correspondientes a la capa nivelante E=0.05m.
- Verificación de los trabajos de conformación de base con material granular de cantera E=0.15m.
- Control y verificación de las actividades correspondientes al transporte de material granular y material excedente hasta y mayor a un KM.
- Verificación en instalación de postes kilométricos, señales preventivas, señales reglamentarias y señales informativas.
- Se verificaron los trabajos de reconfiguración de cunetas.
- Revisión y control de la Programación del servicio.
- Verificación de los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las partidas conformantes del Plan de Trabajo.
- Elaboración de metrados de obra ejecutada.

Alex Javier Diaz Leon
 ALEX JAVIER DIAZ LEON
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 126547

ALEX JAVIER DIAZ LEON

INGENIERO CIVIL

REG. CIP N° 126547

267

- Control de la Programación y Avance de Obra.
- Coordinaciones y reuniones con el Contratista para lograr que la obra se ejecute de acuerdo a lo programado.
- Preparación y presentación de Informe Mensual.
- Control del Plan de Seguridad y Salud en Obra, incluyendo las medidas del plan para la vigilancia prevención y control del COVID-19.
- Se verifico la ejecución de partidas correspondientes al periodo del 01 al 16 de diciembre del 2020.


V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Se concluye dando conformidad a lo presentado por el **CONSORCIO VIAL CALIFORNIA** por concepto de ejecución del: **SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA LONG=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" – DISTRITO SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"** correspondiente a la Valorización N° 04 del Mes de Diciembre del 2020 por el monto de S/643,423.20 (Seis Cientos Cuarenta y Tres Mil cuatrocientos Veintitrés con 20/100 soles); incluido el IGV, que corresponde al 42.59 % del Avance Físico de Obra.

Sin otro particular y atento de brindarle mi servicio, me suscribo de usted.

Atentamente,


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547



CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA




286


- CARTA DE LA
EMPRESA
DIRIGIDA AL
INSPECTOR.


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547





CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA



CARTA N°008 – CONSORCIO VIAL CALIFORNIA/RL/EGD.

SR. : **ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON – CIP N° 126547**
Inspector de Obra.

ASUNTO : **ALCANZA VALORIZACION DE SERVICIO N° 04**

REFERENCIA : **SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO “EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM”, - “CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM” - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.**

FECHA : **15 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Me es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo y al mismo tiempo alcanzarle el INFORME DE VALORIZACION N° 04 correspondiente al mes de diciembre del 2020 (periodo de 01 de diciembre del 2020 al 15 de diciembre del 2020). Para su respectiva revisión y aprobación.

Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente:




CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
.....
EDGAR GOMEZ DOMINGUEZ
DNI N° 64844778
REPRESENTANTE COMUN


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547


Cc:

- Archivo





● FICHA TECNICA.


ALEX JAVIER LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 120047


Quelvin J. Quipezco Alayo
INGENIERO CIVIL
R. CIP. 110887



1-A: FICHA TECNICA DEL CAMINO VECINAL

263

1. **Municipalidad**

2. **Datos Responsable:** Fecha:

Cargo:

3. **Ubicación Política Administrativa:** **Cod. Ubigeo:**

Distrito(s):

Provincia(s):

Departamento:

4. Datos del SINAC: Clasificador de Rutas Vigente

Jerarquía Vial: Código de Ruta:

Código de Ruta Provisional (Rutas sin Clasificar):

Trayectoria:

5. Ubicación Geográfica:

De la Ruta:

Inicio: Descripción

Progresiva: Cota: msnm ZONA:

Coordenada (UTM - WGS84):


Fin: Descripción


Progresiva: Cota: msnm ZONA:

Coordenada (UTM - WGS84):

Sello y Firma de Responsable de elaboración del ICV

Nota: La Información de la Ficha debe tener el respaldo de la Información digital respectiva: Archivos GPS (Puntos=Waypoints y Eje Vial=Tracks), Fotografías (jpg), Video de la Obra (formato Avi). Deberá entregar en DVD.


ALEX JAVIER PAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP Nº 126547


Quelvin Quipezcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887

1-A: FICHA TECNICA DEL CAMINO VECINAL

1. **Municipalidad**

2. **Datos Responsable:** Fecha:

Cargo:

3. **Ubicación Política Administrativa:** **Cod. Ubigeo:**

Distrito(s):

Provincia(s):

Departamento:

4. Datos del SINAC: Clasificador de Rutas Vigente

Jerarquía Vial: Código de Ruta:

Código de Ruta Provisional (Rutas sin Clasificar):

Trayectoria:

5. Ubicación Geográfica:**De la Ruta:**

Inicio: Descripción

Progresiva: Cota: msnm ZONA:

Coordenada (UTM - WGS84): N E

Fin: Descripción


Progresiva: Cota: msnm ZONA:


Coordenada (UTM - WGS84): N E

Sello y Firma de Responsable de elaboración del ICV


Nota: La Información de la Ficha debe tener el respaldo de la Información digital respectiva: Archivos GPS (Puntos=Waypoints y Eje Vial=Tracks), Fotografías (jpg), Video de la Obra (formato Avi). Deberá entregar en DVD.


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547


Quelvin J. Quipezcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887



CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA



261

- FACTURA DEL CONTRATISTA.


ALEX JAVIER ORTIZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547


Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
ING CIVIL
R. CIP 110887





F




ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547



Quelvin Quipuzcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887



- INFORME DE
RESIDENTE.




Quelviny Quipuzcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887




ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547





CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA



0 258

VALORIZACION N°04 – CALIFORNIA

SERVICIO : "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA

INSPECTOR : ALEX JAVIER DIAZ LEON – CIP N°126547

RESIDENTE : QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N°110887


ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

PERIODO : DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020






ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

DICIEMBRE 2020


Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887





INFORME MENSUAL 04
(DICIEMBRE – 2020)
EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO
FASE: II

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

1.1. NOMBRE DEL SERVICIO:

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG. =4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

1.2. N° DE CONTRATO:

Contrato de Sevicio: N° 016-2020-MPSCH-LOG.

1.3. ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

1.4. CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL CALIFORNIA

- ECAN INGENIERIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – ECAN INGENIERIA S.R.L.
- CORPORACION SORIANO L & C S.A.C.

1.5. INSPECTOR:

ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N°126547

1.6. RESIDENTE:

QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N°110887

1.7. MONTO DE CONTRATO:

S/. 1,724,000.00 INC. IGV




Quelvin A. Quipuzcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887




ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547





CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA



1.8. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO:

256

S/. 1,430,920.00 INC. IGV

1.9. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:

S/. 258,600.00 INC. IGV

1.10. PLAZO DE EJECUCIÓN:

120 DIAS CALENDARIOS

1.11. FECHA DE INICIO:

22 DE SETIEMBRE DEL 2020

1.12. FECHA DE CULMINACIÓN:

31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS – FASE II:

2.1. TRAMO CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA - SANTA CRUZ DE CHUCA - SANTIAGO DE CHUCO

2.1.1. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Durante el periodo de 01 de noviembre del 2020 al 30 de noviembre del 2020
Se trabajo en las siguientes partidas:

01.00 OBRAS PROVINCIALES

01.01 Movilización y Desmovilización de Equipos

02.00 PAVIMENTOS

02.01 Capa Nivelante E=0.05M

02.02 Material Granular de Cantera E=0.15M

03.00 TRANSPORTE

03.01 Transporte de Material Granular hasta 1 KM

03.02 Transporte de Material Granular mayor a 1 KM

03.03 Transporte de Material Excedente hasta 1 KM

03.04 Transporte de Material Excedente mayor a 1 KM

04.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01 Reconformación de Cunetas

05.00 SEÑALIZACIÓN

05.01 Instalación de Postes Kilométricos

05.02 Señales Preventivas

05.03 Señales Reglamentarias

05.04 Señales Informativas





Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
ING CIVIL
R. CIP. 110887



ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547





06.00 IMPACTO AMBIENTAL

06.01 Recuperación Ambiental de Áreas Ocupadas

07.00 EMERGENCIA SANITARIA

07.01 Emergencia sanitaria COVID-19

2.1.2. DETALLE DE CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADOS Y ANEXAR LOS CERTIFICADOS DE LABORATORIO.

Durante el periodo de 01 de diciembre del 2020 al 15 de diciembre del 2020, se realizaron ensayos de densidad de campo, los cuales se anexan al informe.

2.2. TRAMO EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA - SANTA CRUZ DE CHUCA - SANTIAGO DE CHUCO

2.2.1. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Durante el periodo de periodo de 01 de diciembre del 2020 al 15 de diciembre del 2020 Se trabajó en las siguientes partidas:

01.00 OBRAS PROVINCIALES

01.01 Movilización y Desmovilización de Equipos

05.00 SEÑALIZACIÓN

05.01 Instalación de Postes Kilométricos

05.02 Señales Preventivas

05.03 Señales Reglamentarias

05.04 Señales Informativas

06.00 IMPACTO AMBIENTAL


06.01 Recuperación Ambiental de Áreas Ocupadas


07.00 EMERGENCIA SANITARIA

07.01 Emergencia sanitaria COVID-19



2.2.2. DETALLE DE CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADOS Y ANEXAR LOS CERTIFICADOS DE LABORATORIO.

Durante el periodo de periodo de 01 de diciembre del 2020 al 15 de diciembre, se realizaron ensayos de densidad de campo, los cuales se anexan al informe.


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547


Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887





3. ESTADO DE SITUACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO – FASE II:

3.1. SITUACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

3.1.1. TRAMO CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA - SANTA CRUZ DE CHUCA - SANTIAGO DE CHUCO

3.1.1.1. DETALLAR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y LOS PORCENTAJES DE AVANCE.

Durante el periodo de periodo de 01 de diciembre del 2020 al 15 de diciembre del 2020
Se realizaron los trabajos en las siguientes partidas.

01.00 OBRAS PROVICIONALES

01.01 Movilización y Desmovilización de Equipos
Esta partida cuenta con un avance del 50.00%.
A la fecha la partida se encuentra en un 100%

02.00 PAVIMENTOS

02.01 Capa Nivelante E=0.05M
Esta partida cuenta con un avance del 35.84%.
A la fecha la partida se encuentra en un 100%

02.02 Material Granular de Cantera E=0.15M
Esta partida cuenta con un avance del 52.60%.
A la fecha la partida se encuentra en un 100%

03.00 TRANSPORTES

03.01 Transporte de Material Granular hasta 1 KM
Esta partida cuenta con un avance del 52.60%.
A la fecha la partida se encuentra en un 100%

03.02 Transporte de Material Granular mayor a 1 KM
Esta partida cuenta con un avance del 44.92%.
A la fecha la partida se encuentra en un 100%

03.03 Transporte de Material Excedente hasta 1 KM
Esta partida cuenta con un avance del 51.44%.
A la fecha la partida se encuentra en un 100%

03.04 Transporte de Material Excedente mayor a 1 KM
Esta partida cuenta con un avance del 40.75%.
A la fecha la partida se encuentra en un 100%

04.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE


04.01 Reconformación de Cunetas
Esta partida cuenta con un avance del 30.18%.
A la fecha la partida se encuentra en un 100%





Quelvin J. Quiroz Alayo
ING. CIVIL
R. O.P. 110887



ALEX JAVIER RUIZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. O.P. N° 126547





05.00 SEÑALIZACIÓN

05.01 Instalación de Postes Kilométricos

Esta partida cuenta con un avance del 100%.

05.02 Señales Preventivas

Esta partida cuenta con un avance del 100%.

05.03 Señales Reglamentarias

Esta partida cuenta con un avance del 100%.

05.04 Señales Informativas

Esta partida cuenta con un avance del 100%.

06.00 IMPACTO AMBIENTAL

06.01 Recuperación Ambiental de Áreas Ocupadas

Esta partida cuenta con un avance del 100%.

07.00 EMERGENCIA SANITARIA

07.01 Emergencia sanitaria COVID-19

Esta partida cuenta con un avance del 25%.

A la fecha la partida se encuentra en un 100%

3.1.1.2. DETALLAR LOS CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADAS Y ANEXAR LOS CERTIFICADOS DE LABORATORIO.

Durante el periodo de periodo de 01 de diciembre del 2020 al 15 de diciembre del 2020, se realizaron ensayos de densidad de campo, los cuales se anexan al informe.

3.1.1.3. CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS

Ver anexos.

3.1.2. TRAMO EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA - SANTA CRUZ DE CHUCA - SANTIAGO DE CHUCO

3.1.2.1. DETALLAR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y LOS PORCENTAJES DE AVANCE.

Durante el periodo de 01 de diciembre del 2020 al 15 de diciembre del 2020

Se realizaron los trabajos en las siguientes partidas.


ALEX JAVIER DIAZ LEON
ING. ENGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

01.00 OBRAS PROVICIONALES

01.01 Movilización y Desmovilización de Equipos

Esta partida cuenta con un avance del 50.00%.

A la fecha la partida se encuentra en un 100%



Quelvin J. Quipezcoo Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887

02.00 PAVIMENTOS


02.01 Capa Nivelante E=0.05M

A la fecha la partida se encuentra en un 100%





CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA



02.02 Material Granular de Cantera E=0.15M
A la fecha la partida se encuentra en un 100%

03.00 TRANSPORTES

03.01 Transporte de Material Granular hasta 1 KM
A la fecha la partida se encuentra en un 100%

03.02 Transporte de Material Granular mayor a 1 KM
A la fecha la partida se encuentra en un 100%

03.03 Transporte de Material Excedente hasta 1 KM
A la fecha la partida se encuentra en un 100%

03.04 Transporte de Material Excedente mayor a 1 KM
A la fecha la partida se encuentra en un 100%

04.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01 Reconfiguración de Cunetas
A la fecha la partida se encuentra en un 100%

05.00 SEÑALIZACIÓN

05.01 Instalación de Postes Kilométricos
Esta partida cuenta con un avance del 100%.

05.02 Señales Preventivas
Esta partida cuenta con un avance del 100%.

05.03 Señales Reglamentarias
Esta partida cuenta con un avance del 100%.

05.04 Señales Informativas
Esta partida cuenta con un avance del 100%.

06.00 IMPACTO AMBIENTAL

06.01 Recuperación Ambiental de Áreas Ocupadas
Esta partida cuenta con un avance del 100%.

07.00 EMERGENCIA SANITARIA

07.01 Emergencia sanitaria COVID-19
Esta partida cuenta con un avance del 25%.
Esta partida cuenta con un avance del 100%.



3.1.2.2. DETALLAR LOS CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADAS Y ANEXAR LOS CERTIFICADOS DE LABORATORIO.

Durante el periodo de 01 de diciembre del 2020 al 15 de diciembre del 2020, se realizaron ensayos de densidad de campo, los cuales se anexan al informe.


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547


Quelvin J. Quiroz Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887





3.1.2.3. CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS
Ver anexos.

3.2 SITUACIÓN DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA

3.2.1 RETENCIÓN DE GARANTÍAS.

Retención del 10% de fiel cumplimiento del contrato.

3.2.2 VIGENCIA DE LAS CARTAS FIANZAS.

No aplica.

3.2.3 VIGENCIA DE LOS SEGUROS (SCTR, SOAT) Y ANEXAR COPIAS.

22/12/2020.

3.2.4 PENALIDADES (APLICADAS Y COBRADAS).

No aplica.

3.2.5 RELACIÓN DE PERSONAL QUE TRABAJÓ (PROFESIONAL, TÉCNICOS Y OBREROS).


PERSONAL ASEGURADO					
SEDE: CONSTRUCCION					
Nro	PATERNO	MATERNO	NOMBRES	DNI	FECHA DE NACIMIENTO
1	RONCAL	MORALES	CARLOS EDUARDO	18010553	16/04/1972
2	SALINAS	DE LA CRUZ	ELVIS HECTOR	70893861	16/01/1992
3	CHÁVEZ	ESPEJO	WALTER	47271818	19/09/1991
4	SÁNCHEZ	ASUNCIÓN	LAZARO	42828408	14/02/1983
5	LIMAY	CHAVARRIA	RUPERTO	41840754	17/08/1982
6	MARDONADO	NOGUERA	JUAN	15236259	04/05/1976
7	POLO	LAYZA	WALTER	47750955	08/04/1953
8	GUEVARA	LLAURY	LORGIO	80459091	02/03/1978
9	CASTILLO	FLORES	JORGE	47037843	23/04/1991
10	MARIÑOS	GUEVARA	CARLOS	63151922	05/11/2002
11	MARIÑOS	RUIZ	AGUSTÍN	48739396	21/05/1996
12	CASTILLO	VASQUEZ	JUAN	80470817	30/03/1978
13	FLORES	VASQUEZ	ADRIANA	48220937	06/03/1994
14	CHACON	ARAUJO	KALIN	71647271	23/06/1999
15	PAITAN	CALDERON	EDGAR	42322993	25/02/1983

3.2.6 RELACIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS.


Se utiliza la misma cantidad de equipos en cada uno de los tramos:

- 01 excavadora
- 01 motoniveladora
- 01 rodillo liso vibratorio
- 01 cisterna para agua
- 04 camión volquete
- 01 camioneta Pick Up



ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547


Quelvin J. Quiñuzcoa Alayo
ING CIVIL
R. CIP. 110887





CONSORCIO VIAL CALIFORNIA



250

3.2.7 SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIA SANITARIA.

Se viene realizando todos los trabajos respetando todos los parámetros de Emergencia Sanitaria COVID-19 según plan de trabajo.

4. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO (% AVANCE MENSUAL)

Se presenta el cuadro resumen de informe mensual de valorización N°04

HOJA DE CANCELACION		
DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020		
Proyecto	"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"	
Cliente	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO	
Ubicación	SANTA CRUZ DE CHUCA	
Contratista	CONSORCIO VIAL CALIFORNIA	
Inspector	ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547	
Residente	ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887	
MONTO REFERENCIAL		1,724,876.17
MONTO CONTRATADO		1,724,000.00
MONTO CONTRATADO MANTENIMIENTO PERIODICO		1,430,920.00
MONTO CONTRATADO MANTENIMIENTO RUTINARIO		258,600.00
ITEM	DESCRIPCION	MONTO VALORIZADO
01	TRAMO CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA	407,708.43
02	TRAMO EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA	41,387.51
1.00.00	COSTO DIRECTO	S/. 449,095.94
	GASTOS GENERALES 10%	S/. 44,909.59
	UTILIDAD 5%	S/. 22,454.80
2.00.00	SUBTOTAL	S/. 516,460.33
	REAJUSTES	0.00
3.00.00	SUBTOTAL CON REAJUSTES	S/. 516,460.33
	AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO 10%	S/. 0.00
	AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES 20%	S/. 0.00
4.00.00	SUBTOTAL CON AMORTIZACIONES	S/. 516,460.33
5.00.00	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)	S/. 92,962.86
6.00.00	TOTAL NETO A RECIBIR	S/. 609,423.19
Porcentaje de avance ejecutado en el mes (%)		42.59%


Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887

5. CONCLUSIONES


- El informe mensual de Valorización N°04, obedece a los trabajos realizados desde el 01 de diciembre del 2020 al 15 de diciembre del 2020, dichos trabajos aprobados por el inspector designado por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.
- El porcentaje de avance físico en el SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM", -"CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906

Alex Javier Diaz Leon
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547





CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA



249



KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD. **el informe mensual de Valorización N°04** es del **42.59%** del ejecutado real mensual contra el **28.36%** ejecutado programado mensual, y un **100 %** ejecutado acumulado real contra el **100%** ejecutado acumulado programado; estando el estado del Servicio culminado con un **100%**.

- El monto correspondiente al informe Mensual de Valorización N°04 es de **S/. 609,423.19** (seiscientos nueve mil cuatrocientos veintitrés cinco con 19/100 soles).
- Recomendamos a la entidad contratante la Municipalidad Provincial de Provincial de Santiago De Chuco, revisar, aprobar y tramitar el informe mensual de Valorización N°04 correspondiente al mes de diciembre del 2020.

Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887

ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547





- RESUMEN DE
VALORIZACION
MENSUAL.

A blue ink handwritten signature, appearing to be 'Q. Quiroz', written over a horizontal line.

Quelvin J. Quiroz Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887

A blue ink handwritten signature, appearing to be 'A. Diaz Leon', written over a horizontal line.

ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547



RESUMEN DE VALORIZACION N° 04

DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

Obra : "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM", - "CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Ciente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

Ubicación : SANTA CRUZ DE CHUCA


Contratista : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA



Inspector : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547

Residente : ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

Item	PRESUPUESTADO Descripción	MONTO CONTRATADO	VALORIZADO ANTERIOR		VALORIZADO DEL MES		ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
			EJECUTADO ANT. ACUM.	%	EJECUTADO EN EL MES	%	EJECUTADO ACT. ACUM	%	Parcial EJECUCION	%
1.00	TRAMO CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA	S/. 828,842.30	S/. 421,133.87		S/. 407,708.43		S/. 828,842.30		S/. 0.00	
2.00	TRAMO EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA	S/. 225,630.80	S/. 184,243.29		S/. 41,387.51		S/. 225,630.80		S/. 0.00	
	SUB TOTALES COSTO DIRECTO	1,054,473.10	605,377.16		449,095.94		1,054,473.10		0.00	
	GASTOS GENERALES (10%)	105,447.31	60,537.71		44,909.59		105,447.31		0.00	
	UTILIDAD (5%)	52,723.66	30,268.86		22,454.80		52,723.66		0.01	
	SUB TOTAL	S/. 1,212,644.07	S/. 696,183.73		S/. 516,460.33		S/. 1,212,644.07		S/. 0.00	
	I.G.V. (18 %)	218,275.93	125,313.07		92,962.86		218,275.93		0.00	
	TOTAL	S/. 1,430,920.00	S/. 821,496.80	57.41%	S/. 609,423.19	42.59%	S/. 1,430,920.00	100.00%	S/. 0.00	0.00%


ALEX JAVIER DIAZ LEON
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 126547


Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
 ING. CIVIL
 R. CIP. 110887



- CONTROL Y
SUSTENTO DE
METRADOS Y
ACTIVIDADES
EJECUTADAS.


Quelvin J. Quiroz Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887


ALEX JAVIER PAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547



CONTROL Y SUSTENTO DE METRADOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS

DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

Proyecto : "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM". - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD" 245

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : TRAMO CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA
Contratista : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
Inspector : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547
Residente : ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

Monto Contratado : S/. 1,724,000.00
Plazo de ejecucion : 120 días calendarios

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATADO	CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS				% EJECUTADO
				ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR EJECUTAR	
1.00	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	0.50	0.50	1.00	0.00	100.00%
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	15.91	15.91	0.00	15.91	0.00	100.00%
2.00	PAVIMENTOS							
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	3,976.50	2,551.50	1,425.00	3,976.50	0.00	100.00%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	11,929.50	5,654.50	6,275.00	11,929.50	0.00	100.00%
3.00	TRANSPORTE							
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	12,289.50	5,825.23	6,464.28	12,289.50	0.00	100.00%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	116,188.51	64,001.85	52,186.66	116,188.51	0.00	100.00%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	7,723.00	3,750.15	3,972.85	7,723.00	0.00	100.00%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	55,845.33	33,090.13	22,755.20	55,845.33	0.00	100.00%
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE							
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	15,906.00	11,106.00	4,800.00	15,906.00	0.00	100.00%
5.00	SEÑALIZACION							
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	100.00%
05.02.	SEÑALES PREVENTIVAS	und	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	100.00%
05.03.	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	100.00%
05.04.	SEÑALES INFORMATIVAS	und	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	100.00%
6.00	IMPACTO AMBIENTAL							
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	100.00%
7.00	EMERGENCIA SANITARIA							
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	0.75	0.25	1.00	0.00	100.00%

CONTROL Y SUSTENTO DE METRADOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS

DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

Servicio : "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM". - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : TRAMO EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA
Contratista : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
Inspector : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547
Residente : ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

Monto Contratado : S/. 1,724,000.00
Plazo de ejecucion : 120 días calendarios

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATADO	CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS				% EJECUTADO
				ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR EJECUTAR	
1.00	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	0.50	0.50	1.00	0.00	100.00%
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO	km	4.33	4.33	0.00	4.33	0.00	100.00%
2.00	PAVIMENTOS							
02.01.	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	1,075.00	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	100.00%
02.02.	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	m3	3,247.50	3,247.50	0.00	3,247.50	0.00	100.00%
3.00	TRANSPORTE							
03.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	3,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	100.00%
03.02.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	12,344.55	12,344.55	0.00	12,344.55	0.00	100.00%
03.03.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	1,935.00	1,935.00	0.00	1,935.00	0.00	100.00%
03.04.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3k	2,838.83	2,838.83	0.00	2,838.83	0.00	100.00%
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE							
04.01.	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	4,330.00	4,330.00	0.00	4,330.00	0.00	100.00%
5.00	SEÑALIZACION							
05.01.	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	100.00%
05.02.	SEÑALES PREVENTIVAS	und	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	100.00%
05.03.	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	100.00%
05.04.	SEÑALES INFORMATIVAS	und	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	100.00%
6.00	IMPACTO AMBIENTAL							
06.01.	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	100.00%
7.00	EMERGENCIA SANITARIA							
07.01.	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	0.75	0.25	1.00	0.00	100.00%


Quelvin J. Quipezcoa Alayo
ING CIVIL
R. CIP. 110887


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

SUSTENTO DE METRADOS

DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

Proyecto : "SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

244

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : TRAMO CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA
Contratista : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
Inspector : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547
Residente : ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

Monto Contratado S/ 1,724,000.00
Plazo de ejecucion 120 días calendarios

1.00 OBRAS PROVISIONALES
 01.01. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Descripcion		Longitud	Parcial
Inicio	Fin	(g/b)	(g/b)
0.50	0.60	0.10	0.10
0.60	0.70	0.10	0.10
0.70	0.80	0.10	0.10
0.80	0.90	0.10	0.10
0.90	1.00	0.10	0.10
TOTAL			0.50

02 PAVIMENTOS
 02.01. CAPA NIVELANTE E=0.05 M

M3

Progresiva		Longitud	Ancho	Espesor	Area	Volumen
Inicio	Fin	(m)	(m)	(m)	(m2)	(m3)
7+200	8+000	800.00	5.00	0.05	4,000.00	200.00
8+000	9+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
9+000	10+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
10+000	11+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
11+000	12+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
12+000	12+900	900.00	5.00	0.05	4,500.00	225.00
TOTAL						1,425.00

02.02. MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M

M3

Progresiva		Longitud	Ancho	Espesor	Area	Volumen
Inicio	Fin	(m)	(m)	(m)	(m2)	(m3)
4+533	5+000	466.66	5.00	0.15	2,333.30	350.00
5+000	6+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
6+000	7+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
7+000	8+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
8+000	9+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
9+000	10+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
10+000	11+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
11+000	12+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
12+000	12+900	900.00	5.00	0.15	4,500.00	675.00
TOTAL						6,275.00

03 TRANSPORTE

03.01. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM
 03.02. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM

Progresiva		CANTERA	CANTERA	DISTANCIA	Longitud	Ancho	Area	Plazoletas 3%	ESPESOR	VOLUMEN	D<=1km	D>1km
Inicio	Fin	UBICACION (km)	ACCESO (km)	(KM)	(m)	(m)	(m2)	(m2)	(m)	(m3)		
4.53	5.00	0.00	0.36	5.12	468.00	5.00	2,340.00	70.20	0.15	361.53	361.53	1,491.11
5.00	6.00	0.00	0.36	5.86	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	3,752.03
6.00	7.00	0.00	0.36	6.86	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	4,524.53
7.00	8.00	0.00	0.36	7.86	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	5,297.03
8.00	9.00	0.00	0.36	8.86	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	6,069.53
9.00	10.00	0.00	0.36	9.86	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	6,842.03
10.00	11.00	0.00	0.36	10.86	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	7,614.53
11.00	12.00	0.00	0.36	11.86	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.15	772.50	772.50	8,387.03
12.00	12.90	0.00	0.36	12.81	900.00	5.00	4,500.00	135.00	0.15	695.25	695.25	8,208.82
TOTAL											6,464.28	52,186.66

03.03. TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM
 03.04. TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM

Progresiva		DME	DME	DISTANCIA	Longitud	Ancho	Area	Plazoletas 3%	ESPESOR	VOLUMEN	D<=1km	D>1km
Inicio	Fin	UBICACION (km)	ACCESO (km)	(KM)	(m)	(m)	(m2)	(m2)	(m)	(m3)		
5.19	6.00	2.32	0.00	3.28	814.27	5.00	4,071.35	122.14	0.10	419.35	419.35	955.22
6.00	7.00	2.32	0.00	4.18	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.10	515.00	515.00	1,640.00
7.00	8.00	2.32	0.00	5.19	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.10	515.00	515.00	2,155.28
8.00	9.00	2.32	0.00	6.19	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.10	515.00	515.00	2,670.28
9.00	10.00	2.32	0.00	7.19	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.10	515.00	515.00	3,185.28
10.00	11.00	2.32	0.00	8.19	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.10	515.00	515.00	3,700.28
11.00	12.00	2.32	0.00	9.19	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.10	515.00	515.00	4,215.28
12.00	12.90	2.32	0.00	10.13	900.00	5.00	4,500.00	135.00	0.10	463.50	463.50	4,233.61
TOTAL											3,972.85	22,755.20


 Quelvin J. Quipuzco Alayo
 ING. CIVIL
 R. CIP. 110887


 ALEX JAVIER DIAZ LEON
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 126547

4.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
04.01. RECONFORMACION DE CUNETAS

Progresiva		Longitud	Parcial
Inicio	Fin	(m)	(m)
7+200	8+000	800.00	800.00
8+000	9+000	1,000.00	1,000.00
9+000	10+000	1,000.00	1,000.00
10+000	11+000	1,000.00	1,000.00
11+000	12+000	1,000.00	1,000.00
TOTAL			4,800.00

5.00 SEÑALIZACIÓN
05.01. INSTALACIÓN DE POSTES KILOMETRICOS

Descripción	Und	Progresiva	Metrado	Total
INSTALACIÓN DE POSTES KILOMETRICOS	Und	0+000 -15+906	16	16.00

05.02. SEÑALES PREVENTIVAS

Descripción	Und	Progresiva	Metrado	Total
SEÑALES PREVENTIVAS	Und	0+000 -15+906	20	20.00

05.03. SEÑALES REGLAMENTARIAS

Descripción	Und	Progresiva	Metrado	Total
SEÑALES REGLAMENTARIAS	Und	0+000 -15+906	5	5.00


05.04. SEÑALES INFORMATIVAS

Descripción	Und	Progresiva	Metrado	Total
SEÑALES INFORMATIVAS	Und	0+000 -15+906	5	5.00

6.00 IMPACTO AMBIENTAL
06.01. RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS

Descripción	Und	Progresiva	Metrado	Total
RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0+000 -15+906	2	2.00


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 26547


Quelvin J. Quirozco Alayo
ING CIVIL
R. CIP. 110887

SUSTENTO DE METRADOS

DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

Servicio

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : TRAMO EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA
Contratista : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
Inspector : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547
Residente : ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

Monto Contratado
Plazo de ejecución

S/ 1,724,000.00
120 días calendario

242

1.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Descripción		Longitud	Parcial
Inicio	Fin	(g/b)	(g/b)
0.50	0.60	0.10	0.10
0.60	0.70	0.10	0.10
0.70	0.80	0.10	0.10
0.80	0.90	0.10	0.10
0.90	1.00	0.10	0.10
TOTAL			0.50

5.00 SEÑALIZACIÓN
05.01. INSTALACIÓN DE POSTES KILOMETRICOS

Descripción	Und	Progresiva	Metrado	Total
INSTALACIÓN DE POSTES KILOMETRICOS	Und	0+000 -4+330	5	5.00

0. SEÑALES PREVENTIVAS

Descripción	Und	Progresiva	Metrado	Total
SEÑALES PREVENTIVAS	Und	0+000 -4+330	4	4.00

05.03. SEÑALES REGLAMENTARIAS

Descripción	Und	Progresiva	Metrado	Total
SEÑALES REGLAMENTARIAS	Und	0+000 -4+330	2	2.00


05.04. SEÑALES INFORMATIVAS


Descripción	Und	Progresiva	Metrado	Total
SEÑALES INFORMATIVAS	Und	0+000 -4+330	2	2.00

6.00 IMPACTO AMBIENTAL
06.01. RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS


Descripción	Und	Progresiva	Metrado	Total
RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0+000 -15+906	1.5	1.50


Quelvin J. Quipuzco Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547



CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA



241

- ANALISIS DE
VALORIZACION
MENSUAL.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Q. J. Quiroz', written over a horizontal line.

Quelvin J. Quiroz
ING. CIVIL
R. CIP. 110887



ANALISIS DE VALORIZACION MENSUAL N° 04

DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG=4.330KM", "CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Proyecto: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Cliente: TRAMO CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA
Ubicación: TRAMO CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA
Contratista: CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
Inspector: ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547
Residente: ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

Monto Contratado: S/ 1,724,000.00
Plazo de ejecución: 120 días calendario

Código	Descripción	PRESUPUESTO GENERAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%
1.00	OBRAS PROVISIONALES												
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	1.00	S/ 40,220.52	S/ 40,220.52	0.50	20,110.26	50.00%	0.50	20,110.26	50.00%	1.00	40,220.52	100.00%
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	15.91	S/ 998.09	S/ 15,879.61	15.91	15,879.61	100.00%	0.00	0.00	0.00%	15.91	15,879.61	100.00%
2.00	PAVIMENTOS												
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05M	3976.50	S/ 4.62	S/ 18,371.43	2,851.50	11,787.89	64.17%	1,425.00	6,583.50	35.84%	3,976.50	18,371.43	100.00%
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	11929.50	S/ 32.06	S/ 382,459.77	5,854.50	181,283.27	47.40%	6,275.00	201,176.50	52.60%	11,929.50	382,459.77	100.00%
3.00	TRANSPORTE												
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	12289.50	S/ 4.93	S/ 60,587.24	5,825.23	28,718.36	47.40%	6,484.28	31,868.90	52.60%	12,289.50	60,587.24	100.00%
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	116188.51	S/ 1.09	S/ 126,645.48	64,001.85	69,762.02	55.08%	52,186.66	56,893.46	44.92%	116,188.51	126,645.48	100.00%
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	7723.00	S/ 4.93	S/ 38,074.39	3,750.15	18,488.24	48.66%	3,972.85	19,588.15	51.44%	7,723.00	38,074.39	100.00%
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	55845.33	S/ 1.09	S/ 60,871.41	33,080.13	36,068.24	59.25%	22,755.20	24,803.17	40.75%	55,845.33	60,871.41	100.00%
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE												
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	15908.00	S/ 1.84	S/ 29,267.04	11,106.00	20,435.04	64.17%	4,800.00	8,632.00	30.18%	15,908.00	29,267.04	94.35%
5.00	SEÑALIZACION												
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	16.00	S/ 315.24	S/ 5,043.84	0.00	0.00	0.00%	16.00	5,043.84	100.00%	16.00	5,043.84	100.00%
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	20.00	S/ 389.22	S/ 7,784.40	0.00	0.00	0.00%	20.00	7,784.40	100.00%	20.00	7,784.40	100.00%
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	5.00	S/ 389.22	S/ 1,946.10	0.00	0.00	0.00%	5.00	1,946.10	100.00%	5.00	1,946.10	100.00%
05.04	SEÑALES INFORMATIVAS	5.00	S/ 468.32	S/ 2,341.60	0.00	0.00	0.00%	5.00	2,341.60	100.00%	5.00	2,341.60	100.00%
6.00	IMPACTO AMBIENTAL												
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	2.00	S/ 7,274.14	S/ 14,548.28	0.00	0.00	0.00%	2.00	14,548.28	100.00%	2.00	14,548.28	100.00%
7.00	EMERGENCIA SANITARIA												
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	1.00	S/ 24,801.19	S/ 24,801.19	0.75	18,600.90	75.00%	0.25	6,200.30	25.00%	1.00	24,801.19	100.00%
	Costo Directo			828,842.30		421,133.87			407,708.43			828,842.30	
	GASTOS GENERALES (10% C.D.)	10.00%		82,884.23		42,113.38			40,770.85			82,884.23	
	UTILIDAD (5% C.D.)	5.00%		41,442.12		21,056.70			20,385.42			41,442.12	
	SUB TOTAL			953,168.65		484,303.95			468,864.70			953,168.65	
	IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (ICV 18%)	18.00%		171,570.35		87,174.71			84,395.64			171,570.35	
	VALOR REFERENCIAL DE OBRA			1,124,739.00		571,478.66			553,260.34			1,124,739.00	
	PORCENTAJE AVANCE DE OBRA			100.00%		50.81%			49.19%			100.00%	

[Handwritten signature]

Quelvin J. Quipuzco Alayo
 ING. CIVIL
 R. CIP. 110887

[Handwritten signature]
ALEX JAVIER DIAZ LEON
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 126547

ANALISIS DE VALORIZACION MENSUAL N° 04

DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALCALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG=4.330KM", "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.908 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"



Proyecto: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Cliente: TRAMO EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALCALLAMA - PACCHA PARTE ALTA
Ubicación: CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
Contratista: ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547
Inspector: ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887
Residente:

Monto Contratado: S/. 1,724,000.00
Plazo de ejecución: 120 días calendario

Código	Descripción	PRESUPUESTO GENERAL		AVANCE ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
		METRADO	PRECIO S/.	METRADO	VALORIZADO	METRADO	VALORIZADO	METRADO	VALORIZADO	METRADO	VALORIZADO
1.00	OBRAS PROVISIONALES										
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	1.00	S/ 40,220.52	0.50	20,110.26	0.50	20,110.26	1.00	40,220.52	0.00	0.00%
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	4.33	S/ 998.09	4.33	4,321.73	0.00	0.00	4.33	4,321.73	0.00	0.00%
2.00	PAVIMENTOS										
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05M	1075.00	S/ 4.62	1,075.00	4,966.50	0.00	0.00	1,075.00	4,966.50	0.00	0.00%
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M	3247.50	S/ 32.06	3,247.50	104,114.85	0.00	0.00	3,247.50	104,114.85	0.00	0.00%
3.00	TRANSPORTE										
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	3360.00	S/ 3.29	3,360.00	11,054.40	0.00	0.00	3,360.00	11,054.40	0.00	0.00%
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	12344.55	S/ 0.64	12,344.55	7,900.51	0.00	0.00	12,344.55	7,900.51	0.00	0.00%
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	1935.00	S/ 2.81	1,935.00	5,437.35	0.00	0.00	1,935.00	5,437.35	0.00	0.00%
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	2838.83	S/ 0.64	2,838.83	1,816.85	0.00	0.00	2,838.83	1,816.85	0.00	0.00%
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE										
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	4930.00	S/ 1.84	7,967.20	7,967.20	0.00	0.00	4,330.00	7,967.20	0.00	0.00%
5.00	SEÑALIZACION										
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	5.00	S/ 315.24	0.00	0.00	5.00	1,576.20	5.00	1,576.20	0.00	0.00%
05.02	SENALES PREVENTIVAS	4.00	S/ 389.22	0.00	0.00	4.00	1,556.88	4.00	1,556.88	0.00	0.00%
05.03	SENALES REGLAMENTARIAS	2.00	S/ 369.22	0.00	0.00	2.00	778.44	2.00	778.44	0.00	0.00%
05.04	SENALES INFORMATIVAS	2.00	S/ 468.32	0.00	0.00	2.00	936.64	2.00	936.64	0.00	0.00%
6.00	IMPACTO AMBIENTAL										
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	1.50	S/ 7,274.14	0.00	0.00	1.50	10,911.21	1.50	10,911.21	0.00	0.00%
7.00	EMERGENCIA SANITARIA										
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	1.00	S/ 22,071.52	0.75	16,553.64	0.25	5,517.88	1.00	22,071.52	0.00	0.00%
Costo Directo			225,630.80		184,243.29		41,387.51		225,630.80		
GASTOS GENERALES (10%) C.D.		10.00%	22,563.08	18,424.33	4,138.75	0.00	0.00	1.00	22,563.08	0.00	0.00%
UTILIDAD (5%) C.D.		5.00%	11,281.54	9,212.17	2,069.37	0.00	0.00	1.00	11,281.54	0.00	0.00%
SUB TOTAL			259,475.42		211,879.79		47,595.63		259,475.42		
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (IGV 18%)		18.00%	46,705.58	38,138.35	8,567.23	0.00	0.00	1.00	46,705.58	0.00	0.00%
VALOR REFERENCIAL DE OBRA			306,181.00		250,018.14		56,162.86		306,181.00		
PORCENTAJE AVANCE DE OBRA			100.00%		81.66%		18.34%		100.00%		0.00%


ALEX JAVIER DIAZ LEON
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 126547

Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
 ING CIVIL
 R. CIP. 110887



- **HOJA DE CANCELACION.**



Quelvin J. Quirozco Atayo
ING CIVIL
R. CIP. 110887



ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547




HOJA DE CANCELACION

DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020


Proyecto	"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"
Cliente	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación	SANTA CRUZ DE CHUCA
Contratista	CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
Inspector	ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547
Residente	ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

MONTO REFERENCIAL	1,724,876.17
MONTO CONTRATADO	1,724,000.00
MONTO CONTRATADO MANTENIMIENTO PERIODICO	1,430,920.00
MONTO CONTRATADO MANTENIMIENTO RUTINARIO	258,600.00


ITEM	DESCRIPCION	MONTO VALORIZADO
01	TRAMO CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA	407,708.43
02	TRAMO EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA	41,387.51
1.00.00	COSTO DIRECTO	S/. 449,095.94
	GASTOS GENERALES 10%	S/. 44,909.59
	UTILIDAD 5%	S/. 22,454.80
2.00.00	SUBTOTAL	S/. 516,460.33
	REAJUSTES	0.00
3.00.00	SUBTOTAL CON REAJUSTES	S/. 516,460.33
	AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO 10%	S/. 0.00
	AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES 20%	S/. 0.00
4.00.00	SUBTOTAL CON AMORTIZACIONES	S/. 516,460.33
5.00.00	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)	S/. 92,962.86
6.00.00	TOTAL NETO A RECIBIR	S/. 609,423.19
	Porcentaje de avance ejecutado en el mes (%)	42.59%


 Quelin J. Quipezcoa Alayo
 ING CIVIL
 R. CIP. 110887



 ALEX JAVIER DIAZ LEON
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 126547



CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA



- CUADRO
COMPARATIVO
DE AVANCE DEL
SERVICIO
(PROGRAMADO –
EJECUTADO -
PAGADO).



Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
ING CIVIL
R. CIP. 110887



ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547



CUADRO COMPRATIVO DE AVANCE - PROGRAMADO - EJECUTADO - PAGADO

DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

Proyecto : "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : TRAMO CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA
Contratista : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
Inspector : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547
Residente : ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

Monto Contratado S/. 1,724,000.00
Plazo de ejecución 120 días calendarios

MES	MONTOS (incl IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	54,088.52	54,088.52	4.81%	4.81%
31-Oct-20	378,619.73	432,708.25	33.66%	38.47%
30-Nov-20	378,619.73	811,327.98	33.66%	72.13%
15-Dic-20	313,411.02	1,124,739.00	27.87%	100.00%
TOTAL	1,124,739.00		100.00%	

MES	MONTOS (incl IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	54,665.14	54,665.14	4.86%	4.86%
31-Oct-20	294,577.97	349,243.11	26.19%	31.05%
30-Nov-20	222,235.55	571,478.65	19.76%	50.81%
15-Dic-20	563,260.34	1,124,739.00	49.19%	100.00%
TOTAL	1,124,739.00		100.00%	


ALEX JAVIER DIAZ LEON
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 126547


Queivin J. Quipuzcoa Alayo
 INGENIERO CIVIL
 R. CIP. 110887

CUADRO COMPRATIVO DE AVANCE - PROGRAMADO - EJECUTADO - PAGADO

DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

Proyecto : "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA LA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : TRAMO EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA
Contratista : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
Inspector : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547
Residente : ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

Monto Contratado Si. 1,724,000.00
Plazo de ejecucion 120 dias calendarios


MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (incl IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL Si.	ACUMUL. Si.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	14,239.78	14,239.78	4.65%	4.65%
31-Oct-20	99,678.44	113,918.22	32.56%	37.21%
30-Nov-20	99,678.44	213,596.66	32.56%	69.77%
31-Dic-20	92,584.34	306,181.00	30.23%	100.00%
TOTAL	306,181.00		100.00%	

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (incl IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL Si.	ACUMUL. Si.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	37,486.20	37,486.20	12.24%	12.24%
31-Oct-20	56,972.26	94,458.46	18.61%	30.85%
30-Nov-20	155,559.68	250,018.14	50.81%	81.66%
15-Dic-20	56,162.86	306,181.00	18.34%	100.00%
TOTAL	306,181.00		100.00%	


ALEX JAVIER DIAZ LEON
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 126547


Quelvín Quipuzcoa Alayo
 ING. CIVIL
 R. CIP. 110887

CUADRO COMPARATIVO DE AVANCE PROGRAMADO - EJECUTADO - PAGADO - GENERAL

DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

Proyecto : "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4,330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : TRAMO EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA
Contratista : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
Inspector : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547
Residente : ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887


Monto Contratado Si. 1,724,000.00
Plazo de ejecución 120 días calendarios

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS



MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	68,328.30	68,328.30	4.78%	4.78%
31-Oct-20	478,298.17	546,626.47	33.43%	38.21%
30-Nov-20	478,298.17	1,024,924.64	33.43%	71.64%
31-Dic-20	405,995.36	1,430,920.00	28.36%	100.00%
TOTAL	1,430,920.00	1,430,920.00	100.00%	100.00%

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS


MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	92,151.34	92,151.34	6.44%	6.44%
31-Oct-20	351,550.23	443,701.57	24.57%	31.01%
30-Nov-20	377,795.23	821,496.80	26.40%	57.41%
15-Dic-20	609,423.20	1,430,920.00	42.59%	100.00%
TOTAL	1,430,920.00	1,430,920.00	100.00%	100.00%


Quelvin J. Quiquizco Alayo
 ING CIVIL
 R. CIP. 110887


ALEX JAVIER DIAZ LEON
 ING. INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 126547



- CUADRO DE BARRAS Y CURVAS.



Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887



ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547




CUADRO DE BARRAS Y CURVA S.

DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALLGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG=4.339KM". - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 16.906 KM" -

Proyecto : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 Cliente : TRAMO CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA
 Ubicación : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
 Contratista : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547
 Inspector :
 Residente : ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

Monto Contratado S/. 1,724,000.00
 Plazo de ejecución 120 días calendarios

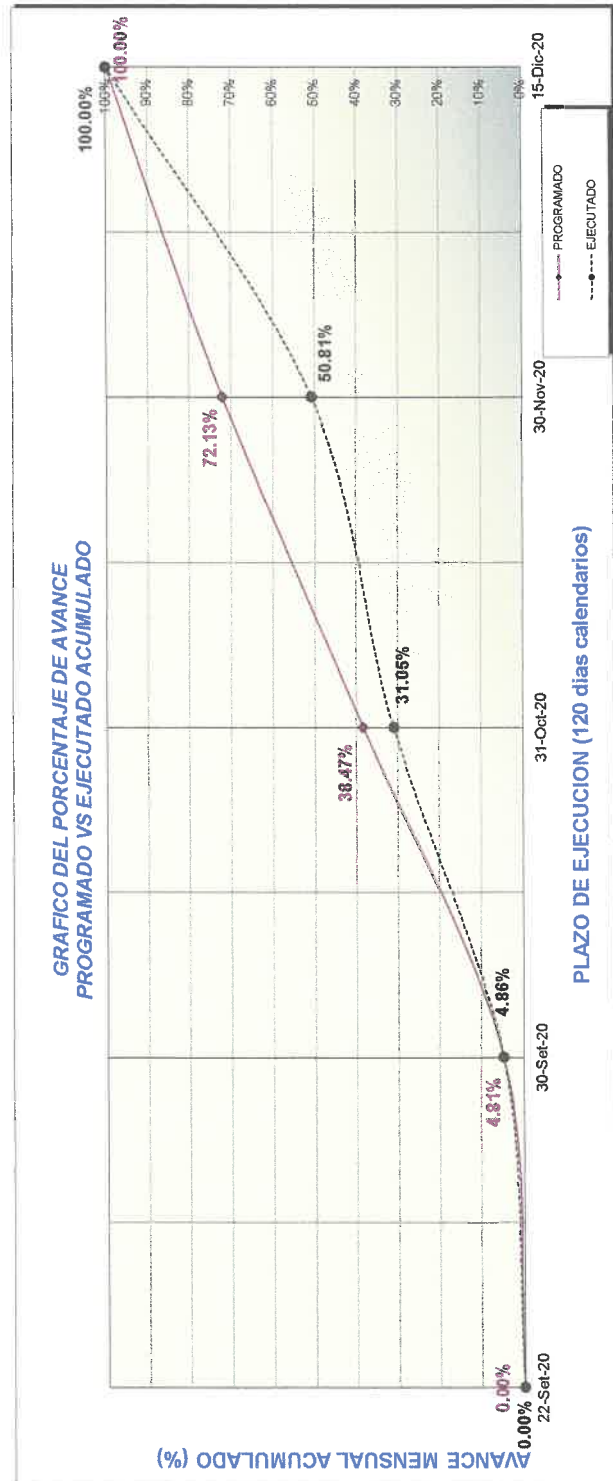

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Incl. IGV) PARCIAL S/.	MONTOS (Incl. IGV) ACUMUL. S/.	PORCENTAJES PARCIAL %	PORCENTAJES ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	54,088.52	54,088.52	4.81%	4.81%
31-Oct-20	378,619.73	432,708.25	33.66%	38.47%
30-Nov-20	378,619.73	811,327.98	33.66%	72.13%
31-Dic-20	317,411.02	1,124,739.00	27.87%	100.00%
TOTAL	1,124,739.00	1,124,739.00	100.00%	100.00%

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (Incl. IGV) PARCIAL S/.	MONTOS (Incl. IGV) ACUMUL. S/.	PORCENTAJES PARCIAL %	PORCENTAJES ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	54,665.14	54,665.14	4.86%	4.86%
31-Oct-20	294,577.97	349,243.11	26.19%	31.05%
30-Nov-20	222,235.55	571,478.65	19.76%	50.81%
15-Dic-20	553,260.34	1,124,739.00	49.19%	100.00%
TOTAL	1,124,739.00	1,124,739.00	100.00%	100.00%

(Signature)
ALEX JAVIER DIAZ LEON
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 126547

(Signature)
Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
 ING. CIVIL
 R. CIP. 110887


CUADRO DE BARRAS Y CURVA S.

DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

Proyecto : "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA LA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : TRAMO EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA
Contratista : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
Inspector : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547
Residente : ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

Monto Contratado S/. 1,724,000.00
Plazo de ejecución 120 días calendarios

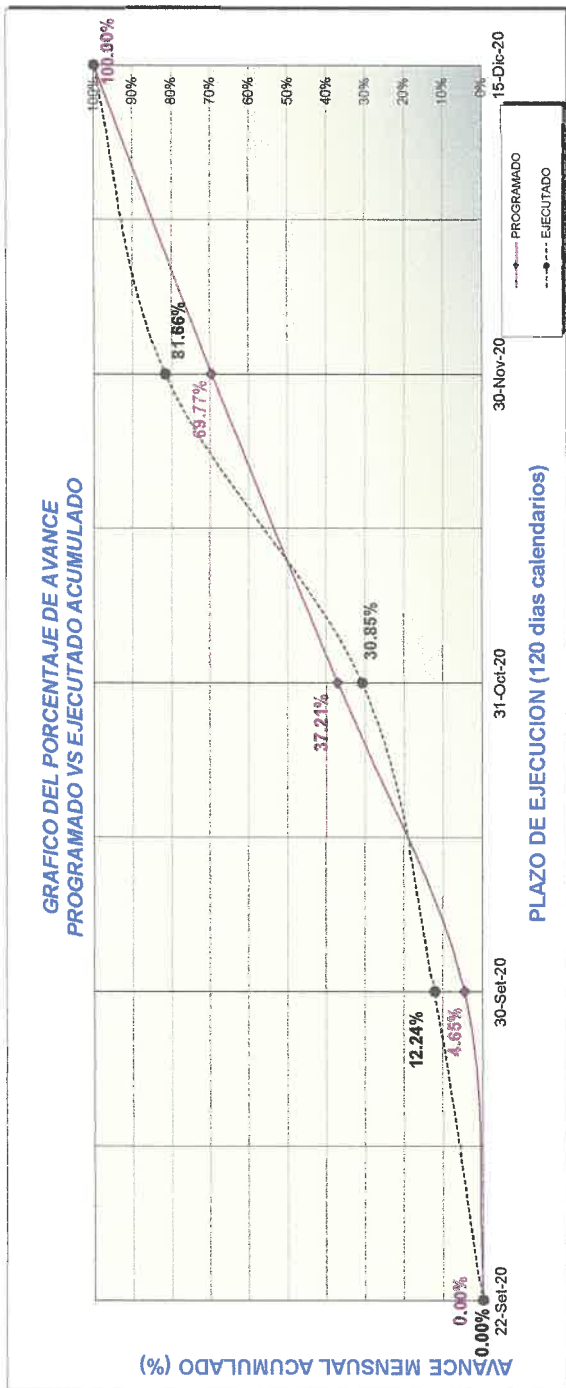

PLAZO DE EJECUCION (120 días calendarios)


MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Inc/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	14,239.78	14,239.78	4.65%	4.65%
31-Oct-20	99,678.44	113,918.22	32.56%	37.21%
30-Nov-20	99,678.44	213,596.66	32.56%	69.77%
31-Dic-20	306,181.00	306,181.00	30.23%	100.00%
TOTAL	306,181.00	306,181.00	100.00%	100.00%

ALEX JAVIER DIAZ LEON
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 126547

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (Inc/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	37,486.20	37,486.20	12.24%	12.24%
31-Oct-20	56,972.26	94,458.46	18.61%	30.85%
30-Nov-20	155,559.68	250,018.14	50.81%	81.66%
31-Dic-20	56,162.66	306,181.00	18.34%	100.00%
TOTAL	306,181.00	306,181.00	100.00%	100.00%


 Quelvin Quipuzcoa Alayo
 ING CIVIL
 R. CIP. 110887

CUADRO DE BARRAS Y CURVA - GENERAL

DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

Proyecto : "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG=4.330KM", "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Ciliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

Ubicación : SANTA CRUZ DE CHUCA


Contratista : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA

Inspector : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547

Residente : ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887

Monto Contratado S/. 1,724,000.00

Plazo de ejecución 120 días calendarios

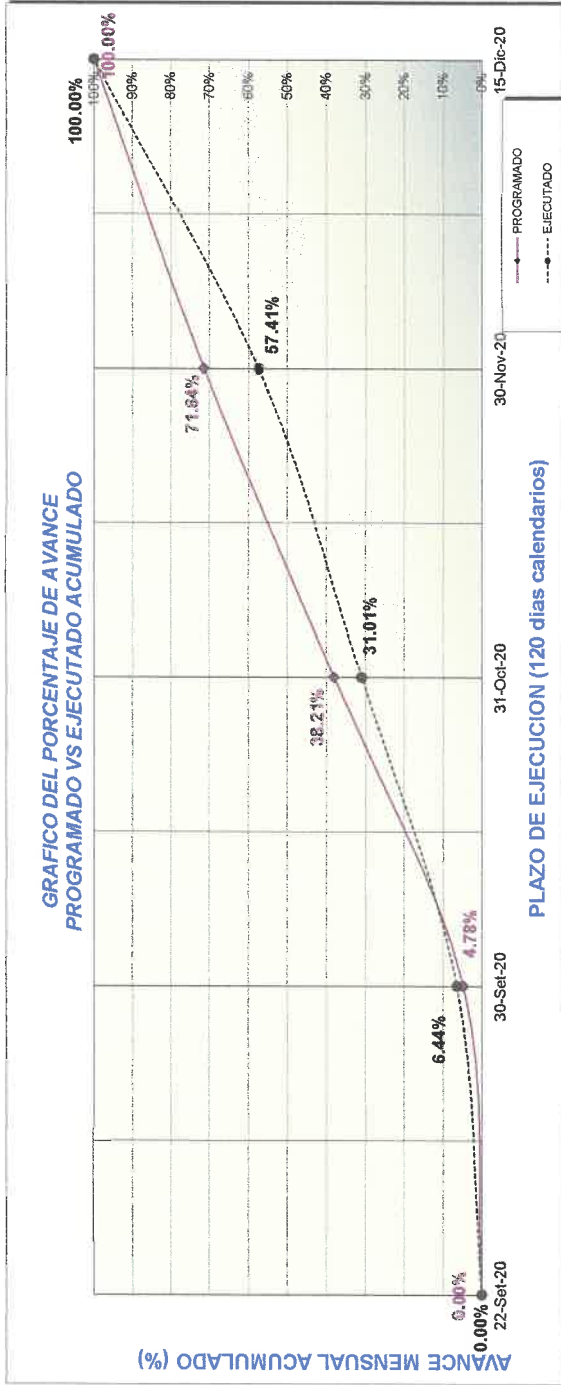

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS



MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	68,328.30	68,328.30	4.78%	4.78%
31-Oct-20	478,298.17	546,626.47	33.43%	38.21%
30-Nov-20	478,298.17	1,024,924.64	33.43%	71.64%
31-Dic-20	405,995.36	1,430,920.00	28.36%	100.00%
TOTAL	1,430,920.00		100.00%	

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS


MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
22-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	92,151.34	92,151.34	6.44%	6.44%
31-Oct-20	351,550.23	443,701.57	24.57%	31.01%
30-Nov-20	377,795.23	821,496.80	26.40%	57.41%
31-Dic-20	609,423.20	1,430,920.00	42.59%	100.00%
TOTAL	1,430,920.00		100.00%	


Quelvin J. Quiquiza Alayo
ING CIVIL
R. CIP. 110887

ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547



- **CRONOGRAMA
DE AVANCE DEL
SERVICIO
PROGRAMADO.**


Quelvin J. Quirozco Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547



CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO

Proyecto : "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO-MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : TRAMO CALIFORNIA - LOS ANGELES - LA CRUZ DE ASHIQUINO - MAL PASO - TIERRA NEGRA
Contratista : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
Inspector : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547
Residente : ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887


Monto Contratado : S/ 1,724,000.00
Plazo de ejecución : 120 días calendarios

ITEM	PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04
01	OBRAS PRELIMINARES								
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	glb	1.00	40,220.52	40,220.52	2,011.03	14,077.18	14,077.18	10,055.13
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	15.91	998.09	15,879.61	793.98	5,557.86	5,557.86	3,969.90
02	PAVIMENTOS				0.00				
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	3,976.50	4.62	18,371.43	918.57	6,430.00	6,430.00	4,592.86
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	m3	11,929.50	32.06	382,459.77	19,122.99	133,860.92	133,860.92	95,614.94
03	TRANSPORTE				0.00				
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	12,289.50	4.93	60,587.24	3,029.36	21,205.53	21,205.53	15,146.81
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	116,188.51	1.09	126,645.48	6,332.27	44,325.92	44,325.92	31,661.37
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	7,723.00	4.93	38,074.39	1,903.72	13,326.04	13,326.04	9,518.60
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	55,845.33	1.09	60,871.41	3,043.57	21,304.99	21,304.99	15,217.85
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				0.00				
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	15,906.00	1.84	29,267.04	1,463.35	10,243.46	10,243.46	7,316.76
05	SEÑALIZACION				0.00				
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	16.00	315.24	5,043.84				5,043.84
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	20.00	389.22	7,784.40				7,784.40
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	5.00	389.22	1,946.10				1,946.10
05.04	SEÑALES INFORMATIVAS	und	5.00	468.32	2,341.60				2,341.60
06	IMPACTO AMBIENTAL				0.00				
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	7,274.14	14,548.28				14,548.28
07	EMERGENCIA SANITARIA				0.00				
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	24,801.19	24,801.19	1,240.06	8,680.42	8,680.42	6,200.30
	COSTO DIRECTO				S/ 828,842.30	S/ 39,858.90	S/ 279,012.33	S/ 279,012.33	S/ 230,958.74
	COSTO INDIRECTO (10.00%)				S/ 82,884.23	S/ 3,985.89	S/ 27,901.23	S/ 27,901.23	S/ 23,095.88
	UTILIDAD (5%)				S/ 41,442.12	S/ 1,992.95	S/ 13,950.62	S/ 13,950.62	S/ 11,547.93
	SUB TOTAL				S/ 953,168.65	S/ 45,837.74	S/ 320,864.18	S/ 320,864.18	S/ 265,602.55
	IGV (18%)				S/ 171,570.36	S/ 8,250.78	S/ 57,755.55	S/ 57,755.55	S/ 47,808.47
	COSTO TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL				S/ 1,124,739.00	S/ 54,088.52	S/ 378,619.73	S/ 378,619.73	S/ 313,411.02

AVANCE TOTAL CONTRACTUAL
PROGRAMADO MENSUAL
ACUMULADO

4.81%	33.66%	33.66%	27.87%
4.81%	38.47%	72.13%	100.00%


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547


Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
INGENIERO CIVIL
P. CIP 110887

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO

Proyecto : "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG=4.330KM", - "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM" - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicación : TRAMO EPM. PE-3N - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA - PACCHA PARTE ALTA
Contratista : CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
Inspector : ING. ALEX JAVIER DIAZ LEON - CIP N° 126547
Residente : ING. QUELVIN JULIO QUIPUZCOA ALAYO - CIP N° 110887



Monto Contratado
Plazo de ejecución
 S/. 1,724,000.00
 120 días calendarios

ITEM	PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04
01	OBRAS PRELIMINARES								
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	glb	1.00	40,220.52	40,220.52	2,011.03	14,077.18	14,077.18	10,055.13
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	4.33	998.09	4,321.73	216.09	1,512.61	1,512.61	1,080.43
02	PAVIMENTOS				0.00				
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	1,075.00	4.62	4,966.50	248.33	1,738.28	1,738.28	1,241.63
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	m3	3,247.50	32.06	104,114.85	5,205.74	36,440.20	36,440.20	26,028.71
03	TRANSPORTE				0.00				
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	3,360.00	3.29	11,054.40	552.72	3,869.04	3,869.04	2,763.60
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	12,344.55	0.64	7,900.51	395.03	2,765.18	2,765.18	1,975.13
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	1,935.00	2.81	5,437.35	271.87	1,903.07	1,903.07	1,359.34
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	2,838.83	0.64	1,816.85	90.84	635.90	635.90	454.21
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				0.00				
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	4,330.00	1.84	7,967.20	398.36	2,788.52	2,788.52	1,991.80
05	SEÑALIZACION				0.00				
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	5.00	315.24	1,576.20				1,576.20
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	4.00	389.22	1,556.88				1,556.88
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	2.00	389.22	778.44				778.44
05.04	SEÑALES INFORMATIVAS	und	2.00	468.32	936.64				936.64
06	IMPACTO AMBIENTAL				0.00				
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	1.50	7,274.14	10,911.21				10,911.21
07	EMERGENCIA SANITARIA				0.00				
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	22,071.52	22,071.52	1,103.58	7,725.03	7,725.03	5,517.88
	COSTO DIRECTO				S/ 225,630.80	S/ 10,493.57	S/ 73,455.00	S/ 73,455.00	S/ 68,227.23
	COSTO INDIRECTO (10.00%)				S/ 22,563.08	S/ 1,049.36	S/ 7,345.50	S/ 7,345.50	S/ 6,822.72
	UTILIDAD (5%)				S/ 11,281.54	S/ 524.68	S/ 3,672.75	S/ 3,672.75	S/ 3,411.36
	SUB TOTAL				S/ 259,475.42	S/ 12,067.61	S/ 84,473.25	S/ 84,473.25	S/ 78,461.31
	IGV (18%)				S/ 46,705.58	S/ 2,172.17	S/ 15,205.19	S/ 15,205.19	S/ 14,123.03
	COSTO TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL				S/ 306,181.00	S/ 14,239.78	S/ 99,678.44	S/ 99,678.44	S/ 92,584.34

AVANCE TOTAL CONTRACTUAL									
PROGRAMADO MENSUAL						4.65%	32.56%	32.56%	30.24%
ACUMULADO						4.65%	37.21%	69.76%	100.00%

QJ
Quevin J. Quipuzcoa Alayo
 ING. CIVIL
 R. CIP. 110887

Alex Javier Diaz Leon
ALEX JAVIER DIAZ LEON
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 126547



- **PANEL
FOTOGRAFICO.**



A blue ink handwritten signature, appearing to be 'Q. Quipezcoa', written over a horizontal line.

Quelvin J. Quipezcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887

A blue ink handwritten signature, appearing to be 'Alex J. Diaz Leon', written over a horizontal line.

ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547





PANEL FOTOGRAFICO

**TRAMO "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA
LONG= 15.906 KM"**

Foto N° 01: Se Observan las charlas de seguridad por parte del residente de obra



Fuente: Propia


Foto N° 02: Se observan trabajos de compactacion de material granular e=0.20 m en el KM



Fuente: Propia

[Signature]
ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126347

[Signature]
Quelvin Quipuzcoa Alayo
ING CIVIL
R. CIP. 110887



CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA




Foto N° 03: Se observan trabajos de compactacion de material granular e=0.20 m en KM

223



Fuente: Propia

Foto N° 04: Se observan trabajos de transporte y descarga de material granular hasta 1 km




Fuente: Propia


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547


17L 823196 9090599
Santiago de Chuco
La Libertad

Network: 25 nov. 2020 2:39:01 p. m. GMT-05:00


Quelvin J. Quiroz Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887



CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA



222

Foto N° 05: Se observan el acopio en cantera de material granular hasta 1km




Fuente: Propia


Foto N° 06: Se observa la cantera para los tramos "CALIFORNIA -LOS ANGELES -LA CRUZ DE ASHIQUINO- MAL PASO - TIERRA NEGRA LONG= 15.906 KM"




Fuente: Propia


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547


Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887



CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA



221

TRAMO: "EPM. PE-3N-VILLA CRUZ DE ALGALLAMA-PACCHA PARTE ALTA LONG.=4.330KM"

Foto N° 07: Se observa la reconfirmación de cuentas



Fuente: Propia


Foto N° 08: Se observan trabajos de compactacion de material granular e=0.20 m en KM 3+000




Fuente: Propia


 ALEX JAVIER DIAZ LEON
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 126547


 Quelvin Quipezcoa Alayo
 ING. CIVIL
 R. CIP. 110887



CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA



220

Foto N° 09: Se observa la reconfirmación de cuentas en el KM 2+000 – 3+000




Fuente: Propia


Foto N° 10: Se observa el acopio y traslado de material granular hasta y mayor a 1km




ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

Fuente: Propia


Quelvin J. Quiroz Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887



CONSORCIO VIAL
CALIFORNIA




Foto N° 11: Se observa la señalización en obra

219








ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547



Quelvin J. Quipezcoa Alayo
ING CIVIL
R. CIP. 110887



- ACTA DE
ENTREGA DE
TERRENO.



Quelin J. Quipuzcoa Alayo
ING CIVIL
R. CIP. 110887



ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547




“ACTA DE ENTREGA DE TERRENO”

Servicio	MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA LONG= 4.330 KM” Y “CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO TIERRA NEGRA LONG= 16.906”, DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
Tramo	“EMP. PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA” LONG = 4.330 KM
Provincia	SANTIAGO DE CHUCO
Distrito	SANTA CRUZ DE CHUCA
Entidad Contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)
Empresa Ejecutora	CONSORCIO VIAL CALIFORNIA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.)
N.º de Contrato	CONTRATO DE SERVICIO N.º 016-2020-MPSCH-LOG
Fecha de Contrato	28/08/2020
Modalidad	SUMA ALZADA
Monto Presupuestado	S/. 369,080.54 soles Inc. (I.G.V.)
Monto Contractual	S/. 368,893.00 soles Inc. (I.G.V.)
Inspector de Servicio	Ing. ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN
Plazo de Ejecución	PLAN DE TRABAJO: 20 D.C. MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C. MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C. INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C. TOTAL: 505 DÍAS CALENDARIOS (sujeto a fecha de contrato)
Fecha de Culminación	31/12/2021



ALIFORNIA
 EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ
 DNI N° 44944779
 REPRESENTANTE COMÚN
 CONSORCIO

Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
 ING. CIVIL
 R. CIP. 110887

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 Ing. David Iván Silva Torres
 SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
 CIP N° 63635

ALEX JAVIER DIAZ LEON
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 126547

Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
 ING. CIVIL
 R. CIP. 110887

ALEX JAVIER DIAZ LEON
 INGENIERO CIVIL

En el caserío de Villa Cruz de Algallama, distrito de Santa Cruz de Chuca, provincia de Santiago de Chuco – La Libertad, siendo las 10:00 p.m. del 29 de agosto del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza con CIP. N° 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N° 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N° 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Ing. Alex Javier Díaz León con CIP N° 126547 y por último, por parte del Contratista el Ing. Quelvin Julio Quipuzcoa Alayo con CIP N° 110887 como Residente de servicio y el Sr. Edgar Gómez Domínguez con DNI N° 44944779, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL CALIFORNIA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.). A fin de realizar la ENTREGA DE TERRENO del tramo: “EMP. PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA” con una longitud de 4.330 km.

Este acto protocolar tiene por finalidad hacer la entrega de la ruta mencionada en todo su recorrido físico para la recolección de información necesaria y de esta manera hacer la elaboración del PLAN DE TRABAJO de la ruta, que es parte de la FASE I del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y formatos (anexos) estipulados en los Términos de Referencia del D.U. N° 070-2020 presentados para la contratación.

Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. PE-3N –

VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA LONG= 4.330 KM” Y “CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO TIERRA NEGRA LONG= 16.906”, DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Siendo las 10:30 p.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para dar inicio a la elaboración del Plan de Trabajo y continuar con los procedimientos posteriores para dar inicio a la FASE II y III (mantenimiento periódico y rutinario) del servicio. Del mismo día, se da por concluida el acto de **ENTREGA DE TERRENO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.

AREA USUARIA

Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 190782

Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 218511

AREA RESPONSABLE

Ing. David Iván Silva Torres
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH
CIP N° 63635

EMPRESA EJECUTORA

Ing. Quelvin Julio Quipuzcoa Alayo
Residente de Servicio
CIP N° 110887

Sr. Edgar Gómez Domínguez
Representante Común de CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
DNI N° 44944779

INSPECTOR

Ing. Alex Javier Díaz León
Inspector del Servicio
CIP N° 126547

Ing. Alex Javier Díaz León
Inspector del Servicio
CIP N° 126547

Gabriel Omar Santa Cossio
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 192701

Ing. Alex Javier Díaz León
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

“ACTA DE ENTREGA DE TERRENO”



CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ
DNI N° 44944779
REPRESENTANTE COMÚN

Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887

ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

Servicio	MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA LONG= 4.330 KM” Y “CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO TIERRA NEGRA LONG= 16.906”, DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
Tramo	“CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO TIERRA NEGRA” LONG = 16.906 KM
Provincia	SANTIAGO DE CHUCO
Distrito	SANTA CRUZ DE CHUCA
Entidad Contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)
Empresa Ejecutora	CONSORCIO VIAL CALIFORNIA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.)
N.º de Contrato	CONTRATO DE SERVICIO N.º 016-2020-MPSCH-LOG
Fecha de Contrato	28/08/2020
Modalidad	SUMA ALZADA
Monto Presupuestado	S/. 1,355,795.63 soles Inc. (I.G.V.)
Monto Contractual	S/. 1,355,107.00 soles Inc. (I.G.V.)
Inspector de Servicio	Ing. ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN
Plazo de Ejecución	PLAN DE TRABAJO: 20 D.C. MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C. MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C. INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C. TOTAL: 505 DÍAS CALENDARIOS (sujeto a fecha de contrato)
Fecha de Culminación	31/12/2021

Gabriel Oñativita Castro
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 192761

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. David Iván Silva Torres
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
CIP N° 63635

Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887

En el caserío de Villa Cruz de Algallma, distrito de Santa Cruz de Chuca, provincia de Santiago de Chuco – La libertad, siendo las 10:00 p.m. del 29 de agosto del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevin Alan Valencia Rebaza con CIP. N° 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávèz con CIP N° 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N° 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Ing. Alex Javier Díaz León con CIP N° 126547 y por último, por parte del Contratista el Ing. Quelvin Julio Quipuzcoa Alayo con CIP N° 110887 como Residente de servicio y el Sr. Edgar Gómez Domínguez con DNI N° 44944779, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL CALIFORNIA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.). A fin de realizar la ENTREGA DE TERRENO del tramo: “CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO TIERRA NEGRA” con una longitud de 16.906 km.

Este acto protocolar tiene por finalidad hacer la entrega de la ruta mencionada en todo su recorrido físico para la recolección de Información necesaria y de esta manera hacer la elaboración del PLAN DE TRABAJO de la ruta, que es parte de la FASE I del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y formatos (anexos) estipulados en los Términos de Referencia del D.U. N° 070-2020 presentados para la contratación.


ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. PE-3N –**

VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA LONG= 4.330 KM” Y “CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO TIERRA NEGRA LONG= 16.906”, DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Siendo las 10:30 p.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para dar inicio a la elaboración del Plan de Trabajo y continuar con los procedimientos posteriores para dar inicio a la FASE II y III (mantenimiento periódico y rutinario) del servicio. Del mismo día, se da por concluida el acto de **ENTREGA DE TERRENO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.

AREA USUARIA



INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
CIP: 190782
JEFE DE OPERACIONES

Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 190782



INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
CIP: 218511
GERENTE GENERAL

Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 218511


AREA RESPONSABLE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. David Iván Silva Torres
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
CIP N° 63635

Ing. David Iván Silva Torres
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH
CIP N° 63635

EMPRESA EJECUTORA



Quelvin J. Quiroz Alayo
ING CIVIL
R. CIP. 110887
Residente de Servicio
CIP N° 110887

Quelvin J. Quiroz Alayo
ING CIVIL
R. CIP. 110887



CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ
DNI N° 44944779
REPRESENTANTE COMÚN

Sr. Edgar Gómez Domínguez
Representante Común de CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
DNI N° 44944779

INSPECTOR




ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 126547



Ing. Alex Javier Díaz León
Inspector del Servicio
CIP N° 126547



Gabriel Omar Pariza C.
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 192716



ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 126547



- ACTA DE INICIO DE SERVICIO.


Quelvin J. Quiroz Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547



“ACTA DE INICIO DE SERVICIO”

Servicio	MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA LONG= 4.330 KM” Y “CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO TIERRA NEGRA LONG= 16.906”, DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
Tramo	“EMP. PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA” LONG = 4.330 KM
Provincia	SANTIAGO DE CHUCO
Distrito	SANTA CRUZ DE CHUCA
Entidad Contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)
Empresa Ejecutora	CONSORCIO VIAL CALIFORNIA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.)
N.º de Contrato	CONTRATO DE SERVICIO N.º 016-2020-MPSCH-LOG
Fecha de Contrato	28/08/2020
Modalidad	SUMA ALZADA
Monto Presupuestado	S/. 369,080.54 soles Inc. (I.G.V.)
Monto Contractual	S/. 368,893.00 soles Inc. (I.G.V.)
Inspector de Servicio	Ing. ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN
Aprobación Plan de Trabajo	RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 150-2020-MPSCH/GM
Fecha de Aprobación	21/09/2020
Fecha de Inicio	22/09/2020
Plazo de Ejecución	MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C. (sujeto a fecha de contrato)
	MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C.
	INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C.
Fecha de Culminación	31/12/2021



CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ
DNI N° 4494779
REPRESENTANTE COMÚN

Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887

Marcel Nicolás Barrantes Parimango
ING. CIVIL
R. CIP. N° 225678

ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887

Ing. David Iván Silva Torres
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
CIP N° 63635

General Omar Panta Cossio
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 192701


En el caserío de Villa Cruz de Algallama, distrito de Santa Cruz de Chuca, provincia de Santiago de Chuco – La Libertad, siendo las 10:00 a.m. del 22 de septiembre del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevin Alan Valencia Rebaza con CIP. N° 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N° 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH, el Ing. Marcial Nicolás Barrantes Parimango con CIP N° 225678 como monitor designado del servicio intervenido (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N° 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Alex Javier Díaz León con CIP N° 126547; asimismo, representando a Provias Descentralizado está el Ing. Gabriel Omar Panta Cossio con CIP N° 192701 encargado de Monitoreo y Seguimiento y el Ing. Bach. Eduardo Rafael Príncipe León con DNI N° 46839109 como Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento; finalmente, por parte del Contratista Ing. Quelvin Julio Quipuzcoa Alayo con CIP N° 110887 como Residente de servicio y el Sr. Edgar Gómez Domínguez con DNI N° 44944779, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL CALIFORNIA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.). A fin de realizar el INICIO DE SERVICIO del tramo: “EMP. PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA” con una longitud de 4.330 km.

Este acto protocolar tiene por finalidad dar inicio a la ejecución de las actividades de **MANTENIMIENTO PERIÓDICO** de la ruta mencionada en todo su recorrido físico correspondiente a la FASE II del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y partidas estipulados en el Plan de Trabajo previamente aprobado por la Entidad.

Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: "EMP. PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA LONG= 4.330 KM" Y "CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO TIERRA NEGRA LONG= 16.906"**, DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Siendo las 10:30 a.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas acorde con el Plan de Trabajo, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para empezar la ejecución del Mantenimiento Periódico. Del mismo día, se da por concluido el acto de **INICIO DE SERVICIO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.

AREA USUARIA



INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
JEFE DE OPERACIONES
CIP N° 190782


INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
GERENTE GENERAL
CIP N° 218511

Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 190782


Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 218511

CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
EDGAR CORMEZ DOMINGUEZ
OR N° 1484475
REPRESENTANTE COMUN


Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887


Marcial Nicolás Barrantes Parimango
ING. CIVIL
Ing. Marcial Nicolás Barrantes Parimango
Monitor Designado del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 225678


AREA RESPONSABLE


Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887


Ing. David Iván Silva Torres
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH
CIP N° 63635



ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

REPRESENTANTES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD


Gabriel Omar Panta Cossio
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 192701
Ing. Gabriel Omar Panta Cossio
Monitoreo y Seguimiento a Mantenimiento Vial
Provincia de Santiago de Chuco
CIP N° 192701


Eduardo R. Principe León
ANALISTA Y REGISTRADOR DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A MANTENIMIENTO VIAL
PROV. SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Bach. Eduardo Rafael Principe León
Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento
Provincia de Santiago de Chuco
DNI N° 46839109

EMPRESA EJECUTORA



Quelvin J. Quipezcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887

Ing. Quelvin Julio Quipezcoa Alayo
Residente de Servicio
CIP N° 110887



CONSORCIO VIAL CALIFORNIA

EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ
DNI N° 4494479
REPRESENTANTE COMÚN

Sr. Edgar Gómez Domínguez
Representante Común de CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
DNI N° 4494479


INSPECTOR



ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 126547

Ing. Alex Javier Díaz León
Inspector del Servicio
CIP N° 126547





Quelvin J. Quipezcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. 110887



ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 126547

“ACTA DE INICIO DE SERVICIO”

Servicio

MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EMP. PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA LONG= 4.330 KM” Y “CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO TIERRA NEGRA LONG= 16.906”, DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Tramo

“CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO TIERRA NEGRA” LONG = 16.906 KM

Provincia

SANTIAGO DE CHUCO

Distrito

SANTA CRUZ DE CHUCA

Entidad Contratante

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)

Empresa Ejecutora

CONSORCIO VIAL CALIFORNIA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.)

N.º de Contrato

CONTRATO DE SERVICIO N.º 016-2020-MPSCH-LOG

Fecha de Contrato

28/08/2020

Modalidad

SUMA ALZADA

Monto Presupuestado

S/. 1,355,795.63 soles Inc. (I.G.V.)

Monto Contractual

S/. 1,355,107.00 soles Inc. (I.G.V.)

Inspector de Servicio

Ing. ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN

Aprobación Plan de Trabajo

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 150-2020-MPSCH/GM

Fecha de Aprobación

21/09/2020

Fecha de Inicio

22/09/2020

Plazo de Ejecución

MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C. (sujeto a fecha de contrato)

MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C.

INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C.

31/12/2021

Fecha de Culminación



Ing. David Iván Silva Torres
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
CIP N° 63635

En el caserío de Villa Cruz de Algallama, distrito de Santa Cruz de Chuca, provincia de Santiago de Chuco – La libertad, siendo las 10:00 a.m. del 22 de septiembre del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza con CIP. N° 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N° 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH, el Ing. Marcial Nicolás Barrantes Parimango con CIP N° 225678 como monitor designado del servicio intervenido (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N° 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Alex Javier Díaz León con CIP N° 126547; asimismo, representando a Provias Descentralizado está el Ing. Gabriel Omar Panta Cossio con CIP N° 192701 encargado de Monitoreo y Seguimiento y el Ing. Bach. Eduardo Rafael Príncipe León con DNI N° 46839109 como Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento; finalmente, por parte del Contratista Ing. Quelvin Julio Quipuzcoa Alayo con CIP N° 110887 como Residente de servicio y el Sr. Edgar Gómez Domínguez con DNI N° 44944779, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL CALIFORNIA (ECAN INGENIERIA S.C.R.L. + CORPORACION SORIANO L Y C S.A.C.). A fin de realizar el INICIO DE SERVICIO del tramo: “CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO TIERRA NEGRA” con una longitud de 16.906 km.

Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
ING. CIVIL
R. CIP. N° 110887


ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 126547


Este acto protocolar tiene por finalidad dar inicio a la ejecución de las actividades de **MANTENIMIENTO PERIÓDICO** de la ruta mencionada en todo su recorrido físico correspondiente a la FASE II del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y partidas estipulados en el Plan de Trabajo previamente aprobado por la Entidad.

Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES: "EMP. PE-3N – VILLA CRUZ DE ALGALLAMA – PACCHA PARTE ALTA LONG= 4.330 KM" Y "CALIFORNIA – LOS ANGELES – LA CRUZ DE ASHIQUINO – MAL PASO TIERRA NEGRA LONG= 16.906"**, DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Siendo las 10:30 a.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas acorde con el Plan de Trabajo, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para empezar la ejecución del Mantenimiento Periódico. Del mismo día, se da por concluido el acto de **INICIO DE SERVICIO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.


AREA USUARIA


Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 190782


Ing. Rafael Kevin Alan Valencia Rebaza
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 218511


Ing. Marcial Nicolás Barrantes Parimango
Monitor Designado del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 225878


AREA RESPONSABLE


Quelvin J. Quiroz Alayo
ING CIVIL
R. CIP. 110887


Ing. David Iván Silva Torres
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH
CIP N° 63635


ALEX JAVIER DIAZ LEON
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

REPRESENTANTES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD



Ing. Gabriel Omar Panta Cossio
Monitoreo y Seguimiento a Mantenimiento Vial
Provincia de Santiago de Chuco
CIP N° 192701


Ing. Bach. Eduardo Rafael Príncipe León
Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento
Provincia de Santiago de Chuco
DNI N° 46839109

CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ
DNI N° 44844778
REPRESENTANTE COMUN

Quelvin J. Quiroz Alayo
ING CIVIL
R. CIP. 110887

EMPRESA EJECUTORA



Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
ING CIVIL
R. CIP. 110887

Ing. Quelvin Julio Quipuzcoa Alayo
Residente de Servicio
CIP N° 110887


CONSORCIO VIAL CALIFORNIA



EDGAR GÓMEZ DOMÍNGUEZ
DNI N° 44944779
REPRESENTANTE COMÚN


Sr. Edgar Gómez Domínguez
Representante Común de CONSORCIO VIAL CALIFORNIA
DNI N° 44944779

INSPECTOR




ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547

Ing. Alex Javier Díaz León
Inspector del Servicio
CIP N° 126547



Quelvin J. Quipuzcoa Alayo
ING CIVIL
R. CIP. 110887



ALEX JAVIER DÍAZ LEÓN
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126547
