



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

INFORME N° 1467 - 2020-MPSCH/DIST/SGI

A : ABOG. JHON JAIRO CURAY REYES
Administrador de la MPSCH

DE : ING. DAVID IVAN SILVA TORRES
Sub Gerente de Infraestructura – MPSCH

ASUNTO : CONFORMIDAD DE VALORIZACION N° 04 CONTRATISTA = CONTRACTUAL
(TRAMO 11)

REFERENCIA : (01) INFORME N° 0284-2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH
(02) INFORME N° 009-2020-ING*JVB/INSPECTOR DE OBRA-MPSCH
(03) OBRA: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: EMP. LI - 122 - HUASHGON - HUAMADA - CASAPAMBA - CANCATE - SHIRACBALL - SINCON - HUANDA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD." Pertenciente al paquete N°11
(04) CONTRATO DE SERVICIO N° 006-2020-MPSCH-LOG

FECHA : Santiago de Chuco, 23 de Diciembre del 2020



Me es sumamente honroso dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo; por otro lado referente al asunto de la presente manifiesto lo siguiente:

I. BASE LEGAL

- Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 27972 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
- Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
- Reglamento Nacional de Edificaciones

II. ANTECEDENTE

- ✓ Mediante el documento de la referencia, **INFORME N° 284-2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH**, el Encargado de la División de Supervisión y Liquidación de Obras, con fecha 23 de Diciembre del 2020, da la **CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION N° 04 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO** del contratista “**CONSORCIO VIAL SINCON**”; presentado por el Ing. Javier Burgos Vergaray - INSPECTOR de la obra denominada: “**MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. LI - 122 - HUASHGON - HUAMADA - CASAPAMBA - CANCATE - SHIRACBALL - SINCON - HUANDA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD**”; quien solicita el **Pago N° 04** por servicios de ejecución de obra al CONTRATISTA “**CONSORCIO VIAL SINCON**”



[Handwritten signature and stamp]
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

TRAMO N° 11.00

VALORIZACION BRUTA	S/. 947,526.11
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (-) SIN IGV	S/. -
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (-) SIN IGV	S/. -
VALORIZACION NETA	S/. 947,526.11
IGV (18%)	S/. 170,554.70
VALORIZACION (INCL. IGV)	S/. 1'118,080.81
RETENCION DE 10% FIEL CUMPLIMIENTO	Se retuvo todo
MONTO TOTAL	S/. 1'118,080.81

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ La **Valorización Bruta N° 04 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. LI - 122 - HUASHGON - HUAMADA - CASAPAMBA - CANCATE - SHIRACBALL - SINCON - HUANDA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD** del contratista fue por **S/. 947,526.11 (NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTI SEIS CON 11/100 SOLES)**.
- ✓ En las primeras valorizaciones se solicitó la **RETENCION DE 10 % GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO ES DE S/. 494,200.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES) INCLU IGV**; el monto solicitado que se retuvo es el saldo total de retención del 10% de garantía de fiel cumplimiento.
- ✓ Por lo tanto, el monto a cancelar al **CONTRATISTA POR CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA VALORIZACION N°04 - POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO**; asciende a **S/. 1'118.080.81 (UN MILLON CIENTO DIESIOCHO MIL OCHENTA CON 81/100 SOLES) INCL. IGV**; se recomienda hacer la retención de fiel cumplimiento.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y acciones que estime por conveniente, salvo mejor parecer.

Atentamente,

Adjunto:

- Referencias
- Val N°04 ()
- Digital ()



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



INFORME N° 284 - 2020 HMMT/DSYLO/SGI/MPSCH

A : ING° DAVID IVAN SILVA TORRES
SUB-GERENTE DE INFRAESTRUCTURA MPSCH

DEL : ING. HERMES M. MELENDEZ TAMAYO
JEFE (e) DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

ASUNTO : VALORIZACIÓN DE SERVICIO N°04 - DICIEMBRE 2020

REFERENCIA: a) "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. LI-122: HUASHGON - HUAMADA - CASAPAMBA - CANCATE - SHIRACBALL - SINCON - HUANDA Long. 58.000 Km., DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"
b) Informe N°009-2020-FEBC/INSPECTOR DE OBRA-MPSCH
c) Carta N°011-2020-BYBT-RC-CVS

FECHA : Santiago de Chuco, 21 de Diciembre del 2020

Es grato dirigirme a Usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo, vistos los documentos de la referencia, el suscrito como Jefe de la División de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco **OTORGA LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN N° 04- DICIEMBRE 2020** del Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. LI-122: HUASHGON - HUAMADA - CASAPAMBA - CANCATE - SHIRACBALL - SINCON - HUANDA Long. 58.000 Km., DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD" y presentado por el Contratista **CONSORCIO VIAL SINCON** según Contrato de Servicios N° 009-2020-MPSCH-LOG y aprobado por el Inspector de Obra.

Se informa trabajos valorizados en el periodo Diciembre 2020.

DATOS GENERALES

1.- DENOMINACION

"MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. LI-122: HUASHGON - HUAMADA - CASAPAMBA - CANCATE - SHIRACBALL - SINCON - HUANDA Long. 58.000 Km., DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

2.- UBICACIÓN

- Caseríos : Huashgon, Huamada, Casapamba, Cancate, Shiracball, Sincon, Huanda
- Distrito : Santiago de Chuco
- Provincia : Santiago de Chuco
- Región : La Libertad

3.- DATOS DEL MANTENIMIENTO:

EJECUTOR

- Proceso de Selección : PES-PROG-11-2020-MPSCH/CS-2
- Contratista : CONSORCIO VIAL SINCON
- Representante Legal : Bander J. Baca Flores
- Contrato de Servicios : N° 006-2020-MPSCH-LOG.
- Suscripción de Contrato : 24/08/2020
- Modalidad : A Suma Alzada
- Valor Referencial (inc. IGV) : S/ 4'942,000.00



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe

- Monto Contratado (inc. IGV)	: S/ 4'942,000.00
- Monto del Tramo (inc. IGV)	: S/ 4'942,000.00
- Factor de Relación	: 1.000
- Fuente de Financiamiento	: MTC -Provias - D. U. N°070-2020
- Plazo de Ejecución Inicial	: 500 Días Calendarios
- Entrega de Terreno	: 25 de Agosto del 2020
- Inicio de Plazo Contractual	: 25 de Agosto del 2020 (Elaboración Plan de Trabajo)
- Inicio de Plazo Fase II	: 17 de Setiembre 2020
- Fecha Término Programado	: 31 de Diciembre del 2021
- Residente de Obra	: Ing. Juan Ramón Correa Saenz CIP 41496
- Porcentaje Programado	: 21.50%
- Porcentaje Programado Acumulado	: 100.00%
- Porcentaje Ejecutado	: 27.26%
- Porcentaje Ejecutado Acumulado	: 100.00%
- Estado del Mantenimiento	: Terminado
- Monto Valorizado	: S/ 1'118,080.81



INSPECTOR

- Inspector	: Ing. Javier Burgos Vergaray CIP 74638
- Contrato de Inspección de Obra	: N° 019-2020-MPSCH-LOG.
- Fecha de Contrato	: 02/10/2020
- Plazo de Prestación de Servicio	: 91 Días Calendario
- Monto Contratado (inc. IGV)	: S/ 44,080.00

4.- ANTECEDENTES

- Con fecha 24 de Agosto del 2019 se firma el Contrato de Servicios N°006-2020-MPSCH-LOG del Mantenimiento Periódico y Rutinario "MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. LI-122: HUASHGON – HUAMADA – CASAPAMBA – CANCATE – SHIRACBALL – SINCON – HUANDA Long. 58.000 Km., DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD" con la Empresa Contratista CONSORCIO SINCON por un monto de S/ 4'942,000.00 con un plazo de ejecución de 500 días calendario.
- El día 02 de Octubre del 2020 se firma el Contrato de Inspección de Servicio N°019-2020-MPSCH-LOG con el Consultor Ing. Javier Burgos Vergaray CIP 74638 por un monto de S/ 44,080.00, con un plazo de ejecución de 91 días calendario.
- Con fecha 25/08/2020 se firma el Acta de Entrega de Terreno con la participación de representantes de todos los involucrados.
- El 25/08/2020 se firma el Acta de Inicio de Obra con una fecha programada de término de servicio del 31 de Diciembre 2020.
- Con fecha 12 de Setiembre el Inspector (encargado) recepciona la Carta N°006-2020-BYBT-RC-CVS con la cual el Contratista CONSORCIO VIAL SINCON hace entrega del Plan de Trabajo para su revisión y tramite respectivo
- El Ingeniero Inspector Encargado del Servicio mediante Informe N°001-2020-ING° GEBE/INSPECTOR DE OBRA-MPSCH del 15 de Setiembre del 2020 ingresa por mesa de partes de la Entidad con Expediente Administrativo N° 4428 el Plan de Trabajo aprobado para su Conformidad.
- Mediante INFORME N°120-2020-HMMT/DEYP/SGI/MPSCH, de fecha 18 de Setiembre del 2020 la División de Estudios y Proyectos otorga la Conformidad del Plan de Trabajo y sugiere su aprobación mediante la Resolución Respectiva.
- Con Resolución de Gerencia Municipal N°00312-2020-MPSCH/GM de fecha 28 de Setiembre 2020 de Aprueban el Plan de Trabajo del Mantenimiento Rutinario y Periódico.
- Mediante Carta N°001-2020-ING° GEBE/INSPECTOR DE OBRA-MPSCH el Ing. Inspector Encargado hace llegar la Valorización de Servicio N°01 – Setiembre 2020 adjuntando la Carta N°007-2020- BYBT-RC-CVS para su revisión y conformidad de pago.



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco


PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019

E-mail: mpsch@terra.com.pe



- Mediante Informe N°002-2020-ING° JBV/INSPECTOR DE OBRA-MPSCH el Ing. Inspector hace llegar la Valorización de Servicio N°02 – Octubre 2020 adjuntando la Carta N°008-2020- BYBT-RC-CVS para su revisión y conformidad de pago.
- Mediante Informe N°005-2020-ING°FEBC/INSPECTOR DE OBRA-MPSCH el Ing. Inspector hace llegar la Valorización de Servicio N°03 – Noviembre 2020 adjuntando la Carta N°010-2020- BYBT-RC-CVS para su revisión y conformidad de pago.
- Mediante Informe N°009-2020-ING°FEBC/INSPECTOR DE OBRA-MPSCH el Ing. Inspector hace llegar la Valorización de Servicio N°04 – Diciembre 2020 adjuntando la Carta N°011-2020- BYBT-RC-CVS para su revisión y conformidad de pago.



5.- DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

- Movilización de Equipos y Maquinaria desde Trujillo a pie de obra. Se ha trasladado la maquinaria que se describe en el informe del Ing. Inspector.
- Ejecución de partida de Trazo y Replanteo al 100% del tramo con el uso de equipo topográfico completo y dejando monumentados BMs y niveles.
- Implementación de protocolos de seguridad y equipamiento con EPPs para todo el personal.
- Colocación de una Capa Nivelante de e=5 cm en un volumen que representa el 100 % del Metrado total.
- Colocación de Material Granular, Emplantillado, Nivelación y Compactado e=15cm de 11,460 m3 que representa el 100% del metrado.
- Extracción, selección, carguío y acumulación o apilamiento en zonas estratégicas, de material granular de cantera en un aproximado de 32,600 m3 que representa el 100% del metrado total.
- Eliminación de Material Excedente a botaderos autorizados en un volumen de 102,800 m3 que representa el 100% aprox. del total.
- Conformación y Perfilado de Cunetas con maquinaria y mano de obra en tramo de 10,500 ml, acumulando que es el 100% de la longitud total.
- En Señalización con la totalidad de Postes Kilométricos, Señales Preventivas, Señales Reglamentarias y Señales Informativas consideradas.
- Se ha realizado la Recuperación Ambiental del 100% de áreas ocupadas en el Tramo.

6.-DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICION:

RESUMEN VALORIZACIÓN N° 04 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (DICIEMBRE 2020)

VALORIZACIÓN CONTRACTUAL	SIN IGV		S/. 947,526.11
	S/.	0.00	
REINTEGROS (REAJUSTES RECONOCIDOS)	SIN IGV		S/. 0.00
	S/.	0.00	
VALORIZACION BRUTA			S/.947,526.11
AMORTIZACIONES	SIN IGV		S/.0.00 (-)
	S/.	0.00	
	S/.	0.00	
DEDUCCIONES (DQNC)			S/. 0.00
	S/.	0.00	
	S/.	0.00	



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019

E-mail: mpsch@terra.com.pe

MATERIALES	
VALORIZACION NETA	S/. 947,526.11
I. G. V. 18.00%	S/. 170,554.70
NETO VALORIZADO POR EL CONTRATISTA	S/. 1'118,080.81

SON : UN MILLON CIENTO DIECIOCHO MIL OCHENTA CON 81/100 SOLES



6.- ANALISIS

- Se ha revisado el trámite seguido a los documentos de la referencia generados por el Contratista y el Inspector del Servicio.
- El Informe de Aprobación de la Valorización del Servicio emitido por el Inspector indica que la valorización está de acuerdo con lo ejecutado y cumple con el contenido de documentos e información técnica requerida y necesaria para el cumplimiento de las metas y objetivos del servicio contratado.
- El Ing. Inspector del Servicio, en las conclusiones de su informe, debe ser claro y específico respecto a la aprobación de la Valorización de Servicio correspondiente.
- El mantenimiento se encuentra ADELANTADO en su ejecución.

7.- RECOMENDACIONES

- Se recomienda al Ing. Residente e Ing Inspector que deben presentar la documentación con el número de ejemplares originales y copias establecidos, contenido en formato digital y con el uso de separadores y la numeración requerida.
- Se recomienda al Ing. Residente e Ing Inspector que deben firmar todos los folios de la Valorización de todos los documentos que se presenten para su trámite. El Representante Legal también debe firmar todos los folios
- Presentar registro fotográfico de la ejecución de las partidas con su respectiva descripción.
- Verificar el cumplimiento de plan de trabajo, especialmente la Adecuación e Implementación de Protocolos ante la Emergencia Sanitaria por el Covid 19.

8.- CONCLUSIÓN

- El Ing. Inspector del Servicio, en su informe, APRUEBA la Valorización de Servicio N°04 - Diciembre 2020.
- Luego de su revisión, la Jefatura de la División de Supervisión y Liquidación de Obras de la Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, **OTORGA LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN N°04 – DICIEMBRE 2020** del Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario “**MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. LI-122: HUASHGON – HUAMADA – CASAPAMBA – CANCATE – SHIRACBALL – SINCON – HUANDA Long. 58.000 Km., DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD**” y elaborado por el Contratista **CONSORCIO VIAL SINCON** y aprobado por el Inspector de Obra y sugiere su **CANCELACION** en cumplimiento de las cláusulas contractuales.

Es todo cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

Ing. Hermes M. Meléndez Tamayo
CIP. 111401
Jefe División de Supervisión y Liquidaciones



Javier Burgos Vergaray

INGENIERO CIVIL

INSPECTOR DE OBRA

C.I.P. 74638

350

INFORME N° 009 – 2020 – ING° GEB/INSPECTOR DE OBRA-MPSCH

A : SR. JUAN ALBERTO GABRIEL ALIPIO
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO


ATENCIÓN : ING° DAVID IVAN SILVA TORRES.
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA – MPSCH

ATENCIÓN : ING° RAFAEL KEVINALAN VALENCIA REBAZA
GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL - MPSCH

DE : ING° JAVIER BURGOS VERGARAY
INSPECTOR DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

ASUNTO : REMISIÓN DE VALORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE SERVICIO N° 04.

FECHA : 18 DE DICIEMBRE DEL 2,020.




Por intermedio de la presente, reciba Usted mis saludos y a la vez hago de su conocimiento lo siguiente:

Adjunto a la presente, le hago llegar la Valorización de Ejecución del Servicio N° 04 del Mantenimiento Periódico: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES – EMP–LI–122 HUASHGON – HUAMADA – CASAPAMBA – CANCATE – SHIRACBAL – SINCON – HUANDA – LONG. = 58.00 Km, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", correspondiente a los trabajos ejecutados del 01/12/2020 al 15/12/2020 por la EMPRESA CONSORCIO SINCON; En atención al Decreto de Urgencia N° 070-2020. Asimismo se informa a su despacho que en el Servicio de Ejecución del Mantenimiento Periódico de la referencia, se ejecutaron las partidas que se indica en la presente valorización.

Cuyos cálculos elaborados por esta inspección se detallan a continuación:

A.- VALORIZACION MES	S/.	947,526.11
B.- REAJUSTES		0.00
C.- DEDUCCION REAJUSTE	S/.	0.00



Javier Burgos Vergaray
Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. C.I.P. N° 74638



Javier Burgos Vergaray

INGENIERO CIVIL

INSPECTOR DE OBRA

C.I.P. 74638

329

D.- VALORIZACION BRUTA ($VB = A + B - D$) S/. 947,526.11

E.- AMORTIZACION ADELANTOS (-) E

ADELANTO DIRECTO S/. 0.00

ADELANTO EN MATERIALES S/. 0.00

F.- VALORIZACION NETA ($VN = VB - E$) S/. 947,526.11

G.- FONDO DE GARANTIA F.G. S/. 00.00

H.- VALORIZACION LIQUIDA = $VN - F.G.$ S/. 947,526.11

I.- I.G.V. = 18% VN S/. 170,554.70

FACTURA DEL CONTRATISTA = $VN + IGV$ S/. 1,118,080.81

Es todo cuanto debo informar, para los fines correspondientes.

Atentamente:


Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. C.I.P. N° 74638



Javier Burgos Vergaray

INGENIERO CIVIL

INSPECTOR DE OBRA

C.I.P. 74638

378

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO



VALORIZACION DE EJECUCIÓN DE SERVICIO PERIÓDICO N° 04

INFORME DE INSPECCIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO N° 04

DICIEMBRE- 2020

SERVICIO: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES – EMP – LI – 122 HUASHGON – HUAMADA – CASAPAMBA – CANCATE – SHIRACBAL – SINCON – HUANDA – – LONG. = 58.000 Km, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".


Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. CIP. N° 74638



Javier Burgos Vergaray

INGENIERO CIVIL

INSPECTOR DE OBRA

C.I.P. 74638

37

INSPECTOR: ING. JAVIER BURGOS VERGARAY

INFORME MENSUAL DE LA INSPECCION DE LA VALORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO N° 01; DEL 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2,020.

01.00 DATOS GENERALES

01.01 ENTIDAD CONTRATANTE: **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO**

01.02 UNIDAD EJECUTORA: **SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA – MPSCH**

: INSTITUTO VIAL PROVINCIAL – IVP – MPSCH

01.03 NOMBRE DEL MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES – EMP – LI – 122 HUASHGON – HUAMADA – CASAPAMBA – CANCATE – SHIRACBAL – SINCON – HUANDA – – LONG. = 58.000 Km, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".

01.04 UBICACIÓN

DISTRITO : SANTIAGO DE CHUCO

PROVINCIA : SANTIAGO DE CHUCO

REGION : LA LIBERTAD

01.05 PROCESO DE SELECCIÓN: PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 011-2020-MPSCH/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA. CONTRATO DE SERVICIO N° 006-2020-MPSCH-LOG. PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDICO Y RUTINARIO "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES – EMP – LI – 122 HUASHGON – HUAMADA – CASAPAMBA – CANCATE – SHIRACBAL – SINCON – HUANDA – – LONG. = 58.000 Km, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

01.06 ALCALDE: SR. JUAN ALBERTO GABRIEL ALIPIO

01.07 MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATA

01.08 MONTO REFERENCIAL (con IGV) S/. 4'942,000.00


Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. C. I. P. N° 74638



Javier Burgos Vergaray

INGENIERO CIVIL

INSPECTOR DE OBRA

C.I.P. 74638

JB

01.09 MONTO CONTRATADO (con IGV) S/. 4'942,000.00

01.10 FACTOR DE RELACIÓN: 1.00000

01.11 FECHA: PRESUPUESTO REFERENCIAL: SEPTIEMBRE 2020

02.00 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SINCON

03.00 PRESUPUESTO CONTRATADO: S/. 4'942,000.00

04.00 SISTEMA DE CONTRATACIÓN: A SUMA ALZADA

05.00 FIRMA DEL CONTRATO: 24/08/2020

06.00 FECHA DE ENTREGA DEL TERRENO: 25/08/2020

07.00 PAGO ADELANTO DIRECTO: NO SE SOLICITO

08.00 PAGO ADELANTO DE MATERIALES: NO SE SOLICITO

09.00 FECHA CONTRACTUAL DE INICIO DEL SERVICIO: 17/09/2020

10.00 FECHA CONTRACTUAL DE TERMINO DEL SERVICIO: 15/12/2021

11.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS CALENDARIOS

12.00 INSPECTOR DE OBRA: ING° JAVIER BURGOS VERGARAY

13.00 RESIDENTE DE OBRA: ING° JUAN RAMON CORREA SAENZ

14.00 AVANCE EJECUTADO MES DE OCTUBRE-2020: 30.11%

15.00 AVANCE PROGRAMADO MES DE OCTUBRE-2020: 37.89%

16.00 AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO: 40.80%

17.00 AVANCE EJECUTADO ACUMULADO: 51.38%

18.00 INSPECTOR DE OBRA: ING° JAVIER BURGOS VERGARAY

19.00 ALCANCES GENERALES:

La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, en atención al Decreto de Urgencia N° 070-2020; viene inspeccionando los trabajos correspondientes a la ejecución del Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario: **"MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES – EMP – LI – 122 HUASHGON – HUAMADA – CASAPAMBA – CANCATE – SHIRACBAL – SINCON – HUANDA – LONG. = 58.000 Km, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"**, Mantenimiento Periódico y Rutinario que beneficiara a las comunidades de los caseríos de: de la zona urbana


Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. C.I.P. N° 74638

100%



325

de la localidad de Santiago de Chuco - Distrito de Santiago de Chuco
en lo siguiente:

METAS FÍSICAS POR ALCANZAR:

Descripción	UND	METRADO	PRECIO	Parcial (\$)	SEPTIEMBRE-2020		OCTUBRE-2020		NOVIEMBRE-2020		DICIEMBRE-2020	
					del 19 al 30		del 01 al 31		del 01 al 30		del 01 al 31	
					Cantidad	Parcial (\$)	Cantidad	Parcial (\$)	Cantidad	Parcial (\$)	Cantidad	Parcial (\$)
02 FASE II												
02.01 MANTENIMIENTO PERIODICO												
02.01.01 OBRAS PRELIMINARES												
02.01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	gib	1.00	40,220.52	40,220.52	0.50	20,110.26	0.00	0.00	0.00	0.50	20,110.26	0.00
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO	km	58.00	1,048.09	60,789.22	58.00	60,789.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.01.02 PAVIMENTOS												
02.01.02.01 CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	14,500.00	1.92	27,840.00	0.00	0.00	8,700.00	16,704.00	5,800.00	11,136.00	0.00	0.00
02.01.02.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	m3	43,500.00	36.93	1,606,455.00	0.00	0.00	17,400.00	642,582.00	17,400.00	642,582.00	8,700.00	321,291.00
02.01.03 TRANSPORTE												
02.01.03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	43,260.00	7.73	334,399.80	0.00	0.00	17,304.00	133,759.92	17,304.00	133,759.92	8,652.00	66,879.96
02.01.03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	414,532.50	0.67	277,937.78	0.00	0.00	165,933.00	111,175.11	165,933.00	111,175.11	82,966.50	55,597.56
02.01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	28,270.00	7.73	218,527.10	0.00	0.00	11,308.00	87,410.84	11,308.00	87,410.84	5,654.00	43,705.42
02.01.03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	387,980.00	0.67	259,343.60	0.00	0.00	154,832.00	103,737.44	154,832.00	103,737.44	77,416.00	51,868.72
02.01.04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE												
02.01.04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS	m	58,000.00	1.84	106,720.00	0.00	0.00	23,200.00	42,688.00	23,200.00	42,688.00	11,600.00	21,344.00
02.01.05 SEÑALIZACION												
02.01.05.01 INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	59.00	315.96	18,641.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	18,641.64
02.01.05.02 SEÑALES PREVENTIVAS	und	40.00	389.43	15,577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	15,577.20
02.01.05.03 SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	22.00	389.43	8,567.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	8,567.46
02.01.05.04 SEÑALES INFORMATIVAS	und	10.00	468.53	4,685.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4,685.30
02.01.06 IMPACTO AMBIENTAL												
02.01.06.01 RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	7,274.14	14,548.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	14,548.28
02.01.07 EMERGENCIA SANITARIA												
02.01.07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gib	1.00	28,488.44	28,488.44	0.25	7,122.11	0.25	7,122.11	0.25	7,122.11	0.25	7,122.11

Javier Burgos Vergaray
Javier Burgos Vergaray
 ING. CIVIL
 R. C.I.P. N° 74638



2.1 Descripción del Proyecto

2.1.1 Objetivos y Metas

El servicio consiste en el mantenimiento periódico y rutinario en un tramo de 58.00 kms de: **“MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES - EMP - LI - 122 HUASHGON - HUAMADA - CASAPAMBA - CANCATE - SHIRACBAL - SINCON - HUANDA - LONG. = 58.000 Km, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”**, beneficiará a los caseríos de: Huashgon, Huamada, Casapamba, Cancate, Shiracbal, Sincon, Huanda.

El proyecto contempla las siguientes metas.

Metas

Descripción	UNO	METRADO	PRECIO	Parcial (\$)	SEPTIEMBRE-2020		OCTUBRE-2020		NOVIEMBRE-2020		DICIEMBRE-2020	
					Cantidad	Parcial (\$)	Cantidad	Parcial (\$)	Cantidad	Parcial (\$)	Cantidad	Parcial (\$)
02.01.01.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOLIZACION DE EQUIPO	gob	1.00	40,220.52	40,220.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,110.26
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO	km	58.00	1,048.00	60,784.00	58.00	60,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.01.02.01 CAPA INHIBIENTE E=0.05 M	m ³	14,500.00	1.92	27,840.00	0.00	0.00	16,704.00	32,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.01.02.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.16 M	m ³	43,500.00	38.95	1,685,475.00	0.00	0.00	17,400.00	682,382.00	17,400.00	682,382.00	8,700.00	321,291.00
02.01.03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m ³ km	43,200.00	7.73	334,680.00	0.00	0.00	17,394.00	133,789.92	17,394.00	133,789.92	8,682.00	66,870.96
02.01.03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m ³ km	44,832.00	0.67	29,997.76	0.00	0.00	163,630.00	111,175.11	163,630.00	111,175.11	82,986.50	55,357.55
02.01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m ³ km	28,200.00	7.73	218,276.00	0.00	0.00	11,398.00	87,410.84	11,398.00	87,410.84	5,654.00	43,105.42
02.01.03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m ³ km	387,000.00	0.67	259,340.00	0.00	0.00	154,632.00	103,731.44	154,632.00	103,731.44	77,416.00	51,865.72
02.01.04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE												
02.01.04.01 RECONFORMACION DE CANCHALES	m	58,000.00	1.94	112,720.00	0.00	0.00	22,200.00	42,888.00	22,200.00	42,888.00	11,600.00	21,944.00
02.01.05 SEÑALIZACION												
02.01.05.01 INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	58.00	315.96	18,324.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	16,341.64
02.01.05.02 SEÑALES PREVENTIVAS	und	40.00	389.43	15,577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	15,577.20
02.01.05.03 SEÑALES REGULATIVAS	und	22.00	389.43	8,567.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	8,567.46
02.01.05.04 SEÑALES INFORMATIVAS	und	10.00	465.30	4,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4,653.00
02.01.06 IMPACTO AMBIENTAL												
02.01.06.01 RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	7,274.44	14,548.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	14,548.88
02.01.07 EMERGENCIA SANITARIA												
02.01.07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	gob	1.00	26,488.44	26,488.44	0.25	7,121.11	0.25	7,121.11	0.25	7,121.11	0.25	7,121.11

Javier Burgos Vergaray
Javier Burgos Vergaray
 ING. CIVIL
 R. C.I.P. N° 74638



Javier Burgos Vergaray

INGENIERO CIVIL

INSPECTOR DE OBRA

C.I.P. 74638

323

CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA

- PRESUPUESTO CONTRATADO.- El Presupuesto Contratado, para el servicio de ejecución del mantenimiento periódico y rutinario, se compone de una fórmula de la siguiente manera:

FORMULA N° 02 "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES – EMP – LI – 122 HUASHGON – HUAMADA – CASAPAMBA – CANCATE – SHIRACBAL – SINCON – HUANDA – LONG. = 58.000 Km, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".

20.00 CONTROL DE VALORIZACIONES DE OBRA:

El avance acumulado contractual, incluye IGV de la Valorización N° 02 es el siguiente:

Total Valorización N° 04	S/.	1,118,080.81
Total Valorización Acumulada	S/.	4,101,860.00
Monto Total Contractual	S/.	4'942,000.00
Porcentaje de Avance Valorización N° 04		27.26%
Porcentaje de Avance Acumulado		100.00%

COSTO DIRECTO	823,935.75		3,022,741.34
COSTO INDIRECTO	82,393.57		302,274.13
UTILIDAD	41,196.79		151,137.07
SUB TOTAL	947,526.11		3,476,152.54
IGV	170,554.70		625,707.46
TOTAL VALORIZACION	1,118,080.81	100.00%	4,101,860.00


Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. C.I.P. N° 74638




21.00 PLAZO DE LA OBRA:

El plazo contractual para el mantenimiento periódico y rutinario incluye el plan de trabajo; para el mantenimiento periódico es de 90 días calendarios, se inició el 17 de Septiembre del 2020 y termina el 15 de Diciembre del 2020, en el transcurso del presente periodo de ejecución de obra el contratista no ha solicitado ampliación de plazo contractual (Artº 169 y 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.- Reglamento D. S. Nº 350-2015-EF.- Ley Nº 30225 y su modificatoria Decreto Legislativo Nº 1341 y D.S. Nº 056-2017-EF.

22.00 CONTROL DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS AVANCE DE OBRA EJECUTADO (Artº 173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) Reglamento D. S. Nº 350-2015-EF.- Ley Nº 30225 y su modificatoria Decreto Legislativo Nº 1341 y D.S. Nº 056-2017-EF.

VALORIZACIÓN Nº		01	02	03	04
Mes		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
Calendario Avance Obra	Parcial	2.91%	37.89%	37.70%	21.50%
	Acum. (APA)	2.91%	40.80%	78.50%	100.00%
Avance Real Obra	Parcial	21.27%	30.11%	21.36%	27.26%
	Acum. (ARA)	21.27%	51.38%	72.74%	100.00%
% Adelanto		18.36%			5.76%
% Atraso			-7.78%	-16.34%	
Condición de Avance de Obra		Adelantada	Con Atraso	Con Atraso	Regular
Calendario Avance Obra Acelerada	Parcial				
	Acum. (ARA)				


Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. C.I.P. Nº 74638



28.00 ADELANTOS OTORGADOS AL CONTRATISTA

31.0 ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO


En concordancia con el Contrato y Art. 155° y 156° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.S. N° 350-2015-EF.- Ley N° 30225 y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1341 y D.S. N° 056-2017-EF. **No** se ha otorgado al Contratista un adelanto directo equivalente al 10 % del monto del Contrato, con precios al mes de Septiembre del 2020.

Se indica que este adelanto corresponde a la Ejecución de la Obra, según el siguiente detalle:

CONCEPTO	ADELANTO DIRECTO	MONTO INC. IGV	FECHA
Ejecución de la obra			
Total Adelanto Directo			
Monto contrato = S/. 4'942,000.00			

31.00 ADELANTO EN MATERIALES

En concordancia con el Contrato y Art. 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado D. S. N° 350-2015-EF.- Ley N° 30225 y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1341 y D.S. N° 056-2017-EF. y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1341 y D.S. N° 056-2017-EF., la Empresa Contratista CONSORCIO SINCON **No** ha solicitado el adelanto para materiales, equivalente al 00.00 % del monto del Contrato, equivalente a S/. 00,00


Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. CIP. N° 74638



31.01 CONTROL DE CARTAS FIANZAS

CONCEPTO	ENTIDAD FINANCIERA	Nº DE CARTA FIANZA	MONTO (SOLES)	FECHA DE VENC.	SITUACION
FIEL CUMPLIMIENTO					
FIANZA POR ADELANTO DIRECTO					
FIANZA POR ADELANTO DE MATERIALES					

31.00 CONTROL DE RETENCIONES 10% DEL MONTO DEL CONTRATO

(Artº 126º.-Ley Nº 30225 – **D.S. Nº 350 – 2015 – EF** y su modificatoria Decreto Legislativo Nº 1341 y D.S. Nº 056-2017-EF.) En las Valorizaciones se le va ha retener el 10% de monto del Contrato teniendo en cuenta que el contratista no presenta Carta Fianza, al Contratista en atención a la **CLAUSULA SÉPTIMA (garantías) del contrato.**

31.00 ACCIONES EJECUTADAS


Durante el periodo de ejecución de la obra del 01 de Diciembre al 15 de Diciembre del 2020, al cierre de la presente valorización se ejecutaron los siguientes trabajos:

PARTIDAS CONTRACTUALES: FASE II

I.-MANTENIMIENTO PERIÓDICO:

1.- OBRAS PRELIMINARES: Se trabajo según metrados ejecutados.

- ✓ **MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO:** Se valorizo un metrado de 0.50 GLB. **(50.00% - S/. 20,110.26).** Se completó la partida al 100%.


Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. C.I.P. Nº 74638



- ✓ TRAZO Y REPLANTEO: Se valorizó un metrado de 00.00 KM. **(0.00% - S/. 00.00)**. Partida terminada al 100%

2.- PAVIMENTOS: Se trabajo según metrados ejecutados.

- ✓ CAPA NIVELANTE; E= 0.05 Mts: Se valorizó un metrado de 3,000.00 M3. **(20.69% - S/. 5,760.00)**. Se completó la partida al 100%.
- ✓ MATERIAL GRANULAR DE CANTERA; E= 0.15 Mts: Se valorizó un metrado de 12,000.00 M3. **(27.59% - S/. 443,160.00)**. Se completó la partida al 100%.

3.- TRANSPORTE: Se trabajo según metrados ejecutados.

- ✓ TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 Km: Se valorizó un metrado de 12,360.00 M3K. **(28.57% - S/. 95,542.80)**. Se completó la partida al 100%.
- ✓ TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 Km: Se valorizó un metrado de 117,420.00 M3K. **(28.31% - S/. 78,671.40)**. Se completó la partida al 100%.
- ✓ TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 Km: Se valorizó un metrado de 7,770.00 M3K. **(27.48% - S/. 60,062.10)**. Se completó la partida al 100%.
- ✓ TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 Km: Se valorizó un metrado de 56,610.00 M3K. **(14.62% - S/. 37,928.70)**. Se completó la partida al 100%.



4.- OBRAS DE ARTE Y DRENAJE: Se trabajo según metrados ejecutados.

- ✓ RECONFORMACIÓN DE CUNETAS: Se valorizó un metrado de 16,000.00 ML. **(27.59% - S/. 29,440.00)**. Se completó la partida al 100%.

5.- SEÑALIZACIÓN : Se trabajo según metrados ejecutados.

- ✓ INSTALACIÓN DE POSTES KILOMÉTRICOS: Se valorizó un metrado de 59 UND **(100.00% - S/. 18,641.64)**. Partida Completada al 100%.
- ✓ SEÑALES PREVENTIVAS: Se valorizó un metrado de 40 UND **(100.00% - S/. 15,577.20)**. Partida Completada al 100%.
- ✓ SEÑALES REGLAMENTARIAS: Se valorizó un metrado de 22 UND **(100.00% - S/. 8,567.46)**. Partida Completada al 100%.
- ✓ SEÑALES INFORMATIVAS: Se valorizó un metrado de 10 UND **(100.00% - S/. 4,685.30)**. Partida Completada al 100%.

6.- IMPACTO AMBIENTAL: Se trabajo según metrados ejecutados.

- ✓ RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ÁREAS OCUPADAS: Se valorizó un metrado de 0.60 HA **(30.00% - S/. 4,364.48)**. Partida Completada al 100%.

6.- EMERGENCIA SANITARIA: Se trabajo según metrados ejecutados.

- ✓ EMERGENCIA SANITARIA COVID-19: Se valorizó un metrado de 0.05 GLB. **(05.00% - S/. 1,424.42)**. Partida Completada al 100%.

COSTO DIRECTO VALORIZADO=S/ 823,935.77


Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. C.I.P. N° 74638



32.00 COMENTARIOS DE LA INSPECCIÓN

32.10 Los trabajos, se vienen realizando de forma normal de acuerdo a la programación de la obra, a la fecha del informe según Acta de Entrega de Terreno de fecha: 25-Agosto-2020 y Acta de Inicio de Servicio de fecha: 17-Septiembre-2020; se viene realizando los trabajos de: movilización y desmovilización de equipos, trazo y replanteo, capa nivelante $e=0.05$ mts., material granular de cantera $e=0.15$ mts., transporte de material granular hasta 1 km, transporte de material granular mayor a 1 km, transporte de material excedente hasta 1 km, transporte de material excedente mayor a 1 km, reconformación de cunetas, y emergencia sanitaria COVID-19; se viene trabajando de acuerdo al Plan de Trabajo; aprobado por RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 144-2020-MPSCH/GM. De fecha: 16 de Septiembre del 2,020.

32.20 Así mismo la inspección constata y verifica que el material granular de cantera; cumple con los requisitos técnicos para material de base gradación del MTC, es material que cumple con lo requerido para la partida de capa nivelante; $e=0.05$ mts y material granular de cantera; $e=0.15$ mts. y se viene eliminando el material excedente a botaderos autorizados. Se recomendó al Residente realizar el control topográfico de acuerdo al avance de progresivas para el computo de los metrados ejecutados en la valorización.

32.30 Asimismo se le indico al contratista por intermedio de su ingeniero residente que deberá presentar de acuerdo a la cantera que abastecerá sus tramos elegidos en lo referente a la partida de capa nivelante; $e=0.05$ mts y material granular de cantera; $e=0.15$ mts. el análisis granulométrico, ensayos de plasticidad, límite


Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. C.I.P. N° 74638



líquido, índice de plasticidad, ensayos proctor, ensayo CBR, Ensayos realizados en laboratorio certificado.

32.40 Asimismo se verifico que se está utilizando frente de trabajo de 02 maestro de obra + 14 operadores + 08 oficiales + 20 peones, divididos en dos cuadrillas, lo que ha repercutido en el avance actual logrado considerable, además todos ellos cuentan con equipos de protección personal y seguridad.


32.50 Se coordina con la Residencia, en lo referente a los avances acelerados de los trabajos, ya que nos encontramos en épocas de lluvias, propias de esta época del año, que retrasarán los avances programados en el cronograma de obra.

32.60 Durante los trabajos se pudo apreciar, que los trabajadores cuentan con implementos de seguridad (Cascos, Botas, Chalecos, etc.)

32.70 Se verifico las charlas diarias impartidas de inducción en la seguridad y salud en el trabajo, asimismo medidas de mitigación del plan COVID-19.

33.00 CONTROL DE CAMPO:

La inspección ha realizado continuamente y permanentemente el control de campo en forma minuciosa verificando el cumplimiento de los documentos técnicos del **Plan de Trabajo**; aprobado por **RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 144-2020-MPSCH/GM.** De fecha: 16 de Septiembre del 2,020. los cuales son: Planos, Especificaciones Técnicas y Metrados del Expediente Técnico (Plan de Trabajo); así como también ordenes emitidas por el suscrito y correcciones cuando la situación ameritaba, tal como puede verse en el cuaderno de ocurrencias.


Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. C.I.P. N° 74638



Javier Burgos Vergaray

INGENIERO CIVIL

INSPECTOR DE OBRA

C.I.P. 74638

315

La inspección ha exigido al contratista la realización de los siguientes trabajos:

- ✓ Control topográfico en lo referente al avance progresivo de las partidas detalladas en una planilla de metrados.
- ✓ Control de los materiales a utilizar: capa nivelante; $e=0.05$ mts y material granular de cantera; $e=0.15$ mts.

34.00 CONTROL DE MATERIALES:

- Se ha verificado permanentemente la calidad de los siguientes materiales: Material granular de cantera; que cumpla con los requisitos técnicos para material de base gradación del MTC y ensayos de plasticidad, límite líquido, índice de plasticidad, ensayos proctor, ensayo CBR, Ensayos realizados en laboratorio certificado.

35.00 CONTROL DE EQUIPO Y MAQUINARIA:

El contratista ha contado en obra con el siguiente equipo y maquinaria:

- ✓ 06 camión volquetes
- ✓ 01 excavadora
- ✓ 01 retroexcavadora
- ✓ 02 motoniveladoras
- ✓ 02 camión cisterna
- ✓ 02 rodillos neumáticos
- ✓ Herramientas Manuales
- ✓ Motor a gasolina

36.00 CONTROL DE PERSONAL DE OBRA:

La obra ha contado con el siguiente personal permanente:

- ✓ 01 maestro general de obra


Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. C.I.P. Nº 74638



Javier Burgos Vergaray

INGENIERO CIVIL

INSPECTOR DE OBRA

C.I.P. 74638

314

- ✓ 14 operadores
- ✓ 04 oficiales
- ✓ 10 peones


En lo referente a la dirección técnica: la obra ha contado permanentemente con el siguiente personal técnico – administrativo:

- ✓ 01 Ingeniero Residente
- ✓ 01 asistente del Ingeniero Residente
- ✓ 01 Administrativo
- ✓ 01 Almacenero

37.00 VALORIZACION N° 04

La **Valorización N° 04 por el servicio de ejecución de mantenimiento periódico** en el periodo de ejecución del 01 de diciembre del 2,020 al 15 de diciembre del 2,020, alcanza a un monto de **S/. 1,118,080.81 (Un Millón Ciento Dieciocho Mil Ochenta con 81/100 Soles)**, que corresponde al **27.26% de avance físico de servicio de mantenimiento periódico correspondiente al mes de diciembre - 2020** y con un **avance acumulado del 100.00%**.

Se presenta el informe que contiene la valorización para los trámites que correspondan.


Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. C.I.P. N° 74638



Javier Burgos Vergaray

INGENIERO CIVIL

INSPECTOR DE OBRA

C.I.P. 74638

313




Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. C.I.P. N° 74638



Javier Burgos Vergaray

INGENIERO CIVIL

INSPECTOR DE OBRA

C.I.P. 74638

312




Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. C.I.P. N° 74638



Javier Burgos Vergaray

INGENIERO CIVIL

INSPECTOR DE OBRA

C.I.P. 74638

311




Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. C.I.P. N° 74638

VALORIZACION N° 04

DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES - EMP. LI-122 HUASHGON HUAMADA CASAPAMBA CANCATE SHIRACBAL SINCON - HUANDA - LONG. = 58.000 km

INSPECTOR: ING. BURGOS VERGARAY JAVIER
 RESIDENTE: ING. JUAN RAMON CORREA SAENZ
 PLAZO DE EJECUCION: 106 DIAS CALENDARIO
 FECHA DE INICIO: 17 DE SETIEMBRE DEL 2020
 PERIODO : DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020
 FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES - EMP. LI-122 HUASHGON HUAMADA CASAPAMBA

CANCATE SHIRACBAL SINCON - HUANDA - LONG. = 58.000 km

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD

MONTO CONTRATADO: S/ 4942000

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SINCON

DESCRIPCIONES	PRESUPUESTADO				ACUMULADO ANTERIOR				AVANCE ACTUAL				ACUMULADO		SALDO		
	Und	Metrado	P.U	Parcial	Metrado	Valoriz. S/	Metrado	Valoriz. S/	Metrado	Valoriz. S/	Metrado	Valoriz. S/	%	Metrado	Valoriz. S/	Metrado	Valoriz. S/
MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES - EMP. LI-122 HUASHGON HUAMADA CASAPAMBA CANCATE SHIRACBAL SINCON - HUANDA - LONG. = 58.000 km																	
02.01 MANTENIMIENTO PERIÓDICO																	
02.01.01 OBRAS PRELIMINARES																	
02.01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	gib	1.00	40,220.52	40,220.52	0.50	20,110.26	0.50	20,110.26	1.00	40,220.52	100.00%						
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO	km	58.00	1,048.09	60,789.22	58.00	60,789.22			58.00	60,789.22	100.00%						
02.01.02 PAVIMENTOS																	
02.01.02.01 CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	14,500.00	1.92	27,840.00	11,500.00	22,080.00	3,000.00	5,760.00	14,500.00	27,840.00	100.00%						
02.01.02.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	m3	43,500.00	36.93	1,606,455.00	31,500.00	1,163,285.00	12,000.00	443,160.00	43,500.00	1,606,455.00	100.00%						
02.01.03 TRANSPORTE																	
02.01.03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	43260.00	7.73	334,399.80	30,900.00	238,857.01	12,360.00	95,542.79	43,260.00	334,399.80	100.00%						
02.01.03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	414832.50	0.67	277,937.78	297,412.50	199,266.38	117,420.00	78,671.40	414,832.50	277,937.78	100.00%						
02.01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	28,270.00	7.73	218,527.10	20,500.00	158,465.00	7,770.00	60,062.10	28,270.00	218,527.10	100.00%						
02.01.03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	387,080.00	0.67	259,343.60	330,470.00	221,414.90	56,610.00	37,928.70	387,080.00	259,343.60	100.00%						
02.01.04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE																	
02.01.04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS	m	58,000.00	1.84	106,720.00	42,000.00	77,280.00	16,000.00	29,440.00	58,000.00	106,720.00	100.00%						
02.01.05 SENALIZACION																	
02.01.05.01 INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	59.00	315.96	18,641.64					59.00	18,641.64	100.00%						
02.01.05.02 SEÑALES PREVENTIVAS	und	40.00	389.43	15,577.20					40.00	15,577.20	100.00%						
02.01.05.03 SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	22.00	389.43	8,567.46					22.00	8,567.46	100.00%						
02.01.05.04 SEÑALES INFORMATIVAS	und	10.00	468.53	4,685.30					10.00	4,685.30	100.00%						
02.01.06 IMPACTO AMBIENTAL																	
02.01.06.01 RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	7,274.14	14,548.28	1.40	10,183.80	0.60	4,364.48	2.00	14,548.28	100.00%						
02.01.07 EMERGENCIA SANITARIA																	
02.01.07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gib	1.00	28,488.44	28,488.44	0.95	27,064.02	0.05	1,424.42	1.00	28,488.44	100.00%						
TOTAL COSTO DIRECTO				3,022,741.34		2,198,805.59		823,935.75		3,022,741.34							
COSTO DIRECTO				3,022,741.34		2,198,805.59		823,935.75		3,022,741.34							
COSTO INDIRECTO				302,274.13		219,880.56		82,393.57		302,274.13							
UTILIDAD		10.00%		151,137.07		109,940.28		41,198.79		151,137.07							
SUB TOTAL		5.00%		3,476,152.64		2,528,626.43		947,526.11		3,476,152.64							
IGV		18.000000%		625,707.46		455,152.76		170,554.70		625,707.46							
TOTAL VALORIZACION				4,101,860.00	72.74%	2,993,779.19	27.26%	1,118,080.81	100.00%	4,101,860.00							

Javier Burgos Vergaray
 INGENIERO CIVIL
 R.C. 107.7533

OK

CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS


DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

**SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES - EMP. LI-122 HUASHGON HUAMADA CASAPAMBA CANCATE SHIRACBAL
SINCON - HUANDA - LONG. = 58.000 km**

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES - EMP. LI-122 HUASHGON HUAMADA
CASAPAMBA CANCATE SHIRACBAL SINCON - HUANDA - LONG. = 58.000 km
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD
MONTO CONTRATADO: S/ 4942000
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SINCON

INSPECTOR: ING. BURGOS VERGARAY JAVIER
RESIDENTE: ING. JUAN RAMON CORREA SAENZ
PLAZO DE EJECUCION: 106 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO: 17 DE SETIEMBRE DEL 2020
PERIODO : DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020


DESCRIPCIONES	PRESUPUESTADO						PROGRAMADO			EJECUTADO			AVANCE	
	Und	Metrado	P.U	Parcial	Metrado	Parcial. S/	Metrado	Parcial. S/	Metrado	Parcial. S/	Metrado	Estado	Metrado	Estado
MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES - EMP. LI-122 HUASHGON HUAMADA CASAPAMBA CANCATE SHIRACBAL SINCON - HUANDA - LONG. = 58.000 km														
02 FASE II														
02.01 MANTENIMIENTO PERIODICO														
02.01.01 OBRAS PRELIMINARES														
02.01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	gib	1.00	40,220.52	40,220.52	40,220.52	40,220.52	0.50	20,110.26	0.50	20,110.26	0.00	REGULAR	0.00	REGULAR
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO	km	58.00	1,048.09	60,789.22	60,789.22	60,789.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REGULAR	0.00	REGULAR
02.01.02 PAVIMENTOS														
02.01.02.01 CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	14500.00	1.92	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	ADELANTADA	3,000.00	ADELANTADA
02.01.02.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	m3	43500.00	36.93	1,606,455.00	1,606,455.00	1,606,455.00	8,700.00	321,291.00	8,700.00	321,291.00	12,000.00	ADELANTADA	3,300.00	ADELANTADA
02.01.03 TRANSPORTE														
02.01.03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	49260.00	7.73	334,399.80	334,399.80	334,399.80	8,652.00	66,879.96	8,652.00	66,879.96	12,380.00	ADELANTADA	3,708.00	ADELANTADA
02.01.03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	414832.50	0.67	277,937.78	277,937.78	277,937.78	82,966.50	55,587.56	82,966.50	55,587.56	117,420.00	ADELANTADA	34,453.50	ADELANTADA
02.01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	28270.00	7.73	218,527.10	218,527.10	218,527.10	5,654.00	43,705.42	5,654.00	43,705.42	7,770.00	ADELANTADA	2,116.00	ADELANTADA
02.01.03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	387080.00	0.67	259,343.60	259,343.60	259,343.60	77,416.00	51,868.72	77,416.00	51,868.72	56,610.00	ATRASADA	-20,806.00	ATRASADA
02.01.04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE														
02.01.04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS	m	58000.00	1.84	106,720.00	106,720.00	106,720.00	11,600.00	21,344.00	11,600.00	21,344.00	16,000.00	ADELANTADA	4,400.00	ADELANTADA
02.01.05 SEÑALIZACION														
02.01.05.01 INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	59.00	315.96	18,641.64	18,641.64	18,641.64	59.00	18,641.64	59.00	18,641.64	0.00	REGULAR	0.00	REGULAR
02.01.05.02 SEÑALES PREVENTIVAS	und	40.00	389.43	15,577.20	15,577.20	15,577.20	40.00	15,577.20	40.00	15,577.20	0.00	REGULAR	0.00	REGULAR
02.01.05.03 SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	22.00	389.43	8,567.46	8,567.46	8,567.46	22.00	8,567.46	22.00	8,567.46	0.00	REGULAR	0.00	REGULAR
02.01.05.04 SEÑALES INFORMATIVAS	und	10.00	468.53	4,685.30	4,685.30	4,685.30	10.00	4,685.30	10.00	4,685.30	0.00	REGULAR	0.00	REGULAR
02.01.06 IMPACTO AMBIENTAL														
02.01.06.01 RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	7,274.14	14,548.28	14,548.28	14,548.28	2.00	14,548.28	2.00	14,548.28	0.60	ATRASADA	-1.40	ATRASADA
02.01.07 EMERGENCIA SANITARIA														
02.01.07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	gib	1.00	28,488.44	28,488.44	28,488.44	28,488.44	0.25	7,122.11	0.25	7,122.11	0.05	ADELANTADA	0.20	ADELANTADA
TOTAL COSTO DIRECTO				3,022,741.34	3,022,741.34	3,022,741.34	587,909.03	587,909.03	587,909.03	587,909.03	823,935.75	823,935.75	823,935.75	823,935.75
COSTO INDIRECTO														
COSTO INDIRECTO		10.00%		302,274.13	302,274.13	302,274.13		58,790.90		58,790.90			82,393.57	
UTILIDAD		5.00%		151,137.07	151,137.07	151,137.07		29,395.45		29,395.45			41,196.79	
SUB TOTAL				3,476,152.54	3,476,152.54	3,476,152.54		676,095.38		676,095.38			947,526.11	
IGV		18.000000%		625,707.46	625,707.46	625,707.46		121,697.17		121,697.17			170,554.70	
TOTAL VALORIZACION				4,101,860.00	4,101,860.00	4,101,860.00	19.45%	797,792.55	19.45%	797,792.55	27.26%	27.26%	1,118,080.81	27.26%


Javier Burgos Vergaray
 ING. CIVIL
 C.O.P. N° 74530

CUADRO DE BARRAS
VALORIZACION N° 04
DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES - EMP. LI-122 HUASHGON HUAMADA CASAPAMBA CANGATE SHIRACBAL SINCON - HUANDA - LONG. = 58.000 km
 INSPECTOR: ING. BURGOS VERGARAY JAVIER
 RESIDENTE: ING. JUAN RAMON CORREA SAENZ
 PLAZO DE EJECUCION: 108 DIAS CALENDARIO
 FECHA DE INICIO: 17 DE SETIEMBRE DEL 2020
 PERIODO : DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020
 FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES - EMP. LI-122 HUASHGON
 HUAMADA CASAPAMBA CANGATE SHIRACBAL SINCON - HUANDA - LONG. = 58.000 km
 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD
 MONTO CONTRATADO: S/ 4942000
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SINCON

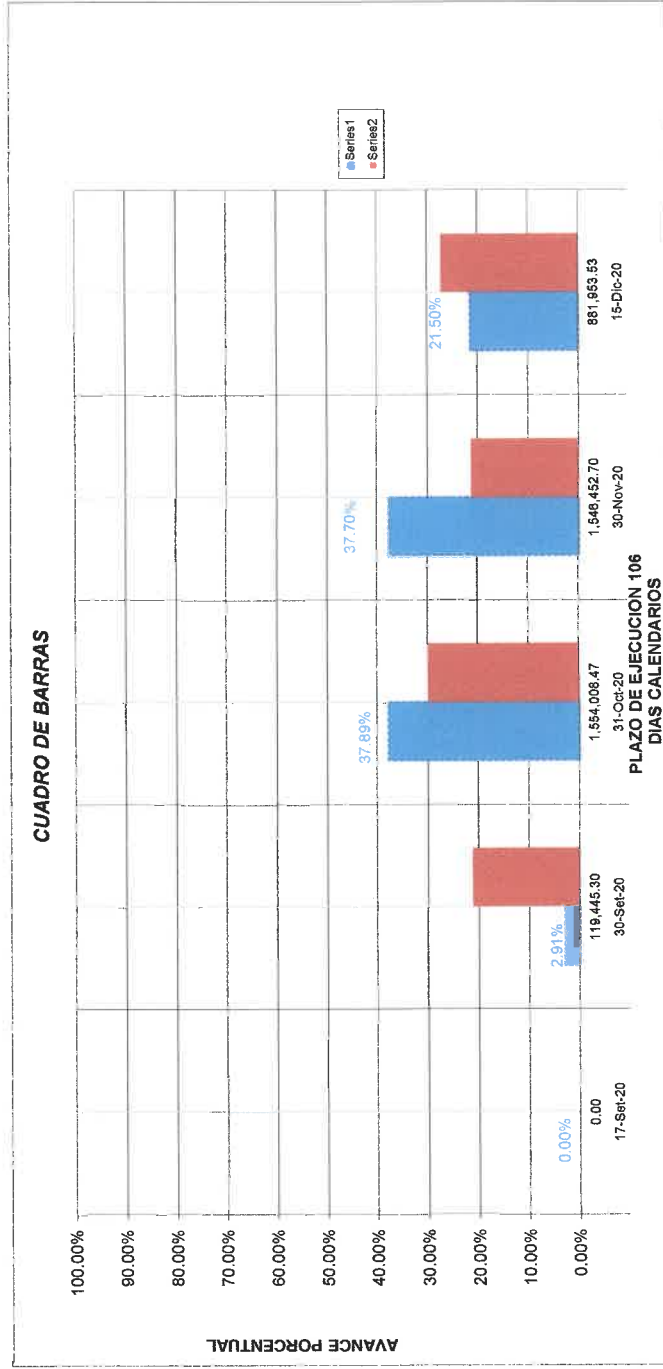

VALORIZACION PROGRAMADO

VALORIZACION	MONTOS (Inc IGV) ACUMUL.		PORCENTAJES ACUMUL.	
	S/	%	S/	%
17-Sep-20	0.00	0.00	0.00	0.00%
30-Sep-20	119,445.30	2.91	2.91	0.00%
31-Oct-20	1,554,008.47	37.89	1,673,453.77	40.80
30-Nov-20	1,546,452.70	37.70	3,219,906.47	78.50
15-Dic-20	881,953.63	21.50	4,101,860.00	100.00%
TOTAL	4,101,860.00			100.00%

VALORIZACION EJECUTADO

VALORIZACION	MONTOS (Inc IGV) ACUMUL.		PORCENTAJES ACUMUL.	
	S/	%	S/	%
17-Sep-20	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Sep-20	872,596.52	21.27	872,596.52	21.27
31-Oct-20	2,107,635.86	51.38	2,107,635.86	51.38
30-Nov-20	2,983,779.19	72.74	2,983,779.19	72.74
15-Dic-20	4,101,860.00	100.00%	4,101,860.00	100.00%
TOTAL	4,101,860.00			100.00%

Situación de la Obra con Respecto al Avance Acumulado Ejecutado VS Acumulado Programado
 Concluido al 100.00%



Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
 F. C.I.P. N° 74638

CURVA S (Porcentual)
VALORIZACION N° 04
DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES - EMP. LI-122 HUASHGON HUAMADA CASAPAMBA CANCATE SHIRACBAL SINCON - HUANDA - LONG. = 68.000 km
 INSPECTOR: ING. BURGOS VERGARAY JAVIER
 RESIDENTE: ING. JUAN RAMON CORREA SAENZ
 PLAZO DE EJECUCION: 106 DIAS CALENDARIO
 FECHA DE INICIO: 17 DE SETIEMBRE DEL 2020
 PERIODO : DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020
 FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES - EMP. LI-122 HUASHGON HUAMADA CASAPAMBA CANCATE SHIRACBAL SINCON - HUANDA - LONG. = 68.000 km
 INSPECTOR: ING. BURGOS VERGARAY JAVIER
 RESIDENTE: ING. JUAN RAMON CORREA SAENZ
 PLAZO DE EJECUCION: 106 DIAS CALENDARIO
 FECHA DE INICIO: 17 DE SETIEMBRE DEL 2020
 PERIODO : DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020
 FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD
 MONTO CONTRATADO: S/ 4942000
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SINCON

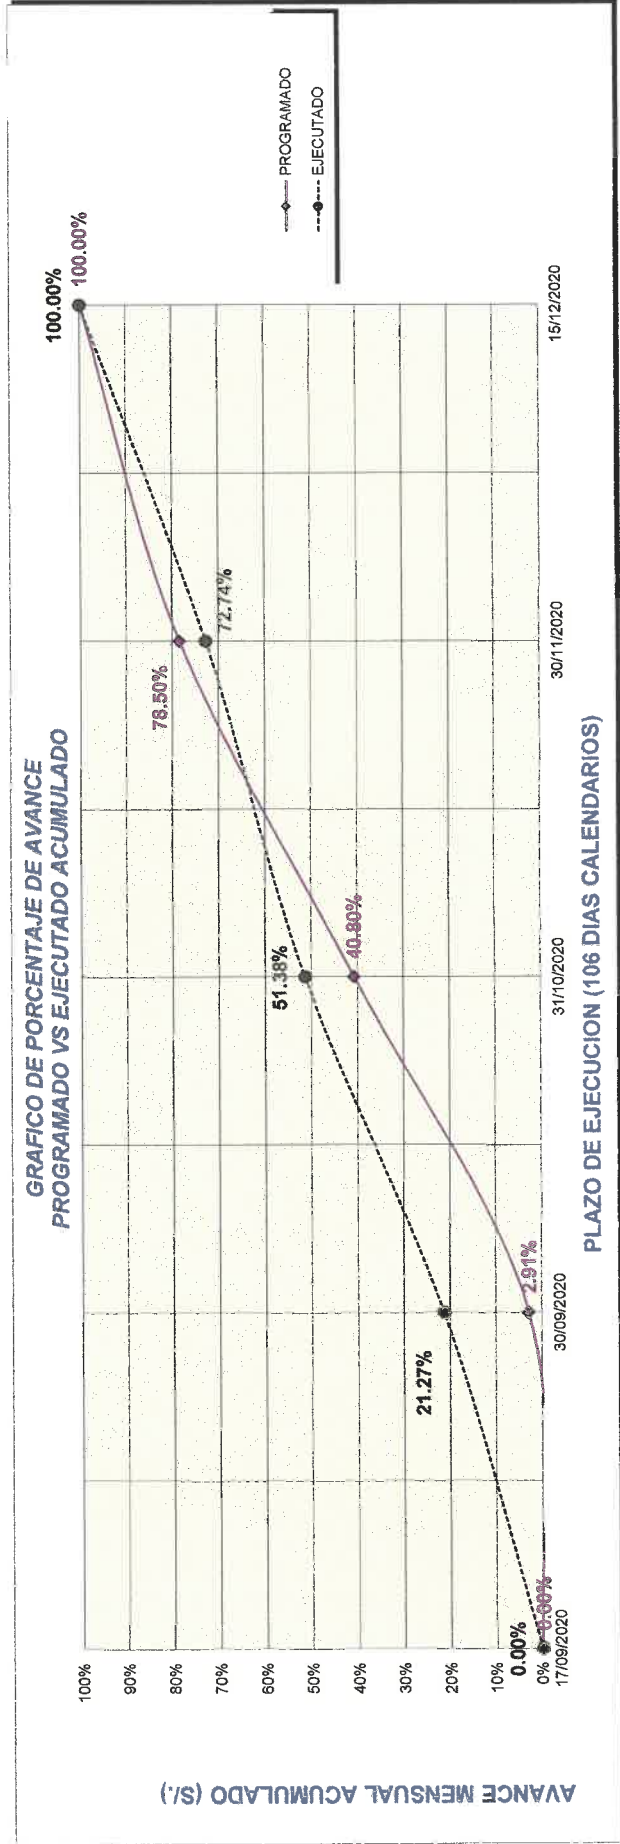

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
17-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	119,445.30	119,445.30	2.91%	2.91%
31-Oct-20	1,554,008.47	1,673,453.77	37.89%	40.80%
30-Nov-20	1,546,452.70	3,219,906.47	37.70%	78.50%
15-Dic-20	881,953.53	4,101,860.00	21.50%	100.00%
TOTAL	4,101,860.00	4,101,860.00	100.00%	100.00%

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS


MES	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
17-Sep-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-20	872,598.52	872,598.52	21.27%	21.27%
31-Oct-20	1,235,037.34	2,107,635.86	30.11%	51.38%
30-Nov-20	876,143.33	2,983,779.19	21.36%	72.74%
15-Dic-20	1,118,080.81	4,101,860.00	27.26%	100.00%
TOTAL	4,101,860.00	4,101,860.00	100.00%	100.00%

Javier Burgos Vergaray
 ING. CIVIL
 R. C.I.P. N° 4838

CURVA S (Financiero)
VALORIZACION N° 04
DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES - EMP. LI-122 HUASHGON HUAMADA CASAPAMBA CANCATE SHIRACBAL SINCON - HUANDA - LONG. = 58.000 km
 INSPECTOR: ING. BURGOS VERGARAY JAVIER
 RESIDENTE: ING. JUAN RAMON CORREA SAENZ
 PLAZO DE EJECUCION: 106 DIAS CALENDARIO
 FECHA DE INICIO: 17 DE SETIEMBRE DEL 2020
 PERIODO : DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020
 FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES - EMP. LI-122 HUASHGON HUAMADA CASAPAMBA CANCATE SHIRACBAL SINCON - HUANDA - LONG. = 58.000 km
 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD
 MONTO CONTRATADO: S/ 4942000
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SINCON

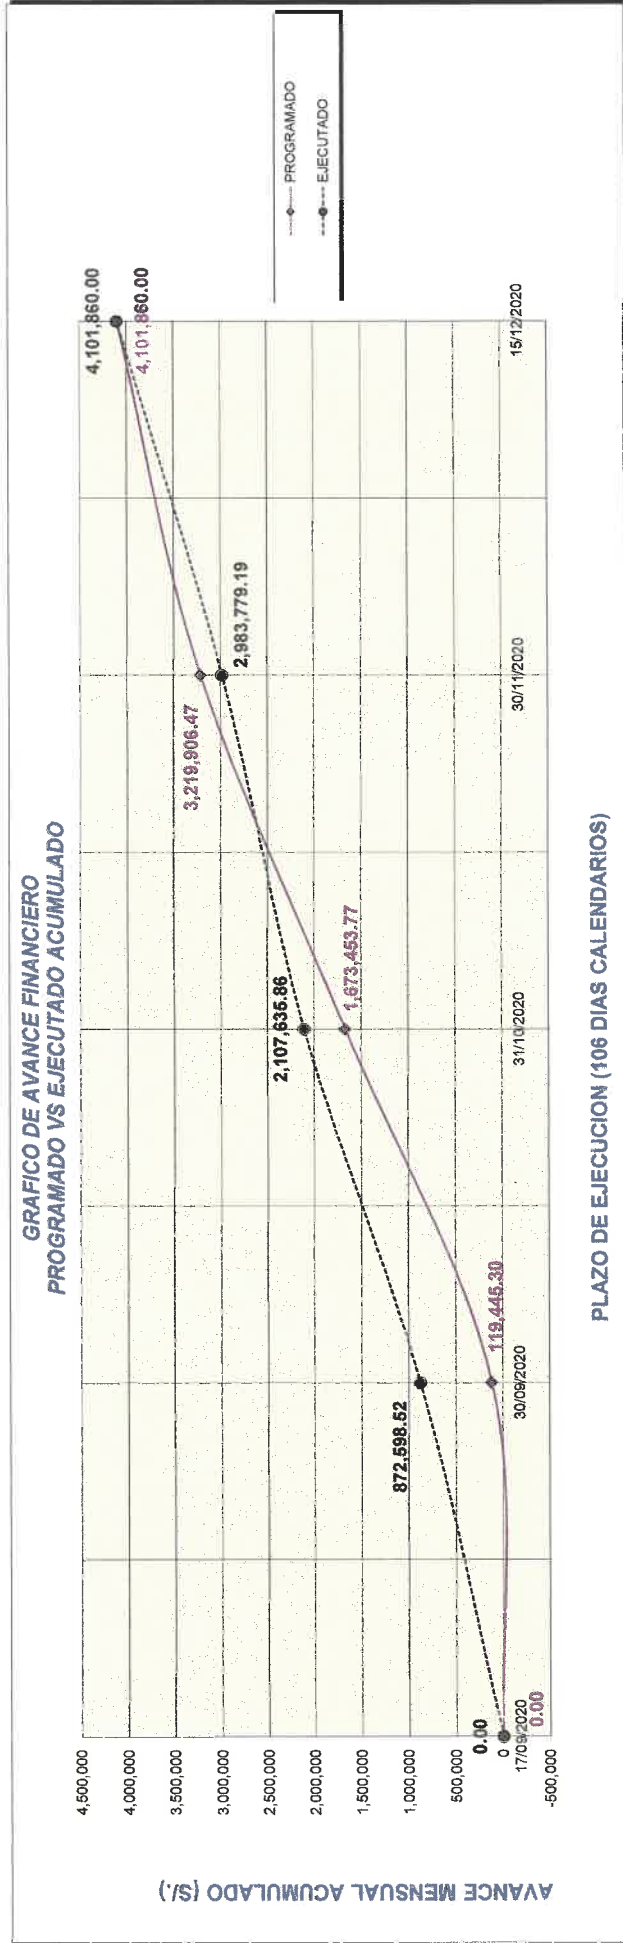

PLAZO DE EJECUCION (106 DIAS CALENDARIOS)

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Incl. IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
	S/.	S/.	%	%
17/09/2020	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30/09/2020	119,445.30	119,445.30	2.91%	2.91%
31/10/2020	1,554,008.47	1,673,453.77	37.89%	40.80%
30/11/2020	1,546,452.70	3,219,906.47	37.70%	78.50%
15/12/2020	881,953.53	4,101,860.00	21.50%	100.00%
TOTAL	4,101,860.00	4,101,860.00	100.00%	100.00%

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (Incl. IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
	S/.	S/.	%	%
17/09/2020	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30/09/2020	872,598.52	872,598.52	21.27%	21.27%
31/10/2020	1,235,037.34	2,107,635.86	50.11%	51.38%
30/11/2020	876,143.33	2,983,779.19	21.36%	72.74%
15/12/2020	1,118,080.81	4,101,860.00	27.26%	100.00%
TOTAL	4,101,860.00	4,101,860.00	100.00%	100.00%


Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. CIP. N° 74638

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE PROGRAMADO

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES - EMP. L-122 HUASHGON HUAMADA CASAPAMBA CANCATE SHIRACBAL SINCON - HUANDA - LONG. = 58.000 km

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

DURACION:

106 DIAS CALENDARIOS

Descripción	UND	METRADO	PRECIO	Parcial (S/)	SEPTIEMBRE-2020		OCTUBRE-2020		NOVIEMBRE-2020		DICIEMBRE-2020	
					Cantidad	Parcial (S/)	Cantidad	Parcial (S/)	Cantidad	Parcial (S/)	Cantidad	Parcial (S/)
02 FASE II												
02.01 MANTENIMIENTO PERIÓDICO												
02.01.01 OBRAS PRELIMINARES												
02.01.01.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO	glb	1.00	40,220.52	40,220.52	0.50	20,110.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	20,110.26
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO	km	58.00	1,048.09	60,789.22	58.00	60,789.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.01.02 PAVIMENTOS												
02.01.02.01 CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	14,500.00	1.92	27,840.00	0.00	0.00	8,700.00	16,704.00	5,800.00	11,136.00	0.00	0.00
02.01.02.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	m3	43,500.00	36.93	1,606,455.00	0.00	0.00	17,400.00	642,582.00	17,400.00	642,582.00	8,700.00	321,291.00
02.01.03 TRANSPORTE												
02.01.03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	43,260.00	7.73	334,399.80	0.00	0.00	17,304.00	133,759.92	17,304.00	133,759.92	8,652.00	66,879.96
02.01.03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	414,832.50	0.67	277,937.78	0.00	0.00	165,933.00	111,175.11	165,933.00	111,175.11	82,966.50	55,587.56
02.01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	28,270.00	7.73	218,927.10	0.00	0.00	11,308.00	87,410.84	11,308.00	87,410.84	5,654.00	43,705.42
02.01.03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	387,080.00	0.67	259,343.60	0.00	0.00	154,832.00	103,737.44	154,832.00	103,737.44	77,416.00	51,868.72
02.01.04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE												
02.01.04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS	m	58,000.00	1.84	106,720.00	0.00	0.00	23,200.00	42,688.00	23,200.00	42,688.00	11,600.00	21,344.00
02.01.05 SEÑALIZACIÓN												
02.01.05.01 INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	59.00	315.96	18,641.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	18,641.64
02.01.05.02 SEÑALES PREVENTIVAS	und	40.00	389.43	15,577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	15,577.20
02.01.05.03 SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	22.00	389.43	8,567.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	8,567.46
02.01.05.04 SEÑALES INFORMATIVAS	und	10.00	468.53	4,685.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4,685.30
02.01.06 IMPACTO AMBIENTAL												
02.01.06.01 RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	7,274.14	14,548.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	14,548.28
02.01.07 EMERGENCIA SANITARIA												
02.01.07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	28,488.44	28,488.44	0.25	7,122.11	0.25	7,122.11	0.25	7,122.11	0.25	7,122.11
COSTO DIRECTO												
costo indirecto				3,022,741.34		88,021.59		1,145,179.42		1,139,811.42		649,928.91
Utilidades				302,274.13		8,802.16		114,517.94		113,961.14		64,992.89
SUB TOTAL				151,137.07		4,401.08		57,258.97		56,980.57		32,495.45
I G V				3,476,152.54		101,224.83		1,316,956.33		1,310,553.13		747,416.24
VALOR REFERENCIAL				625,707.46		18,220.47		237,052.14		235,899.56		134,535.28
% DE AVANCE MENSUAL				4,101,860.00		119,445.30		1,584,008.47		1,546,452.70		891,953.53
% DE AVANCE MENSUAL ACUMULADO						2.91%		37.89%		37.70%		21.50%
						2.91%		40.80%		78.50%		100.00%


Jover Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. CIP. N° 74539

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE EJECUTADO

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES - EMP. LL-122 HUASHGON HUAMADA CASAPAMBA CANCATE SHIRACBAL SINCON - HUANDA - LONG. = 58.000 km

Servicio:

Propietario: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUICO

DURACION: 106 DIAS CALENDARIOS

Item	Descripción	Parcial (S/)	SETIEMBRE 2020 del 17 al 30	OCTUBRE 2020 del 01 al 31	NOVIEMBRE 2020 del 01 al 30	DICIEMBRE 2020 del 01 al 15
02 FASE II						
02.01 MANTENIMIENTO PERIODICO						
02.01.01 OBRAS PRELIMINARES						
02.01.01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	40,220.52	20,110.26	0.00	0.00	20,110.26
02.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	60,789.22	60,789.22	0.00	0.00	0.00
02.01.02 PAVIMENTOS						
02.01.02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	27,840.00	7,660.00	10,560.00	3,840.00	5,760.00
02.01.02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	1,806,465.00	332,370.00	498,555.00	332,370.00	443,160.00
02.01.03 TRANSPORTE						
02.01.03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	334,399.80	65,685.68	107,485.65	65,685.68	95,542.79
02.01.03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	277,937.78	35,505.65	91,403.75	72,356.99	78,671.40
02.01.03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	216,527.10	46,380.00	65,705.00	46,380.00	60,062.10
02.01.03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	259,343.60	38,190.00	96,171.80	87,053.10	37,928.70
02.01.04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE						
02.01.04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	106,720.00	22,080.00	33,120.00	22,080.00	29,440.00
02.01.05 SEÑALIZACION						
02.01.05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	18,641.64				18,641.64
02.01.05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	15,577.20				15,577.20
02.01.05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	8,567.46				8,567.46
02.01.05.04	SEÑALES INFORMATIVAS	4,685.30				4,685.30
02.01.06 IMPACTO AMBIENTAL						
02.01.06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	14,548.28			10,163.80	4,364.48
02.01.07 EMERGENCIA SANITARIA						
02.01.07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	28,468.44	14,244.22	7,122.11	5,697.69	1,424.42
COSTO DIRECTO		3,022,741.34	643,035.02	910,123.31	645,647.26	823,935.75
costo indirecto	10.00%	302,274.13	64,303.50	91,012.33	64,564.73	82,393.57
Utilidades	5.00%	151,137.07	32,151.75	45,506.17	32,282.36	41,196.79
SUB TOTAL		3,476,152.54	739,490.27	1,046,641.81	742,494.35	947,526.11
I G V	18.00%	625,707.46	133,108.25	188,395.53	133,648.98	170,564.70
VALOR REFERENCIAL		4,101,860.00	872,598.52	1,235,037.34	876,143.33	1,118,080.81
% DE AVANCE MENSUAL			21.27%	30.11%	21.36%	27.26%
% DE AVANCE MENSUAL ACUMULADO			21.27%	51.38%	72.74%	100.00%

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO




VALORIZACION DE SERVICIO N°04

SERVICIO : MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES -
EMP. LI-122 HUASHGON HUAMADA CASAPAMBA CANCATE SHIRACBAL
SINCON - HUANDA - LONG. = 58.000 km

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL SINCON

RESIDENTE : ING. JUAN RAMON CORREA SAENZ

INSPECTOR : ING. BURGOS VERGARAY JAVIER


Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. CIP. N° 74633

SANTIAGO DE CHUCO, 30 DE DICIEMBRE DEL 2020

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO
MESA DE PARTES
N° Exp: 7658
18 DIC. 2020 1:00
N° Folios: 333 + 2108
Hora: 9:48 Firma: 


CONSORCIO VIAL SINCON
Banda Yojansoy Haca Torres
REPRESENTANTE COMÚN


Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. CIP. N° 41496

CONTENIDO

302

- ❖ CARTA DE LA EMPRESA DIRIGIDA AL INSPECTOR.
- ❖ FICHA TÉCNICA.
- ❖ FACTURA DEL CONTRATISTA.
- ❖ INFORME N° 04 DEL RESIDENTE.
- ❖ RESUMEN DE VALORIZACIÓN MENSUAL.
- ❖ CONTROL DE METRADOS Y ACTIVIDADES EJECUTADOS.
- ❖ SUSTENTO DE METRADOS.
- ❖ ANÁLISIS DE VALORIZACIÓN MENSUAL.
- ❖ AMORTIZACIÓN (DE SER EL CASO).
- ❖ HOJA DE CANCELACIÓN.
- ❖ CUADRO COMPARATIVO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO-EJECUTADO-PAGADO.
- ❖ CUADRO DE BARRAS Y CURVA S.
- ❖ CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO.
- ❖ PROGRAMACION DE OBRA PERT-CPM Y GANTT
- ❖ PANEL FOTOGRÁFICO.
- ❖ ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
- ❖ ACTA DE INICIO DE SERVICIO.
- ❖ COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO Y/O EMPRESA.
- ❖ COPIA DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE SERVICIO.
- ❖ CUADERNO DE OCURRENCIAS.
- ❖ COPIAS DE CERTIFICADO DE HABILIDAD DE EQUIPO TÉCNICO.
- ❖ ANEXOS
 - COPIA DE CARTA DE RETENCION DEL 10%.
 - COPIA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
 - INFORME MENSUAL DE ING. DE SEGURIDAD.
 - REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES.
 - PLANTILLA ELECTRÓNICA.
 - SEGUROS SCTR.
 - INFORME DE TOPOGRAFIA
 - INFORME DE SUELOS
 - INFORME DE MECANICA DE SUELOS (CANTERAS).
 - PRUEBAS DE LABORATORIO.
 - INFORME DE SEÑALIZACION
 - INFORME DE DRENAJE
 - INFORME DE PAVIMENTOS
 - INFORME DE ZONAS CRITICAS
 - ACTAS (DE SER EL CASO).
 - PLAN DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19).
 - INFORME MENSUAL COVID-19


Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. CIP. N° 74838

CONSORCIO VIAL SINCON

Juan Ramon Correa Saenz
REPRESENTANTE COMUN


Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. CIP. N° 41496

CARTA DE LA EMPRESA
DIRIGIDA AL INSPECTOR


Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. C.I.P. N° 74838

CONSORCIO VIAL SINCON

Osvaldo Yonasson Bacia Torres
REPRESENTANTE COMUN


Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. C.I.P. N° 41496

Santiago de Chuco, 17 de noviembre del 2020.

CARTA N° 011-2020-BYBT-RC-CVS

ATENCIÓN : ING. JAVIER BURGOS VERGARAY
Inspector del Servicio

ASUNTO : ALCANZO VALORIZACION N°04 -MES DE DICIEMBRE

REFERENCIA : CONTRATO DE SERVICIO N° 006-2020-MPSCH-LOG.
EJECUCION DEL SERVICIO: “**MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO Emp. LI -122-HUASHGON-HUAMADA-CASAPAMBA-CANCATE-SHIRACBAL-SINCON-HUANDA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD**”.

De mi especial consideración:

Por intermedio de la presente, me dirijo a usted para hacer llegar nuestro cordial saludo, así mismo hacer llegar la **VALORIZACION N°04 - MES DE DICIEMBRE** (del 01 al 15 de diciembre) del servicio de referencia para su revisión, aprobación y trámite correspondiente ante la Entidad.

El monto de la presente Valorización asciende a **S/ 1,118,080.81 (UN MILLÓN CIENTO DIECHIOCHO MIL OCHENTA CON 81/100 SOLES)**, y corresponde a un avance mensual del 27.26% y a un acumulado total del 100% de partidas ejecutadas del Mantenimiento Periódico.

Es propia la oportunidad para expresar las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



CONSORCIO VIAL SINCON
Bander Yojanson Baca Torres
REPRESENTANTE COMUN



Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. CIP N° 74838

FICHA TECNICA



Javier Bulgos Vergaray
ING. CIVIL
R. CIP. N° 74938

CONSORCIO VIAL/SINCON



Bander Yojanagon Daza Torres
REPRESENTANTE COMUN



Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. CIP. N° 41496

FICHA TECNICA DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO

1 ANTECEDENTES

- 1.01 Denominacion : MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES - EMP. LI-122 HUASHGON HUAMADA CASAPAMBA CANCATE SHIRACBAL SINCON - HUANDA - LONG. = 58.000 km
- 1.02 Ubicación : Zonas : Sierra
 Distrito : Santiago de Chuco
 Provincia : Santiago de Chuco
 Región : La Libertad
- 1.03 Entidad contratante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
- 1.04 Proceso de adjudicación : PES-N°011-2020-MPSCH/CS
- 1.05 Sistema de Contratación : A SUMA ALZADA
- 1.06 Contratista : CONSORCIO VIAL SINCON
- 1.07 Numero de contrato : N°006 – 2020 – MPSCH – LOG.
- 1.08 Monto Referencial (con IGV) : S/ -
- 1.09 Monto Contratado (con IGV) : S/ 4942000
- 1.10 Plazo de Ejecución (contractual) : 106 (Días Calendarios)
- 1.11 Monto Adelanto Directo (con IGV) : S/ 0.00
- 1.12 Fecha entrega adelanto directo : Ninguna
- 1.13 Monto adelanto materiales (con IGV) : S/ 0.00
- 1.14 Fecha entrega adelanto materiales : NO APLICA
- 1.15 Inspector de Servicio : ING. BURGOS VERGARAY JAVIER
- 1.16 Residente de Servicio : ING. JUAN RAMON CORREA SAENZ

2 ASPECTOS TECNICOS

- 2.01 Fecha entrega de terreno : 25 de agosto de 2020
- 2.02 Fecha de inicio del servicio : 17 de septiembre de 2020
- 2.03 Fecha de término del Servicio : 31 de diciembre de 2020 (contractual), 15 de diciembre (real)
- 2.04 Avance de servicio programado mes : 21.50%
- 2.05 Avance del Servicio real mes : 27.26%
- 2.06 Avance de Servicio programado acum. : 100.00%
- 2.07 Avance de Servicio ejecutado acum. : 100.00%
- 2.08 Estado del Servicio : CULMINADO

3 ASPECTO ECONOMICO

- 3.01 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento : Retencion del 10 % del monto contractual
- 3.02 Carta Fianza Adelanto Directo : Ninguna
- 3.03 Carta Fianza Adelanto Materiales : Ninguna
- 3.04 Ampliaciones de Plazo : Ninguna
- 3.05 Adicionales : Ninguno
- 3.06 Deductivos : Ninguno


Javier Burgos Vergaray
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 74638

CONSORCIO VIAL SINCON

Bander Yojansson Baca Torres
 REPRESENTANTE COMÚN


Juan Ramon Correa Saenz
 INGENIERO CIVIL
 R. CIP. N° 41496

FACTURA


Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. C.I.P. N° 74638


CONSORCIO VIAL SINCON
Dander Yodanisson Baca Torres
REPRESENTANTE COMUN


Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. C.I.P. N° 41496

HIDROVIAS PERU S.A.

JR. RAMÓN CASTILLA 208 PBLO. HUAMACHUCO EN LA ESQ. DEL
CAMPANARIO
HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20603089619****E001-48**

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **22/12/2020**
Señor(es) : **MUNICIPALIDAD PROVINC
SANTIAGO DE CHUCO**
RUC : **20187630101**
Dirección del Cliente : **JR. PACO YUNQUE 735 ---- SAN
CRISTOBAL LA LIBERTAD-
SANTIAGO DE CHUCO-
SANTIAGO DE CHUCO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **CTA DE DETRACCIONES
00801058477 BANCO DE LA
NACION**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION 04 PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO MANTENIMIENTOPERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL-EMP.LI-122-HUASHGON-HUAMADA-CASAPAMBA-CANCATE -SHIRACBAL-SINCON-HUANDA-LONG.=58.000KM CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE-2020 CS 006-2020-MPSCH-LOG	947526.11	0.00


Valor de Venta de Operaciones :
Gratuitas

Sub Total Ventas :	S/ 947,526.11
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 947,526.11
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 170,554.70
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,118,080.81

SON: UN MILLON CIENTO DIECIOCHO MIL OCHENTA Y 81/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.


Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. CIP. N° 41496

CONSORCIO VIAL SINCON

Bander Yojan
REPRESENTANTE COMÚN


Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. CIP. N° 74638

INFORME N°04
DE RESIDENTE


Javier Burgos Vergaray
ING. CIV.
R. CIP. N° 74638

CONSORCIO VIAL SINGON

Bander Yolansson Baca Torres
REPRESENTANTE COMUN


Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. CIP. N° 41496

INFORME DEL RESIDENTE DE SERVICIO

RESIDENTE: ING. JUAN RAMON CORREA SAENZ

VALORIZACION N° 04 : NOVIEMBRE 2020

1. RESUMEN EJECUTIVO

- * El servicio se inició el 17 de setiembre del 2020 , con los trabajos correspondientes a la partida obras preliminares (movilización de equipos , Trazo y replanteo, y la ejecución de las partidas correspondientes al mantenimiento periódico), luego se procedió a iniciar con la extracción de material de cantera. Así mismo en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre se han ejecutado las partidas de capa nivelante, y colocación de material granular con espesores de 5 y 15 cm respectivamente. Para el mes de Diciembre se han ejecutado las partidas de señalización, las cuales comprende la colocación de señales reglamentarias, preventivas e informativas, así como también la colocación de hitos kilometricos en toda la longitud del tramo. Cabe señalar que los trabajos han sido efectuados al 100% de acuerdo a las especificaciones técnicas del plan de trabajo. Así mismo, cabe resaltar que la empresa contratista ha ejecutado a lo largo del tramo, y dentro del tiempo de ejecución del mantenimiento periódico trabajos complementarios que no han sido considerados en el plan de trabajo y los cuales han sido asumidos enteramente por la empresa contratista. También, se realizaron trabajos de pase de agua como aporte a la población beneficiaria y usuaria de la vía, asumiendo el 100% del costo por parte de la empresa contratista.

- * En el presente mes, se ha alcanzado un avance mensual ejecutado de: 27.26%
- * En el presente mes, se tiene un avance acumulado en las partidas de:

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	: 100.00%
TRAZO Y REPLANTEO	: 100.00%
CAPA NIVELANTE E=0.05 M	: 100.00%
MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	: 100.00%
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	: 100.00%
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	: 100.00%
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	: 100.00%
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	: 100.00%
RECONFORMACION DE CUNETAS	: 100.00%
INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	: 100.00%
SEÑALES PREVENTIVAS	: 100.00%
SEÑALES REGLAMENTARIAS	: 100.00%
SEÑALES INFORMATIVAS	: 100.00%
RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	: 100.00%
EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	: 100.00%

2. ASPECTOS TECNICOS

A.- ASPECTOS TECNICOS

1. Situación del Servicio al	: 15 DE DICIEMBRE DEL 2020
2. Avance programado vigente mes	: 21.50%
3. Avance ejecutado al mes	: 27.26%
4. Avance progr. Acum. al mes	: 100.00%


Javier Burgos Vergaray
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 74638


CONSORCIO VIAL SINCON
 Bander Yojankson Baca Torres
 REPRESENTANTE COMÚN


Juan Ramon Correa Saenz
 INGENIERO CIVIL
 R. CIP. N° 41496

INFORME DEL RESIDENTE DE SERVICIO

RESIDENTE: ING. JUAN RAMON CORREA SAENZ

7. Plan de trabajo

De acuerdo al CAO se ejecutaron los trabajos con la finalidad de concluir el servicio en el plazo establecido en el acuerdo de 106 DIAS CALENDARIOS, concluyendo los trabajos 15 días antes del plazo final.

8. Conclusiones

El servicio se encuentra: **CULMINADO**

9. Recomendaciones

Se recomienda aprobar la presente valorización a fin de garantizar un buen financiamiento del servicio.

B.- DESARROLLO DEL SERVICIO

* El servicio durante el mes de diciembre concurrió de forma regular, el plazo de ejecución es de 106 días el cual inicio el plazo contractual el día 17 de setiembre y culminó el 31 de Diciembre del 2020, se ejecutaron los trabajos de acuerdo al calendario de avance de servicio. En todo momento se tiene constante coordinación con el inspector del servicio y la entidad contratante. Se concluyeron los trabajos al 100% el día 15 de diciembre del presente año.

* Se viene realizando los controles de calidad correspondientes a los trabajos realizados en la calzada, mediante el uso de equipos de laboratorio para encontrar el grado de compactación utilizando el método de densidad de campo (CONO DE ARENA) y proctor modificado.


* Todo el personal utiliza el equipo mínimo de protección personal como son: casco, lentes, zapatos de seguridad, guantes, respiradores, tapones de oído, caretas de protección, éstos dependiendo de la actividad que realizan.


3. ASPECTOS ECONOMICO

3.01	Numero de valorizaciones pagadas	:	2	
3.02	Numero de valorizaciones tramitadas	:	3	
3.03	% de Valorizacion N°04	:	27.26%	
3.04	Amortizaciones (NO ES EL CASO)			
	Adelanto directo acumulado	:	S/ 0.00	inc. IGV
	Adelanto por materiales acumulado	:	S/ 0.00	inc. IGV
3.05	Estado de Fianzas Bancarias	:	No Aplica - MYPE	
3.06	Retencion del 10% por Garantia de Fiel Cumplimiento	:	S/ -	
3.07	Adelanto Directo	:	No se solicitó	
3.08	Adelanto por materiales	:	No se solicitó	
3.09	METAS LOGRADAS	:	100.00%	
3.10	Valorizacion N°04 (Incluye IGV), asciende a	:	S/ 1,118,080.81	inc. IGV
3.11	Retencion del 10% por Garantia de Fiel Cumplimiento-OCTUBRE RETENIDO EL 100% EN LA 1RA. VALORIZACION.			
3.12	Monto a cancelar al contratista	:	S/ 1,118,080.81	inc. IGV

son:

UN MILLÓN CIENTO DIECHIOCHO MIL OCHENTA CON 81/100 SOLES


Javier Burgos Vergaray
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 74638



Juan Ramon Correa Saenz
 INGENIERO CIVIL
 R. CIP. N° 41496

CONSORCIO VIAL SINCON


Bander Yojansson Baca Torres
 REPRESENTANTE COMÚN

RESUMEN DE
VALORIZACION
MENSUAL


Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. CIP. N° 74638

CONSORCIO VIAL SINCON

Rafael Yojansón Daza Torres
REPRESENTANTE COMÚN


Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. CIP. N° 41496

RESUMEN DE VALORIZACION N° 04

DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES - EMP. II-122 HUASHGON HUAMADA CASAPAMBA CANCATE SHIRACBAL SINCON - HUANDA - LONG. = 58.000 km

(PERIODO : DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020)

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 MONTO CONTRATADO: S/ 4942000
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SINCON
 PLAZO DE EJECUCION: 106 DIAS CALENDARIO

INSPECTOR: ING. BURGOS VERGARAY JAVIER
 RESIDENTE: ING. JUAN RAMON CORREA SAENZ
 FECHA DE INICIO: 17 DE SETIEMBRE DEL 2020
 FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Item	Presupuestado	Según Expediente	Ejecutado Ant. Acum.	%	Ejecutado en el mes	%	Ejecutado Act. Acum.	%	Saldo por valorizar
02 FASE II									
02.01 MANTENIMIENTO PERIODICO									
02.01.01 OBRAS PRELIMINARES									
02.01.01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	40.220,52	20.110,26	50,00%	20.110,26	50,00%	40.220,52	100,00%	0,00%
02.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	60.789,22	60.789,22	100,00%	0,00	0,00%	60.789,22	100,00%	0,00%
02.01.02 PAVIMENTOS									
02.01.02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	27.840,00	22.080,00	79,31%	5.760,00	20,69%	27.840,00	100,00%	0,00%
02.01.02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	1.806.455,00	1.163.295,00	72,41%	443.160,00	27,59%	1.606.455,00	100,00%	0,00%
02.01.03 TRANSPORTE									
02.01.03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	334.999,80	238.857,01	71,43%	95.542,79	28,57%	334.999,80	100,00%	0,00%
02.01.03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	277.937,78	199.266,38	71,69%	78.671,40	28,31%	277.937,78	100,00%	0,00%
02.01.03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	218.527,10	158.465,00	72,52%	60.062,10	27,48%	218.527,10	100,00%	0,00%
02.01.03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	259.343,60	221.414,90	85,38%	37.928,70	14,62%	259.343,60	100,00%	0,00%
02.01.04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE									
02.01.04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	106.720,00	77.280,00	72,41%	29.440,00	27,59%	106.720,00	100,00%	0,00%
02.01.05 SEÑALIZACION									
02.01.05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	18.641,64	0,00	0,00%	18.641,64	100,00%	18.641,64	100,00%	0,00%
02.01.05.02	SENALES PREVENTIVAS	15.577,20	0,00	0,00%	15.577,20	100,00%	15.577,20	100,00%	0,00%
02.01.05.03	SENALES REGLAMENTARIAS	8.567,46	0,00	0,00%	8.567,46	100,00%	8.567,46	100,00%	0,00%
02.01.05.04	SENALES INFORMATIVAS	4.685,30	0,00	0,00%	4.685,30	100,00%	4.685,30	100,00%	0,00%
02.01.06 IMPACTO AMBIENTAL									
02.01.06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	14.548,28	10.183,80	70,00%	4.364,48	30,00%	14.548,28	100,00%	0,00%
02.01.07 EMERGENCIA SANITARIA									
02.01.07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	28.488,44	27.064,02	95,00%	1.424,42	5,00%	28.488,44	100,00%	0,00%
SUB TOTALES COSTO DIRECTO		3.022.741,34	2.198.805,59		823.935,75		3.022.741,34		0,00
COSTO INDIRECTO		302.274,13	219.880,56		82.393,57		302.274,13		0,00
UTILIDAD		151.137,07	109.940,28		41.196,79		151.137,07		0,00
SUB TOTAL		3.476.152,54	2.528.626,43		947.526,11		3.476.152,54		0,00
IGV		625.707,46	455.152,76		170.554,70		625.707,46		0,00
TOTAL		4.101.860,00	2.983.779,19	72,74%	1.118.080,81	27,26%	4.101.860,00	100,00%	0,00%

CONSORCIO VIAL SINCON

Balder Yojansón Baca Torres
 REPRESENTANTE COMÚN

Javier Burgos Vergaray
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 74638

Juan Ramon Correa Saenz
 INGENIERO CIVIL
 R. CIP. N° 41496

CONTROL DE METRADOS Y ACTIVIDADES EJECUTADOS



Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. CIP. N° 74938

CONSORCIO VIAL SINCON

Alexander Volante
REPRESENTANTE COMUN



Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. CIP. N° 41496

METRADOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO

PARTIDAS	METRADO EJECUTADO	
	UND	METRADO
02 FASE II		
02.01 MANTENIMIENTO PERIODICO		
02.01.01 OBRAS PRELIMINARES		
02.01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	glb	0.50
02.01.02 PAVIMENTOS		
02.01.02.01 CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	3,000.00
02.01.02.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	m3	12,000.00
02.01.03 TRANSPORTE		
02.01.03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	12,360.00
02.01.03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	117,420.00
02.01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	7,770.00
02.01.03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	56,610.00
02.01.04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE		
02.01.04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS	m	16,000.00
02.01.05 SEÑALIZACION		
02.01.05.01 INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	59.00
02.01.05.02 SEÑALES PREVENTIVAS	und	40.00
02.01.05.03 SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	22.00
02.01.05.04 SEÑALES INFORMATIVAS	und	10.00
02.01.06 IMPACTO AMBIENTAL		
02.01.06.01 RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	0.60
02.01.07 EMERGENCIA SANITARIA		
02.01.07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	0.05


Javier Burgos Vergaray
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 74636


CONSORCIO VIAL SINCON
 Bander Yohansson Baca Torres
 REPRESENTANTE COMÚN


Juan Ramon Correa Saenz
 INGENIERO CIVIL
 R. CIP. N° 41496

SUSTENTO DE METRADOS


Javier Burgos Verdoray
R. CIP. N° 41496

CONSORCIO VIAL SINCON

Estado de Veracruz - Boca Lomas
REPRESENTANTE COMUN


Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. CIP. N° 41496

METRADOS MANTENIMIENTO PERIODICO

02 FASE II
 02.01 MANTENIMIENTO PERIODICO
 02.01.01 OBRAS PRELIMINARES
 02.01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO

GLB

Descripción	Unidad	Parcial
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	GLB	0.50
TOTAL		0.50

02.01.02 PAVIMENTOS
 02.01.02.01 CAPA NIVELANTE E=0.05 M

M3

Progresiva		Longitud	Ancho	Espesor	Area	Volumen
Inicio	Fin	m.	m.	m.	m2.	m3.
00+000	01+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
01+000	02+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
02+000	03+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
03+000	04+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
04+000	05+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
05+000	06+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
06+000	07+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
07+000	08+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
08+000	09+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
09+000	10+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
10+000	11+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
11+000	12+000	1,000.00	5.00	0.05	5,000.00	250.00
		12,000.00			TOTAL	3,000.00


02.01.02.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M

M3

Progresiva		Longitud	Ancho	Espesor	Area	Volumen
Inicio	Fin	m.	m.	m.	m2.	m3.
00+000	01+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
01+000	02+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
02+000	03+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
03+000	04+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
04+000	05+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
05+000	06+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
06+000	07+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
07+000	08+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
08+000	09+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
09+000	10+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
10+000	11+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
11+000	12+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
12+000	13+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
13+000	14+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
14+000	15+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
15+000	16+000	1,000.00	5.00	0.15	5,000.00	750.00
		16,000.00			TOTAL	12,000.00

02.01.03 TRANSPORTE *
 02.01.03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM

M3K


Javier Burgos Vergaray
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 74636

Descripción	Unidad	Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	M3K	12,360.00
TOTAL		12,360.00

CONSORCIO VIAL SINCON

 Wladimir Yojansson Baca Torres
 REPRESENTANTE COMUN


Juan Ramon Carrea Saenz
 INGENIERO CIVIL
 R. CIP. N° 41496

02.01.03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM M3K

Descripción	Unidad	Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	M3K	117,420.00
TOTAL		117,420.00

02.01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM M3K

Descripción	Unidad	Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	M3K	7,770.00
TOTAL		7,770.00

02.01.03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM M3K

Descripción	Unidad	Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	M3K	56,610.00
TOTAL		56,610.00

* VER CALCULOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL Y DME

02.01.04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
02.01.04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS ML

Progresiva		Longitud	Parcial
Inicio	Fin	m.	m.
00+000	01+000	1,000.00	1,000.00
01+000	02+000	1,000.00	1,000.00
02+000	03+000	1,000.00	1,000.00
03+000	04+000	1,000.00	1,000.00
04+000	05+000	1,000.00	1,000.00
05+000	06+000	1,000.00	1,000.00
06+000	07+000	1,000.00	1,000.00
07+000	08+000	1,000.00	1,000.00
08+000	09+000	1,000.00	1,000.00
09+000	10+000	1,000.00	1,000.00
10+000	11+000	1,000.00	1,000.00
11+000	12+000	1,000.00	1,000.00
12+000	13+000	1,000.00	1,000.00
13+000	14+000	1,000.00	1,000.00
14+000	15+000	1,000.00	1,000.00
15+000	16+000	1,000.00	1,000.00
TOTAL			16,000.00

02.01.05 SEÑALIZACION
02.01.05.01 INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS UND


Descripción	Unidad	Parcial
INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	UND	59.00
TOTAL		59.00

02.01.05.02 SEÑALES PREVENTIVAS UND

Descripción	Unidad	Parcial
SEÑALES PREVENTIVAS	UND	40.00
TOTAL		40.00


02.01.05.03 SEÑALES REGLAMENTARIAS UND

Descripción	Unidad	Parcial
SEÑALES REGLAMENTARIAS	UND	22.00
TOTAL		22.00


Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. C.I.P. N° 74638

CONSORCIO VIAL SINCON

Ricardo Yriarte
REPRESENTANTE COMÚN


Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. C.I.P. N° 41496

02.01.05.04 SEÑALES INFORMATIVAS

UND

Descripción	Unidad	Parcial
SEÑALES INFORMATIVAS	UND	10.00
TOTAL		10.00

02.01.06 IMPACTO AMBIENTAL

02.01.06.01 RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS

HA

Descripción	Unidad	Parcial
RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	HA	0.60
TOTAL		0.60

02.01.07 EMERGENCIA SANITARIA

02.01.07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

GLB

Descripción	Unidad	Parcial
EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	GLB	0.05
TOTAL		0.05


Javier Burgos Vergaray
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 74636


CONSORCIO VIAL SINCON
 Bander Yojansson Baca Torres
 REPRESENTANTE COMÚN


Juan Ramon Correa Saenz
 INGENIERO CIVIL
 R. CIP. N° 41496

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA Y MAYOR A 1 KM

INICIO (km)	FIN (km)	Código Cantera	UBICACIÓN DE CANTERAS	PARTICIPACION %	ACCESO (km)	D.L.P. - 120.00 m (km)	DISTANCIA (km)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	PAVIMENTOS			ESPESOR (m)	VOLUMEN (m³)	MOMENTO (m³-km)	D<=1km	D>1km
										AREA (m²)	Pizolotas 3% (m²)	Sobre ancho 3% (m²)					
0.00	1.00	C-1	0.00	100.00%	2.50	0.00	3.00	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.00	0.15	772.50	2,317.50	772.50	1,545.00
1.00	2.00	C-1	0.00	100.00%	2.50	0.00	4.00	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.00	0.15	772.50	3,090.00	772.50	2,317.50
2.00	3.00	C-1	0.00	100.00%	2.50	0.00	5.00	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.00	0.15	772.50	3,862.50	772.50	3,090.00
3.00	4.00	C-1	0.00	100.00%	2.50	0.00	6.00	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.00	0.15	772.50	4,635.00	772.50	3,862.50
4.00	5.00	C-1	0.00	100.00%	2.50	0.00	7.00	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.00	0.15	772.50	5,407.50	772.50	4,635.00
5.00	6.00	C-1	0.00	100.00%	2.50	0.00	8.00	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.00	0.15	772.50	6,180.00	772.50	5,407.50
6.00	7.00	C-1	0.00	100.00%	2.50	0.00	9.00	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.00	0.15	772.50	6,952.50	772.50	6,180.00
7.00	8.00	C-1	0.00	100.00%	2.50	0.00	10.00	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.00	0.15	772.50	7,725.00	772.50	6,952.50
8.00	9.00	C-1	0.00	100.00%	2.50	0.00	11.00	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.00	0.15	772.50	8,497.50	772.50	7,725.00
9.00	10.00	C-1	0.00	100.00%	2.50	0.00	12.00	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.00	0.15	772.50	9,270.00	772.50	8,497.50
10.00	11.00	C-1	0.00	100.00%	2.50	0.00	13.00	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.00	0.15	772.50	10,042.50	772.50	9,270.00
11.00	12.00	C-1	0.00	100.00%	2.50	0.00	14.00	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.00	0.15	772.50	10,815.00	772.50	10,042.50
12.00	13.00	C-1	0.00	100.00%	2.50	0.00	15.00	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.00	0.15	772.50	11,587.50	772.50	10,815.00
13.00	14.00	C-1	0.00	100.00%	2.50	0.00	16.00	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.00	0.15	772.50	12,360.00	772.50	11,587.50
14.00	15.00	C-1	0.00	100.00%	2.50	0.00	17.00	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.00	0.15	772.50	13,132.50	772.50	12,360.00
15.00	16.00	C-1	0.00	100.00%	2.50	0.00	18.00	1,000.00	5.00	5,000.00	150.00	0.00	0.15	772.50	13,905.00	772.50	13,132.50
										82,400.00	Dist. Media (km):		12,360.00	129,780.00	10.50		
LONGITUD TOTAL DE AFIRMADO										16,000.00			12,360.00	129,780.00	10.50		


Javier Burgos Vergaray
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 74638



CONSORCIO VIAL SINCON
Wander Volansson Basa Torres
 REPRESENTANTE COMUN


Juan Ramon Correa Saenz
 INGENIERO CIVIL
 R. CIP. N° 41496

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA Y MAYOR A 1 KM

INICIO (km)	FIN (km)	Código Cantera	UBICACIÓN PARA DIME	PARTICIPACION %	ACCESO (km)	D.L.P. - 120.00 m (km)	DISTANCIA (km)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	PAVIMENTOS				VOLUMEN (m³)	MOMENTO (m³-km)	D<=1km	D>1km
										AREA (m²)	Piaseletas 3% (m³)	Sobre ancho 3% (m²)	ESPESOR (m)				
0.00	1.00	DME-1	0.00	100.00%	0.04	0.00	0.54	1,000.00	5.00	5,000.00	0.00	0.00	0.10	500.00	270.00	270.00	0.00
1.00	2.00	DME-1	0.00	100.00%	0.04	0.00	1.54	1,000.00	5.00	5,000.00	0.00	0.00	0.10	500.00	770.00	500.00	270.00
2.00	3.00	DME-1	0.00	100.00%	0.04	0.00	2.54	1,000.00	5.00	5,000.00	0.00	0.00	0.10	500.00	1,270.00	500.00	770.00
3.00	4.00	DME-1	0.00	100.00%	0.04	0.00	3.54	1,000.00	5.00	5,000.00	0.00	0.00	0.10	500.00	1,770.00	500.00	1,270.00
4.00	5.00	DME-1	0.00	100.00%	0.04	0.00	4.54	1,000.00	5.00	5,000.00	0.00	0.00	0.10	500.00	2,270.00	500.00	1,770.00
5.00	6.00	DME-1	0.00	100.00%	0.04	0.00	5.54	1,000.00	5.00	5,000.00	0.00	0.00	0.10	500.00	2,770.00	500.00	2,270.00
6.00	7.00	DME-1	0.00	100.00%	0.04	0.00	6.54	1,000.00	5.00	5,000.00	0.00	0.00	0.10	500.00	3,270.00	500.00	2,770.00
7.00	8.00	DME-1	0.00	100.00%	0.04	0.00	7.54	1,000.00	5.00	5,000.00	0.00	0.00	0.10	500.00	3,770.00	500.00	3,270.00
8.00	9.00	DME-1	0.00	100.00%	0.04	0.00	8.54	1,000.00	5.00	5,000.00	0.00	0.00	0.10	500.00	4,270.00	500.00	3,770.00
9.00	10.00	DME-1	0.00	100.00%	0.04	0.00	9.54	1,000.00	5.00	5,000.00	0.00	0.00	0.10	500.00	4,770.00	500.00	4,270.00
10.00	11.00	DME-1	0.00	100.00%	0.04	0.00	10.54	1,000.00	5.00	5,000.00	0.00	0.00	0.10	500.00	5,270.00	500.00	4,770.00
11.00	12.00	DME-1	0.00	100.00%	0.04	0.00	11.54	1,000.00	5.00	5,000.00	0.00	0.00	0.10	500.00	5,770.00	500.00	5,270.00
12.00	13.00	DME-1	0.00	100.00%	0.04	0.00	12.54	1,000.00	5.00	5,000.00	0.00	0.00	0.10	500.00	6,270.00	500.00	5,770.00
13.00	14.00	DME-1	0.00	100.00%	0.04	0.00	13.54	1,000.00	5.00	5,000.00	0.00	0.00	0.10	500.00	6,770.00	500.00	6,270.00
14.00	15.00	DME-1	0.00	100.00%	0.04	0.00	14.54	1,000.00	5.00	5,000.00	0.00	0.00	0.10	500.00	7,270.00	500.00	6,770.00
15.00	16.00	DME-1	0.00	100.00%	0.04	0.00	15.54	1,000.00	5.00	5,000.00	0.00	0.00	0.10	500.00	7,770.00	500.00	7,330.00
LONGITUD TOTAL DE AFIRMADO										16,000.00	80,000.00		Dist.Medida (km):		8,000.00	8,04	


Javier Burgos Vergaray
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 74638

CONSORCIO VIAL SINCON

 Dander Vojansson Baez Torres
 REPRESENTANTE COMUN


Juan Ramon Correa Saenz
 INGENIERO CIVIL
 R. CIP. N° 41496

ANALISIS DE VALORIZACION
MENSUAL


Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. CIP. N° 74838

CONSORCIO VIAL SINCON

Gaudete Yrarrasoain Haer Torres
REPRESENTANTE COMUN


Juan Ramon Cortea Saenz
INGENIERO CIVIL
R. CIP. N° 41496

VALORIZACION N° 04

DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES - EMP. LI-122 HUASHGON HUAMADA CASAPAMBA CANCATE SHIRACBAL SINCON - HUANDA - LONG. = 58.000 km

INSPECTOR: ING. BURGOS VERGARAY JAVIER
 RESIDENTE: ING. JUAN RAMON CORREA SAENZ
 PLAZO DE EJECUCION: 106 DIAS CALENDARIO
 FECHA DE INICIO: 17 DE SETIEMBRE DEL 2020
 PERIODO : DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020
 FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES - EMP. LI-122 HUASHGON HUAMADA CASAPAMBA

CANCATE SHIRACBAL SINCON - HUANDA - LONG. = 58.000 km

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD

MONTO CONTRATADO: S/ 4942000

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SINCON

DESCRIPCIONES	PRESUPUESTADO				ACUMULADO ANTERIOR				AVANCE ACTUAL				ACUMULADO		SALDO	
	Und	Metrado	P.U	Parcial	Metrado	Valoriz. S/	Metrado	Valoriz. S/	Metrado	Valoriz. S/	Metrado	Valoriz. S/	%	Metrado	Valoriz. S/	
																Metrado
MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES - EMP. LI-122 HUASHGON HUAMADA CASAPAMBA CANCATE SHIRACBAL SINCON - HUANDA - LONG. = 58.000 km																
02.01.01 MANTENIMIENTO PERIÓDICO																
02.01.01 OBRAS PRELIMINARES																
02.01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	glb	1.00	40,220.52	40,220.52	0.50	20,110.26	0.50	20,110.26	1.00	40,220.52	100.00%					
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO	km	58.00	1,048.09	60,789.22	58.00	60,789.22		60,789.22	58.00	60,789.22	100.00%					
02.01.02 PAVIMENTOS																
02.01.02.01 CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	14,500.00	1.92	27,940.00	11,500.00	22,080.00	3,000.00	5,760.00	14,500.00	27,840.00	100.00%					
02.01.02.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	m3	43,500.00	36.93	1,606,455.00	31,500.00	1,163,295.00	12,000.00	443,160.00	43,500.00	1,606,455.00	100.00%					
02.01.03 TRANSPORTE																
02.01.03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	43,260.00	7.73	334,399.80	30,000.00	238,867.01	12,360.00	95,542.79	43,260.00	334,399.80	100.00%					
02.01.03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	414,832.50	0.67	277,937.78	297,412.50	198,266.38	117,420.00	78,671.40	414,832.50	277,937.78	100.00%					
02.01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3k	28,270.00	7.73	218,527.10	20,500.00	158,485.00	7,770.00	60,062.10	28,270.00	218,527.10	100.00%					
02.01.03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	m3k	387,080.00	0.67	259,343.60	330,470.00	221,414.80	56,610.00	37,928.70	387,080.00	259,343.60	100.00%					
02.01.04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE																
02.01.04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS	m	58,000.00	1.84	106,720.00	42,000.00	77,280.00	16,000.00	29,440.00	58,000.00	106,720.00	100.00%					
02.01.05 SEÑALIZACION																
02.01.05.01 INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	59.00	315.96	18,641.64			59.00	18,641.64		18,641.64	100.00%					
02.01.05.02 SEÑALES PREVENTIVAS	und	40.00	389.43	15,577.20			40.00	15,577.20		15,577.20	100.00%					
02.01.05.03 SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	22.00	389.43	8,567.46			22.00	8,567.46		8,567.46	100.00%					
02.01.05.04 SEÑALES INFORMATIVAS	und	10.00	468.53	4,685.30			10.00	4,685.30		4,685.30	100.00%					
02.01.06 IMPACTO AMBIENTAL																
02.01.06.01 RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	2.00	7,274.14	14,548.28	1.40	10,183.80	0.60	4,364.48	2.00	14,548.28	100.00%					
02.01.07 EMERGENCIA SANITARIA																
02.01.07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	glb	1.00	28,488.44	28,488.44	0.95	27,064.02	0.05	1,424.42	1.00	28,488.44	100.00%					
TOTAL COSTO DIRECTO				3,022,741.34		2,198,806.59		823,935.75		3,022,741.34						
COSTO DIRECTO				3,022,741.34		2,198,806.59		823,935.75		3,022,741.34						
COSTO INDIRECTO				302,274.13		219,890.96		82,393.57		302,274.13						
UTILIDAD				151,137.07		109,940.28		41,196.79		151,137.07						
SUB TOTAL				3,476,152.54		2,528,626.43		947,526.11		3,476,152.54						
IGV				625,707.46		455,152.76		170,954.70		625,707.46						
TOTAL VALORIZACION				4,101,860.00	72.74%	2,983,779.19	27.26%	1,118,080.81	100.00%	4,101,860.00						

CONSORCIO VIAL SINCON

Bander Yojansson Baca Torres
 REPRESENTANTE COMÚN

Javier Burgos Vergaray
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 74638

Juan Ramon Correa Saenz
 INGENIERO CIVIL
 R. CIP. N° 41496

AMORTIZACION (DE SER EL CASO)


Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. C.I.P. N° 74838

CONSORCIO VIAL SINCON

Bander Yonasson Baez Torres
REPRESENTANTE COMUN


Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. C.I.P. N° 41496

NO CORRESPONDE



Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. CIP. N° 74938



CONSORCIO VIAL SINCON
Daniel Torres
Bander Yominston Baza Torres
REPRESENTANTE COMÚN



Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. CIP. N° 41496

HOJA DE CANCELACION


Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. C.I.P. N° 74638

CONSORCIO VIAL SINCON

Ricardo Yonasson
REPRESENTANTE COMUN


Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. C.I.P. N° 41496

SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACION N° 04

SERVICIO : MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES - EMP. LI-122 HUASHGON HUAMADA CASAPAMBA CANCATE SHIRACBAL SINCON - HUANDA - LONG. = 58.000 km

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL SINCON

RESIDENTE DE SERVICIO : ING. JUAN RAMON CORREA SAENZ

INSPECTOR : ING. BURGOS VERGARAY JAVIER

PRES. CONTRATADO : S/ 4942000

VALORIZACION N° 04
(PERIODO : DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020)

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL
VALORIZACION MENSUAL (sin IGV)		S/ 823,935.75
Valorización de Servicio N° 04: V04 (sin IGV)	S/ 947,526.11	
Deducción de Reajustes: D		S/ 0.00
Deducción del Reajuste que No corresponde por Adelanto Directo	S/ 0.00	
Deducción del Reajuste que No corresponde por Pago a cuenta Materiales	S/ 0.00	
VALORIZACION BRUTA: $V_B = V_{01} - D =$		S/ 823,935.75
Amortización de Adelantos: A		S/ 0.00
Amortización por Adelanto Directo	S/ 0.00	
Amortización por Pago a Cuenta Materiales	S/ 0.00	
VALORIZACION NETA: $V_N = V_B - A =$		S/ 823,935.75
COSTO DIRECTO		S/ 82,393.57
COSTO INDIRECTO	10.00%	S/ 41,196.79
UTILIDAD	5.00%	S/ 947,526.11
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS: I.G.V.	18.00%	S/ 170,554.70
MONTO A CANCELAR: I.G.V. + $V_N =$		S/ 1,118,080.81

NOTA: RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 10% FUE EJECUTADA EN LA 1RA. VALORIZACIÓN.

MONTO TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA	S/1,118,080.81
--	-----------------------

Son:
UN MILLÓN CIENTO DIECHIOCHO MIL OCHENTA CON 81/100 SOLES


Javier Burgos Vergaray
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 74638


CONSORCIO VIAL SINCON
 Bander Yojanisson Baca Torres
 REPRESENTANTE COMÚN


 Juan Ramon Correa Saenz
 INGENIERO CIVIL
 R. CIP. N° 41496

CUADRO COMPARATIVO DE
AVANCE DE OBRA
PROGRAMADO-
EJECUTADO-PAGADO



Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. C.I.P. N° 74936

CONSORCIO VIAL SINCON

Daniel Yojanison Baca Torres
REPRESENTANTE COMUN



Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. C.I.P. N° 41496

CUADRO DE BARRAS


Joymar Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. CIP. N° 74638

CONSORCIO VIAL SINCON


Bander Yumbura de Banca Torres
REPRESENTANTE COMUN


Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. CIP. N° 41496

CUADRO DE BARRAS
VALORIZACION N° 04
DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES - EMP. LL-122 HUASHGON HUAMADA CASAPAMBA CANCATE SHIRACBAL SINCON - HUANDA - LONG. = 58.000 km
 INSPECTOR: ING. BURGOS VERGARAY JAVIER
 RESIDENTE: ING. JUAN RAMON CORREA SAENZ
 PLAZO DE EJECUCION: 108 DIAS CALENDARIO
 FECHA DE INICIO: 17 DE SETIEMBRE DEL 2020
 PERIODO : DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020
 FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES - EMP. LL-122 HUASHGON HUAMADA CASAPAMBA CANCATE SHIRACBAL SINCON - HUANDA - LONG. = 68.000 km
 HUAMADA CASAPAMBA CANCATE SHIRACBAL SINCON - HUANDA - LONG. = 68.000 km
 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD
 MONTO CONTRATADO: S/ 4942000
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SINCON

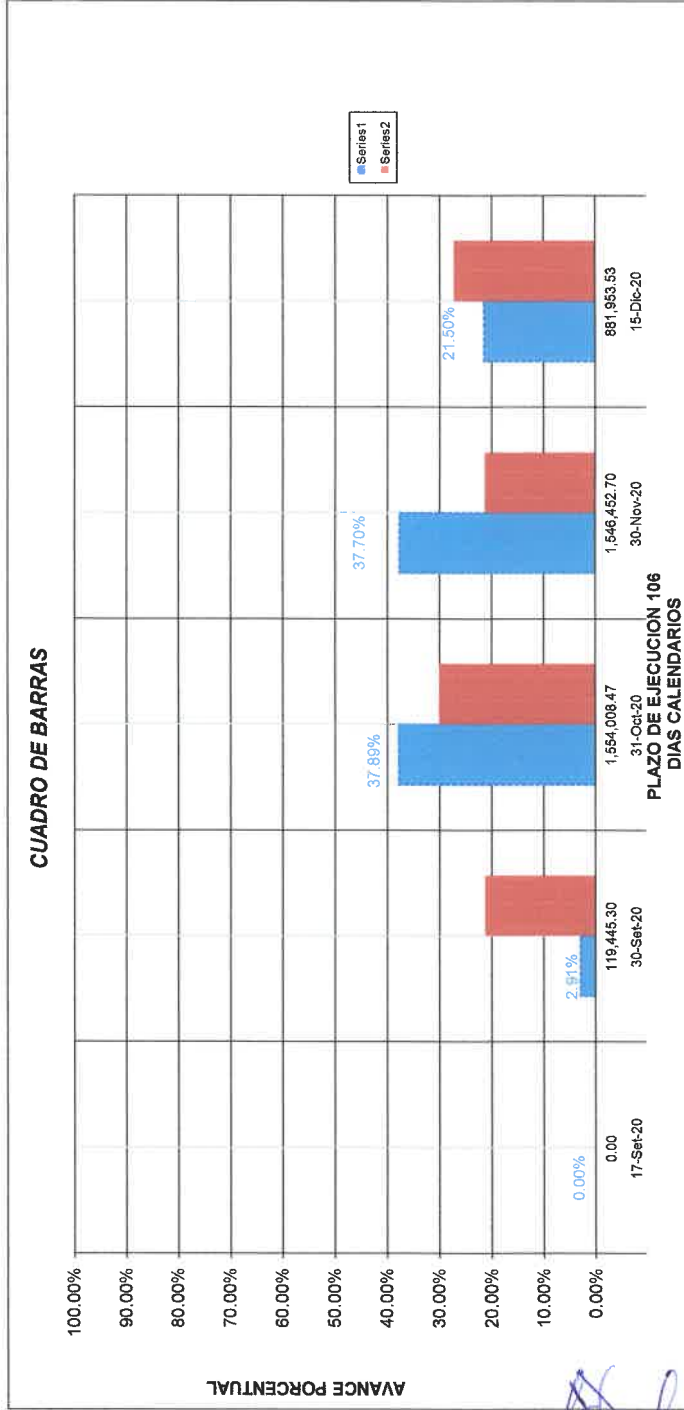

VALORIZACION EJECUTADO

VALORIZACION	MONTOS (Inc IGV) PARCIAL S/	ACUMUL. S/	PORCENTAJES PARCIAL %	ACUMUL. %
17-Sep-20	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Sep-20	872,596.52	872,596.52	21.27	21.27
31-Oct-20	1,235,037.34	2,107,633.86	30.11	51.38
30-Nov-20	876,143.33	2,983,777.19	21.36	72.74
15-Dic-20	1,118,080.81	4,101,858.00	27.26	100.00
TOTAL	4,101,860.00	4,101,860.00	100.00%	100.00%

VALORIZACION PROGRAMADO

VALORIZACION	MONTOS (Inc IGV) PARCIAL S/	ACUMUL. S/	PORCENTAJES PARCIAL %	ACUMUL. %
17-Sep-20	0.00	0.00	0.00	0.00%
30-Sep-20	119,445.30	119,445.30	2.81	2.81
31-Oct-20	1,554,008.47	1,673,453.77	37.89	40.80
30-Nov-20	1,546,452.70	3,219,906.47	37.70	78.50
15-Dic-20	881,953.53	4,101,860.00	21.50	100.00
TOTAL	4,101,860.00	4,101,860.00	100.00%	100.00%

Situación de la Obra con Respecto al Avance Acumulado Ejecutado vs Acumulado Programado
 Concluido al 100.00%

Javier Burgos Vergaray
Javier Burgos Vergaray
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 74638

Bander Yojansson Baca Torres
Bander Yojansson Baca Torres
 REPRESENTANTE COMUN

Juan Ramon Correa Saenz
Juan Ramon Correa Saenz
 INGENIERO CIVIL
 R. CIP. N° 41496

273

CURVA S



Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. CIP. N° 71938



CONSORCIO VIAL SINCOM
Daniel Yonathan Baca Torres
REPRESENTANTE COMÚN




Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. CIP. N° 41496

CURVA S (Porcentual)
VALORIZACION N° 04
DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES - EMP. LI-122 HUASHGON HUAMADA CASAPAMBA CANGATE SHIRACBAL SINCON - HUANDA - LONG. = 58.000 km
 INSPECTOR: ING. BURGOS VERGARAY JAVIER
 RESIDENTE: ING. JUAN RAMON CORREA SAENZ
 PLAZO DE EJECUCION: 106 DIAS CALENDARIO
 FECHA DE INICIO: 17 DE SETIEMBRE DEL 2020
 PERIODO : DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020
 FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES - EMP. LI-122 HUASHGON HUAMADA CASAPAMBA CANGATE SHIRACBAL SINCON - HUANDA - LONG. = 58.000 km
 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD
 MONTO CONTRATADO: S/ 4942000
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SINCON

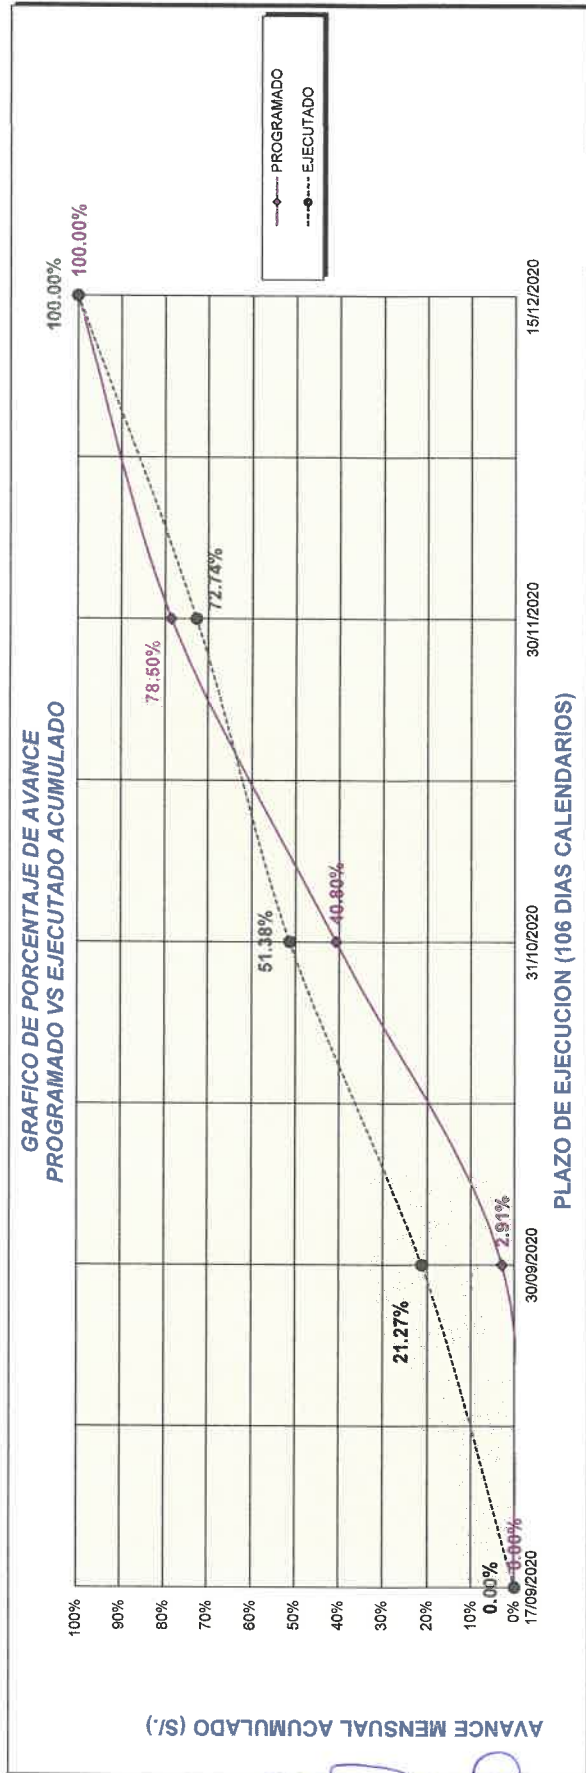

Bander Yojansson Baca Torres
 RESPONSABLE TÉCNICO

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
17-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	872,598.52	872,598.52	21.27%	21.27%
31-Oct-20	1,235,037.34	2,107,635.86	30.11%	51.38%
30-Nov-20	876,143.33	2,983,779.19	21.36%	72.74%
15-Dic-20	1,118,080.81	4,101,860.00	27.26%	100.00%
TOTAL	4,101,860.00		100.00%	

Javier Burgos Vergaray
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 74638


MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
17-Set-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-20	119,445.30	119,445.30	2.91%	2.91%
31-Oct-20	1,554,008.47	1,673,453.77	37.89%	40.80%
30-Nov-20	1,546,452.70	3,219,906.47	37.70%	78.50%
15-Dic-20	881,953.53	4,101,860.00	21.50%	100.00%
TOTAL	4,101,860.00		100.00%	

Juan Ramon Correa Saenz
 INGENIERO CIVIL
 R. CIP. N° 41496

CURVA S (Financiero)
VALORIZACION N° 04
DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES - EMP. LI-122 HUASHGON HUAMADA CASAPAMBA CANCATE SHIRACBAL SINCON - HUANDA - LONG. = 58.000 km
 INSPECTOR: ING. BURGOS VERGARAY JAVIER
 CASAPAMBA CANCATE SHIRACBAL SINCON - HUANDA - LONG. = 58.000 km
 RESIDENTE: ING. JUAN RAMON CORREA SAENZ
 PLAZO DE EJECUCION: 106 DIAS CALENDARIO
 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD
 PERIODO : DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020
 MONTO CONTRATADO: S/ 4842000
 FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SINCON

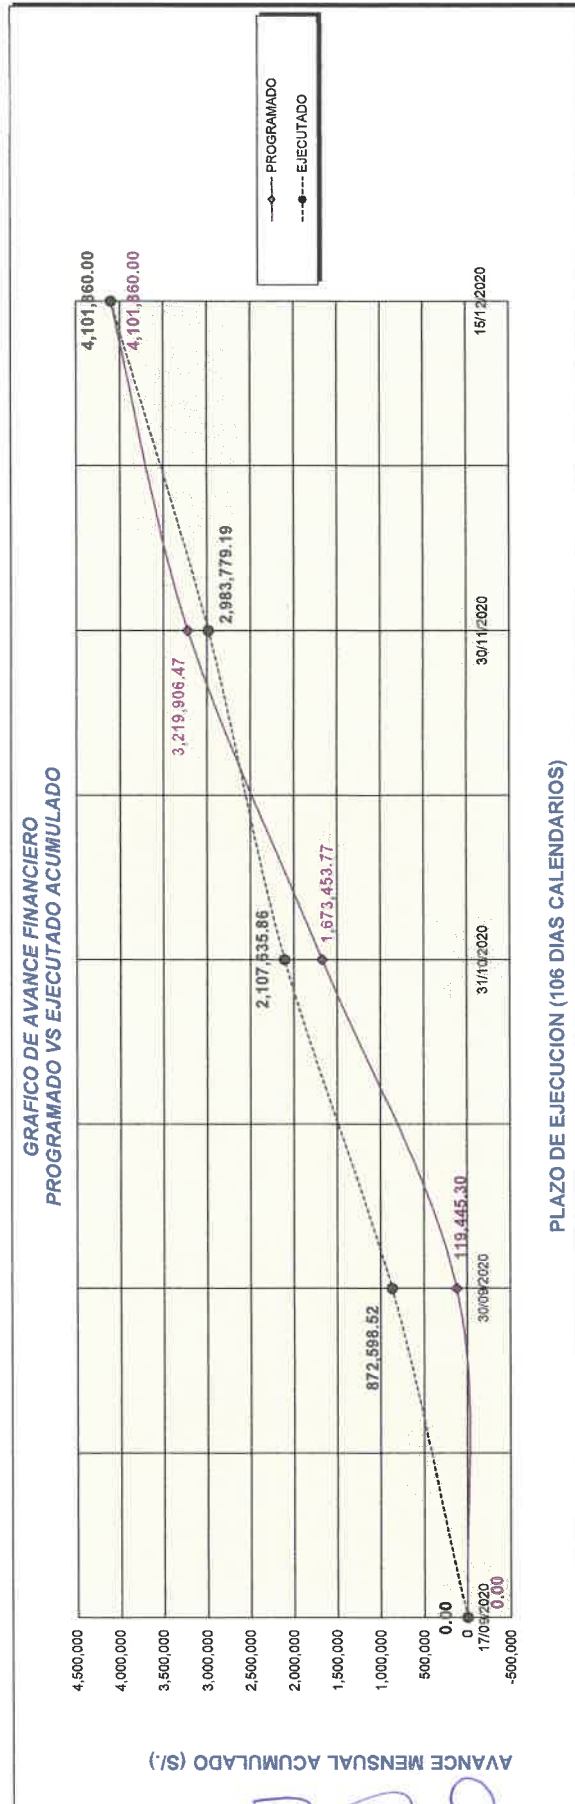

CONSORCIO VIAL SINCON

Bander Yoananson Baca Torres
 REPRESENTANTE COMUN

PLAZO DE EJECUCION (106 DIAS CALENDARIOS)

MONTO VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
17/09/2020	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30/09/2020	119,445.30	119,445.30	2.91%	2.91%
31/10/2020	1,554,006.47	1,673,453.77	37.69%	40.60%
30/11/2020	1,548,452.70	3,219,906.47	37.70%	78.50%
15/12/2020	881,953.53	4,101,860.00	21.50%	100.00%
TOTAL	4,101,860.00	4,101,860.00	100.00%	100.00%

MONTO VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
17/09/2020	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30/09/2020	872,598.52	872,598.52	21.27%	21.27%
31/10/2020	1,235,037.34	2,107,635.86	30.11%	51.38%
30/11/2020	876,143.33	2,983,779.19	21.36%	72.74%
15/12/2020	1,118,080.81	4,101,860.00	27.26%	100.00%
TOTAL	4,101,860.00	4,101,860.00	100.00%	100.00%

Javier Burgos Vergaray
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 74838

Juan Ramon Correa Saenz
 INGENIERO CIVIL
 R. CIP. N° 41496

CRONOGRAMA DE AVANCE PROGRAMADO



Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. CIP. N° 74058

CONSORCIO VIAL SINCON

Róndar Yojandson Bachi Torres
REPRESENTANTE COMÚN



Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. CIP. N° 41496

CRONOGRAMA DE AVANCE
EJECUTADO


Javier Borges Vergaray
ING. CIVIL
R. C.I.P. N° 74638


CONSORCIO VIAL SINGON
Bander Yofanston Escá Torres
REPRESENTANTE COMÚN


Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. C.I.P. N° 41496

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE EJECUTADO

Servicio: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES - EMP. L-122 HUASHGON HUAMADA CASAPAMBA CANGATE SHIRACBAL SINCON - HUANDA - LONG. = 58.000 km


Propietario: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

DURACION: 106 DÍAS CALENDARIOS

Item	Descripción	Parcial (S/)	SETIEMBRE 2020 del 17 al 30	OCTUBRE 2020 del 01 al 31	NOVIEMBRE 2020 del 01 al 30	DICIEMBRE 2020 del 01 al 15
02 FASE II						
02.01 MANTENIMIENTO PERIÓDICO						
02.01.01 OBRAS PRELIMINARES						
02.01.01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO	40,220.52	20,110.26	0.00	0.00	20,110.26
02.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	60,789.22	60,789.22	0.00	0.00	0.00
02.01.02 PAVIMENTOS						
02.01.02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	27,840.00	7,680.00	10,560.00	3,840.00	5,760.00
02.01.02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	1,606,455.00	332,370.00	498,555.00	332,370.00	443,160.00
02.01.03 TRANSPORTE						
02.01.03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	334,399.80	65,665.68	107,465.65	65,665.68	95,542.79
02.01.03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	277,937.78	35,505.65	91,403.75	72,356.99	78,671.40
02.01.03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	218,527.10	46,360.00	65,705.00	46,360.00	60,062.10
02.01.03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	259,343.60	38,190.00	96,171.80	87,063.10	37,928.70
02.01.04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE						
02.01.04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	106,720.00	22,080.00	33,120.00	22,080.00	29,440.00
02.01.05 SEÑALIZACION						
02.01.05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	18,641.64				18,641.64
02.01.05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	15,577.20				15,577.20
02.01.05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	8,567.46				8,567.46
02.01.05.04	SEÑALES INFORMATIVAS	4,885.30				4,885.30
02.01.06 IMPACTO AMBIENTAL						
02.01.06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	14,548.28				14,548.28
02.01.07 EMERGENCIA SANITARIA						
02.01.07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	28,468.44	14,244.22	7,122.11	5,697.69	1,424.42
COSTO DIRECTO			643,035.02	910,123.31	645,647.26	823,935.75
Costo Indirecto						
Utilidades			302,274.13	91,012.33	64,564.73	82,393.57
			151,137.07	45,506.17	32,292.36	41,196.79
SUB TOTAL			739,480.27	1,046,641.81	742,494.35	947,526.11
I G V			133,106.25	188,395.53	133,648.98	170,564.70
VALOR REFERENCIAL			625,707.46	1,235,037.34	876,143.33	1,118,080.81
% DE AVANCE MENSUAL			21.27%	30.11%	21.36%	27.26%
% DE AVANCE MENSUAL ACUMULADO			21.27%	51.38%	72.74%	100.00%


Javier Augusto Vergaray
 R. C. P. N° 14636
 INGENIERO CIVIL


Rander Yoiansson Baca Torres
 REPRESENTANTE COMÚN


Juan Ramon Correa Saenz
 INGENIERO CIVIL
 R. C. P. N° 41496

PROGRAMACION DE OBRA
PERT-CPM GANTT



Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. CIP. N° 74638



CONSORCIO VIAL SINCON
Ender Yojansson Bacs Torres
REPRESENTANTE COMUN



Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. CIP. N° 41496

CRONOGRAMA - MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	septiembre 2020 03.08.13 16 23 28	octubre 2020 03.08.13 13 18 23 28	noviembre 2020 02.07.12 17 22 27	diciembre 2020 02.07.12 17 22 27	enero 01.06.11
1	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES - EMP. LI-122 HUASHGON HUAMADA CASAPAMBA CASCATE SHIRACBAL SINCON - HUANDA - LONG. = 58.000 km	106 días	jue 17/09/20	jue 31/12/20					
2	INICIO	0 días	jue 17/09/20	jue 17/09/20					
3	02 FASE II	106 días	jue 17/09/20	jue 31/12/20					
4	02.01 MANTENIMIENTO PERIODICO	106 días	jue 17/09/20	jue 31/12/20					
5	02.01.01 OBRAS PRELIMINARES	106 días	jue 17/09/20	jue 31/12/20					
6	02.01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	2 días	jue 17/09/20	jue 31/12/20					
7	02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO	48 días	vie 18/09/20	mié 04/11/20					
8	02.01.02 PAVIMENTOS	45 días	mié 23/09/20	vie 06/11/20					
9	02.01.02.01 CAPA NIVELANTE E=0.05 M	11 días	mié 23/09/20	sáb 03/10/20					
10	02.01.02.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	44 días	jue 24/09/20	vie 06/11/20					
11	02.01.03 TRANSPORTE	71 días	mié 23/09/20	mié 02/12/20					
12	02.01.03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	70 días	mié 23/09/20	mar 01/12/20					
13	02.01.03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	70 días	jue 24/09/20	mié 02/12/20					
14	02.01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	70 días	mié 23/09/20	mar 01/12/20					
15	02.01.03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	70 días	jue 24/09/20	mié 02/12/20					
16	02.01.04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	80 días	mié 23/09/20	vie 11/12/20					
17	02.01.04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS	80 días	mié 23/09/20	vie 11/12/20					
18	02.01.05 SEÑALIZACION	26 días	jue 03/12/20	lun 28/12/20					
19	02.01.05.01 INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	23 días	jue 03/12/20	vie 25/12/20					
20	02.01.05.02 SEÑALES PREVENTIVAS	25 días	vie 04/12/20	lun 28/12/20					
21	02.01.05.03 SEÑALES REGLAMENTARIAS	20 días	vie 04/12/20	mié 23/12/20					
22	02.01.05.04 SEÑALES INFORMATIVAS	15 días	vie 04/12/20	vie 18/12/20					
23	02.01.06 IMPACTO AMBIENTAL	6 días	sáb 26/12/20	jue 31/12/20					
24	02.01.06.01 RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	6 días	sáb 26/12/20	jue 31/12/20					
25	02.01.07 EMERGENCIA SANITARIA	106 días	jue 17/09/20	jue 31/12/20					
26	02.01.07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	106 días	jue 17/09/20	jue 31/12/20					
27	FIN	0 días	jue 31/12/20	jue 31/12/20					

Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. C. P. N° 74636

CONSORCIO VIAL SINCON

Wander Yojañson Baca Torres
1er. ASISTENTE COM. E

Juan Ramon Cortes Saenz
INGENIERO CIVIL
R. C. P. N° 41496

Fecha: 01/01/2021

Nueva Project

Tarea

División

Hitos

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hitos resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hitos externos

Tarea inactiva

Hitos inactivos

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Fecha límite

Tarea crítica

Progreso

264

PROGRAMACIÓN PERT - CPM
MANTENIMIENTO PERIÓDICO

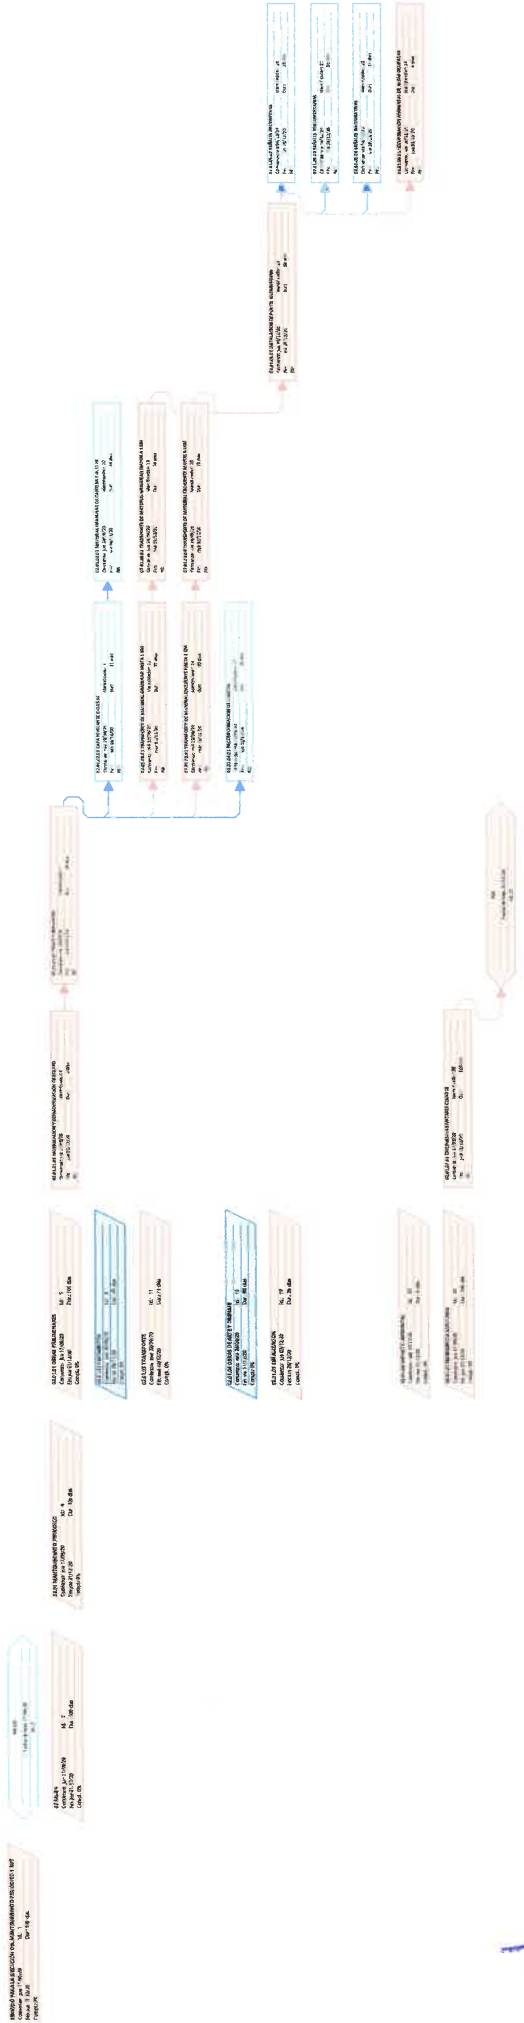

CONSORCIO VIAL SINCON
[Signature]
Randy Yojansson Baca Torres
 REPRESENTANTE COMÚN

[Signature]
Javier Burgos Vergaray
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 74638

[Signature]
Juan Ramon Correa Saenz
 INGENIERO CIVIL
 R. CIP. N° 41496

PANEL
FOTOGRAFICO


Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. CIP. N° 14528

CONSORCIO VIAL SINCON

Bander Vojansson Baca Torres
REPRESENTANTE COMÚN


Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. CIP. N° 41496





Inicio de trabajos en Cantera KM 21+150 para el transporte de material granular.
90888115N 812618E



Verificación del proceso constructivo, colocación de capa nivelante e=0.05m, Km 16+000,
9090500N 814920E


Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. CIP. N° 74634


CONSORCIO VIAL SINCON
Bander Yojansson Baca Torres
REPRESENTANTE COMÚN


Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. CIP. N° 41496



Verificación del proceso constructivo, colocación de capa nivelante e=0.05m, Km 13+250, 9091906N 814885E



Verificación del proceso constructivo, colocación de capa nivelante e=0.05m, Km 13+050, 9092047N 815027E


Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. C.I.P. N° 74636


CONSORCIO VIAL SINCON
Bander Yojanson Baca Torres
REPRESENTANTE COMÚN


.....
Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. C.I.P. N° 41496



Inicio del proceso constructivo colocación de material granular de cantera e=0.15m, km 15+500, em presencia de Ing Residente.
9090951N 814911E



Esparcido de material granular de cantera e=0.15m, km 12+250, junto al Ing. Residente.
9092660N 814917E

Javier Burges Vergaray
Javier Burges Vergaray
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 74638

Barder Yojanssen Daza Torres
CONSORCIO VIAL SINCON
 Barder Yojanssen Daza Torres
 REPRESENTANTE COMÚN

Juan Ramon Correa Saenz
 Juan Ramon Correa Saenz
 INGENIERO CIVIL
 R. CIP. N° 41496



Verificación de los trabajos realizados, referente a la colocación de material granular km 08+500, a cargo del Ing. Residente.
9093933N 814276E



Inicio del proceso constructivo, Compactación de la plataforma en el, km 13+500 junto al Ing. Residente.
9091796N 814663E

Javier Burgos Vergaray
Javier Burgos Vergaray
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 74636

CONSORCIO VIAL SINCON
Bander Yojanson Baca Torres
 Bander Yojanson Baca Torres
 REPRESENTANTE COMÚN

Juan Ramon Correa Saenz
 Juan Ramon Correa Saenz
 INGENIERO CIVIL
 R. CIP. N° 41496



Proceso constructivo, Compactación de la plataforma en el, km 12+500 junto al Ing. Residente.
9092462N 815068E



Proceso constructivo, Compactación de la plataforma en el, km 15+150 junto al Ing. Residente.
9091191N 814936E

Javier Burges Vergaray
Javier Burges Vergaray
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 74636

Bander Yojansson
CONSORCIO VIAL SINCON
Bander Yojansson
 Bander Yojansson Baca Torres
 REPRESENTANTE COMÚN

Juan Ramon Correa Saenz
Juan Ramon Correa Saenz
 INGENIERO CIVIL
 R. CIP. N° 41496



Proceso constructivo, Compactación de la plataforma en el, km 10+100 junto al Ing. Residente.
9093228N 814355E



Proceso constructivo, Compactación de la plataforma en el, km 08+200 junto al Ing. Residente.
90942000N 814152E

Javier Burgos
Javier Burgos Velgaray
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 74636

CONSORCIO VIAL SINCON
Bander Yojanson
Bander Yojanson Baen Torres
 REPRESENTANTE COMÚN


Juan Ramon Correa Saenz
Juan Ramon Correa Saenz
 INGENIERO CIVIL
 R. CIP. N° 41496




Proceso constructivo, Compactación de la plataforma en el, km 09+850 junto al Ing. Residente.
9093180N 814214E



Verificación de los trabajos, compactación de la plataforma en el, km 13+150 junto al Ing. Residente.
9091973N 814959E


Javier Burgos Vergaray
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 74638


CONSORCIO VIAL SINCON
 Bander Yofansson Baca Torres
 REPRESENTANTE COMUN


 Juan Ramon Correa Saenz
 INGENIERO CIVIL
 R. CIP. N° 41496



Verificación de los trabajos, Riego de plataforma y compactación en el km 11+500 junto al Ing. Residente.
9092993N 814548E



Verificación de los trabajos realizados, referente a la partida reconformación de cunetas km 12+500
9092462N 815068E

Javier Burgos Vergaray
Javier Burgos Vergaray
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 74636

CONSORCIO VIAL SINCON
Bander Yojansson Baga Torres
 Bander Yojansson Baga Torres
 REPRESENTANTE COMÚN

Juan Ramon Correa Saenz
 Juan Ramon Correa Saenz
 INGENIERO CIVIL
 R. CIP. N° 41496



Verificación de los trabajos realizados en la progresiva, km 15+850
9090636N 814968E



Verificación de la fabricación de los Hitos kilométricos en el almacén de producción, para la colocación de los mismos en la vía referente al paquete 11, Hito Km 0+000



Verificación de la fabricación de las señales preventivas en el almacén de producción, para la colocación de los mismos, en la vía referente al paquete 11.

Javier Burgos Vergaray
Javier Burgos Vergaray
 ING. CIVIL
 R. C.I.P. N° 74636

CONSORCIO VIAL SINCON
[Signature]
 Bander Yojansón Baca Torres
 REPRESENTANTE COMÚN

[Signature]
Juan Ramon Correa Saenz
 INGENIERO CIVIL
 R. C.I.P. N° 41496



Verificación de la fabricación de las señales reglamentarias en el almacén de producción, para la colocación de los mismos en la vía referente al paquete 11



Verificación de la fabricación de los postes metálicos, en el almacén de producción, para la colocación de los mismos, en la vía referente al paquete 11



Verificación de las señales reglamentarias referente al paquete 11, cerca de la localidad de CASAPAMBA km 6+250
9095531N 816643E



Verificación de las señales reglamentarias referente al paquete 14, cerca de la localidad de SHIRACBAL km 12+460
9095478N 816263E

Javier Burgos Vergaray
Javier Burgos Vergaray
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 74636

Juan Yojanson Baca Torres
CONSORCIO VIAL SINCON
Juan Yojanson Baca Torres
 Bander Yojanson Baca Torres
 REPRESENTANTE COMÚN

Juan Ramon Correa Saenz


Juan Ramon Correa Saenz
 INGENIERO CIVIL
 R. CIP. N° 41496



Movilización y desmovilización de equipos, referente al paquete 11, entre las localidades que une Huashgon, Huamada, 9096739N 811539E



Movilización y desmovilización de equipos, referente al paquete 11, entre las localidades que une Huashgon, Huamada, 9096739N 811539E


Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. C.I.P. N° 74638


CONSORCIO VIAL SINCON
Rander Yojanson Baca Torres
REPRESENTANTE COMÚN


Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. C.I.P. N° 41496

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO



Javier Burgos Veigaray
ING. CIVIL
R. CIP. N° 74638

CONSORCIO VIAL SINCON

Bander Yojansson Baca Torres
REPRESENTANTE COMÚN



Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. CIP. N° 41496

“ACTA DE ENTREGA DE TERRENO”

Servicio	MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: EMP. LI-122 – HUASHGON – HUAMADA – CASAPAMBA – CANCATE – SHIRACBAL – SINCON – HUANDA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
Tramo	“EMP. LI-122 – HUASHGON – HUAMADA – CASAPAMBA – CANCATE – SHIRACBAL – SINCON – HUANDA” LONG. = 58.00 KM
Provincia	SANTIAGO DE CHUCO
Distrito	SANTIAGO DE CHUCO
Entidad Contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)
Empresa Ejecutora	CONSORCIO VIAL SINCON (HIDROVIAS PERU S.A. + PERFOR GKA S.A.C.)
N.º de Contrato	CONTRATO DE SERVICIO N.º 006-2020-MPSCH-LOG
Fecha de Contrato	24/08/2020
Modalidad	SUMA ALZADA
Monto Presupuestado	S/. 4,943,804.00 soles Inc. (I.G.V.)
Monto Contractual	S/. 4,942,000.00 soles Inc. (I.G.V.)
Inspector de Servicio	Ing. GILMER ENRIQUE BAZÁN CISNEROS
Plazo de Ejecución	PLAN DE TRABAJO: 20 D.C. MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C. MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C. INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C. TOTAL: 505 DÍAS CALENDARIOS (sujeto a fecha de contrato)
Fecha de Culminación	31/12/2021 (Mantenimiento Periódico)



Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. CIP. N° 41496

CONSORCIO VIAL SINCON
Bander Yojansson Baca Torres
REPRESENTANTE COMÚN

Gabriel Omar Espinoza Cossio
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 192701

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Gilmer Enrique Bazán Cisneros
CIP. N° 74375
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. David Iván Silva Torres
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
CIP N° 63635

Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. CIP. N° 74038

En el desvío Emp. LI-122, caserío de Huashgón, distrito de Santiago de Chuco, provincia de Santiago de Chuco – La libertad, siendo las 8:00 a.m. del 25 de agosto del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza con CIP. N° 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N° 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N° 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Ing. Gilmer Enrique Bazán Cisneros con CIP N° 74375; y por último, por parte del Contratista el Ing. Juan Ramon Correa Sáenz con CIP N° 41496 como Residente de servicio y el Sr. Bander Yojansson Baca Torres con DNI N° 43006265, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL SINCON (HIDROVIAS PERU S.A. + PERFOR GKA S.A.C.). A fin de realizar la ENTREGA DE TERRENO del tramo: “CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. LI-122 – HUASHGON – HUAMADA – CASAPAMBA – CANCATE – SHIRACBAL – SINCON - HUANDA” con una longitud de 58.00 km.

Este acto protocolar tiene por finalidad hacer la entrega de la ruta mencionada en todo su recorrido físico para la recolección de información necesaria y de esta manera hacer la elaboración del PLAN DE TRABAJO de la ruta, que es parte de la FASE I del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y formatos (anexos) estipulados en los Términos de Referencia del D.U. N° 070-2020 presentados para la contratación.

Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: EMP. LI-122 – HUASHGON – HUAMADA – CASAPAMBA – CANCATE – SHIRACBAL – SINCON – HUANDA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

CONSORCIO VIAL SINCON
Bander Yojansson Baca Torres
REPRESENTANTE COMÚN

Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. CIP. N° 41496

Siendo las 2:00 p.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para dar inicio a la elaboración del Plan de Trabajo y continuar con los procedimientos posteriores para dar inicio a la FASE II y III (mantenimiento periódico y rutinario) del servicio. Del mismo día, se da por concluida el acto de **ENTREGA DE TERRENO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.

AREA USUARIA



Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 190782



Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH
CIP N° 218511

AREA RESPONSABLE



Ing. David Iván Silva Torres
Sub Gerente de Infraestructura MPSCH
CIP N° 63635



Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. CIP. N° 74638

EMPRESA EJECUTORA



Ing. Juan Ramón Correa Sáenz
Residente de Servicio
CIP N° 41496



Sr. Bander Yojansson Baca Torres
Representante Común de CONSORCIO VIAL SINCON
DNI N° 43006265

INSPECTOR



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Gilmer Enrique Bazán Cisneros
CIP. N° 74375
INSPECTOR DE OBRA


Ing. Gilmer Enrique Bazán Cisneros
Inspector del Servicio
CIP N° 74375



Gabriel Omar Panta Cossio
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 192701



CONSORCIO VIAL SINCON
Bander Yojansson Baca Torres
REPRESENTANTE COMÚN



Juan Ramón Correa Sáenz
INGENIERO CIVIL
R. CIP. N° 41496

ACTA DE INICIO DE SERVICIO



Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. C.I.P. N° 74038

CONSORCIO VIAL SINCON

Bander Yojanson Baca Torres
REPRESENTANTE COMÚN



Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. C.I.P. N° 41496

“ACTA DE INICIO DE SERVICIO”



Servicio	MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: EMP. LI-122 – HUASHGON – HUAMADA – CASAPAMBA – CANCATE – SHIRACBAL – SINCON – HUANDA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
Tramo	“EMP. LI-122 – HUASHGON – HUAMADA – CASAPAMBA – CANCATE – SHIRACBAL – SINCON – HUANDA” LONG. = 58.00 KM
Provincia	SANTIAGO DE CHUCO
Distrito	SANTIAGO DE CHUCO
Entidad Contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO (MPSCH)
Empresa Ejecutora	CONSORCIO VIAL SINCON (HIDROVIAS PERU S.A. + PERFOR GKA S.A.C.)
N.º de Contrato	CONTRATO DE SERVICIO N.º 006-2020-MPSCH-LOG
Fecha de Contrato	24/08/2020
Modalidad	SUMA ALZADA
Monto Presupuestado	S/. 4,943,804.00 soles Inc. (I.G.V.)
Monto Contractual	S/. 4,942,000.00 soles Inc. (I.G.V.)
Inspector de Servicio	Ing. GILMER ENRIQUE BAZÁN CISNEROS
Aprobación Plan de Trabajo	RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 144-2020-MPSCH/GM
Fecha de Aprobación	16/09/2020
Fecha de Inicio	17/09/2020
Plazo de Ejecución	MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 120 D.C. (sujeto a fecha de contrato) MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C. INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL: 5 D.C.
Fecha de Culminación	31/12/2021 (Mantenimiento Periódico)

Gabriel Omar Panta Cossio
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 192701

Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. CIP. N° 74638

CONSORCIO VIAL SINCON
REPRESENTANTE COMÚN

Juan Ramón Correa Sáenz
INGENIERO CIVIL



En el desvío Emp. LI-122, caserío de Huashgón, distrito de Santiago de Chuco, provincia de Santiago de Chuco – La libertad, siendo las 8:00 a.m. del 17 de septiembre del 2020, se reunieron en tal lugar por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (Entidad Contratante): el Ing. Rafael Kevin Alan Valencia Rebaza con CIP. N° 218511 en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial de la MPSCH, el Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez con CIP N° 190782 como jefe de Operaciones de IVP – MPSCH, el Ing. Marcial Nicolás Barrantes Parimango con CIP N° 225678 como monitor designado del servicio intervenido (área usuaria) y el Ing. David Iván Silva Torres con CIP N° 63635 como Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH (área responsable); en calidad de Inspector de servicio el Ing. Gilmer Enrique Bazán Cisneros con CIP N° 74375; asimismo, representando a Provias Descentralizado está el Ing. Gabriel Omar Panta Cossio con CIP N° 192701 encargado de Monitoreo y Seguimiento y el Ing. Bach. Eduardo Rafael Príncipe León con DNI N° 46839109 como Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento; finalmente, por parte del Contratista el Ing. Juan Ramón Correa Sáenz con CIP N° 41496 como Residente de servicio y el Sr. Bander Jojansson Baca Torres con DNI N° 43006265, en calidad del representante común del CONSORCIO VIAL SINCON (HIDROVIAS PERU S.A. + PERFOR GKA S.A.C.). A fin de realizar el INICIO DE SERVICIO del tramo: “CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. LI-122 – HUASHGON – HUAMADA – CASAPAMBA – CANCATE – SHIRACBAL – SINCON - HUANDA” con una longitud de 58.00 km.

Este acto protocolar tiene por finalidad dar inicio a la ejecución de las actividades de MANTENIMIENTO PERIÓDICO de la ruta mencionada en todo su recorrido físico correspondiente a la FASE II del servicio, cumpliendo con los plazos, especificaciones y partidas estipulados en el Plan de Trabajo previamente aprobado por la Entidad.

Cabe mencionar que este tramo forma parte del paquete de contratación de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINRIO Y PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: EMP. LI-122 – HUASHGON – HUAMADA – CASAPAMBA – CANCATE – SHIRACBAL – SINCON – HUANDA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**

Siendo las 2:00 p.m., tras efectuar la inspección ocular del tramo y hacer las coordinaciones respectivas acorde con el Plan de Trabajo, se deja constancia que **NO EXISTE** impedimento alguno para empezar la ejecución del Mantenimiento Periódico. Del mismo día, se da por concluido el acto de **INICIO DE SERVICIO** y en señal de conformidad firmamos los involucrados en (05) cinco juegos originales.

AREA USUARIA


 Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial MPSCH CIP N° 190782	 Ing. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza Gerente General del Instituto Vial Provincial MPSCH CIP N° 218511
--	--


 Marcial Nicolás Barrantes Parimango
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 225678
Ing. Marcial Nicolás Barrantes Parimango
 Monitor Designado del Instituto Vial Provincial MPSCH
 CIP N° 225678



CONSORCIO VIAL SINCON
 REPRESENTANTE COMUN


AREA RESPONSABLE


 Ing. David Iván Silva Torres
 Sub Gerente de Infraestructura MPSCH
 CIP N° 63635


Javier Burgos Vergara
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 74638

REPRESENTANTES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD

 Gabriel Omar Panta Cossio INGENIERO CIVIL Reg. CIP. N° 192701	 Ing. Baeh: Eduardo Rafael Principe León Analista y Registrador de Monitoreo y Seguimiento Provincia de Santiago de Chuco DNI N° 46839109
Ing. Gabriel Omar Panta Cossio Monitoreo y Seguimiento a Mantenimiento Vial Provincia de Santiago de Chuco CIP N° 192701	CONSORCIO VIAL SINCON  Bander Yojansson Baca Torres REPRESENTANTE COMUN


Juan Ramon Correa Saenz
 INGENIERO CIVIL
 R. CIP. N° 41496

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
 DE SANTIAGO DE CHUCO
 Ing. César Enrique Balcón Cordero
 CIP N° 74876
 REPRESENTANTE COMUN

EMPRESA EJECUTORA


Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. CIP. 41496

Ing. Juan Ramón Correa Sáenz
Residente de Servicio
CIP N° 41496

CONSORCIO VIAL SINCON

Sr. Bander Yojansson Baca Torres
REPRESENTANTE COMÚN

Sr. Bander Yojansson Baca Torres
Representante Común de CONSORCIO VIAL SINCON
DNI N° 43006265

INSPECTOR



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Gilmer Enrique Bazán Cisneros
CIP. N° 74375
INSPECTOR DE OBRA


Ing. Gilmer Enrique Bazán Cisneros
Inspector del Servicio
CIP N° 74375


Gabriel Oyarza Santa Cossio
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 192701


Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. C. P. N° 74638

CONSORCIO VIAL SINCON

Sr. Bander Yojansson Baca Torres
REPRESENTANTE COMÚN


Juan Ramon Correa Saenz
INGENIERO CIVIL
R. CIP. N° 41496
