



ORDEN DE SERVICIO

1266

NUMERO:	
000545	
DE FECHA:	1/06/2021

Señor(es) **INVERSIONES Y TRANSPORTES APUS E.I.R.L** RUC N° **20602945171**

Direccion JR. TERESA G DE FANING 501-BAR CENTENARIO INDEPENDENCIA HUARAZ ANCASH

Referencia N° CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 002-2020-MPSCH/LOG

Condiciones de Pago : CCI OFICINA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA .

Objeto del Servicio : **EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE --CALLAYGUIDA BAJA-- EMP. LI 122 QUIGUIR Y TRAMO MUNGURRAL --SANTA ROSA--OYON DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHUCO-LA LIBERTAD.**

Destino a MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO Pedido N° : 000545

LOS SIGUIENTES SERVICIOS :			VALOR	
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
		POR VALORIZACION N° 01: DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE --CALLAYGUIDA BAJA--- EMP. LI 122 QUIGUIR Y TRAMO MUNGURRAL --SANTA ROSA--OYON DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHUCO-LA LIBERTAD.. AVANCE ACUMULADO 8.33%,PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021. SEGÚN: INFORME N°176-2021-IVP-MPSCH/GG/VRRK INFORME N°0291-2021-MPSCH/DIST/SGI		S/. 29,758.72

TOTAL S/. 29,758.72

AFECTACION PRESUPUESTAL DEL SERVICIO			DISTRIBUCION CONTABLE
ACTIVIDAD/PROYECTO:	META	CLASIFICADOR:	CUENTAS POR PAGAR
0138- PROMOCION,IMPLEMETACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA	0111-0112	23.24.31	S/ 29,758.72

AUTORIZACION DEL SERVICIO		ÁREA USUARIA:		
 Ltc. Yenny J. Argueta JEFE DE LOGISTICA UNIDAD DE LOGISTICA	 Abog. Natali Castillo Felipe JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADMINISTRACION y/o GERENCIA	DIA	MES	AÑO
		 Ing. David Iván Siva Torres SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA FIRMA		

INVERSIONES Y TRANSPORTES APUS E.I.R.L.
JR. TERESA G DE FANING 501 BAR. CENTENARIO OESTE
INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20602945171
E001-69

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 01/06/2021
Señor(es) : MUNICIPALIDAD PROVINC
SANTIAGO DE CHUCO
RUC : 20187630101
JR. PACO YUNQUE 735 ---- SAN
Dirección del Cliente : CRISTOBAL LA LIBERTAD-
SANTIAGO DE CHUCO-SANTIAGO
DE CHUCO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VAL. NRO.01 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE-CALLAYGUIDA BAJA-EMP.LI-122-QUIGUIR Y TRAMO MUNGURRAL-SANTA ROSA OYON, SANTIAGO DE CHUCO-LA LIBERTAD, AVANCE ACUMULADO DEL 8.33% ENERO 2021	25219.254	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 72/100 SOLES


Sub Total Ventas :	S/ 25,219.25
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 25,219.25
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,539.47
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 29,758.72

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA N° 0000000068

(EN SOLES)



DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA : 10 SANTIAGO DE CHUCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO [301197]

MES : ENERO
FECHA DE DOCUMENTO : 15/01/2021
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM N° DE DOCUMENTO PREVISION-014-2020
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION. PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL TRAMO "EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP. LI-122 (QUIGUIR)" Y "MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON"

FECHA APROBACION : 10/02/2021
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG PRODIPRY ACT/A/OBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
--	-------

0002 INICIAL

0138 3000133 5006373 15 033 0066 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	171,600.00
0111 MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP. LI-122 (QUIGUIR); SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	171,600.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	171,600.00
5 GASTOS CORRIENTES	171,600.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	171,600.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	171,600.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	171,600.00
2.3.2.4.3 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	171,600.00
2.3.2.4.3.1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	171,600.00
0138 3000133 5006373 15 033 0066 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	198,000.00
0112 MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON; SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	198,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	198,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	198,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	198,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	198,000.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	198,000.00
2.3.2.4.3 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	198,000.00
2.3.2.4.3.1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	198,000.00

TOTAL	369,600.00
TOTAL CERTIFICACION	369,600.00
TOTAL NOTA	369,600.00

Q-5-PROC-17-2020-MPSCCH/CS-1
 Contrato de servicios N° 02-2020-MPSCCH-628
 S/. 2,380,697.34 Valor Adjudicado
 S/. 363,633.34 por comprometer
 Inversiones y Transportes Apuz EIRL RUC: 20602945171

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
SANTIAGO DE CHUCO

C.P.C. Natividad L. Peres Sánchez
D.F. DE MANTENIMIENTO Y PRESUPUESTO

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

INFORME N° 176-2021-IVP-MPSCH/GG/VRK

A : Dr. Rodriguez Lujan Patricia Karina.
Director de administración y Finanzas de la MPSCH

DE : ING. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza
Gerente del Instituto Vial Provincial de Santiago de Chuco

ASUNTO : CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N° 01 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIR), LONG. 13.00 KM.; MUNGURRAL - SANTA ROSA – OYON, LONG. 15.00 KM.

REFERENCIA : Informe N° 70-2021-JO/IVPSCH/LFGCH
INFORME N° 08-2021-IVP-MPSCH/TACSMRP/NBP
Informe N° 0313-2021-MPSCH/DST/SGI
CARTA N° 006-2021-ING. GEBC-IO/MPSCH
CARTA N° 098-2021-MPSCH/DST/SGI
CARTA N° 009-2021-MPSCH-IVP-SCH/VRK
Informe N° 0291-2021-MPSCH/DST/SGI
INFORME 003-2021 ING° GEBC-IO/MPSCH
INFORME 001-2021 ING° GEBC-IO/MPSCH
CARTA N° 003-2021-RCONSORCIOSANTAROSA
CONTRATO N° 002-2020-MPSCH-LOG
DU. N° 070-2020

FECHA : Santiago de Chuco, 30 de abril del 2021

Previo cordial saludo y afecto, por medio del presente tengo a bien manifestarle con respecto al asunto de la referencia lo siguiente:

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Ejecución de Servicio : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIR), LONG. 13.00 KM.; MUNGURRAL - SANTA ROSA – OYON, LONG. 15.00 KM

Longitud : 28.00 Km.
Superficie de Rodadura : Afirmado.
Nivel de intervención : Mantenimiento Rutinario
Velocidad Directriz : 30 km/h.
Perfilado de Cunetas : Terreno natural



UBICACIÓN

Distrito : Santiago de Chuco
Provincia : Santiago de Chuco
Región : La Libertad

RESPONSABLES DEL SERVICIO

EJECUTOR:

Fuente de financiamiento : Recursos por operaciones oficios de crédito
Modalidad Contratación : a Suma Alzada



Contrato de Servicio	: CONTRATO N° 002-2020-MPSCH-LOG
Contratista	: CONSORCIO SANTA ROSA.
Monto Referencial del Servicio	: S/. 2, 386,664.00 inc el IGV.
Monto del Contrato de Servicio	: S/. 2, 380,697.34 inc el IGV
Plazo de Ejecución mantenimiento Rutinario	: 360 DIAS CALENDARIOS
Inicio Plazo de Servicio Contractual	: 01-01-2021
Fecha Termino de Servicio Contractual	: 26-12-2021

INSPECTOR

INSPECTOR : ING. GILEMR ENRRIQUE BAZAN CISNEROS
Resolución de designación : R. Sub Gerencia de Infraestructura N° 003-2021-MPSCH

2. DE LA PRESENTACIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE N° 01-ENERO 2021

Mediante INFORME 006-2021 ING° GEBC-IO/MPSCH, del Inspector de Servicio, recepcionada por mesa de partes de la sub gerencia de infraestructura de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, el día 26/04/2021, el ING. GILEMR ENRRIQUE BAZAN CISNEROS, hace llegar a la Municipalidad la Valorización N° 01 por los trabajos ejecutados en el periodo comprendido entre el 01/01/2021 hasta el 31/01/2021, del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIR), LONG. 13.00 KM.; MUNGURRAL - SANTA ROSA – OYON, LONG. 15.00 KM, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD

3. ANÁLISIS DEL IVP.

Para la ejecución del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIR), LONG. 13.00 KM.; MUNGURRAL - SANTA ROSA – OYON, LONG. 15.00 KM, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, en el proceso especial de selección N° 16-2020-MPSCH/CS-Segunda convocatoria, la empresa contratista CONSORCIO SANTA ROSA, ha sido favorecida con la buena pro, por su monto ofertado de S/. 2, 237,886.19 inc. IGV que a continuación se detalla:

- A) Elaboración del Plan de Trabajo la suma de S/. 23,806.97 inc IGV, que se desarrollara exclusivamente para tal fase.
- B) Ejecución del mantenimiento Periódico la suma de 1, 975,978.79, inc. IGV, que se desarrollara exclusivamente en la fase de Ejecución del Mantenimiento Periódico.
- C) Ejecución del Mantenimiento Rutinario, la suma de S/. 357,104.60, inc. IGV, que se desarrollara exclusivamente para tal fase.
- D) La Elaboración del Inventario de Condición Vial la Suma de S/. 23,806.97, inc. IGV, que se desarrollara exclusivamente para tal fase.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL SERVICIO DURANTE EL MES

De acuerdo a la verificación de los trabajos referidos al "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIR), LONG. 13.00 KM.; MUNGURRAL - SANTA ROSA – OYON, LONG. 15.00 KM, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD", se ha observado que desde la fecha 01/01/2021 HASTA el 31/01/2021, se desarrollaron las actividades validadas por el Técnico Administrativo según detalla en los análisis ítem 3 (*descripción de las actividades ejecutadas fase III*), validando las actividades programadas en el plan de trabajo así mismo en la ejecución del mismo.





Instituto Vial Provincial



MPSCH

Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD

ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VEENALES TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIRI); MUNGUERRAL - SANTA ROSA - OYON, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

CONTRATO : N° 002-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR : ING. GLMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS

CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ROSA



Instituto Vial Provincial



PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD

PRESUP. OFERTADO (CD-I6G-U) S/ ISV 302,63101

PRESUP. OFERTADO (CD-I6G-U) NCI/ ISV 357,19460
 FECHA DE PRESUPUESTO 01/09/2020
 PLAZO DE EJECUCION 360 d.s. (2 meses)
 FECHA DE INICIO Y TERMINO CONTRACTUAL 01/01/2021 - 26/02/2021

VALORIZACION DE AVANCE DE SERVICIO N° 01, MANTENIMIENTO RUTINARIO

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021

FORMULA 01 : SERVICIO PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	MONTO CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE VALORIZACION		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
			P.U.	SOLES	SOLES	%	SOLES	%	SOLES	%	SOLES	%
01	EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIRI)			122,180.22	0.00	0.00%	10,181.69	8.33%	10,181.69	8.33%	111,998.54	91.67%
01.01	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	G30	122,180.22	122,180.22	-	-	10,181.69	8.33%	10,181.69	8.33%	111,998.54	91.67%
02	Munguerral - Santa Rosa - Oyon			140,977.17	0.00	0.00%	11,748.10	8.33%	11,748.10	8.33%	129,229.07	91.67%
02.01	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	G30	140,977.17	140,977.17	-	-	11,748.10	8.33%	11,748.10	8.33%	129,229.07	91.67%
A-	COSTO DIRECTO			263,157.40	-	-	21,929.79		21,929.79		241,227.61	
B-	GASTOS GENERALES		10.000%	26,315.74	0.00	-	2,192.98		2,192.98		24,122.77	
C-	UTILIDAD		5.000%	13,157.87	0.00	-	1,056.49		1,056.49		12,081.38	
D-	SUB TOTAL			302,631.01	0.00	-	25,219.26		25,219.26		277,411.75	
E-	I.G.V.			54,473.59	-	-	4,539.47		4,539.47		49,994.12	
F-	TOTAL			357,104.60	-	-	29,758.72		29,758.72		327,345.87	
G-	PORCENTAJE			100.00%	0.00%	-	8.33%		8.33%		91.67%	



El resumen de la valorización de Servicio N° 01 ENERO 2021, para efectos de pago al contratista CONSORCIO SANTA ROSA, se ha determinado el importe de **SI. 29,758.72 (VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 72/100 SOLES), INC. El IGV** cuyo detalle es el siguiente.

RESUMEN GENERAL VALORIZACION N° 01-ENERO MANTENIMIENTO RUTINARIO


DESCRIPCION	MONTO CONTRATO	VALORIZACION				% AVANCE
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUM.	SALDO	
1.- VALORIZACION CONTRACTUAL						
Valorización No. 01	302,631.01	-	25,219.26	25,219.26	277,411.76	8.33%
	302,631.01	0.00	25,219.26	25,219.26	277,411.76	8.33%
Avance Ejecutado		0.000%	8.333%	8.333%		
Avance Programado		0.000%	8.333%	8.333%		
2.- REAJUSTES						
Reajuste de la Valorización No. 05		-	-	-		
Regularización Reajuste Valorización anteriores		-	-	-		
Retención por atraso de Obra		-	-	-		
*El reajuste no se aplica según CGC 47.1		0.00	0.00	0.00		
A.- VALORIZACION BRUTA (sin IGV) (1+2)		0.00	25,219.26	25,219.26		
3.- RETENCIÓN POR GARANTIA						
Valorización No.01		-	-	-		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
* Contratista si solicita retención de garantía		0.00	0.00	0.00	0.00	
4.- AMORTIZACION POR ADELANTO MATERIALES						
Valorización No.01		-	-	-		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
5.- DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE						
Por Adelanto Directo		-	-	-		
Por Adelanto de Materiales		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto Directo		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto de Materiales		-	-	-		
		0.00	0.00	0.00		
B.- VALORIZACION NETA (sin IGV) (1)		0.00	25,219.26	25,219.26		
C.- MONTO NETO		0.00	25,219.26	25,219.26		
D.- I.G.V. (18% DE B)		0.00	4,539.47	4,539.47		
E.- MONTO A CANCELAR (C+D)		0.00	29,758.72	29,758.72		
F.- MONTO A FACTURAR (A*0.18)		0.00	29,758.72	29,758.72		

Para efectos de control de avance de ejecución del servicio, se ha determinado que Como el monto de la valorización acumulada ejecutada es mayor que el 80% del monto de la valorización acumulada programada, la obra se encuentra dentro del atraso permisible, por lo que no es necesario que el contratista presente el calendario acelerado de avance de obra (CAAO). En ella se puede visualizar que el avance programado para el mes de enero 2021, incluyendo la situación actual del servicio y el realmente ejecutado acumulado Promedio de los dos tramos es de 8.33 %, es decir la obra está en su avance normal, frente a lo programado de 8.33%.



PERIODO	VALORIZACIONES DE SERVICIO PROGRAMADA					VALORIZACIONES DE SERVICIO REAL					SITUACION DE SERVICIO	
	CONTRATO ORIGINAL	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)		PRINCIPAL TOTAL	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)		SERVICIO	%
		PARCIAL	ACUM. (A)	PARCIAL	ACUM.		PARCIAL	ACUM. (B)	PARCIAL	ACUMULADO		
ENE. 2021	29,758.72	29,758.72	29,758.72	8.33%	8.33%	29,758.72	29,758.72	29,758.72	8.33%	8.33%	ADELANTADA	0.00%
FEB. 2021	29,758.72	29,758.72	59,517.43	8.33%	16.67%							
MAR. 2021	29,758.72	29,758.72	89,276.15	8.33%	25.00%							
ABR. 2021	29,758.72	29,758.72	119,034.86	8.33%	33.33%							
MAY. 2021	29,758.72	29,758.72	148,793.58	8.33%	41.67%							
JUN. 2021	29,758.72	29,758.72	178,552.30	8.33%	50.00%							
JUL. 2021	29,758.72	29,758.72	208,311.01	8.33%	58.33%							
AGO. 2021	29,758.72	29,758.72	238,069.73	8.33%	66.67%							
SET. 2021	29,758.72	29,758.72	267,828.44	8.33%	75.00%							
OCT. 2021	29,758.72	29,758.72	297,587.16	8.33%	83.33%							
NOV. 2021	29,758.72	29,758.72	327,345.88	8.33%	91.67%							
DIC. 2021	29,758.72	29,758.72	357,104.59	8.33%	100.00%							
TOTALES	357,104.60	357,104.60				29,758.72	29,758.72					

DIAGRAMA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

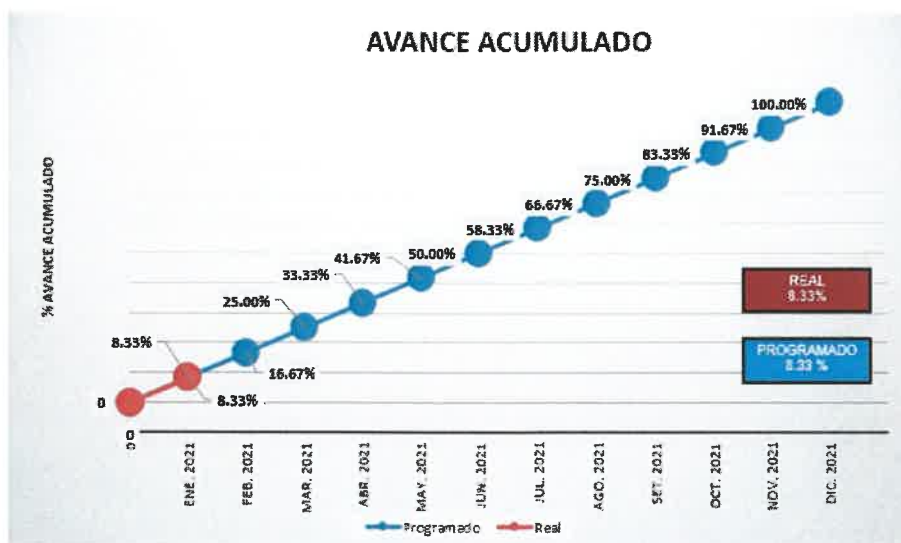

La retención de la Garantía de Fiel Cumplimiento, que tiene como responsabilidad el CONSORCIO SANTA ROSA, en dejar como garantía del trabajo a ejecutar, fue descontado en las dos primeras Valorizaciones concerniente a los meses de Setiembre y octubre del 2020 en la ejecución del Mantenimiento Periódico.

Dentro del contenido del informe mensual del contratista, de valorización N° 01 al mes de enero del 2021, nos detalla las pólizas de seguros por la compañía de seguros MAFRE PERU relacionadas a bajo la POLIZA DE PENSIONES N° 7012100025945 Y CONTRATO DE SALUD N° 7022100030229, con vigencia desde el 01/01/2021 hasta el 31/01/2021, con las coberturas de pensiones y salud por trabajo en riesgo según la ley N° 26790 Y normas complementarias



CONCLUSIÓN:

Conforme al EVALUACION DEL AVANCE VALORIZADO RESPECTO AL PROGRAMADO, del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIR), LONG. 13.00 KM.; MUNGURRAL - SANTA ROSA – OYON, LONG. 15.00 KM, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, ubicado en el distrito de Santiago de Chuco, Provincia de Santiago de Chuco, Departamento la Libertad, se encuentra en estado de avance normal; por cuanto el acumulado programado de los dos tramos para el mes de ENERO del 2021 es el 8.33 % contra lo realmente ejecutado que es el 8.33%, Como el monto de la valorización acumulado ejecutada es mayor que el 80% del monto de la valorización acumulada

programada, la obra se encuentra dentro de lo permisible, por lo que no es necesario que el contratista presente el calendario acelerado de avance de obra (CAAO)

Las cargas de trabajo conciliados entre el INSPECTOR y el Residente del SERVICIO, han generado la VALORIZACION DEL SERVICIO N° 01, correspondiente a los trabajos ejecutados en el periodo comprendido entre el 01/01/2021 hasta el 31/01/2021 por la empresa contratista CONSORCIO SANTA ROSA, el mismo que asciende a la suma de **S/. 29,758.72 (VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 72/100 SOLES), INC. EI IGV**

Las pólizas de seguros contra accidentes personales emitidas por la compañía aseguradora POLIZA DE PENSIONES N° 7012100025945 Y CONTRATO DE SALUD N° 7022100030229, con vigencia desde el 01/01/2021 hasta el 31/01/2021, con las coberturas de pensiones y salud por trabajo en riesgo según la ley N° 26790 Y normas complementarias, a favor de la empresa **INVERSIONES Y TRANSPORTES APUS EIRL., DE FECHA 19/03/2021, se encuentra ACTIVO.**















Después de haber evaluado el informe del Inspector con respecto a la valorización del servicio N° 01 por los trabajos ejecutados por el **CONSORCIO SANTA ROSA**, durante el periodo comprendido entre el 01/01/2021 hasta el 31/01/2021, del servicio de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIR), LONG. 13.00 KM.; MUNGURRAL - SANTA ROSA – OYON, LONG. 15.00 KM, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD", la misma que asciende a la suma de **S/. 29,758.72 (VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 72/100 SOLES), INC. EI IGV**, esta gerencia da su **CONFORMIDAD** respectiva al informe N° 070-2021-JO/IVPSCH/LFGCH, así mismo, el Inspector de servicio y área responsable emiten su opinión favorable mediante **Informe N° 0313-2021-MPSCH/DST/SGI** para que se continúe con trámite respectivo de dicha valorización.

RECOMENDACION

Hacer efectivo la Valorización del SERVICIO N° 01 mes de ENERO 2021, por un monto a Pagar de **S/. 29,758.72 (VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 72/100 SOLES), INC. EI IGV**, por el periodo comprendido entre el 01/01/2021 hasta el 31/01/2021, generado por el avance de los trabajos ejecutados en el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIR), LONG. 13.00 KM.; MUNGURRAL - SANTA ROSA – OYON, LONG. 15.00 KM, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, la misma que está a cargo del contratista, **CONSORCIO SANTA ROSA** e Inspeccionado por el Inspector de servicio el **ING. GILEMR ENRIQUE BAZAN CISNEROS**, para efectos consiguientes a este informe se hace llegar la siguiente documentación:

Sin otro particular, me suscribo de Usted, no sin antes reiterar mi estima personal.

Atentamente,
Adjunta:

-  Informe N° 70-2021-JO/IVPSCH/LFGCH
-  INFORME N° 08-2021-IVP-MPSCH/TACSMRP/NBP
-  Informe N° 0313-2021-MPSCH/DST/SGI
-  CARTA N° 006-2021-ING. GEBC-IO/MPSCH
-  CARTA N° 098-2021-MPSCH/DST/SGI
-  CARTA N° 009-2021-MPSCH-IVP-SCH/VRK
-  Informe N° 0291-2021-MPSCH/DST/SGI
-  INFORME 003-2021 ING° GEBC-IO/MPSCH
-  INFORME 001-2021 ING° GEBC-IO/MPSCH
-  CARTA N° 003-2021-RCONSORCIOSANTAROSA
-  CONTRATO N° 002-2020-MPSCH-LOG
-  02 archivador Original de la valorización presentada por el contratista
-  Planilla de Valorización N° 01 resumida por la entidad
-  Resumen de la Valorización del servicio N° 01 por la entidad


INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Valencio Reaza Rafael K.
CIP 218511
GERENTE GENERAL



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD



RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 01 ENERO 2021, POR LA EJECUCIÓN DEL: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIR); MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ROSA
INSPECTOR : ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS
SERVICIO : TRAMO: L. MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIR); MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON

N° Contrato	: N° 002-2020-MPSCHILOG
Plazo de Ejecución M. R.	360 Días Calendarios
Anticipo	:S/0.00 Sin IGV
Adelanto de Materiales	:S/0.00 Sin IGV
Fecha Inicio Ejec. Servicio	: 1 enero 2021
Fecha Término Servicio	: 28 diciembre 2021

ACTIVIDAD	COSTO DIRECTO (S/.)	GASTOS GENERALES 10%	UTILIDAD 5%	SUB TOTAL	IGV 18%	TOTAL S/.
MANTENIMIENTO RUTINARIO	263,157.41	26,315.74	13,157.87	302,631.02	54,473.58	357,104.60
TOTAL S/.	263,157.41	26,315.74	13,157.87	302,631.02	54,473.58	357,104.60

N° Valorización	Valorización Bruta	Reintegro de Valorización	Reajuste de Reintegro de Valorización	Deducción del reajuste que no corresponde	Retención Según Art. 151 DS 344-2018-EF Reglamento de la ley N° 30225		MONTOS A PAGAR S/IGV	IGV	Valorización del mes		
					Retención de Garantía 10%	Retención Inc. IGV			Adelanto	Amortización	Actual
V. N° 01. Ene. 2021	25,219.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,219.26	4,539.47	0.00	29,758.72	8.33%
V. N° 02. Feb. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
V. N° 03. Mar. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
V. N° 04. Abr. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
V. N° 05. May. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
V. N° 06. Jun. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
V. N° 07. Jul. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
V. N° 08. Ago. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
V. N° 09. Set. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
V. N° 10. Oct. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
V. N° 11. Nov. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
V. N° 12. Dic. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Parcial	25,219.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,219.26	4,539.47	0.00	29,758.72	

ADICIONALES											
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General	25,219.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,219.26	4,539.47	0.00	29,758.72	

NOTA: Conforme lo establece el Resolución de Superintendencia N° 071-2018/SUNAT, a partir del 01 de abril de 2018, los siguientes servicios, contenidos en el Anexo 3 de la R.S. 183-2004/SUNAT, cuyo nacimiento de la obligación tributaria del IGV se origine a partir de dicha fecha, estarán sujetos a la aplicación del 12%:



JEFE DE OPERACIONES
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

GERENTE GENERAL
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

224

223

ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO : *SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIR); MUNGUERRAL - SANTA ROSA - OYON, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD*

CONTRATO : N° 002-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR : ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS

CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ROSA




Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD



RESUMEN DE PAGO N° 01 - ENERO 2021
CONTRATO N° 002-2020-MPSCH/LOG **MES DE ENERO 2021**

PAGO A CUENTA A CANCELAR AL CONTRATISTA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONCEPTO		MONTOS
		S/.
1.- Monto Valorizado sin Reajuste en el presente mes :		25,219.26
- Valorizacion No.01		25,219.26
2.- Reajuste de las Valorizaciones :		0.00
- Reajuste de la Valorizacion No.01		0.00
- Regularizacion Reajuste Valorización anterior		0.00
- Retención por atraso de Obra		0.00
* El reajuste no se aplica según CGC 47.1		
A.- VALORIZACION BRUTA (VB) (sin IGV) (1+2)	S/.	25,219.26
3.- Retención de Garantía :		0.00
- En la Valorizacion No.01		0.00
- Regularización Valorizaciones anteriores		0.00
* Contratista no solicito retención de Garantia		
4.- Amortizacion del Adelanto de Materiales :		0.00
- En la Valorizacion No.01		0.00
- Regularización Valorizaciones anteriores		0.00
* Contratista no solicito adelanto		
5.- Deducción del Reajuste que no corresponde :		0.00
- Por Adelanto Directo		0.00
- Por Adelanto de Materiales		0.00
- Por Regularización del Adelanto Directo		0.00
- Por Regularización del Adelanto de Materiales		0.00
B.- VALORIZACION NETA (sin IGV) (1)	S/.	25,219.26
C.- MONTO NETO	S/.	25,219.26
D.- I.G.V. (18% DE B)	S/.	4,539.47
E.- MONTO A CANCELAR (C+D)	S/.	29,758.72
F.- MONTO A FACTURAR (A*0.18)	S/.	29,758.72



ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: : *SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIR); MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

CONTRATO : N° 002-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR : ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS

CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ROSA



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD



RESUMEN GENERAL VALORIZACION N° 01-ENERO MANTENIMIENTO RUTINARIO

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO	VALORIZACION			SALDO	% AVANCE
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUM.		
1.- VALORIZACION CONTRACTUAL						
Valorizacion No. 01	302,631.01	-	25,219.26	25,219.26	277,411.76	8.33%
	302,631.01	0.00	25,219.26	25,219.26	277,411.76	8.33%
Avance Ejecutado		0.000%	8.333%	8.333%		
Avance Programado		0.000%	8.333%	8.333%		
2.- REAJUSTES						
Reajuste de la Valorizacion No. 05		-	-	-		
Regularizacion Reajuste Valorización anteriores		-	-	-		
Retención por atraso de Obra		-	-	-		
*El reajuste no se aplica según CGC 47.1		0.00	0.00	0.00		
A.- VALORIZACION BRUTA (sin IGV) (1+2)		0.00	25,219.26	25,219.26		
3.- RETENCIÓN POR GARANTIA						
Valorizacion No.01		-	-	-		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
* Contratista si solicitó retención de garantía		0.00	0.00	0.00	0.00	
4.- AMORTIZACION POR ADELANTO MATERIALES						
Valorizacion No.01		-	-	-		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
5.- DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE						
Por Adelanto Directo		-	-	-		
Por Adelanto de Materiales		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto Directo		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto de Materiales		-	-	-		
		0.00	0.00	0.00		
B.- VALORIZACION NETA (sin IGV) (1)		0.00	25,219.26	25,219.26		
C.- MONTO NETO		0.00	25,219.26	25,219.26		
D.- I.G.V. (18% DE B)		0.00	4,539.47	4,539.47		
E.- MONTO A CANCELAR (C+D)		0.00	29,758.72	29,758.72		
F.- MONTO A FACTURAR (A*0.18)		0.00	29,758.72	29,758.72		



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

PRESUP. OFERTADO (CD+GG+J) S/IGV 302,631.01

SERVICIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIR); MUNGUJRAL - SANTA ROSA - OYON, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

PRESUP. OFERTADO (CD+GG+J) INCI/IGV 357,104.60
 FECHA DE PRESUPUESTO 01/09/2020
 PLAZO DE EJECUCION 360 d.c. (12 meses)
 FECHA DE INICIO Y TERMINO CONTRACTUAL 01/01/2021 - 26/12/2021



Instituto Vial Provincial
 PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD



CONTRATO : N° 002-2020-MPSC-HILOG
 INSPECTOR : ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS
 CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ROSA

VALORIZACION DE AVANCE DE SERVICIO N° 01, MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021

FORMULA 01 : SERVICIO PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	MONTO CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE VALORIZACION		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
			P.U.	SOLES	SOLES	%	SOLES	%	SOLES	%	SOLES	%
01	EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIR)			122,180.22	0.00	0.00%	10,181.69	8.33%	10,181.69	8.33%	111,998.54	91.67%
01.01	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	Glb	122,180.22	122,180.22	-	-	10,181.69	8.33%	10,181.69	8.33%	111,998.54	91.67%
02	Mungujral - Santa Rosa - Oyon			140,977.17	0.00	0.00%	11,748.10	8.33%	11,748.10	8.33%	129,229.07	91.67%
02.01	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	Glb	140,977.17	140,977.17	-	-	11,748.10	8.33%	11,748.10	8.33%	129,229.07	91.67%
A-	COSTO DIRECTO			263,157.40	-	-	21,929.79		21,929.79		241,227.61	
B-	GASTOS GENERALES		10.000%	26,315.74	0.00		2,192.98		2,192.98		24,122.77	
C-	UTILIDAD		5.000%	13,157.87	0.00		1,096.49		1,096.49		12,061.38	
D-	SUB TOTAL			302,631.01	0.00		25,219.26		25,219.26		277,411.76	
E-	I.G.V.			54,473.58	-		4,539.47		4,539.47		49,934.12	
F-	TOTAL			357,104.60	-		29,758.72		29,758.72		327,345.87	
G-	PORCENTAJE			100.00%	0.00%		8.33%		8.33%		91.67%	



22

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUDA BANA - Em. U-122 (QUISURJI, MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

CONTRATO : N° 002/2020/MPSC/CHCLOG
INSPECTOR : ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS
CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ROSA



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD





CUADRO COMPARATIVO DE AVANCES : PROGRAMADO VS EJECUTADO (CURVA "S") COMPARACION EFECTUADA CON EL CAOA N° 01

PERIODO	CONTRATO ORIGINAL		VALORIZACIONES DE SERVICIO PROGRAMADA		VALORIZACIONES DE SERVICIO REAL		SITUACION DE SERVICIO		
	PARCIAL	TOTAL	ACUM. (A)	PARCIAL	ACUM. (B)	PARCIAL	ACUMULADO	SERVICIO	%
ENE. 2021	29,758.72	29,758.72	29,758.72	8.33%	29,758.72	29,758.72	29,758.72	ADELANTADA	0.00%
FEB. 2021	29,758.72	29,758.72	59,517.43	16.67%					
MAR. 2021	29,758.72	29,758.72	89,276.15	25.00%					
ABR. 2021	29,758.72	29,758.72	119,034.86	33.33%					
MAY. 2021	29,758.72	29,758.72	148,793.58	41.67%					
JUN. 2021	29,758.72	29,758.72	178,552.30	50.00%					
JUL. 2021	29,758.72	29,758.72	208,311.01	58.33%					
AGO. 2021	29,758.72	29,758.72	238,069.73	66.67%					
SET. 2021	29,758.72	29,758.72	267,828.44	75.00%					
OCT. 2021	29,758.72	29,758.72	297,587.16	83.33%					
NOV. 2021	29,758.72	29,758.72	327,345.88	91.67%					
DIC. 2021	29,758.72	29,758.72	357,104.59	100.00%					
TOTALES	357,104.60	357,104.60			29,758.72	29,758.72	29,758.72		



NOTAS :
1.- Montos que considera costo directo + gastos generales + utilidad, montos sin incluir IGV.
2.-En el avance programado se ha considerado el Calendario de Avance Servicio que corresponde al mes de setiembre

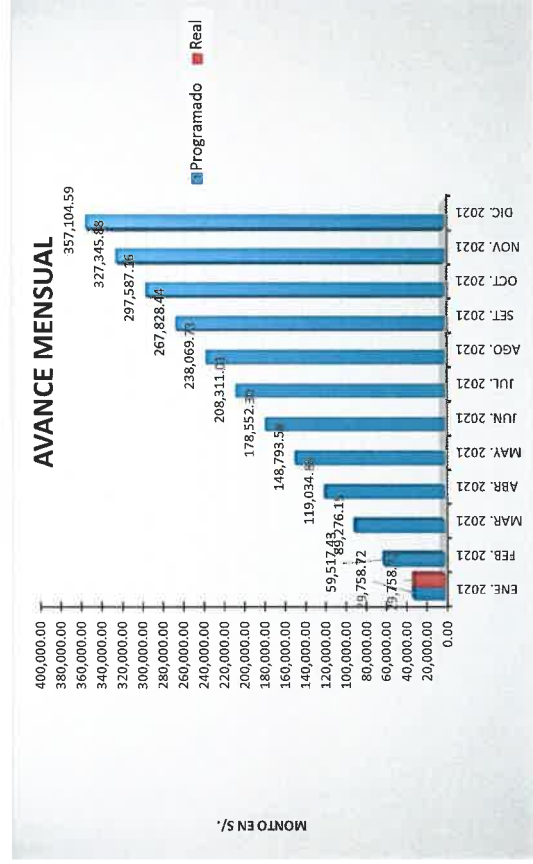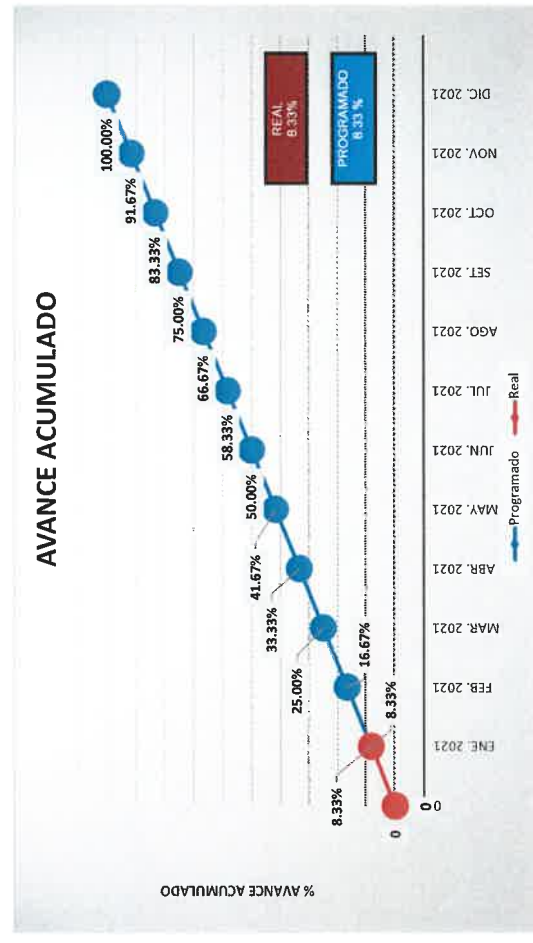

20

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUR); MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATO: N° 002-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR: ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS

CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ROSA



Instituto Vial Provincial
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD



EVALUACION DEL AVANCE VALORIZADO RESPECTO AL PROGRAMADO

PRESUPUESTO	MONTO TOTAL X PRESUPUESTO	MONTO AVANCE ACUMULADO	
		VALORIZADO	PROGRAMADO
SERVICIO PRINCIPAL	357,104.60	29,758.72	29,758.72
TOTAL (Sin IGV)	357,104.60	29,758.72	29,758.72
		8.33%	8.33%

Situación de Obra	$S/.29,758.72 > S/.29,758.72 \implies$	Adelantada
		0.000%

<u>VERIFICACION SI REQUIERE CALENDARIO ACELERADO (ART. 205 DEL RLCE)</u>	
a.- Monto Valorizacion Acumulado Programado	29,758.72
b.- Porcentaje art. 205 del Reglamento.	80%
c.- Monto Tope (80% de a)	23,806.97
d.- Monto Valorizacion Acumulado Ejecutado	29,758.72
Se tiene que:	
$(d) > (c) \implies$	$S/.29,758.72 > S/.23,806.97$
Conclusion :	
Como el monto de la valorizacion acumulado ejecutada es mayor que el monto de la valorizacion acumulada programada, la obra se encuentra adelantada por lo que no procede comparacion por atraso según el art. 205 del RLCE.	



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

INFORME N° 070-2021-JO/IVPSCH/LFGCH

A : ING. RAFAEL K. VALENCIA REBAZA
GERENTE DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

DE : ING. LUIS F. GUTIERREZ CHÁVEZ
JEFE DE OPERACIONES DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

ASUNTO : ANÁLISIS DE VALORIZACIÓN N° 01 MES DE ENERO PARA EL SERVICIO MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: "EL MOLLE – CALLAIGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR), LONG= 13.000 KM" Y "MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON, LONG= 15.000 KM" DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.



REFERENCIA :

MONITOR DESIGNADO POR IVP	a)	INF. N°008-2021-IVP-MPSCH/TACMR/NBP
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	b)	INF. N°313-2021-MPSCH/DIST/SGI
INSPECTOR DE SERVICIO	c)	INF N°006-2021 ING° GEBC-IO/MPSCH
CONTRATISTA	f)	CARTA N°006-2021-CONSORCIO SANTA ROSA

FECHA : SANTIAGO DE CHUCO, 29 DE ABRIL DEL 2021

Por medio del presente informe, le expreso mi cordial saludo y afecto, a su vez alcanzo el análisis de la VALORIZACIÓN N°01 del SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL **RUTINARIO** DE LOS CAMINOS VECINALES: "EL MOLLE – CALLAIGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR), LONG= 13.000 KM" Y "MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON, LONG= 15.000 KM" DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, correspondiente al mes de enero (del 01 al 31) de 2021, la cual **cuenta con la conformidad del ÁREA RESPONSABLE** de la ejecución (documento de referencia b) y la ha remitido al ÁREA USUARIA para su análisis y posterior conformidad por parte del gerente de esta; siguiendo la ruta de trámite para pagos de los servicios que se estipula en los Términos de Referencia del Proceso.

Es por ello que esta Jefatura de Operaciones, a través de los técnicos administrativos con los que cuenta el IVP-MPSCH (área usuaria), evalúa las valorizaciones para dar un análisis de la misma con la finalidad de advertir cualquier observación que se haya omitido en las verificaciones anteriores, siguiendo la ruta de trámite estipulada. Para este caso, **el técnico administrativo Ing. Marcial Nicolás Barrantes Parimango ha elaborado el respectivo análisis** (documento de referencia a) en base a la documentación presentada, contrastándola con la reglamentación en la cual se suscribe este proceso (Ley de Contrataciones, Términos de Referencia, Plan de Trabajo, Decreto de Urgencia N° 070-2020).

I. INFORME GENERAL:

Nombre de Servicio : SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: "EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (EL QUIGUIR) LONG= 13.000 KM" Y "MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON LONG= 15.000 KM" DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.

EJECUTOR:

Convocatoria del servicio : RES-PROC-17-2020-MPSCH/CS-1
 Fuente de Financiamiento : Recursos por operaciones oficios de crédito
 Modalidad Contratación : A suma alzada
 Contrato de Servicio : N° 002-2020-MPSCH-LOG
 Decreto de Urgencia : N° 070-2020
 Fecha de Suscripción : 21-08-2020
 Contratista : CONSORCIO SANTA ROSA
 Monto Referencial del Servicio : S/. 2, 386,664.00 (INCL. IGV)
 Monto del Contrato del Servicio : S/. 2, 380,697.34 (INCL. IGV).
 Adelanto Directo : NO APLICA
 Plazo de Ejecución : MANTENIMIENTO RUTINARIO – 360 DC
 Fecha Inicio Servicio Contractual : 01/01/2021
 Fecha Término Servicio Contractual : 31/12/2021

INSPECCIÓN:

Inspector de Servicio : Ing. Gilmer Enrique Bazán Cisneros
 Resolución de designación : R. Subgerencia Infraestructura N°003-2021-MPSCH
 Fecha de Designación : 03/01/2021

II. ANALISIS

Basándose en la información detallada de los documentos de referencia, vemos que no se advirtieron observaciones, asimismo, no se consignó penalidad, cumpliendo con la ejecución programada, en el plazo correspondiente y bajo la normativa vigente. Por lo que se tiene el siguiente resumen:

CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ROSA
INSPECTOR : ING.GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS
FASE : III-MANTENIMIENTO RUTINARIO
TRAMO 1 : EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (EL QUIGUIR) LONG= 13.000 KM
TRAMO 2 : MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON LONG= 15.000 KM

MONTO	S/IGV	IGV	TOTAL
TRAMO 1	140,507.25	25,291.31	165,798.56
TRAMO 2	162,123.76	29,182.28	191,306.04
TOTAL	302,631.01	54,473.58	357,104.60

TRAMO 1					AVANCE	
N° Valorización	Monto Bruto	IGV (18%)	PENALIDAD	Valorización del mes	Actual	Acuml.

N° 01. Enero	S/.11,708.94	S/.2,107.61	S/.0.00	S/.13,816.55	8.33%	8.33%
N° 02. Febrero						
N° 03. Marzo						
N° 04. Abril						
N° 05. Mayo						
N° 06. Junio						
N° 07. Julio						
N° 08. Agosto						
N° 09. Septiembre						
N° 10. Octubre						
N° 11. Noviembre						
N° 12. Diciembre						
TOTAL				S/.13,816.55		

TRAMO 2					AVANCE	
N° Valorización	Monto Bruto	IGV (18%)	PENALIDAD	Valorización del mes	Actual	Acuml.
N° 01. Enero	S/.13,510.31	S/.2,431.86	S/.0.00	S/.15,942.17	8.33%	8.33%
N° 02. Febrero						
N° 03. Marzo						
N° 04. Abril						
N° 05. Mayo						
N° 06. Junio						
N° 07. Julio						
N° 08. Agosto						
N° 09. Septiembre						
N° 10. Octubre						
N° 11. Noviembre						
N° 12. Diciembre						
TOTAL				S/.15,942.17		

TOTAL VALORIZADO POR PAQUETE				S/.29,758.71	8.33%	8.33%
-------------------------------------	--	--	--	---------------------	--------------	--------------

Donde se tiene un **avance total del 8.33%** y el monto valorizado de este mes es de **S/.15,942.17 (QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 17/00 NUEVOS SOLES) incluido IGV.**

III. CONCLUSIONES

Tomando en cuenta lo analizado anteriormente, se hace las siguientes conclusiones:

- ❖ El saldo total a pagar por la **VALORIZACIÓN N° 01 - ENERO** de la FASE III del servicio es de **S/.15,942.17 (QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 17/00 NUEVOS SOLES inc. IGV).**
- ❖ El avance acumulado total del servicio hasta enero es del **8.33%.**
- ❖ **No se presentaron PENALIDADES.**
- ❖ Es da **VALIDEZ** a la documentación presenta.

IV. RECOMENDACIONES

Se recomienda dar la **CONFORMIDAD** del ÁREA USUARIA a la presente VALORIZACIÓN N° 01 – ENERO, por parte del Gerente del Instituto Vial Provincial de Santiago de Chuco, quien es el representante de dicha área; a fin de realizar el pago correspondiente al CONSORCIO SANTA ROSA, conforme a lo estipulado en el cronograma programado del Plan de Trabajo.

Es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y fines.

ATENTAMENTE



INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE
SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Cutierrez Chavez Luis F
C.I.E. 496782
JEFE DE OPERACIONES

214



Instituto Vial Provincial

Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD



MPSCH

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

INFORME N° 008-2021-IVP-MPSCH/TACSMRP/NBP

Handwritten signature and date: 29/04/21

A : Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Santiago Chuco

DE : Ing. Nicolás Barrantes Parimango
Técnico Administrativo del Área del IVP – MSCH – La Libertad

ASUNTO : ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACION N° 01 MES DE ENERO PARA TRAMITE RESPECTIVO

Servicio: Mantenimiento Periódico y Rutinario de los Caminos Vecinales Tramos:

1. - EL MOLLE – CALLAIGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR) - LONG. = 13.000 KM

2. - MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON - LONG. = 15.000 KM – DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD

REFERENCIA : CARTA N° 001-2021
CARTA N° 0001-2021-CONSORCIO SANTA ROSA
INFORME N° 001-2021-ING° GEBE-IO/MPSCH
CARTA N° 003-2021
CARTA N° 003-2021-CONSORCIO SANTA ROSA
INFORME N° 003-2021 ING° GEBE-IO/MPSCH
INFORME N° 0291-2021-MPSCH/DIST/SGI
CARTA N° 010-2021/NBP/TACSMRP
INFORME N° 050-2021-JO/IVPSCH/LFGCH
CARTA N° 009-201-MPSCH-IVP-SCH/VRRK
CARTA N° 009-2021-MPSCH-SG/DIST
INFORME N° 005-2021 ING° GEBE-IO/MPSCH
CARTA N° 0006-2021-CONSORCIO SANTA ROSA
INFORME N° 006-2021 ING° GEBE-IO/MPSCH
INFORME N° 0313-2021-MPSCH/HMMMT/SG
CONTRATO N°002-2020-MPSCH-LOG, de fecha 21/08/2020
D.U.N° 070-2020

FECHA : Santiago de Chuco, 29 de abril del 2021

I.- ANTECEDENTES:

1. DEL CONTRATISTA

Con fecha 13 de agosto de 2020 el Comité de Selección, adjudico la Buena Pro del **PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 017-2020-MPSCH/CS – SEGUNDA CONVOCATORIA**, para la ejecución del **SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR) – LONG. = 13.000 KM – MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON - LONG. = 15.000 KM**

213 84



Instituto Vial Provincial

Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD



MPSCH

– DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD al CONSORCIO VIAL SANTA ROSA.

Mediante CONTRATO DE SERVICIO N° 002-2020-MPSCH-LOG, que celebra de una parte la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, en adelante la ENTIDAD, con RUC N° 20187630101, con domicilio legal en calle Paco Yunque N° 735 – Santiago de Chuco, representada por su Gerente Municipal **Abog. Felipe Wilmer Angulo Zavaleta**, identificado con D.N.I. N° 18185361, con delegación de facultades mediante Resolución de Alcaldía N° 219-2020-MPSCH de fecha 10 de agosto de 2020, y de otra parte el **CONSORCIO SANTA ROSA**, conformado por **INVERSIONES Y TRANSPORTES APUS E.I.R.L.** (70% de participación), con RUC N° 20602945171, con domicilio legal en Jr. Teresa Gonzales de Faning N° 501 Barrio Centenario Oeste Ancash – Huaraz – Independencia, inscrita en la Partida Electrónica N° 11305824, en la Oficina Registral de Huaraz, debidamente representado por su Representante Legal Sra. Nicodemos Salazar Nancy, con DNI N° 44797900 y **JEANS CONSTRUCTOR S.A.C.** (30% de participación), con RUC N° 20533765506, con domicilio legal en Jirón Enrique Palacios 420 BR Pumacayan (por la iglesia san Francisco) / Ancash – Huaraz – Huaraz, inscrita en la Partida Electrónica N° 11137331 del Registro de Personas Jurídicas en la Oficina Registral de Huaraz, debidamente representado por su Representante Legal Sr. Morales Olivera Alex Fernando, con DNI N° 31677794, consignado como representante común del consorcio a la Sra. Nicodemos Salazar Nancy, con D.N.I. N° 44797900, con Domicilio Legal en Jr. Teresa Gonzales de Faning N° 501 Barrio Centenario Oeste Ancash – Huaraz – Independencia, a quien en adelante se le denominara **EL CONTRATISTA**.

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE SERVICIO DEL **MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR) LONG. = 13.000 KM – MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON - LONG. = 15.000 KM – DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.**

El monto total para la ejecución del servicio asciende a S/. 2,380,697.34 (Dos Millones Trescientos Ochenta Mil Seiscientos Noventisiete con 34/100 Soles), que incluyen todos los impuestos de ley.

2.- DEL INSPECTOR

Mediante RESOLUCION SUB GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA N° 003-2021-MPSCH, de fecha 03 de enero del 2021, SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR AL ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS, como INSPECTOR del “MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR) – MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON , SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD”

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR AL ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS, como INSPECTOR del “MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122



Instituto Vial Provincial



Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD

MPSCH

(QUIGUR) – MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON, SANTAIGO DE CHUCO – LA LIBERTAD”, por un periodo de 59 días calendarios.

1.- INFORMACION CONTRACTUAL

- 1.1. NOMBRE DEL SERVICIO : Mantenimiento Periódico y Rutinario de los Caminos Vecinales Tramo El Molle – Callayguida Baja – Emp. LI – 122 (Quiguir) Long. = 13.000 Km – Mungurrall – Santa Rosa – Oyon Long. = 15.000 Km - Distrito de Santiago de Chuco – Provincia de Santiago de Chuco – La Libertad
- 1.2. N° DE CONTRATO : CONTRATO N° 002-2020-MPSCH-LOG
- 1.3. ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
- 1.4. CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ROSA (INVERSIONES Y TRANSPORTES APUS E.I.R.L. – JANS CONSTRUCTOR S.A.C.)
- 1.5. INSPECTOR : ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS (periodo de 59 d.c.). RESOLUCION SUB GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA N° 003-2021-MPSCH), de fecha 03.01.2021
- 1.6. PLAZO DE EJECUCION : 360 Días Calendarios. (Mantenimiento Rutinario)
- 1.7. MONTO DE CONTRATO : S/. 2,380,697.34
- 1.8. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO : S/. 357,104.60
- 1.9. PLAZO DE EJECUCION MANT. RUTINARIO : 360 Días Calendarios
- 1.10. FECHA DE INICIO : 01/01/2021
- 1.11. FECHA DE CULMINACION : 26/12/2021

2. SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA - MPSCH

Del Informe N° 0291-2021-MPSCH/DIST/SGI, emitido por el Ing. David Ivan Silva Torres (Sub Gerente de Infraestructura), en el ITEM II ANALISIS: (se transcribe lo siguiente)

SE EXPONE LA DEMORA DE LA CONFORMIDAD

Al hecho, se debe la carga laboral, que se tienen en la Municipalidad Provincial Santiago de Chuco, especificamente en el área de la Sub Gerencia de Infraestructura se nos hizo imposible realizar la gestión necesaria y dar la conformidad de la VALORIZACION N° 01-RUTINARIO-ENERO del respectivo consorcio, informo a su despacho a efectos de solicitarse se sirva a realizar o emitir los actos administrativos, para que se pueda continuar con el tramite correspondiente, es por ello que pese a que como se ha manifestado producto de la carga laboral y al no contar con personal que desempeñe el cargo DE SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA (DEJANDO COMO ENCARGADO AL ING. HERMES M. MELENDEZ TAMAYO QUE YA DE POR SI VENIA DESEMPEÑANDO 3 ENCARGATURAS), siendo uno de los principales motivos ya que se nos fue imposible tramitar de igual manera



Instituto Vial Provincial

Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD



MPSCH

valorizaciones de obras por contrata, obras por administración directa y actualmente los servicios de mantenimiento que se venían ejecutando, cabe indicar que actualmente me he reincorporado a mis labores por tal motivo expongo y pido la comprensión de la demora de la conformidad de pago de la presente valorización.

3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS – FASE III

Las actividades ejecutadas son las siguientes:

1. - EL MOLLE – CALLAIGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR) - LONG. = 13.000 KM
2. - MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON - LONG. = 15.000 KM

FASE III

MR-100 MANTENIMIENTO RUTINARIO

MR-101 LIMPIEZA DE CALZADA

DESCRIPCION:

Consistió en la remoción de piedras, material suelto, vegetación y cualquier otro elemento caído sobre la superficie de rodadura.

MR-102 BACHEO – CAMINO TIPO I

Se procedió en rellenar y compactar con herramientas manuales los baches o depresiones que pudieran presentarse en la superficie de rodadura.

PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL

Se realizó la conformación y la compactación de material superficial de la plataforma de la vía.

MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

MR-201 LIMPIEZA DE CUNETAS

Se procedió al retiro y posterior eliminación de material acumulado o sedimentado, alojado en las cunetas.

MR-202 LIMPIEZA DE ALCANTARILLA

Se ejecutó el retiro y posterior eliminación de todo tipo de material o residuo que obstruía el libre flujo del agua, a través de la alcantarilla.

MR-205 LIMPIEZA DE PONTONES

Se ejecutó la limpieza en las partes visibles del pontón tales como: tablero, estribos, barandas y elementos de drenaje.

MR-206 ENCAUZAMIENTO DE PEQUEÑOS CURSOS DE AGUA

Se procedió en desviar los pequeños cursos de agua hacia las estructuras de drenaje.

MR- 400 SEGURIDAD VIAL

MR 401 CONSERVACION DE SAÑALES

Se realizó el mantenimiento de las señales preventivas, informativas y postes kilométricos.



MR- 600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

MR-601 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

Se observo el estado permanente del camino detectando los hechos que puedan afectar su transitabilidad.

POR TANTO:

1. - EL MOLLE – CALLAIGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR) - LONG. = 13.000 KM

MONTO MANT. RUT.	VALORIZACION ANTERIOR N°	VALORIZACION ACTUAL N° 01	MONTO A CANCELAR	SALDO DE PRESUPUESTO	% ACTUAL	% ACUM.
165,798.56	0.00	13,816.55	13,816.55	151,982.01	8.33 %	8.33

2. - MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON - LONG. = 15.000 KM

MONTO MANT. RUT.	VALORIZACION ANTERIOR N°	VALORIZACION ACTUAL N° 01	MONTO A CANCELAR	SALDO DE PRESUPUESTO	% ACTUAL	% ACUM.
191,306.04	0.00	15,942.17	15,942.17	175,363.87	8.33 %	8.33

El monto a cancelar al CONSORCIO SANTA ROSA, asciende a la suma de S/. 29,758.72 (Veintinueve Mil Setecientos Cincuentiocho con 72/100 Soles). con un avance fisico Actual de 8.33%.

4. RECOMENDACIONES

Se está alcanzando al Jefe de operaciones del IVP-SCH, Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez, para el trámite correspondiente de la Valorización N° 01, del **Servicio: "Mantenimiento Periódico y Rutinario de los Caminos Vecinales El Molle – Callayguida baja – Emp. LI-122 (Quiguir) Long= 13.000 Km – Mungurrall – Santa Rosa – Oyon – Long. = 15.000 Km – Distrito de Santiago de Chuco – Provincia de Santiago de Chuco – La Libertad.**

Es cuanto tengo que informar a Ud., para los fines que estime conveniente.


ADJUNTO:
01 ARCHIVADOR (F. 191)
01 ARCHIVADOR (F. 207)

Atentamente,


 Marcial Nicolás Barrantes Parimango
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 225678

2021
Pag 12

Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015-837019

RESOLUCIÓN SUB GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA N° 003-2021-MPSCH

Santiago de Chuco, 03 de Enero del 2021

VISTO: CARTA N° 003 - 2021 - MPSCH - IVP-SCH/VRK de fecha 02 de enero del 2021; y,
CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional sobre Descentralización, reconoce a las Municipalidades Provinciales la calidad de Órgano de Gobierno Local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972.

Que, conforme a lo establecido por los artículos 6° y 20° de la ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, la Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local, el Alcalde es el representante Legal de la Municipalidad y su máxima Autoridad Administrativa, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 43° de la referida Ley, las Resoluciones de Alcaldía aprueba y resuelven los asuntos de carácter administrativo.


Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 243-2019-MPSCH, de fecha 22 de abril de 2019, el Alcalde de la Municipalidad Provincial Santiago de Chuco, delega facultades administrativas al Sub Gerente de Infraestructura de esta dependencia municipal.

En cumplimiento a lo dispuesto en los términos de referencia según artículo 29 del D.U N°070-2020, donde nos detalla que la ejecución del mantenimiento rutinario entrara en vigencia a partir del día siguiente de suscrita el acta de terminación de las actividades de la FASE II,

Es por ello que conocedores de que los inspectores que fueron contratados para la ejecución de Mantenimiento Periódico, terminara suscribiendo el acta de terminación de actividades es por ello que en tal razón:


Mediante la CARTA N° 003 - 2021 - MPSCH - IVP-SCH/VRK de fecha 02 de enero del 2021, la GERENCIA DE IVP, solicita que se designe a los INGENIEROS que se harán cargo de la INSPECCION de los trabajos de MANTENIEMIENTOS RUTINARIOS DE LOS PAQUETES 17 Y 18.

17	RES-PROC-17-2020-MPSCH/CS-1	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP. LI-122 (QUIGUIR); SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD
		MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON; SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD
18	RES-PROC-18-2020-MPSCH/CS-1	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. LI-122 (LA PAZCA) - CACHUBAMBA - MONCHUGO - HUALALAY; SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD
		MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. LI-122 (PAIBAL) - RESERVA NACIONAL - QUIGUIR - SANTUARIO NACIONAL DE CALIPUY; SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD





Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 – Telf.: 837015-837019

Estando a los dispositivos legales de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N°27972 y la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225, Reglamento y Modificatorias.


SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR al ING, GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS como INSPECTOR del "MANTENIMEINTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP. LI-122 (QUIGUIR) – MUNGURRAL – SANTA ROSA - OYON; SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD."

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR al ING, GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS como INSPECTOR del "MANTENIMEINTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP. LI-122 (QUIGUIR) – MUNGURRAL – SANTA ROSA - OYON; SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD", por un periodo de 59 días calendarios.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR a las áreas correspondientes a fin de que tenga conocimiento de la presente resolución y a las empresas responsables para su respectivo cumplimiento.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Juan Silva Torres
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA




Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



INFORME N°0313-2021-MPSCH/HMMT/SG



A : ING. RAFAEL K. VALENCIA REBAZA.
Gerente del IVP.

DE : ING. DAVID IVAN SILVA TORRES.
Sub Gerente de Infraestructura- MPSCH.

ASUNTO : ALCANZO VALORIZACION N° 1 DEL MES DE ENERO DE LA OBRA:
"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EL MOLLE -
CALLAYGUIDA BAJA - EMP. LI-122 (QUIGUIR)- MUNGURRAL - SANTA ROSA -
OYON; PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD".

FECHA : Santiago de Chuco, 26 de abril del 2021.

De mi especial estimación.-

Me es sumamente honroso dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo; por otro lado, referente al asunto del presente manifiesto lo siguiente: ALCANZO VALORIZACIÓN N° 1 DEL MES DE ENERO DE LA OBRA: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP. LI-122 (QUIGUIR)-MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON; PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD". para el trámite correspondiente habiendo levantado todas las observaciones alcanzadas por el Área del Instituto Vial Provincial (IVP).

Seguro de su atención a la presente me despido, reiterándole mi muestra de alta estima consideración.

Adjunto:

02 archivadores ()

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO
Ing. David Ivan Silva Torres
Sub Gerente de Infraestructura



INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP N° 74375

206

INFORME N° 006-2021 ING° GEBC-IO/MPSCH.

A : ING° DAVID IVAN SILVA TORRES.
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA – MPSCH

ATENCIÓN : ING° RAFAEL KEVINALAN VALENCIA REBAZA
GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MPSCH

DE : ING° GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS.
INSPECTOR DE OBRA

ASUNTO : ALCANZO EL INFORME MENSUAL DE VALORIZACIÓN N°01 – ANEXO N°04
TRAMO: MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON Y EL MOLLE – CALLAYGUIDA
BAJA EMP LI-122(QUIGUIR) (LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA
VALORIZACION N°01 ENERO)


REFERENCIA : CONTRATO DE SERVICIO N°002-2020-MPSCH-LOG: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD".

FECHA : Santiago de Chucuito, 26 de ABRIL del 20201

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente, así mismo hacer de su conocimiento que dado el: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD". Se alcanza la conformidad correspondiente del INFORME DE MENSUAL DE VALORIZACIÓN N°1 – ANEXO N°04 TRAMO: MUNGURRAL – SANTA ROSA - OYON Y EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP LI (QUIGUIR) durante el periodo de trabajo del mes de ENERO.

Es todo cuanto tengo que informar a Ud. Para su conocimiento y fines.

Atentamente,





“CONSORCIO SANTA ROSA”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

Santiago de Chuco, 25 de Abril del 2021

CARTA N° 0006-2021-CONSORCIO SANTA ROSA.

Señor:
ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS
INGENIERO INSPECTOR

Asunto : Presentación de Levantamiento de Observaciones del Informe Mensual de Valorización N°01 – Anexo N° 04
Tramo: Mungurral – Santa Rosa – Oyon
Tramo: El Molle – Callayguida Baja – Emp LI-122(Quiguir)

Referencia : Contrato N°002-2020-MPSCH-LOG Servicio para la ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinales tramo El Molle – Callayguida Baja – Emp LI-122 (Quiguir) Del Distrito de Santiago de chuco Provincia Santiago de Chuco La Libertad y Servicio de Mantenimiento Rutinario y Periódico de los Caminos Vecinales Tramo Mungurral – Santa Rosa – Oyon del Distrito de Santiago de Chuco Provincia Santiago de Chuco La Libertad.

Mediante la presente, me dirijo a Usted, para hacerle llegar a su despacho el Informe Mensual de Valorización N.º 01 del Levantamiento de Observaciones del Servicio Tramo: Mungurral – Santa Rosa – Oyon y Tramo: El molle – Callayguida Baja – Emp LI-122(Quiguir) Anexo 04, documento que forma parte de la fase 3 del presente contrato descrito en la referencia.

Así mismo adjunto a la presente la documentación pertinente.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

CONSORCIO SANTA ROSA

Nancy Nicodemos Salazar
Nancy Nicodemos Salazar

DN: 44737900

REPRESENTANTE COMÚN

Representante Común



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO

Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros
Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros
CIP N° 74375
INSPECTOR DE OBRA

recibido el 25/04/21

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: MUNGURRAL – SANTA ROSA - OYON, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD



INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP N° 74375

204

INFORME N° 005-2021 ING° GEBC-IO/MPSCH.

A : ING° MARCO VELASQUEZ VELASQUEZ.
RESIDENTE DE SERVICIO – PROCESO N°17

ATENCIÓN : NANCY NICODEMOS SALAZAR
REPRESENTANTE COMUN – CONSORCIO SANTA ROSA

DE : ING° GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS.
INSPECTOR DE SERVICIO – PROCESO N°17

ASUNTO : SOLICITA LEVANTAR OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LA VALORIZACION N°01 MANTENIMIENTO RUTINARIO MES DE ENERO DEL 2021

REFERENCIA : CONTRATO DE SERVICIO N°002-2020-MPSCH-LOG: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD”.

FECHA : Santiago de Chuco, 24 de ABRIL del 20201

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente, para SOLICITAR A USTED LEVANTAR OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LA VALORIZACION N°01 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO RUTINARIO MES DE ENERO DEL 2021, emitida por la EMPRESA CONSORCIO SANTA ROSA (INVERSIONES Y TRANSPORTES APUS EIRL + JANS CONSTRUCTOR SAC), RESPONSABLE DE REALIZAR LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD Y TRAMO MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD”.

Es todo cuanto tengo que informar a Ud. Para su conocimiento y fines.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros
CIP N° 74375
INSPECTOR DE OBRA

CONSORCIO SANTA ROSA
Nancy Nicodemos Salazar
DNI: 44797900
REPRESENTANTE COMUN


recibí el 24/04/21



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



Santiago de Chuco, 23 de abril del 2021.

CARTA N° 098-2021 - MPSCH - SGI/DIST

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS
Inspector de Mantenimiento Paquete N° 17

ASUNTO : SOLICITA LEVANTAR OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LA VALORIZACION N° 01 MANTENIMIENTO RUTINARIO MES DE ENERO DEL 2021

REFERENCIA : (01) "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP. LI-122 (QUIGUIR), EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD." (17.1)
"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD." (17.2)
(02) CONTRATO DE SERVICIO N° 012-2020-MPSCH-LOG

De mi consideración:

Me es grato dirigirme a Usted, para SOLICITARLE A USTED LEVANTAR OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LA VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO RUTINARIO MES DE ENERO DEL 2021, emitida por la EMPRESA CONSORCIO SANTA ROSA (INVERSIONES Y TRANSPORTES APUS EIRL + JANS CONSTRUCTOR SAC), RESPONSABLE DE REALIZAR LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINO VECINAL : EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP. LI-122 (QUIGUIR), EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD." (17.1) Y MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD. (17.2).

Seguro de su atención a la presente me despido, reiterándole mi muestra de alta estima consideración.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO
ING. Gilmer Enrique Bazan Cisneros
CIP N° 74375
INSPECTOR DE OBRA

recibido e / 23/04/21

“Año de la Universalización de la Salud”


Santiago de Chuco, 22 de marzo del 2021

CARTA N° 009-2021-MPSCH-IVP-SCH/VRK

Señor
Ing. David Ivan Silva Torres
Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH

SANTIAGO DE CHUCO

ASUNTO : REMITO OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



De nuestra consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar a usted, nuestro cordial saludo y a la vez hacer de su conocimiento que el técnico administrativo del Instituto Vial de la Provincia de Santiago de Chuco, hace de conocimiento de las observaciones al informe mensual N° 01 del servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal EL MOLLE – COLLAGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR); DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD LONG. 13.00 KM; MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON LONG. 15.00 km., quien fue corroborado por la jefatura de operaciones del IVP, mediante INFORME N° 050-2021-JO/IVPSCH/LFGCH, detallando lo siguiente:

TRAMO	OBSERVACIONES
EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP. LI-122 (EL QUIGUIR) LONG= 13.000 KM	Incompatibilidad de presupuesto aprobado en Plan de Trabajo con el que aparece en la VALORIZACION N°01-ENERO del mantenimiento rutinario.
	A consecuencia de lo anterior, se presentan errores en la secuencia de páginas referidas a los metrados y presupuesto.
	Folio 143, sin sello de responsables del Certificado de Transitabilidad del camino vecinal.
	Modificación del informe de conformidad del Inspector
MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON LONG= 15.000 KM	Incompatibilidad de presupuesto aprobado en Plan de Trabajo con el que aparece en la VALORIZACION N°01-ENERO del mantenimiento rutinario.
	A consecuencia de lo anterior, se presentan errores en la secuencia de páginas referidas a los metrados y presupuesto.
	Folio 144, sin sello de responsables del Certificado de Transitabilidad del camino vecinal.
	Modificación del informe de conformidad del Inspector

- ✓ *Se DEVUELVE la documentación alcanzada, incluyendo los documentos donde estipulan las observaciones del INGENIERO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE LA JEFATURA DE OPERACIONES DEL IVP, para su posterior subsanación.*

- ✓ Así mismo se le hace recordar que toda documentación basada en el D.U. 070-2020, debe de ser ingresada por mesa de parte única de nuestra entidad.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer la atención brindada.

ATENTAMENTE


INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE
SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Volante Roberto Rafael E.
1985
DIRECTOR GENERAL

Adjunta:

- ✓ INFORME N° 050-2021-JO/IVPSCH/LFGCH
✓ CARTA N° 010-2021/NBP/TACSMRP

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

INFORME N° 050-2021-JO/IVPSCH/LFGCH

A : ING. RAFAEL K. VALENCIA REBAZA
GERENTE DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

DE : ING. LUIS F. GUTIERREZ CHÁVEZ
JEFE DE OPERACIONES DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

ASUNTO : REMITO OBSERVACIONES DE LA VALORIZACIÓN N° 01 MES DE ENERO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (EL QUIGUIR) LONG= 13.000 KM” Y “MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON LONG= 15.000 KM” DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.

REFERENCIA : a) CARTA N°010-2021/NBP/TACSMRP
b) INF N°0291-2021-MPSCH/DIST/SGI

FECHA : SANTIAGO DE CHUCO, 21 DE ABRIL DEL 2021

Por medio del presente, le expreso mi cordial saludo y afecto, a su vez le hago presente las OBSERVACIONES hechas por el Técnico Administrativo – Ing. Civil Marcial Nicolás Barrantes Parimango (documento de referencia a), a las VALORIZACIONES N° 01, del mes de, para los dos tramos que componen el paquete contractual del SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (EL QUIGUIR) LONG= 13.000 KM” Y “MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON LONG= 15.000 KM” DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD; con la finalidad de que el inspector del servicio haga conocer a la empresa ejecutora para su consiguiente levantamiento y/o subsanación.

I. ANTECEDENTES:

- a) Mediante los INFORMES N°001-2021 ING° GEBC-IO/MPSCH y N°003-2021 ING° GEBC-IO/MPSCH, ambos de fecha 05 de febrero de 2021, el Inspector de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (EL QUIGUIR) LONG= 13.000 KM” Y “MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON LONG= 15.000 KM” DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, Ing. Gilmer Enrique Bazán Cisneros, alcanza sus conformidades de los informes mensuales de VALORIZACIÓN N°01-ANEXO 04 junto con los mismos, para los dos tramos que incluye el servicio en mención; a la Subgerencia de Infraestructura (área responsable).
- b) Mediante INFORME N°0291-2021-MPSCH/DIST/SGI, de fecha 14 de abril de 2021, el Subgerente de Infraestructura (representante del área responsable), Ing. David Iván Silva Torres, alcanza al área usuaria, IVP-MPSCH su Conformidad de Valorización N°01-MANTENIMIENTO RUTINARIO – ENERO, junto con la misma, para su evaluación.

II. ANÁLISIS:

La Jefatura de Operaciones como la unidad que **evalúa** las valorizaciones de la ejecución de los mantenimientos rutinarios a través de los Técnicos

Administrativos que están a disposición del área usuaria (Instituto Vial Provincial), **previa conformidad del área responsable de la ejecución (Sub gerencia de Infraestructura)**; ha realizado las OBSERVACIONES a la Valorización N°01 ENERO del SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (EL QUIGUIR) LONG= 13.000 KM” Y “MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON LONG= 15.000 KM” DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD para los dos tramos que componen este paquete contractual, elaborada por el Técnico Administrativo Ing. Marcial Nicolás Barrantes Parimango y se resumen a continuación en el siguiente recuadro:

TRAMO	OBSERVACIONES
EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (EL QUIGUIR) LONG= 13.000 KM	Incompatibilidad de presupuesto aprobado en Plan de Trabajo con el que aparece en la VALORIZACION N°01-ENERO del mantenimiento rutinario.
	A consecuencia de lo anterior, se presentan errores en la secuencia de páginas referidas a los metrados y presupuesto.
	Folio 143, sin sello de responsables del Certificado de Transitabilidad del camino vecinal.
	Modificación del informe de conformidad del Inspector
MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON LONG= 15.000 KM	Incompatibilidad de presupuesto aprobado en Plan de Trabajo con el que aparece en la VALORIZACION N°01-ENERO del mantenimiento rutinario.
	A consecuencia de lo anterior, se presentan errores en la secuencia de páginas referidas a los metrados y presupuesto.
	Folio 144, sin sello de responsables del Certificado de Transitabilidad del camino vecinal.
	Modificación del informe de conformidad del Inspector

Aclaración: se recalca que el área responsable de la ejecución (Subgerencia de Infraestructura) alcanzó la documentación pertinente para ambas Valorizaciones (enero y febrero) en fuera de plazo, justificando este inconveniente en su informe (referencia b). Asimismo, de acuerdo con lo estipulado en el DECRETO DE ALCALDÍA N° 01-2021-MPSCH, de fecha 05 de abril de 2021, **se suspendieron labores físicas** desde el día 06 de abril de 2021, a causa de la cuarentena obligatoria por la Pandemia COVID-19, retomándose las labores el día 21 de abril del presente; por lo cual la oficina del IVP-MPSCH solo recepcionó las valorizaciones dentro del periodo de cuarentena mas no se atendió por la ausencia de todo el personal técnico por las razones antes expuestas.

III. CONCLUSIONES:

Según el Informe visto por el técnico administrativo Ing. Marcial Nicolás Barrantes Parimango, se concluye:

- ❖ Las observaciones advertidas en la Valorización N° 01 – ENERO del SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (EL QUIGUIR) LONG= 13.000 KM” Y “MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON LONG= 15.000 KM” DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, por el Técnico Administrativo Ing. Marcial Nicolás Barrantes Parimango, deben ser **SUBSANADAS** por el Inspector y a la empresa contratista.
- ❖ Se **DEVUELVE** toda la documentación alcanzada, incluyendo los documentos donde se han estipulado las observaciones hayadas, para su posterior subsanación.
- ❖ Debido a la **SUSPENSIÓN FÍSICA DE LABORES** de 14 días calendarios a partir del 6 de abril de 2021, la cual se estipula en el **DECRETO DE ALCALDÍA N° 01-2021-MPSCH** (05 de abril de 2021), recién se está tramitando el proceso de evaluación de las valorizaciones antes mencionadas.

IV. RECOMENDACIONES:

Se recomienda **NOTIFICAR al área responsable de la ejecución** del SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (EL QUIGUIR) LONG= 13.000 KM” Y “MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON LONG= 15.000 KM” DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, para que, a su vez, haga conocer las observaciones advertidas al inspector y empresa contratista, a fin de que se subsanen.

Es todo cuanto informo, sírvase a utilizar esta documentación con Ud. crea conveniente, en la medida que lo estipula la ley y el reglamento interno de esta institución.

ATENTAMENTE



INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE
SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Eusebio Chavez Luis F
C.I.: 190782
JEFE DE OPERACIONES

197 01

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

Santiago de Chuco, 20 de Abril del 2021

CARTA N° 010-2021/NBP/TACSMRP

ATENCIÓN:

Ing. Luis F. Gutiérrez Chávez
Jefe de Operaciones del IVP-MPSCH



ASUNTO : OBSERVACIONES INFORME MENSUAL N° 01 – MES DE ENERO 2021
Servicio: Mantenimiento Periódico y Rutinario de los Caminos Vecinales Tramos:
1. - EL MOLLE – CALLAIGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR) - LONG. = 13.000 KM
2. - MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON - LONG. = 15.000 KM – DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD

REFERENCIA : INFORME N° 001-2021 ING° GEBC-IO/MPSCH
INFORME N° 003-2021 ING° GEBC-IO/MPSCH
INFORME N° 0291-2021-MPSCH/DIST/SGI
CARTA N° 001-2021
CARTA N° 001-2021-CONSORCIO SANTA ROSA
CARTA N° 003-2021
CARTA N° 003-2021-CONSORCIO SANTA ROSA.

Es grato dirigirme a ud, para hacer de su conocimiento que se ha iniciado los trabajos de mantenimiento RUTINARIO, de los tramos descritos líneas arriba, y en atención a la REFERENCIA, se procedió a su revisión de los INFORMES N° 01, correspondiente al mes de ENERO del 2021, observándose lo siguiente:

1. - EL MOLLE – CALLAIGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR) - LONG. = 13.000 KM

EL PRESUPUESTO APROBADO EN EL PLAN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO RUTINARIO ES DE S/. 165,798.56 y en presupuesto de VALORIZACION de INFORME MENSULA N° 01, MES DE ENERO -2021 es de S/. 165,799.00.

Verificar los metrados que existen en el Presupuesto del Mantenimiento Rutinario, aprobados en el PLAN DE TRABAJO.

Dado que los metrados no coinciden con el INFORME MENSUAL N° 01, se tienen que modificar la secuencia de cada página referido al metrado y presupuesto del Mantenimiento Rutinario.

- Folio 143, sin sello de responsables del Certificado de Transitabilidad del Camino Vecinal
- Modificar el informe N° 001-2021-ING° GEBC-IO/MPSCH.

2. - MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON - LONG. = 15.000 KM

EL PRESUPUESTO APROBADO EN EL PLAN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO RUTINARIO ES DE S/. 191,306.04 y en presupuesto de VALORIZACION de INFORME MENSUAL N° 01, MES DE ENERO -2021 es de S/. 191,306.00.

Verificar los metrados que existen en el Presupuesto del Mantenimiento Rutinario, aprobados en el PLAN DE TRABAJO.

Dado que los metrados no coinciden con el INFORME MENSUAL N° 01, se tienen que modificar la secuencia de cada página referido al metrado y presupuesto del Mantenimiento Rutinario.

- Folio 144, sin sello de responsables del Certificado de Transitabilidad del Camino Vecinal
- Modificar el informe N° 003-2021-ING° GEBC-IO/MPSCH

ANEXO:

Se hace de conocimiento que con fecha 05 de abril de 2021, mediante DECRETO DE ALCALDIA N° 01-2021-MPSCH, SE DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: DISPONER, la suspensión de labores de manera física de todo el personal de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, por el lapso de 14 días calendarios, a partir del día 6 de abril de 2021, suspendiéndose toda atención a los administrados, con la finalidad de que todos los trabajadores municipales efectúen su cuarentena de prevención obligatoria, se realicen labores de limpieza y desinfección de todos los ambientes y locales de la MPSCH.

Por ende el suscrito hizo presencia al área de trabajo de la MPSCH, el día 20.04.2021, para realizar las actividades en el área del IVP-MPSCH.

Se devuelve a su despacho los INFORMES MENSUAL N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO – 2021, para su levantamiento de observaciones y proceder a su trámite respetivo.

Es propicia la oportunidad para reiterar las muestras de especial consideración.

Atentamente,

Adjunto:

- 1.- EL MOLLE – CALLAIGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR) - LONG. = 13.000 KM
01 Archivador Informe Mensual N° 01 (F. 191 + 01 Archivador)
- 2.- MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON - LONG. = 15.000 KM
01 Archivador Informe MENSUAL N° 01 (F. 195 + 01 Archivador)



Marcial Nicolás Barrantes Pumungo
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 225678



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD


Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



198

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

INFORME N°0291 - 2021-MPSCH/DIST/SGI



A : ING. RAFAEL KEVINALAN VALENCIA REBAZA
Gerente de IVP

DE : ING. DAVID IVAN SILVA TORRES
Sub Gerente de Infraestructura – MPSCH

ASUNTO : CONFORMIDAD DE VALORIZACION N° 01 – MANTENIMIENTO RUTINARIO – ENERO

REFERENCIA :

(01) INFORME N° 003-2021 ING.GEBC-IO/MPSCH
 (02) SERVICIO: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP LI-122 (QUIGUIR), EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD." (17.1)
 (05) OBRA: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD." (17.2)
 (06) CONTRATO DE SERVICIO N° 012-2020-MPSCH-LOG

FECHA : Santiago de Chuco, de 14 de Abril del 2021

I. BASE LEGAL

- Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 27972 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
- Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
- Reglamento Nacional de Edificaciones

II. ANALISIS

SE EXPONE LA DEMORA DE LA CONFORMIDAD

Al hecho, se debe la carga laboral, que se tiene en la Municipalidad Provincial Santiago de Chuco, específicamente en el área de la Sub Gerencia de Infraestructura, se nos hizo imposible realizar la gestión necesaria y dar la conformidad de la VALORIZACION N°01 – RUTINARIO – ENERO del respectivo consorcio; informo a su despacho a efectos de solicitarse se sirva a realizar o emitir los actos administrativos, para que se pueda continuar con el trámite correspondiente, es por ello que pese a que como se ha manifestado producto de la carga laboral y al no contar con personal que desempeñe el cargo DE SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA (DEJANDO COMO ENCARGADO AL ING. HERMES M. MELENDEZ TAMAYO QUE YA DE POR SI VENIA DESEMPEÑANDO 3 ENCARGATURAS); siendo uno de los principales motivos ya que se nos fue imposible tramitar de igual manera valorizaciones de obras por contrata, obras por administración directa y actualmente los servicios de mantenimiento que se venían ejecutando; cabe indicar que actual mente me eh reincorporado a mis labores por tal motivo expongo y pido la comprensión de la demora de la conformidad de pago de la presente valorización.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 Ing. David Ivan Silva Torres
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA".

Mediante el documento de la referencia, INFORME N° 003-2021 ING.GEBC-IO/MPSCH, el ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS Inspector de planta del Servicio de Mantenimiento que mediante la RESOLUCION SUB GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA N° 003-2021-MPSCH de fecha 03 de enero del 2021 fue designado, da la CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION N° 01 – MANTENIMIENTO del servicio: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR), MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD." quien solicita el Pago N° 01 por servicios de MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL SERVICIO DADO, por lo que se concluye:

En un ANALISIS DEL INFORME DE LA REF. (01); esta SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA MPSCH da la CONFORMIDAD DE PAGO DE LA VALORIZACION N°01 – MANTENIMIENTO RUTINARIO del CONTRATISTA según el informe de la ref. (01) se debe pagar según el cuadro adjunto en el informe (01) de la obra: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR), MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD", se detallan los montos a continuación:

TRAMO N°01: EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR)

DIAS TRABAJADOS	31 DIAS
COSTO DIRECTO	S/. 10,181.71
GG 10%	S/. 1,018.17
UTILIDAD 5%	S/. 509.09
VALORIZACION PARCIAL	S/. 11,708.97
IGV 18%	S/. 2,107.61
MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA	S/. 13,816.58

TRAMO N°02: MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON

DIAS TRABAJADOS	31 DIAS
COSTO DIRECTO	S/. 11,718.10
GG 10%	S/. 1,174.81
UTILIDAD 5%	S/. 587.40
VALORIZACION PARCIAL	S/. 13,510.31
IGV 18%	S/. 2,431.86
MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA	S/. 15,942.17

CONSOLIDADO DE PAGO

DIAS TRABAJADOS	31 DIAS
COSTO DIRECTO	S/. 21,899.81
GG 10%	S/. 2,192.98
UTILIDAD 5%	S/. 1,096.49
VALORIZACION PARCIAL	S/. 25,219.28
IGV 18%	S/. 4,539.47
MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA	S/. 29,758.75

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO
Ing. David An Silva Torres
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA".

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se da la CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION N°01 - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP. LI-122 (QUIGUIR), MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD." 1||
- La VALORIZACION PARCIAL N° 01 - MANTENIMIENTO RUTINARIO del CONTRATISTA fue por S/. 25,219.28 (VEINTI CINCO MIL DOSCIENTOS DIESEINUEVE CON 28/100 SOLES)
- Se informa que el monto que corresponde a la RETENCION DE 10 % GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (FUE SOLICITADO SE RETENGA EN LAS VALORIZACIONES DEL MANTENIMIENTO PERIODICO)
- Por lo tanto el monto a cancelar al CONTRATISTA POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO asciende a S/. 29,758.75 (VEINTI NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 75/100 SOLES) INCLU IGV

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y acciones que estime por conveniente, salvo mejor parecer.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. David Silva Torres
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA



INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP N° 74375

192


INFORME N° 003-2021 ING° GEBE-IO/MPSCH.

A : **ING° DAVID IVAN SILVA TORRES.**
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA – MPSCH

ATENCIÓN : **ING° RAFAEL KEVINALAN VALENCIA REBAZA**
GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MPSCH

DE : **ING° GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS.**
INSPECTOR DE OBRA

ASUNTO : CONFORMIDAD DEL INFORME MENSUAL DE VALORIZACIÓN N°01 – ANEXO N°04
TRAMO: MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON



REFERENCIA : CONTRATO DE SERVICIO N°002-2020-MPSCH-LOG: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD".

FECHA : Santiago de Chuco, 05 de FEBRERO del 20201

*Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente, así mismo hacer de su conocimiento que dada la Obra: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD". Se alcanza la conformidad correspondiente del **INFORME MENSUAL DE VALORIZACIÓN N°01 – ANEXO N°04 TRAMO: MUNGURRAL – SANTA ROSA - OYON** durante el periodo de trabajo del mes de **ENERO**.*

Es todo cuanto tengo que informar a Ud. Para su conocimiento y fines.

Atentamente,

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros
CIP. N° 74375
INSPECTOR DE OBRA



INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP N° 74375

191

VALORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE SERVICIO RUTINARIO N° 01

INFORME DE INSPECCIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N° 01

FASE III – ANEXO N° 04

ENERO – 2021

SERVICIO:

**MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS
VECINALES TRAMO:**

**MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON, DEL DISTRITO
DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA DE
SANTIAGO DE CHUCO- LA LIBERTAD.”**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros
CIP. N° 74375
INSPECTOR DE SERVICIO



INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP N° 74375

190

INFORME MENSUAL DE LA INSPECCIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N° 01: DEL MES DE ENERO

01.00 DATOS GENERALES

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA – MPSCH
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL – IVP – MPSCH

NOMBRE DEL MANTENIMIENTO:

“MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO MUNGURRAL – SANTA ROSA - OYON, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”.

UBICACIÓN:

DISTRITO : SANTIAGO DE CHUCO
PROVINCIA : SANTIAGO DE CHUCO
REGION : LA LIBERTAD

PROCESO DE SELECCIÓN:

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 017- 2020-MPSCH/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA. CONTRATO DE SERVICIO N° 002-2020-MPSCH-LOG. PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDICO Y RUTINARIO “MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO MUNGURRAL – SANTA ROSA - OYON, EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – QUIQUIR DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

ALCALDE:

SR. JUAN ALBERTO GABRIEL ALIPIO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

POR CONTRATA

MONTO REFERENCIAL (con IGV)

S/. 1'058,560.07

MONTO CONTRATADO (con IGV)

S/. 1'058,560.07

FACTOR DE RELACIÓN:

1.00000

CONTRATISTA:

CONSORCIO SANTA ROSA

PRESUPUESTO CONTRATADO:

S/. 1'058,560.07

SISTEMA DE CONTRATACIÓN:

A SUMA ALZADA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO

Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros
CIP N° 74375
INSPECTOR DE OBRAS



INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP Nº 74375

FIRMA DEL CONTRATO:

21/08/2020

FECHA DE ENTREGA DEL TERRENO:

22/08/2020

PAGO ADELANTO DIRECTO:

NO SE SOLICITO

PAGO ADELANTO DE MATERIALES:

NO SE SOLICITO

FECHA CONTRACTUAL DE INICIO DEL SERVICIO M. RUTINARIO:

01/01/2021

FECHA CONTRACTUAL DE TERMINO DEL SERVICIO M. RUTINARIO:

31/12/2021

PLAZO DE EJECUCIÓN:

500 DÍAS CALENDARIOS

INSPECTOR DE SERVICIO:

INGº GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS

RESIDENTE DE OBRA:

INGº MARCO VELASQUEZ VELASQUEZ

AVANCE EJECUTADO MES DE ENERO-2021:

8.33%

AVANCE PROGRAMADO MES DE ENERO-2021:

8.33%

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO:

8.33%

AVANCE EJECUTADO ACUMULADO:

8.33%



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO

Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros
CIP 74375
INSPECTOR DE OBRA



ALCANCES GENERALES

La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, en atención al Decreto de Urgencia N° 070-2020; viene inspeccionando los trabajos correspondientes a la ejecución del Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO MUNGURRAL – SANTA ROSA - OYON, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", Mantenimiento Rutinario que beneficiara a las comunidades, en lo siguiente:

1.0	MANTENIMIENTO RUTINARIO		
1.1	CONSERVACION DE CALZADA		
1.1.1	Limpieza de calzada	km	6.00
1.1.2	Bacheo camino tipo I	m ²	3,637.30
1.1.3	Bacheo camino tipo II	m ²	0.00
1.1.4	Bacheo camino tipo III	m ²	0.00
1.1.5	Desquinche	m ³	0.00
1.1.6	Remoción de derrumbes	m ³	0.00
1.1.7	Perfilado de la superficies sin aporte de material	m ²	14,669.98
1.2	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE		
1.2.1	Limpieza de cunetas	m	12,675.01
1.2.2	Limpieza de alcantarilla	und	1.00
1.2.3	Limpieza de baden	und	0.00
1.2.4	Limpieza de Tajea	und	0.00
1.2.5	Limpieza de zanjas de coronación	m	0.00
1.2.6	Limpieza de pontones	und	1.00
1.2.7	Encauzamiento de pequeños cursos de agua	m	525.00
1.3	CONTROL DE VEGETACION		
1.3.1	Roce y limpieza	m ²	0.00
1.4	SEGURIDAD VIAL		
1.4.1	Conservación de señales	und	25.00
1.5	MEDIO AMBIENTE		
1.5.1	Reforestación	und	0.00
1.6	VIGILANCIA Y CONTROL		
1.6.1	Vigilancia y control	km	225.00
1.7	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA		
1.7.1	Reparación de muros secos	m ³	0.00
1.7.2	Reparación de pontones	und	0.00



INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP N° 74375

187

METAS FÍSICAS POR ALCANZAR:

Descripción del Proyecto

Objetivos y Metas

El servicio consiste en el mantenimiento periódico y rutinario en un tramo de 15.00 km en el tramo siguiente: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

El proyecto contempla las siguientes metas.

VALORIZACION MENSUAL N° 01

PERIODO: MES 01 (ENERO DEL 2021)

PROYECTO "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

LONGITUD : 15 KM

ÍTEM	DESCRIPCION	Und	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	ANTERIOR EJECUTADO ACUMULADO			EJECUTADO MES 01			ACUMULADO EJECUTADO TOTAL			SALDO TOTAL A EJECUTAR			
						METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	
1.0	MANTENIMIENTO RUTINARIO																	
1.1.1	Limpieza de Calzada	km	6.00	713.47	4,282.82	-	0.00	0.00%	0.50	357.74	8.33%	0.50	357.74	8.33%	5.50	3,895.08	91.87%	
1.1.2	Bacheo camino tipo I	m²	3,637.30	22.96	83,512.41	-	0.00	0.00%	303.11	6,958.37	8.33%	303.11	6,958.37	8.33%	336.19	76,553.04	91.67%	
1.1.3	Bacheo camino tipo II	m²	0.00	22.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4	Bacheo camino tipo III	m²	0.00	22.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.5	Desquince	m²	0.00	36.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.6	Remoción de detumbes	m²	0.00	47.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.7	Pavilado de la superficie sin aporte de material	m²	14,669.98	2.13	31,247.06	-	0.00	0.00%	1,222.50	2,603.92	8.33%	1,222.50	2,603.92	8.33%	1347.48	28,843.14	91.67%	
1.2.1	Limpieza de cunetas	m	12,675.01	1.18	14,958.51	-	0.00	0.00%	1,058.25	1,248.38	8.33%	1,058.25	1,248.38	8.33%	1188.76	13,710.14	91.67%	
1.2.2	Limpieza de alcantarilla	und	1.00	214.64	214.64	-	0.00	0.00%	0.08	17.89	8.33%	0.08	17.89	8.33%	0.92	198.75	91.67%	
1.2.3	Limpieza de badén	und	0.00	14.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.4	Limpieza de talaje	und	0.00	107.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.5	Limpieza de zanjas de coronación	m	0.00	1.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.6	Limpieza de pontones	und	1.00	283.48	283.48	-	0.00	0.00%	0.08	23.62	8.33%	0.08	23.62	0.00%	0.92	258.86	91.67%	
1.2.7	Encabezamiento de pequeños cursos de agua	m	325.00	7.16	3,758.00	-	0.00	0.00%	43.75	313.25	8.33%	43.75	313.25	8.33%	481.25	3,445.75	91.67%	
1.3.1	Roca y Limpieza	m²	0.00	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.1	Conservación de Señales	und	25.00	30.06	751.50	-	0.00	0.00%	2.08	62.63	8.33%	2.08	62.63	8.33%	22.92	688.69	91.67%	
1.5.1	Restauración	und	0.00	1.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6	Vigilancia y Control	km	225.00	8.71	1,958.75	-	0.00	0.00%	18.75	163.31	8.33%	18.75	163.31	8.33%	208.25	1,798.44	91.67%	
1.7.1	Reparación de Muros secos	m²	0.00	117.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7.2	Reparación de Pontones	und	0.00	860.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COSTO DIRECTO S/.					140,977.17		0.00			11,748.10			11,748.10				129,229.07	
GASTOS GENERALES			10.0%		14,097.72		0.00			1,174.81			1,174.81				12,922.91	
UTILIDAD			5.0%		7,048.86		0.00			587.40			587.40				6,461.45	
PARCIAL					162,123.75		0.00			13,510.31			13,510.31				148,613.43	
IGV			18.0%		29,182.28		0.00			2,431.86			2,431.86				26,750.42	
TOTAL S/.					191,306.04		0.00			15,942.17			15,942.17				175,363.87	
% DE AVANCE							0.00%			8.33%			8.33%				91.67%	



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros
CIP N° 74375
INSPECTOR DE OBRA



INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP N° 74375

186

CONTROL ECONÓMICO DEL SERVICIO

PRESUPUESTO CONTRATADO. - El Presupuesto Contratado, para el servicio de ejecución del mantenimiento periódico y rutinario, se compone de una fórmula de la siguiente manera: **FORMULA N° 02 "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"**

CONTROL DE VALORIZACIONES DEL SERVICIO:

El avance acumulado contractual, incluye IGV de la Valorización N° 01 es el siguiente:

Total, Valorización N° 01	S/.	15,942.17
Total, Valorización Acumulada	S/.	15,942.17
Monto Total Contractual	S/.	191,306.00
Porcentaje de Avance Valorización N° 01		8.33%
Porcentaje de Avance Acumulado		8.33%

PLAZO DE LA OBRA:

El plazo contractual para el mantenimiento rutinario es de 365 días calendarios, se inició el 1 de Enero del 2021 y termina el 31 de Diciembre del 2021, en el transcurso del presente periodo de ejecución de obra el contratista no ha solicitado ampliación de plazo contractual (Art° 169 y 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.-Reglamento D. S. N° 350-2015-EF.- Ley N° 30225 y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1341 y D.S. N° 056-2017-EF.



PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros
CIP N° 74375



INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP N° 74375

185

COMENTARIOS DE LA INSPECCIÓN:

Los trabajos, se vienen realizando de forma normal de acuerdo a la programación de la obra, a la fecha del informe según Acta de Entrega de Terreno de fecha: 22-Agosto-2020 y Acta de Inicio M. Rutinario de Servicio de fecha: 01-Enero-2021; se viene realizando los trabajos según el presupuesto el Mantenimiento Rutinario

Así mismo la inspección constatará y verificará que; cumpla con los requisitos técnicos para el mantenimiento anual.

Se coordina con la Residencia, en lo referente a los avances de los trabajos, ya que nos encontramos en épocas de lluvias, propias de esta época del año, que desgastarán la plataforma de afirmado.

Durante los trabajos se pudo apreciar, que los trabajadores cuentan con implementos de seguridad (Casco, Botas, Chalecos, etc.)

CONTROL DE CAMPO:

La inspección ha realizado continuamente y permanentemente el control de campo en forma minuciosa verificando el cumplimiento de los documentos técnicos del Plan de Trabajo; los cuales son: Planos, Especificaciones Técnicas y Metrados del Expediente Técnico (Plan de Trabajo); así como también ordenes emitidas por el suscrito y correcciones cuando la situación ameritaba.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCUITO
Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros
CIP. N° 74375

VALORIZACION MENSUAL N° 01


PERIODO: MES 01 (ENERO DEL 2021)

PROYECTO "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

LONGITUD 15 KM

ÍTEM	DESCRIPCION	Und	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.	ANTERIOR EJECUTADO		EJECUTADO MES 01		ACUMULADO EJECUTADO TOTAL		SALDO TOTAL A EJECUTAR		
						METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%
1.0	MANTENIMIENTO RUTINARIO													
1.1	CONSERVACION DE CALZADA													
1.1.1	Limpieza de Calzada	km	6.00	715.47	4,292.82	-	0.00	0.00%	0.50	357.74	8.33%	5.50	3,935.09	91.67%
1.1.2	Bacheo camino tipo I	m²	3,637.36	22.76	83,512.41	-	0.00	0.00%	303.11	6,950.37	8.33%	3,334.19	76,553.04	91.67%
1.1.3	Bacheo camino tipo II	m²	0.00	22.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Bacheo camino tipo III	m²	0.00	22.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Desquinche	m²	0.00	56.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6	Remoción de derrumbes	m³	0.00	47.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7	Perfilado de la superficie sin aporte de material	m²	14,669.98	2.13	31,247.06	-	0.00	0.00%	1,222.50	2,603.92	8.33%	13,447.48	26,643.14	91.67%
1.2	REPARACION DE ESPALDAJE													
1.2.1	Limpieza de cunetas	m	12,475.01	1.18	14,956.51	-	0.00	0.00%	1,056.25	1,246.38	8.33%	11,618.76	13,710.14	91.67%
1.2.2	Limpieza de alcantarilla	und	1.00	214.64	214.64	-	0.00	0.00%	0.08	17.89	8.33%	0.92	196.75	91.67%
1.2.3	Limpieza de badén	und	0.00	14.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Limpieza de Tolea	und	0.00	107.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Limpieza de zanjas de coronación	m	0.00	1.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Limpieza de pontones	und	1.00	283.48	283.48	-	0.00	0.00%	0.08	23.62	8.33%	0.92	259.86	91.67%
1.2.7	Encauzamiento de pequeños cursos de agua	m	525.00	7.16	3,758.00	-	0.00	0.00%	43.75	313.25	8.33%	481.25	3,465.75	91.67%
1.3	SEGURIDAD VIAL													
1.3.1	Roce y Limpieza	m²	0.00	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	CONSERVACION DE SEÑALES													
1.4.1	Conservación de Señales	und	25.00	30.06	751.50	-	0.00	0.00%	2.08	62.63	8.33%	22.92	688.88	91.67%
1.5	MANTENIMIENTO													
1.5.1	Reforestación	und	0.00	1.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	ACTIVIDADES DE MONITOREO Y CONTROL													
1.6.1	Vigilancia y Control	km	225.00	8.71	1,958.75	-	0.00	0.00%	18.75	163.31	8.33%	206.25	1,796.44	91.67%
1.7	REPARACION DE MUROS SECOS													
1.7.1	Reparación de Muros secos	m²	0.00	117.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2	Reparación de Pontones	und	0.00	860.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COSTO DIRECTO \$/.				140,977.17		0.00		11,748.40		11,748.40		128,229.07	
	GASTOS GENERALES			10.0%	14,097.72		0.00		1,174.81		1,174.81		12,922.91	
	UTILIDAD			5.0%	7,048.86		0.00		587.40		587.40		6,461.45	
	PARCIAL				162,123.75		0.00		13,510.31		13,510.31		148,613.43	
	IGV			18.0%	29,182.28		0.00		2,431.86		2,431.86		26,750.42	
	TOTAL \$/.				191,306.04		0.00		15,942.17		15,942.17		175,343.87	
	% DE AVANCE				0.00%		0.00%		8.33%		8.33%		91.67%	



MANTENIMIENTO RUTINARIO (PLANILLA DE METRADOS)

PROYECTO: "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: DPTO: LA LIBERTAD PROV: SANTIAGO DE CHUCO DIST: SANTIAGO DE CHUCO LOC: MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON

15:00

Ítem	Descripción	Unidad	N° ELEMENTOS	DIMENSIONES			AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL
				LARGO	ANCHO	ALTO				
1.0	MANTENIMIENTO RUTINARIO									
1.1	OBRAS PRELIMINARES									
1.1.1	Limpieza de Calzada	km	1.00	6.00				0.50	0.50	
1.1.2	Bacheo camino tipo I	m ²	1.00			3,637.30		303.11	303.11	
1.1.2	Bacheo camino tipo II	m ²	1.00			0.00		0.00	0.00	
1.1.2	Bacheo camino tipo III	m ²	1.00			0.00		0.00	0.00	
1.1.3	Desquinche	m ³	1.00				0.00	0.00	0.00	
1.1.4	Remoción de derrumbes	m ³	1.00				0.00	0.00	0.00	
1.1.5	Perfilado de la superficie sin aporte de material	m ²	1.00			14,669.98		1,222.50	1,222.50	
1.2	PAVIMENTOS									
1.2.1	Limpieza de Cunetas	m	1.00	12,675.01				1,056.25	1,056.25	
	PROGRESIVA 0+000 A 15+000									
1.2.2	Limpieza de Alcantarilla	und	1.00					0.08	0.08	
1.2.3	Limpieza de badén	und	0.00					0.00	0.00	
1.2.4	Limpieza de Tajea	und	0.00					0.00	0.00	
1.2.5	Limpieza de zanjas de coronación	m	1.00	0.00				0.00	0.00	
1.2.6	Limpieza de pontones	und	1.00					0.08	0.08	
1.2.7	Encauzamiento de pequeños cursos de agua	m	1.00	525.00				43.75	43.75	
1.3	CONTROL DE VEGETACIÓN									
1.3.1	Roce y Limpieza	m ²	1.00				0.00	0.00	0.00	
1.4	SEGURIDAD VIAL									
1.4.1	Conservación de señales	u	25.00					2.08	2.08	
1.5	MEDIO AMBIENTE									
1.5.1	Reforestación	u	0.00					0.00	0.00	
1.6	VIGILANCIA Y CONTROL									
1.6.1	Vigilancia y Control	km	1.00	225.00				18.75	18.75	
1.7	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA									
1.7.1	Reparación de muros secos	m ³	1.00					0.00	0.00	
1.7.2	Reparación de pontones	u	0.00					0.00	0.00	



MANTENIMIENTO RUTINARIO

PROYECTO: "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: DPTO: LA LIBERTAD PROV: SANTIAGO DE CHUCO DIST: SANTIAGO DE CHUCO LOC: MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON
Longitud (Km) 15.00

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	MES N°01	
				01/01/2021 AL 31/01/2021	
				30 DIAS	%
1.0	MANTENIMIENTO RUTINARIO				
1.1	CONSERVACION DE CALZADA				
1.1.1	Limpieza de calzada	km	6.00	0.50	8.33%
1.1.2	Bacheo camino tipo I	m ²	3,637.30	303.11	8.33%
1.1.2	Bacheo camino tipo II	m ²	0.00	0.00	0.00%
1.1.2	Bacheo camino tipo III	m ²	0.00	0.00	0.00%
1.1.3	Desquinche	m ³	0.00	0.00	0.00%
1.1.4	Remoción de derrumbes	m ³	0.00	0.00	0.00%
1.1.5	Perfilado de la superficies sin aporte de material	m ²	14,669.98	1,222.50	8.33%
1.2	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE				
1.2.1	Limpieza de cunetas	m	12,675.01	1,056.25	8.33%
1.2.2	Limpieza de alcantarilla	und	1.00	0.08	8.33%
1.2.3	Limpieza de baden	und	0.00	0.00	0.00%
1.2.4	Limpieza de Tajea	und	0.00	0.00	0.00%
1.2.5	Limpieza de zanjas de coronación	m	0.00	0.00	0.00%
1.2.6	Limpieza de pontones	und	1.00	0.08	8.33%
1.2.7	Encauzamiento de pequeños cursos de agua	m	525.00	43.75	8.33%
1.3	CONTROL DE VEGETACION				
1.3.1	Roce y limpieza	m ²	0.00	0.00	0.00%
1.4	SEGURIDAD VIAL				
1.4.1	Conservación de señales	und	25.00	2.08	8.33%
1.5	MEDIO AMBIENTE				
1.5.1	Reforestación	und	0.00	0.00	0.00%
1.6	VIGILANCIA Y CONTROL				
1.6.1	Vigilancia y control	km	225.00	18.75	8.33%
1.7	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA				
1.7.1	Reparación de muros secos	m ³	0.00	0.00	0.00%
1.7.2	Reparación de pontones	und	0.00	0.00	0.00%



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO

Ing. Guimer Enrique Bazan Cisneros
CIP N° 74376
INSPECTOR DE OBRA

MANTENIMIENTO RUTINARIO

PROYECTO: "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: DPTO: LA LIBERTAD PROV. SANTIAGO DE CHUCO DIST: SANTIAGO DE CHUCO LOC: MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	MES Nº01	
				01/01/2021 AL 31/01/2021	
				PROGRAMADO	EJECUTADO
31 DIAS					
1.0	MANTENIMIENTO RUTINARIO				
1.1	CONSERVACION DE CALZADA				
1.1.1	Limpieza de calzada	km	6.00	357.74	357.74
1.1.2	Bacheo camino tipo I	m ²	3,637.30	6,959.37	6,959.37
1.1.2	Bacheo camino tipo II	m ²	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Bacheo camino tipo III	m ²	0.00	0.00	0.00
1.1.3	Desquinche	m ³	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Remoción de derrumbes	m ³	0.00	0.00	0.00
1.1.5	Perfilado de la superficies sin aporte de material	m ²	14,669.98	2,603.92	2,603.92
1.2	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE				
1.2.1	Limpieza de cunetas	m	12,675.01	1,246.38	1,246.38
1.2.2	Limpieza de alcantarilla	und	1.00	17.89	17.89
1.2.3	Limpieza de badén	und	0.00	0.00	0.00
1.2.4	Limpieza de Tajera	und	0.00	0.00	0.00
1.2.5	Limpieza de zanjas de coronación	m	0.00	0.00	0.00
1.2.6	Limpieza de pontones	und	1.00	23.62	23.62
1.2.7	Encauzamiento de pequeños cursos de agua	m	525.00	313.25	313.25
1.3	CONTROL DE VEGETACION				
1.3.1	Roce y limpieza	m ²	0.00	0.00	0.00
1.4	SEGURIDAD VIAL				
1.4.1	Conservación de señales	und	25.00	62.63	62.63
1.5	MEDIO AMBIENTE				
1.5.1	Reforestación	und	0.00	0.00	0.00
1.6	VIGILANCIA Y CONTROL				
1.6.1	Vigilancia y control	km	225.00	163.31	163.31
1.7	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA				
1.7.1	Reparación de muros secos	m ³	0.00	0.00	0.00
1.7.2	Reparación de pontones	und	0.00	0.00	0.00
Costo Directo				11,748.10	11,748.10
Gastos Generales			10.00%	1,174.81	1,174.81
Utilidad			5.00%	587.40	587.40
Parcial				13,510.31	13,510.31
I.G.V.			18.00%	2,431.86	2,431.86
TOTAL :				15,942.17	15,942.17
Porcentaje de avance por Mes				8.33%	8.33%
Porcentaje de avance acumulado				8.33%	8.33%



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO

Ing. Gámir Enrique Bezaán Cárdenas
CIP Nº 74075
INSPECTOR DE OBRA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

INFORME MENSUAL N° 01
EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

“SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO- PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO”



ENERO - 2021



"CONSORCIO SANTA ROSA"

178

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

Santiago de Chuco, 03 de Febrero del 2021

CARTA N° 0003-2021-CONSORCIO SANTA ROSA.

Señor:
ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS
INGENIERO INSPECTOR

Asunto : Presentación del Informe Mensual de Valorización N°01 – Anexo N° 04
Tramo: Mungurrall – Santa Rosa - Oyon

Referencia : Contrato N°002-2020-MPSCH-LOG Servicio para la ejecución del
Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinales tramo El
Molle – Callayguida Baja – Emp LI-122 (Quiguir) Del Distrito de
Santiago de chuco Provincia Santiago de Chuco La Libertad y
Servicio de Mantenimiento Rutinario y Periódico de los Caminos
Vecinales Tramo Mungurrall – Santa Rosa – Oyon del Distrito de
Santiago de Chuco Provincia Santiago de Chuco La Libertad.

Mediante la presente, me dirijo a Usted, para hacerle llegar a su despacho el Informe Mensual de Valorización N° 01 del Servicio Tramo: Mungurrall – Santa Rosa – Oyon Anexo 04, documento que forma parte de la fase 3 del presente contrato descrito en la referencia.

Así mismo adjunto a la presente la documentación pertinente.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

CONSORCIO SANTA ROSA


Nancy Nicodemos Salazar
DNI: 44797900

REPRESENTANTE COMUN

Representante Común



RECIBIDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros
CIP N° 74375
INGENIERO DE OBRAS

recibido el 03/02/21

01 cd + 02 copias + 01 original

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL TRAMO: MUNGURRAL – SANTA ROSA - OYON, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO
– PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD



“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”.

CARTA N°003 - 2021

Santiago de Chuco, 02 de Febrero de 2021.

Señor : NANCY NICODEMOS SALAZAR
Representante de la empresa contratista

De : ING. MARCO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ
Residente del Servicio

Asunto : ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACIÓN N°
01 – ANEXO N° 04
TRAMO: MUNGURRAL – SANTA ROSA - OYON

Referencia : CONTRATO N°002-2020-MPSCH-LOG SERVICIO PARA
LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINALES TRAMO EL MOLLE
– CALLAYGUIDA BAJA – EMP LI-122 (QUIGUIR) DEL
DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA
SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD Y SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LOS
CAMINOS VECINALES TRAMO MUNGURRAL – SANTA
ROSA – OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO
PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD.

Por medio de la presente, me es grato saludarle cordialmente a usted y a la vez para hacerle alcance el INFORME MENSUAL DE VALORIZACIÓN N° 1 DEL SERVICIO TRAMO: MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON , ANEXO N° 04, según indicado en la referencia.

A la espera de la aprobación respectiva.

Atentamente.



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Consejo Departamental Ancash - Huaraz

Marco Velásquez Velásquez
INGENIERO CIVIL
REG. CIP 89468

Residente del Servicio

recibido el 02/03/2021

CONSORCIO SANTA ROSA

Nancy Nicodemos Salazar

REG. D.L. 137300
REPRESENTANTE COMUN

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD



INFORME MENSUAL N°01
DE ENERO DEL 2021
EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO

FASE: III
ANEXO N° 04



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Gilmer Enrique Bazar Cisneros
CIP. N° 74375
INSPECTOR DE OBRA



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

**Provias
Descentralizado**



**MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
SANTIAGO DE CHUCO**

CONSORCIO SANTA ROSA

Nancy Nicodemos Salazar
Nancy Nicodemos Salazar
DNI: 44797100
REPRESENTANTE COMUN



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Consejo Departamental Ancash - Huaraz

Marco Velásquez Velásquez
Marco Velásquez Velásquez
INGENIERO CIVIL
REG. CIP 89468

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL TRAMO: MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO –
PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD



INDICE

- 1.0 INFORMACIÓN CONTRACTUAL
- 2.0 REPORTES DE TRABAJO – FASE III
- 3.0 PROGRAMACIÓN DE TRABAJO MENSUAL – FASE III
 - 3.1 PROGRAMACIÓN REAL EJECUTADO
 - 3.2 PROGRAMACIÓN DEL MES
 - 3.3 PROGRAMACIÓN DEL SIGUIENTE MES
- 4.0 RECURSOS UTILIZADOS
- 5.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
- 6.0 PANEL FOTOGRÁFICO
- 7.0 COPIAS DEL CUADERNO DE MANTENIMIENTO
- 8.0 PUNTOS CRÍTICOS
- 9.0 ANEXOS
 - 9.1 FACTURA
 - 9.2 RELACIÓN DE PERSONAL, ROTATIVO, SOCIOS O TRABAJADOR.
 - 9.3 TAREO MENSUAL DE PERSONAL CON RESPECTIVA COPIA DE DNI.
 - 9.4 PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE PERSONAL DEL MES ANTERIOR.
 - 9.5 COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
 - 9.6 COPIA DE CONTRATO Y CONTRATO DE CONSORCIO EN CASO CORRESPONDA.
 - 9.7 COPIA DE SEGUROS DEL PERSONAL Y VEHÍCULOS UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y HERRAMIENTAS.
 - 9.8 DECLARACIÓN JURADA DE NO ADEUDO DE LOS PERSONALES DE CAMPO Y AUTORIDADES DE LA ZONA.
 - 9.9 PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y PREVENCIÓN COVID-19 EN EL TRABAJO.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO

Ing. Gilmer Enrique Daza Cisneros
E.I.P. N° 14375
INSPECTOR DE OBRA


COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Consejo Departamental Ancash - Huaraz


Marco Velasquez Velasquez
INGENIERO CIVIL
REG. CIP 99468


CONSORCIO SANTA ROSA
Nancy Nicodemos Salazar
DNI: 44797900
REPRESENTANTE COMUN

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD



1.0 INFORMACIÓN CONTRACTUAL



SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD



INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP N° 74375

191


INFORME N° 001-2021 ING° GEBC-IO/MPSCH.

A : ING° DAVID IVAN SILVA TORRES.
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA – MPSCH

ATENCIÓN : ING° RAFAEL KEVINALAN VALENCIA REBAZA
GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MPSCH

DE : ING° GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS.
INSPECTOR DE OBRA

ASUNTO : CONFORMIDAD DEL INFORME MENSUAL DE VALORIZACIÓN N°01 – ANEXO N°04
TRAMO: EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP L1-122 (QUIGUIR)



REFERENCIA : CONTRATO DE SERVICIO N°002-2020-MPSCH-LOG: “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL
MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO
DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD Y SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO
MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO
PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD”.

FECHA : Santiago de Chuco, 05 de FEBRERO del 20201

*Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente, así mismo hacer de su conocimiento que dada la Obra: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD”. Se alcanza la conformidad correspondiente del **INFORME MENSUAL DE VALORIZACIÓN N°01 – ANEXO N°04 TRAMO: EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP L1-122 (QUIGUIR)** durante el periodo de trabajo del mes de **ENERO**.*

Es todo cuanto tengo que informar a Ud. Para su conocimiento y fines.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO

Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros
CIP. N° 74375
INSPECTOR DE OBRA



INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP N° 74375

140

VALORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE SERVICIO RUTINARIO N° 01

INFORME DE INSPECCIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N° 02

FASE III –ANEXO N°04

ENERO – 2021

SERVICIO:

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS
VECINALES TRAMO:

**“EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA EMP LI-122
(QUIGUIR), DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO –
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO- LA
LIBERTAD.”**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO

Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros
CIP. N° 74375
INSPECTOR DE OBRA



INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP N° 74375

189

INFORME MENSUAL DE LA INSPECCIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N° 01; DEL MES DE ENERO

01.00 DATOS GENERALES

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA – MPSCH
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL – IVP – MPSCH

NOMBRE DEL MANTENIMIENTO:

“MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA EMP LI-122, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”.

UBICACIÓN:

DISTRITO : SANTIAGO DE CHUCO
PROVINCIA : SANTIAGO DE CHUCO
REGION : LA LIBERTAD

PROCESO DE SELECCIÓN:

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 017- 2020-MPSCH/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA. CONTRATO DE SERVICIO N° 002-2020-MPSCH-LOG. PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDICO Y RUTINARIO “MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO MUNGURRAL – SANTA ROSA - OYON, EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – QUIGUIR DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

ALCALDE:

SR. JUAN ALBERTO GABRIEL ALIPIO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

POR CONTRATA

MONTO REFERENCIAL (con IGV)

S/. 1'058,560.07

MONTO CONTRATADO (con IGV)

S/. 1'058,560.07

FACTOR DE RELACIÓN:

1.00000

CONTRATISTA:

CONSORCIO SANTA ROSA

PRESUPUESTO CONTRATADO:

S/. 1'058,560.07



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO

Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros
CIP N° 74375
INSPECTOR DE OBRA



INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP N° 74375

188

SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
A SUMA ALZADA

FIRMA DEL CONTRATO:
21/08/2020

FECHA DE ENTREGA DEL TERRENO:
22/08/2020

PAGO ADELANTO DIRECTO:
NO SE SOLICITO

PAGO ADELANTO DE MATERIALES:
NO SE SOLICITO

FECHA CONTRACTUAL DE INICIO DEL SERVICIO M. RUTINARIO:
01/01/2021

FECHA CONTRACTUAL DE TERMINO DEL SERVICIO M. RUTINARIO:
31/12/2021

PLAZO DE EJECUCIÓN:
500 DÍAS CALENDARIOS

INSPECTOR DE SERVICIO:
ING° GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS

RESIDENTE DE OBRA:
ING° MARCO VELASQUEZ VELASQUEZ

AVANCE EJECUTADO MES DE ENERO-2021:
8.33%

AVANCE PROGRAMADO MES DE ENERO-2021:
8.33%

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO:
8.33%

AVANCE EJECUTADO ACUMULADO:
8.33%



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO

Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros
CIP N° 74375
INSPECTOR DE OBRA



INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP N° 74375

187

ALCANCES GENERALES

La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, en atención al Decreto de Urgencia N° 070-2020; viene inspeccionando los trabajos correspondientes a la ejecución del Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario: **"MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE-CALLAYGUIDA BAJA-EMP LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"**, Mantenimiento Rutinario que beneficiara a las comunidades ,en lo siguiente:

Item	Descripción	Unid.	Cantidad
1	MANTENIMIENTO RUTINARIO		
1.1	CONSERVACIÓN DE CALZADA		
1.1.1	LIMPIEZA DE CALZADA	km	13.00
1.1.2	BACHEO CAMINO TIPO I	m ²	1,448.42
1.1.3	BACHEO CAMINO TIPO II	m ²	911.57
1.1.4	BACHEO CAMINO TIPO III	m ²	0.00
1.1.5	DESQUINCHE	m ²	383.00
1.1.6	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m ²	5.40
1.1.7	PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORE DE MATERIAL	m ²	7,200.72
1.2	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE		
1.2.1	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	13,000.00
1.2.2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLA	u	7.00
1.2.3	LIMPIEZA DE BADEN	m ²	0.00
1.2.4	LIMPIEZA DE ZANJAS DE CORONACIÓN	m	0.00
1.2.5	LIMPIEZA DE PONTONES	u	0.00
1.2.6	ENCAUZAMIENTO DE PEQUEÑOS CURSOS DE AGUA	m	241.09
1.3	CONTROL DE VEGETACIÓN		
1.3.1	ROCE Y LIMPIEZA	m ²	664.44
1.4	SEGURIDAD VIAL		
1.4.1	CONSERVACIÓN DE SEÑALES	u	29.00
1.5	MEDIO AMBIENTE		
1.5.1	REFORESTACIÓN	u	165.00
1.6	VIGILANCIA Y CONTROL		
1.6.1	VIGILANCIA Y CONTROL	km	169.00
1.7	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA		
1.7.1	REPARACIÓN DE MUROS SECOS	m ²	0.00
1.7.2	REPARACIÓN DE PONTONES	u	0.00





INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP N° 74375

186

METAS FÍSICAS POR ALCANZAR:

Descripción del Proyecto

Objetivos y Metas

El servicio consiste en el mantenimiento periódico y rutinario en un tramo de 13.00 km en el tramo siguiente: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE-CALLAYGUIDA BAJA-EMP LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

El proyecto contempla las siguientes metas.

VALORIZACION MENSUAL N° 01

PERIODO: MES 01 (ENERO DEL 2021)

PROYECTO "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP - LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO LONGITUD 13 KM

ÍTEM	DESCRIPCION	Und	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	ANTERIOR EJECUTADO ACUMULADO			EJECUTADO MES 01			ACUMULADO EJECUTADO TOTAL			SALDO TOTAL A EJECUTAR			
						METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	
1.0 MANTENIMIENTO RUTINARIO																		
1.1.1	limpieza de calzada	km	13.00	715.49	9,301.11	-	0.00	0.00%	1.08	775.08	8.33%	1.08	775.08	8.33%	11.92	8,526.02	91.67%	
1.1.2	Bacheo camino tipo I	m²	1,448.42	22.96	33,255.68	-	0.00	0.00%	120.70	2,771.31	8.33%	120.70	2,771.31	8.33%	1327.72	30,484.47	91.67%	
1.1.3	Bacheo camino tipo II	m²	911.57	22.96	20,928.85	-	0.00	0.00%	75.08	1,744.14	8.33%	75.96	1,744.14	8.33%	855.61	18,185.51	91.67%	
1.1.4	Bacheo camino tipo III	m²	0.00	22.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.5	Desquinche	m²	383.00	55.70	21,718.10	-	0.00	0.00%	31.92	1,809.88	8.33%	31.92	1,809.88	8.33%	351.08	19,908.43	91.67%	
1.1.6	Remoción de derrumbes	m²	5.40	47.70	257.58	-	0.00	0.00%	0.45	21.47	8.33%	0.45	21.47	8.33%	4.95	238.12	91.67%	
1.1.7	Pertido de la superficie sin aporte de material	m²	7,300.72	2.13	15,337.53	-	0.00	0.00%	608.08	1,278.13	8.33%	608.08	1,278.13	8.33%	8800.68	14,058.41	91.67%	
1.2 SERVICIO DE CUNETA																		
1.2.1	limpieza de cunetas	m	13,000.00	1.18	15,340.00	-	0.00	0.00%	1,083.33	1,278.33	8.33%	1,083.33	1,278.33	8.33%	11916.67	14,061.67	91.67%	
1.2.2	limpieza de alcantarilla	u	7.00	274.54	1,921.78	-	0.00	0.00%	0.58	125.21	8.33%	0.58	125.21	8.33%	6.42	1,377.27	91.67%	
1.2.3	limpieza de bacheos	m²	0.00	14.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.4	limpieza de zonas de canalización	m	0.00	1.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.5	limpieza de puentes	u	0.00	263.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.6	Encauzamiento de pequeños cursos de agua	m	241.09	7.16	1,728.20	-	0.00	0.00%	20.08	143.85	8.33%	20.08	143.85	8.33%	221.00	1,582.35	91.67%	
1.3	Roca y Limpieza	m²	664.44	0.36	239.20	-	0.00	0.00%	55.37	19.93	8.33%	55.37	19.93	8.33%	609.07	218.27	91.67%	
1.4	Conservación de Señales	u	29.00	30.03	871.74	-	0.00	0.00%	2.42	72.65	8.33%	2.42	72.65	8.33%	26.58	798.10	91.67%	
1.5	Reparación	u	165.00	1.41	232.65	-	0.00	0.00%	13.75	19.38	8.33%	13.75	19.38	8.33%	151.25	213.28	91.67%	
1.6	Vigilancia y Control	km	169.00	8.70	1,470.30	-	0.00	0.00%	14.08	122.53	8.33%	14.08	122.53	8.33%	154.02	1,347.78	91.67%	
1.7	Reparación de Muros secos	m²	0.00	117.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7.2	Reparación de Puentes	u	0.00	860.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COSTO DIRECTO S/.						122,180.22	0.00		10,181.69			10,181.69			111,998.53			
GANSTOS GENERALES						10.0%	12,218.02	0.00		1,018.17			1,018.17			11,199.85		
UTILIDAD						5.0%	6,109.01	0.00		509.08			509.08			5,599.93		
PARCIAL						140,507.25	0.00		11,708.94			11,708.94			128,798.31			
IGV						18.0%	25,291.31	0.00		2,107.61			2,107.61			23,183.70		
TOTAL S/.						165,798.56	0.00		13,816.55			13,816.55			151,982.01			
% DE AVANCE							0.00%		8.33%			8.33%			91.67%			





INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP N° 74375

185

CONTROL ECONÓMICO DEL SERVICIO

PRESUPUESTO CONTRATADO. - El Presupuesto Contratado, para el servicio de ejecución del mantenimiento periódico y rutinario, se compone de una fórmula de la siguiente manera: FORMULA N° 02 "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE-CALLAYGUIDA BAJA-EMP LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

CONTROL DE VALORIZACIONES DEL SERVICIO:

El avance acumulado contractual, incluye IGV de la Valorización N° 01 es el siguiente:

Total, Valorización N° 01	S/.	13,816.55
Total, Valorización Acumulada	S/.	13,816.55
Monto Total Contractual	S/.	165,798.56
Porcentaje de Avance Valorización N° 01		8.33%
Porcentaje de Avance Acumulado		8.33%

PLAZO DE LA OBRA:

El plazo contractual para el mantenimiento rutinario es de 365 días calendarios, se inició el 1 de Enero del 2021 y termina el 31 de Diciembre del 2021, en el transcurso del presente periodo de ejecución de obra el contratista no ha solicitado ampliación de plazo contractual (Art° 169 y 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.-Reglamento D. S. N° 350-2015-EF.- Ley N° 30225 y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1341 y D.S. N° 056-2017-EF.





INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

184

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP Nº 74375

COMENTARIOS DE LA INSPECCIÓN:

Los trabajos, se vienen realizando de forma normal de acuerdo a la programación de la obra, a la fecha del informe según Acta de Entrega de Terreno de fecha: 22-Agosto-2020 y Acta de Inicio M.Rutinario de Servicio de fecha: 01-Enero-2021; se viene realizando los trabajos según el presupuesto el Mantenimiento Rutinario

Así mismo la inspección constatará y verificará que; cumpla con los requisitos técnicos para el mantenimiento anual.

Se coordina con la Residencia, en lo referente a los avances de los trabajos, ya que nos encontramos en épocas de lluvias, propias de esta época del año, que desgastaran la plataforma de afirmado.

Durante los trabajos se pudo apreciar, que los trabajadores cuentan con implementos de seguridad (Casco, Botas, Chalecos, etc.)

CONTROL DE CAMPO:

La inspección ha realizado continuamente y permanentemente el control de campo en forma minuciosa verificando el cumplimiento de los documentos técnicos del Plan de Trabajo; los cuales son: Planos, Especificaciones Técnicas y Metrados del Expediente Técnico (Plan de Trabajo); así como también ordenes emitidas por el suscrito y correcciones cuando la situación ameritaba.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros
CIP Nº 74375
INSPECTOR DE OBRA

VALORIZACION MENSUAL N° 01

PERIODO: MES 01 (ENERO DEL 2021)

PROYECTO "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP - UJ 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

LONGITUD 13 KM

ÍTEM	DESCRIPCION	Und	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	ANTERIOR EJECUTADO		EJECUTADO MES 01		ACUMULADO EJECUTADO TOTAL		SALIDO TOTAL A EJECUTAR	
						METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO
1.0	MANTENIMIENTO RUTINARIO												
1.1	REPARACION DE CALZADA												
1.1.1	Limpeza de Calzada	km	13.00	715.47	9,301.11								
1.1.2	Bacheo camino tipo I	m ²	1,418.42	23.96	33,255.68								
1.1.3	Bacheo camino tipo II	m ²	911.57	22.96	20,929.65								
1.1.4	Bacheo camino tipo III	m ²	0.00	22.96									
1.1.5	Desquinche	m ³	383.00	54.70	21,116.10								
1.1.6	Remoción de derrumbes	m ³	5.40	47.70	257.38								
1.1.7	Pentado de la superficie sin aporte de material	m ²	7,200.72	2.13	15,337.53								
1.2.1	Limpeza de cunetas	m	13,000.00	1.18	15,340.00								
1.2.2	Limpeza de alcantarilla	u	7.00	214.64	1,502.48								
1.2.3	Limpeza de badén	m ²	0.00	4.18									
1.2.4	Limpeza de zanjas de coronación	m	0.00	1.18									
1.2.5	Limpeza de pautones	u	0.00	283.48									
1.2.6	Encruzamiento de pequeños cursos de agua	m	24.00	7.16	1,728.20								
1.3	CONTROL DE VEGETACION												
1.3.1	Roca y Limpieza	m ²	644.44	0.36	239.20								
1.4.1	Conservación de Señales	u	29.00	30.06	871.74								
1.5.1	Reforestación	u	165.00	1.41	232.65								
1.6.1	Vigilancia y Control	km	149.00	8.70	1,470.30								
1.7.1	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	m ³	0.00	117.44									
1.7.2	Reparación de Muros secos	u	0.00	860.55									
1.7.2	Reparación de Fontanes	u	0.00	860.55									
COSTO DIRECTO S/.						122,180.22	0.00	10,181.60	10,181.60	111,998.53	10,181.60	111,998.53	
GASTOS GENERALES						12,218.02	0.00	1,018.17	1,018.17	11,199.85	1,018.17	11,199.85	
UTILIDAD						6,109.01	0.00	509.08	509.08	5,599.93	509.08	5,599.93	
PARCIAL						140,507.25	0.00	11,708.94	11,708.94	128,798.31	11,708.94	128,798.31	
IGV						25,291.31	0.00	2,107.61	2,107.61	23,183.70	2,107.61	23,183.70	
TOTAL S/.						165,798.56	0.00	13,816.55	13,816.55	151,982.01	13,816.55	151,982.01	
% DE AVANCE							0.00%	8.33%	8.33%	91.67%	8.33%	91.67%	



Ing. Gimel Enrique Bazzan Osorio
CIP N° 74078
INSPECTOR DE OBRA

MANTENIMIENTO RUTINARIO

PROYECTO: "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP - LI 122(QUIQUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: DPTO: LA LIBERTAD PROV: SANTIAGO DE CHUCO DIST: SANTIAGO DE CHUCO LOC: EL MOLLE - CALLAYGUIDO

Longitud 13.00
IV-m-1

Item	Descripción	Unidad	N° ELEMENTOS	DIMENSIONES			AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL
				LARGO	ANCHO	ALTO				
1.0	MANTENIMIENTO RUTINARIO									
1.1	OBRAS PRELIMINARES									
1.1.1	Limpieza de Calzada	km	1.00	13.00				1.08	1.08	
1.1.2	Bacheo camino tipo I	m²	1.00			1,448.42		120.70	120.70	
1.1.2	Bacheo camino tipo II	m²	1.00			911.57		75.96	75.96	
1.1.2	Bacheo camino tipo III	m²	1.00			0.00		0.00	0.00	
1.1.3	Desquinche	m³	1.00				383.00	31.92	31.92	
1.1.4	Remoción de derrumbes	m³	1.00				5.40	0.45	0.45	
1.1.5	Perfilado de la superficie sin aporte de material	m²	1.00			7,200.72		600.06	600.06	
1.2	PAVIMENTOS									
1.2.1	Limpieza de Cunetas	m	1.00					1,083.33	1,083.33	
	PROGRESIVA 0+000 A 13+000			13,000.00						
1.2.2	Limpieza de Alcantarilla	und	7.00					0.58	0.58	
1.2.3	Limpieza de badén	m2	0.00					0.00	0.00	
1.2.4	Limpieza de zanjas de coronación	m	0.00					0.00	0.00	
1.2.5	Limpieza de pontones	u	0.00					0.00	0.00	
1.2.6	Encauzamiento de pequeños cursos de agua	m	1.00	241.09				20.09	20.09	
1.3	CONTROL DE VEGETACION									
1.3.1	Roce y Limpieza	m2	1.00				664.44	55.37	55.37	
1.4	SEGURIDAD VIAL									
1.4.1	Conservación de señales	u	29.00					2.42	2.42	
1.5	MEDIO AMBIENTE									
1.5.1	Reforestación	u	165.00					13.75	13.75	
1.6	VIGILANCIA Y CONTROL									
1.6.1	Vigilancia y Control	km	1.00	169.00				14.08	14.08	
1.7	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA									
1.7.1	Reparación de muros secos	m3	0.00					0.00	0.00	
1.7.2	Reparación de pontones	u	0.00					0.00	0.00	




CONTROL DE AVANCE DE EJECUCION

"SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO EL PROYECTO MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP -LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO: 365 DIAS CALENDARIO

GRAFICO DE AVANCE DE OBRA
PROGRAMADO ACUMULADO vs EJECUTADO ACUMULADO

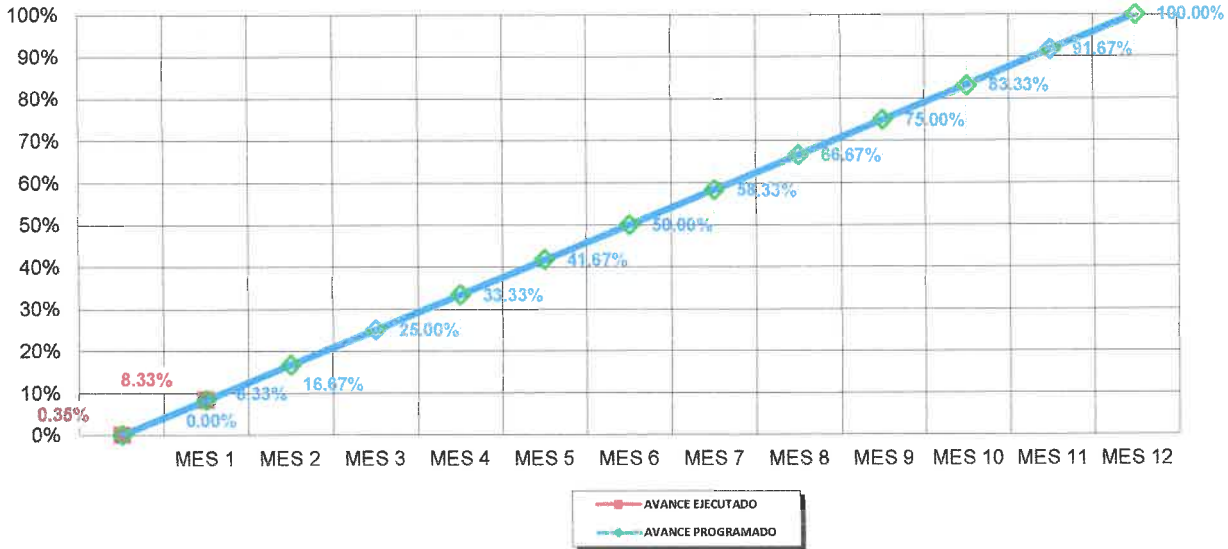

AVANCE PROGRAMADO					
N° de MES	MES	MONTOS TOTAL (Incl. IGV)		PORCENTAJES	
		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
		S/	S/	%	%
					0.00%
MES 1	ENERO	13,816.55	13,816.55	8.33%	8.33%
MES 2	FEBRERO	13,816.55	27,633.10	8.33%	16.67%
MES 3	MARZO	13,816.55	41,449.66	8.33%	25.00%
MES 4	ABRIL	13,816.55	55,266.21	8.33%	33.33%
MES 5	MAYO	13,816.55	69,082.76	8.33%	41.67%
MES 6	JUNIO	13,816.55	82,899.31	8.33%	50.00%
MES 7	JULIO	13,816.55	96,715.86	8.33%	58.33%
MES 8	AGOSTO	13,816.55	110,532.41	8.33%	66.67%
MES 9	SETIEMBRE	13,816.55	124,348.97	8.33%	75.00%
MES 10	OCTUBRE	13,816.55	138,165.52	8.33%	83.33%
MES 11	NOVIEMBRE	13,816.55	151,982.07	8.33%	91.67%
MES 12	DICIEMBRE	13,816.55	165,798.62	8.33%	100.00%
TOTAL		165,798.62		100.00%	

AVANCE EJECUTADO					
N° de MES	MES	MONTOS TOTAL (Incl. IGV)		PORCENTAJES	
		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
		S/	S/	%	%
					0.00%
MES 1	ENERO	13,816.55	13,816.55	8.33%	8.33%
MES 2	FEBRERO				
MES 3	MARZO				
MES 4	ABRIL				
MES 5	MAYO				
MES 6	JUNIO				
MES 7	JULIO				
MES 8	AGOSTO				
MES 9	SETIEMBRE				
MES 10	OCTUBRE				
MES 11	NOVIEMBRE				
MES 12	DICIEMBRE				
TOTAL		13,816.54		8.33%	



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO**
Ing. Gámer Enrique Bazán Cisneros
CIP N° 74375
INSPECTOR DE OBRA

CRONOGRAMA VALORIZADO VS EJECUTADO

PROYECTO : *SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP -
 LIZQUIGURI DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD*
 PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 UBICACIÓN : DPTO LA LIBERTAD PROV. SANTIAGO DE CHUCO DIST: SANTIAGO DE CHUCO LOC: EL MOLLE - CALLAYGUIDO

Item	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio	Parcial	Mes 1			Mes 2			Saldo por Ejecutar					
						METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%			
1	MANTENIMIENTO RUTINARIO																
1.1	CONSERVACIÓN DE CALZADA	km	13.00	715.47	9,301.11	1.08	775.09	8.33%	1.08	775.09	8.33%	11.92	8,526.02	91.67%			
1.1.1	LIMPIEZA DE CALZADA	m²	1,448.42	22.96	33,255.68	120.70	2,771.31	8.33%	120.70	2,771.31	8.33%	1,327.72	30,484.37	91.67%			
1.1.2	BACHEO CAMINO TIPO I	m²	911.57	22.96	20,929.65	75.96	1,744.14	8.33%	75.96	1,744.14	8.33%	835.61	19,185.51	91.67%			
1.1.3	BACHEO CAMINO TIPO II	m²	0.00	22.96													
1.1.4	BACHEO CAMINO TIPO III	m²	363.00	56.70	21,716.10	31.92	1,809.68	8.33%	31.92	1,809.68	8.33%	351.08	19,906.43	91.67%			
1.1.5	DESQUINCHE	m²	5.40	47.70	257.58	0.45	21.47	8.33%	0.45	21.47	8.33%	4.95	236.12	91.67%			
1.1.6	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m²	7,200.72	2.13	15,337.53	600.06	1,278.13	8.33%	600.06	1,278.13	8.33%	6,600.66	14,059.41	91.67%			
1.1.7	PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORE DE MATERIAL	m²															
1.2	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE	m	13,000.00	1.18	15,340.00	1,083.33	1,278.33	8.33%	1,083.33	1,278.33	8.33%	11,916.67	14,061.67	91.67%			
1.2.1	LIMPIEZA DE CUNETAS	u	7.00	214.64	1,502.48	0.58	125.21	8.33%	0.58	125.21	8.33%	6.42	1,377.27	91.67%			
1.2.2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLA	m²	0.00	14.18													
1.2.3	LIMPIEZA DE BAHEN	m	0.00	1.16													
1.2.4	LIMPIEZA DE ZANJAS DE CORONACIÓN	u	0.00	283.48													
1.2.5	LIMPIEZA DE PONTONES	m	241.09	7.16	1,726.20	20.09	143.85	8.33%	20.09	143.85	8.33%	221.00	1,562.35	91.67%			
1.2.6	ENCAJAZAMIENTO DE PEQUEÑOS CURSOS DE AGUA	m²	664.44	0.35	236.20	55.37	19.93	8.33%	55.37	19.93	8.33%	606.07	219.27	91.67%			
1.3	CONTROL DE VEGETACIÓN	u	29.00	30.06	871.74	2.42	72.65	8.33%	2.42	72.65	8.33%	26.58	798.10	91.67%			
1.3.1	ROCE Y LIMPIEZA	u	165.00	1.41	232.65	13.75	19.39	8.33%	13.75	19.39	8.33%	151.25	213.26	91.67%			
1.4	SEGURIDAD VIAL	km	169.00	8.70	1,470.30	14.08	122.53	8.33%	14.08	122.53	8.33%	154.92	1,347.78	91.67%			
1.4.1	CONSERVACIÓN DE SEÑALES	m²	0.00	117.44													
1.5	MEDIO AMBIENTE	u	0.00	860.55													
1.5.1	REFRESTACIÓN	u	0.00	860.55													
1.6	VIGILANCIA Y CONTROL	m²	165,798.96														
1.6.1	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA	u	0.00	117.44													
1.7	REPARACIÓN DE MUROS SECOS	m²	0.00	860.55													
1.7.1	REPARACIÓN DE MUROS SECOS	u	0.00	860.55													
1.7.2	REPARACIÓN DE PONTONES	u	0.00	860.55													
Costo directo:					122,180.22		10,181.69						10,181.69				111,998.53
Gastos Generales (10.00%)					12,218.02		1,018.17						1,018.17				11,199.85
Utilidad (5.00%)					6,109.01		509.08						509.08				5,599.93
Parcial					140,507.25		11,708.94						11,708.94				128,798.31
I.G.V (18.00%)					25,291.31		2,107.61						2,107.61				23,183.70
TOTAL					165,798.56		13,816.55						13,816.55				151,982.01
Porcentaje de avance por Mes							8.33%						8.33%				91.67%
Porcentaje de avance acumulado							8.33%						8.33%				91.67%



MANTENIMIENTO RUTINARIO

PROYECTO: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES. TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP -LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: DPTO: LA LIBERTAD PROV: SANTIAGO DE CHUCO DIST: SANTIAGO DE CHUCO LOC: EL MOLLE - CALLAYGUIDO

Longitud (Km) 13.00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Parcial	Sub Total
1.0	MANTENIMIENTO RUTINARIO					122,180.23
1.1	CONSERVACION DE CALZADA					100,797.65
1.1.1	Limpieza de calzada	km	13.00	715.47	9,301.11	
1.1.2	Bacheo camino tipo I	m ²	1,448.42	22.96	33,255.68	
1.1.3	Bacheo camino tipo II	m ²	911.57	22.96	20,929.65	
1.1.4	Bacheo camino tipo III	m ²	0.00	22.96	0.00	
1.1.5	Desquinche	m ³	383.00	56.70	21,716.10	
1.1.6	Remoción de derrumbes	m ³	5.40	47.70	257.58	
1.1.7	Perfilado de la superficies sin aporte de material	m ²	7,200.72	2.13	15,337.53	
1.2	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE					18,568.68
1.2.1	Limpieza de cunetas	m	13,000.00	1.18	15,340.00	
1.2.2	Limpieza de alcantarilla	u	7.00	214.64	1,502.48	
1.2.3	Limpieza de baden	m ²	0.00	14.18	0.00	
1.2.4	Limpieza de zanjas de coronación	m	0.00	1.18	0.00	
1.2.5	Limpieza de pontones	u	0.00	283.48	0.00	
1.2.6	Encauzamiento de pequeños cursos de agua	m	241.09	7.16	1,726.20	
1.3	CONTROL DE VEGETACION					239.20
1.3.1	Roce y limpieza	m ²	664.44	0.36	239.20	
1.4	SEGURIDAD VIAL					871.74
1.4.1	Conservación de señales	u	29.00	30.06	871.74	
1.5	MEDIO AMBIENTE					232.65
1.5.1	Reforestación	u	165.00	1.41	232.65	
1.6	VIGILANCIA Y CONTROL					1,470.30
1.6.1	Vigilancia y control	km	169.00	8.70	1,470.30	
1.7	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA					0.00
1.7.1	Reparación de muros secos	m ³	0.00	117.44	0.00	
1.7.2	Reparación de pontones	u	0.00	860.55	0.00	

Costo Directo		122,180.22
Gastos Generales	10.00%	12,218.02
Utilidad	5.00%	6,109.01
Parcial		140,507.25
I.G.V.	18.00%	25,291.31
TOTAL :		165,798.56

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 56/100 SOLES





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

INFORME MENSUAL N° 01
EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

“SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA-EMP. LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO- PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO”



ENERO – 2021



"CONSORCIO SANTA ROSA"

177

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

Santiago de Chuco, 03 de febrero del 2021

CARTA N° 0001-2021-CONSORCIO SANTA ROSA.

Señor:
ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS
INGENIERO INSPECTOR

Asunto : Presentación del Informe Mensual de Valorización N°01 – Anexo N° 04
Tramo: tramo El Molle – Callayguida Baja – Emp LI-122 (Quiguir)

Referencia : Contrato N°002-2020-MPSCH-LOG Servicio para la ejecución del
Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinales tramo El
Molle – Callayguida Baja – Emp LI-122 (Quiguir) Del Distrito de
Santiago de chuco Provincia Santiago de Chuco La Libertad y
Servicio de Mantenimiento Rutinario y Periódico de los Caminos
Vecinales Tramo Mungurrall – Santa Rosa – Oyon del Distrito de
Santiago de Chuco Provincia Santiago de Chuco La Libertad.

Mediante la presente, me dirijo a Usted, para hacerle llegar a su despacho el Informe
Mensual de Valorización N° 01 del Servicio Tramo: tramo El Molle – Callayguida Baja
– Emp LI-122 (Quiguir)– Anexo 04, documento que forma parte de la fase 3 del
presente contrato descrito en la referencia.

Así mismo adjunto a la presente la documentación pertinente.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,


CONSORCIO SANTA ROSA
Nancy Nicodemos Salazar
DNI: 44791900
REPRESENTANTE COMÚN
Representate Común



recibi el 03/02/21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros
CIP. N° 74375
INSPECTOR DE OBRA

1cd - 01 original - 02 copias

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL TRAMO: "EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP.LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE
SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD



"CONSORCIO SANTA ROSA"

176

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia".

CARTA N°001 - 2021

Santiago de Chuco, 02 de febrero de 2021.

Señor : **NANCY NICODEMOS SALAZAR**
Representante de la empresa contratista

De : **ING. MARCO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ**
Residente del Servicio

**Asunto : ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACIÓN N°
01 – ANEXO N° 04
TRAMO: EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP.LI-122
(QUIGUIR)**

**Referencia : CONTRATO N°002-2020-MPSCH-LOG SERVICIO PARA
LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINALES TRAMO EL MOLLE
– CALLAYGUIDA BAJA – EMP LI-122 (QUIGUIR) DEL
DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA
SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD Y SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LOS
CAMINOS VECINALES TRAMO MUNGURRAL – SANTA
ROSA – OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO
PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD.**

Por medio de la presente, me es grato saludarle cordialmente a usted y a la vez para hacerle alcance el INFORME MENSUAL DE VALORIZACIÓN N° 01 DEL SERVICIO TRAMO: EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP LI-122 (QUIGUIR) - ANEXO N° 04, según indicado en la referencia.

A la espera de la aprobación respectiva.

Atentamente.

CONSORCIO SANTA ROSA

Nancy Nicodemos Salazar
Nancy Nicodemos Salazar
DNI: 44187800
REPRESENTANTE COMUN

recibi el 02/02/2021



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Consejo Departamental Ancash - Huancayo

Marco Velasquez Velasquez
Marco Velasquez Velasquez
INGENIERO CIVIL
REG. CIR. 95438

Residente del Servicio

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP.LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD



“CONSORCIO SANTA ROSA”

INFORME MENSUAL N°01

DE ENERO DEL 2020

EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO

FASE: III

ANEXO N° 04



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCÚ
Ing. Gilmer Enrique Bazán Cisneros
CIP. N° 74375
INSPECTOR DE OBRA



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Provias
Descentralizado



**MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
SANTIAGO DE CHUCO**

CONSORCIO SANTA ROSA

Nancy Nicodermos Salazar
Nancy Nicodermos Salazar
DNI: 44797900

REPRESENTANTE COMÚN



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Consejo Departamental Ancash - Huaraz

Marco Velasquez Velasquez
Marco Velasquez Velasquez
INGENIERO CIVIL
REG. CIP 99468

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL TRAMO: EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP.LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE
SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD



"CONSORCIO SANTA ROSA"

INDICE

- 1.0 INFORMACIÓN CONTRACTUAL
- 2.0 REPORTES DE TRABAJO – FASE III
- 3.0 PROGRAMACIÓN DE TRABAJO MENSUAL – FASE III
 - 3.1 PROGRAMACIÓN REAL EJECUTADO
 - 3.2 PROGRAMACIÓN DEL MES
 - 3.3 PROGRAMACIÓN DEL SIGUIENTE MES
- 4.0 RECURSOS UTILIZADOS
- 5.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
- 6.0 PANEL FOTOGRÁFICO
- 7.0 COPIAS DEL CUADERNO DE MANTENIMIENTO
- 8.0 PUNTOS CRÍTICOS
- 9.0 ANEXOS
 - 9.1 FACTURA
 - 9.2 RELACIÓN DE PERSONAL, ROTATIVO, SOCIOS O TRABAJADOR.
 - 9.3 TAREO MENSUAL DE PERSONAL CON RESPECTIVA COPIA DE DNI.
 - 9.4 PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE PERSONAL DEL MES ANTERIOR.
 - 9.5 COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
 - 9.6 COPIA DE CONTRATO Y CONTRATO DE CONSORCIO EN CASO CORRESPONDA.
 - 9.7 COPIA DE SEGUROS DEL PERSONAL Y VEHÍCULOS UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y HERRAMIENTAS.
 - 9.8 DECLARACIÓN JURADA DE NO ADEUDO DE LOS PERSONALES DE CAMPO Y AUTORIDADES DE LA ZONA.


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
 DE SANTIAGO DE CHUCO
 Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros
 CIP. N° 74375
 INSPECTOR DE OBRA


CONSORCIO SANTA ROSA
 Nancy Woodempe Salazar
 DNI: 44787900
 REPRESENTANTE COMUN


 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
 Consejo Departamental Ancash - Huáraz
 Marco Velasquez Velasquez
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP 99468

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP.LI-122 (QUIQUIR), DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD



“CONSORCIO SANTA ROSA”



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCÚ
Ing. Gilmer Enrique Bazán Caseros
CIP N° 74378
INSPECTOR DE OBRA

1.0 INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONSORCIO SANTA ROSA

Nancy Nicodemos Salazar
Nancy Nicodemos Salazar
DNI 4792900
REPRESENTANTE COMUN



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Consejo Departamental Ancash - Huanaz

Marco Velasquez Velasquez
Marco Velasquez Velasquez
INGENIERO CIVIL
REG. CIP 99488

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP.LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD



"CONSORCIO SANTA ROSA"

1.0 INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL SERVICIO	: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA - EMP LI-122 (QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD
N° DE CONTRATO	: N°002-2020-MPSCH-LOG
PROCESO DE SELECCIÓN DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN	: N° 017-2020-MPSCH/CS
ENTIDAD CONTRATANTE	: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
CONTRATISTA	: CONSORCIO SANTA ROSA
RESIDENTE DE SERVICIO	: ING. RONAL ARAUJO BAUTISTA
INSPECTOR	: ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 485 D.C.
MONTO CONTRACTUAL	: S/ 1,105,323.77
PRESUPUESTO DEL PLAN DE TRABAJO	: S/ 11,053.00
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO	: S/ 917,419.040
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	: S/ 165,799.00
PRESUPUESTO DE INVENTARIO VIAL	: S/ 11,053.00
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	: 485 D.C.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros
CIP N° 74376
INSPECTOR DE OBRA

CONSORCIO SANTA ROSA

Nancy Nicodemos Salazar
DNI: 44791900
REPRESENTANTE COMUN



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Consejo Departamental Ancash - Huancayo

Marco Velasquez Velasquez
INGENIERO CIVIL
REG. CIP 99488

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP.LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD



“CONSORCIO SANTA ROSA”



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. Gilmer Enrique Bazán Cisneros
CIP. N° 74375
INSPECTOR DE OBRA

1.1 VALORIZACIÓN MENSUAL - FASE III

CONSORCIO SANTA ROSA

Nancy Nicodemos Salazar
Nancy Nicodemos Salazar
CNI: 44707900
REPRESENTANTE COMUN



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Consejo Departamental Ancash - Huaraz

Marco Velasquez Velasquez
Marco Velasquez Velasquez
INGENIERO CIVIL
REG. CIP 99468

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL TRAMO: "EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP. LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE
SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO
Inq. Gilmar Enrique Bazan Cisneros
SUI N.º 74375
INDEPENDENCIA DE PERU

CERTIFICADO DE PAGO
(PAGO A CUENTA A CANCELAR AL CONTRATISTA)

CONSORCIO SANTA ROSA
Nancy Nicodermos Salazar
Nancy Nicodermos Salazar
DNI: 44787990
REPRESENTANTE COMUN



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Consejo Departamental Ancash - Huánuco

Marco Velasquez Velasquez
Marco Velasquez Velasquez
INGENIERO CIVIL
REG. CIP 99468

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: “EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP.LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD

CONSORCIO SANTA ROSA	CERTIFICADO DE PAGO PAGO A CUENTA A CANCELAR AL CONTRATISTA	Cod. Proyec.	01-2020
		Valoriz.:	1
		Revisión:	A

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP -LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

REGION	: LA LIBERTAD	SISTEMA DE CONTRATACIÓN	: A SUMA ALZADA
DEPARTAMENTO	: LA LIBERTAD	MONTO MANTENIMIENTO PERIODICO	: S/. 777,473.49 Sin IGV
PROVINCIA	: SANTIAGO DE CHUCO	CONTRATISTA	: CONSORCIO SANTA ROSA
DISTRITO	: SANTIAGO DE CHUCO	INSPECCION DEL SERVICIO	: ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS

VALORIZACION N° 01

DESCRIPCION	VALORIZACION
1 VALORIZACIÓN CONTRACTUAL (V)	11,708.94
MONTO VALORIZADO SIN REAJUSTE	11,708.94
MONTO BRUTO DE LA VALORIZACION N° 01	11,708.94
MONTO POR REAJUSTE	(0.00)
REAJUSTE DE LA VALORIZACION N° 1	0.00
REGULARIZACION DE REAJUSTE VAL. N° 1	0.00
RETENCIÓN POR ATRASO DE OBRA	0.00
AMORTIZACION POR ADELANTO DIRECTO	(0.00)
AMORTIZACION POR ADELANTO DIRECTO	0.00
REGUL. AMORTIZACIÓN POR ADELANTO DIRECTO MES ANTERIOR	0.00
AMORTIZACION POR ADELANTO ESPECIFICO DE MATERIALES	(0.00)
AMORTIZACION POR ADELANTO DE MATERIALES	0.00
REGUL. AMORTIZACIÓN POR ADELANTO DE MATERIALES	0.00
DEDUC. DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE	(0.00)
DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE POR ADELANTO DIRECTO	0.00
REGULARIZACIÓN DE DEDUCC. DEL REAJ. POR ADELANTO DIRECTO	0.00
DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE POR ADELANTO DE MATERIALES	0.00
REGULARIZAC. DE DEDUCC. DEL REAJ. POR ADELANTO MATERIALES	0.00
I MONTO FACTURABLE (SIN IGV)	11,708.94
MULTAS Y OBLIGACIONES VARIAS	0.00
- RETENCION POR GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO	0.00
- RETENCION POR RETRASO DE OBRA	0.00
II TOTAL DE DEDUCCIONES	0.00
III MONTO LIQUIDO A PAGAR (I-II)	11,708.94
IV IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18% I)	2,107.61

V MONTO A FACTURAR (I+IV)	13,816.55
----------------------------------	------------------

TRECE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 55/100 SOLES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros
 CIP N° 74378
 INSPECTOR DE OBRA

CONSORCIO SANTA ROSA
 Nancy Nicodemos Salazar
 DNI: 44797900
 REPRESENTANTE COMUN

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
 Consejo Departamental Ancash - Huaraz
 Marco Velasquez Velasquez
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP 99468



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO

Ing. Gilmer Enrique Pizarro Cisneros
CIP. N° 14375
INSPECTOR DE OBRA

RETENCIÓN DE GARANTÍA

CONSORCIO SANTA ROSA

Nancy Nicodemus Salazar
Nancy Nicodemus Salazar

REPRESENTANTE COMUN



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Consejo Departamental Ancash - Huaraz

Marco Velasquez Velasquez
Marco Velasquez Velasquez
INGENIERO CIVIL
REG. CIP 99488

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP. LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCUITO

Ing. Gilmer Enrique Bazañán Cisneros
CIP. N° 71375
INSPECTOR DE OBRA

PRESUPUESTO RESUMEN

CONSORCIO SANTA ROSA


Nancy Nicodemos Salazar

DNI: 44797900

REPRESENTANTE COMUN



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Consejo Departamental Arequipa - Huancayo


Marco Velasquez Velasquez

INGENIERO CIVIL
REB. CIP 99468

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: “EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP.LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD

MANTENIMIENTO RUTINARIO

PROYECTO: "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP -LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: DPTO: LA LIBERTAD PROV: SANTIAGO DE CHUCO DIST: SANTIAGO DE CHUCO LOC: EL MOLLE - CALLAYGUIDO

Longitud (Km) 13.00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Parcial	Sub Total
1.0	MANTENIMIENTO RUTINARIO					10,181.69
1.1	CONSERVACION DE CALZADA					8,399.81
1.1.1	Limpieza de calzada	km	1.08	715.47	775.09	
1.1.2	Bacheo camino tipo I	m ²	120.70	22.96	2,771.31	
1.1.3	Bacheo camino tipo II	m ²	75.96	22.96	1,744.14	
1.1.4	Bacheo camino tipo III	m ²	0.00	22.96	0.00	
1.1.5	Desquinche	m ³	31.92	56.70	1,809.68	
1.1.6	Remoción de derrumbes	m ³	0.45	47.70	21.47	
1.1.7	Perfilado de la superficies sin aporte de material	m ²	600.06	2.13	1,278.13	
1.2	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE					1,547.39
1.2.1	Limpieza de cunetas	m	1,083.33	1.18	1,278.33	
1.2.2	Limpieza de alcantarilla	u	0.58	214.64	125.21	
1.2.3	Limpieza de baden	m ²	0.00	14.18	0.00	
1.2.4	Limpieza de zanjas de coronación	m	0.00	1.18	0.00	
1.2.5	Limpieza de pontones	u	0.00	283.48	0.00	
1.2.6	Encauzamiento de pequeños cursos de agua	m	20.09	7.16	143.85	
1.3	CONTROL DE VEGETACION					19.93
1.3.1	Roce y limpieza	m ²	55.37	0.36	19.93	
1.4	SEGURIDAD VIAL					72.65
1.4.1	Conservación de señales	u	2.42	30.06	72.65	
1.5	MEDIO AMBIENTE					19.39
1.5.1	Reforestación	u	13.75	1.41	19.39	
1.6	VIGILANCIA Y CONTROL					122.53
1.6.1	Vigilancia y control	km	14.08	8.70	122.53	
1.7	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA					0.00
1.7.1	Reparación de muros secos	m ³	0.00	117.44	0.00	
1.7.2	Reparación de pontones	u	0.00	860.55	0.00	

Costo Directo		10,181.69
Gastos Generales	10.00%	1,018.17
Utilidad	5.00%	509.08
Parcial		11,708.94
I.G.V.	18.00%	2,107.61
TOTAL :		13,816.55

SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 55/100 SOLES



CONSORCIO SANTA ROSA
 Nancy Nicodemos Satazar
 DNI 44737900
 REPRESENTANTE COMUN

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
 Consejo Departamental Arequipa - Arequipa
 Marco Velásquez Velásquez
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP 99-60



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO

Ing. Glimar Enrique Bazán Cisneros

CIP N° 74375

VALORIZACIÓN MENSUAL N°01

CONSORCIO SANTA ROSA

Nancy Nicodemos Salazar
Nancy Nicodemos Salazar
DNI: 44797900
REPRESENTANTE COMUN



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Consejo Departamental Arequipa - Huaraz

Marco Velazquez Velasquez
Marco Velazquez Velasquez
INGENIERO CIVIL
REG. CIP 99488

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: “EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP.LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD

VALORIZACION MENSUAL N° 01


PERIODO: MES 01 (ENERO DEL 2021)

PROYECTO "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP - LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

LONGITUD 13 KM

ÍTEM	DESCRIPCION	Und	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	ANTERIOR EJECUTADO ACUMULADO		EJECUTADO MES 01		ACUMULADO EJECUTADO TOTAL		SALDO TOTAL A EJECUTAR			
						METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	
MANTENIMIENTO RUTINARIO															
1.0	Limpiereza de canchales	m	13.00	715.47	9,301.11	-	0.00	0.00%	1.08	775.09	1.08	775.09	11.92	8,526.02	91.67%
1.1.1	Limpiereza de Calzada	km	1.448.42	22.96	33,255.68	-	0.00	0.00%	120.70	2,771.31	120.70	2,771.31	1327.72	30,484.41	91.67%
1.1.2	Bacheo camino tipo I	m²	911.57	22.96	20,929.65	-	0.00	0.00%	75.96	1,744.14	75.96	1,744.14	835.61	19,185.51	91.67%
1.1.3	Bacheo camino tipo II	m²	0.00	22.96	-	-	0.00	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Bacheo camino tipo III	m²	383.00	56.70	21,716.10	-	0.00	0.00%	31.92	1,809.68	31.92	1,809.68	357.08	19,906.43	91.67%
1.1.5	Desquinche	m²	5.40	47.70	257.58	-	0.00	0.00%	0.45	21.47	0.45	21.47	4.95	236.12	91.67%
1.1.6	Remoción de derrumbes	m²	7,200.72	2.13	15,337.53	-	0.00	0.00%	600.06	1,278.13	600.06	1,278.13	6,600.66	14,059.41	91.67%
1.1.7	Perfilado de la superficie sin aporte de material	m²	13,000.00	1.18	15,340.00	-	0.00	0.00%	1,065.33	1,278.33	1,065.33	1,278.33	1,916.67	14,061.67	91.67%
1.2.1	Limpiereza de cunetas	m	7.00	214.64	1,502.48	-	0.00	0.00%	0.58	125.21	0.58	125.21	6.42	1,377.27	91.67%
1.2.2	Limpiereza de alcantarilla	u	0.00	14.18	-	-	0.00	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Limpiereza de borden	m²	0.00	1.18	-	-	0.00	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Limpiereza de zanjas de coronación	m	0.00	283.48	-	-	0.00	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Encaruzamiento de pequeños cursos de agua	u	2.11.09	7.16	1,726.20	-	0.00	0.00%	20.09	143.85	20.09	143.85	221.00	1,562.35	91.67%
1.2.6	CONFER DE VEGETACION	m	664.44	0.36	239.20	-	0.00	0.00%	55.37	19.93	55.37	19.93	609.07	219.27	91.67%
1.3.1	Roca y Limpiereza	m²	29.00	30.06	871.74	-	0.00	0.00%	2.42	72.85	2.42	72.85	26.58	795.10	91.67%
1.4.1	Conservación de Señales	u	165.00	1.41	232.65	-	0.00	0.00%	13.75	19.39	13.75	19.39	151.25	213.26	91.67%
1.5.1	Reforestación	km	169.00	8.70	1,470.30	-	0.00	0.00%	14.08	122.53	14.08	122.53	154.92	1,347.78	91.67%
1.6.1	Vigilancia y Control	m²	0.00	117.44	-	-	0.00	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1	Reparación de Muros secos	m³	0.00	840.55	-	-	0.00	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2	Reparación de Pontones	u	0.00	-	-	-	0.00	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIRECTO S/.						122,180.22	0.00	0.00%	10,161.69	10,161.69	10,161.69	111,988.53	111,988.53	91.67%	
GASTOS GENERALES						12,218.02	0.00	0.00%	1,018.17	1,018.17	1,018.17	11,199.85	11,199.85	91.67%	
UTILIDAD						6,109.01	0.00	0.00%	509.08	509.08	509.08	5,599.93	5,599.93	91.67%	
PARCIAL						140,507.25	0.00	0.00%	11,708.94	11,708.94	11,708.94	128,796.31	128,796.31	91.67%	
IGV						25,291.31	0.00	0.00%	2,107.61	2,107.61	2,107.61	23,183.70	23,183.70	91.67%	
TOTAL S/.						165,798.56	0.00	0.00%	13,816.55	13,816.55	13,816.55	151,982.01	151,982.01	91.67%	
% DE AVANCE						0.00%	0.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	91.67%	91.67%	91.67%	



CONSORCIO SANTA ROSA
 Ing. Carlos Enrique Bazaín Osorio
 CIP N° 7,4275
 PRESIDENTE COMUN
 Página 1

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
 Consejo Departamental Arequipa - Huánuco
 MATEO VÁSQUEZ VELÁSQUEZ
 INGENIERO CIVIL
 B.S.G. CIP 99468

MANTENIMIENTO RUTINARIO

PROYECTO: "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP - LI 122(QUIQUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: DPTO: LA LIBERTAD PROV: SANTIAGO DE CHUCO DIST: SANTIAGO DE CHUCO LOC: EL MOLLE - CALLAYGUIDO

Largitud 13.00
ANCHO

Item	Descripción	Unidad	N° ELEMENTOS	DIMENSIONES			AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL
				LARGO	ANCHO	ALTO				
1.0	MANTENIMIENTO RUTINARIO									
1.1	OBRAS PRELIMINARES									
1.1.1	Limpieza de Calzada	km	1.00	13.00				1.08	1.08	
1.1.2	Bacheo camino tipo I	m ²	1.00			1,448.42		120.70	120.70	
1.1.2	Bacheo camino tipo II	m ²	1.00			911.57		75.96	75.96	
1.1.2	Bacheo camino tipo III	m ²	1.00			0.00	383.00	0.00	0.00	
1.1.3	Desquinche	m ³	1.00				5.40	31.92	31.92	
1.1.4	Remoción de derrumbes	m ³	1.00					0.45	0.45	
1.1.5	Perfilado de la superficie sin aporte de material	m ²	1.00			7,200.72		600.06	600.06	
1.2	PAVIMENTOS									
1.2.1	Limpieza de Cunetas	m	1.00	13,000.00				1,083.33	1,083.33	
	PROGRESIVA 0+000 A 13+000									
1.2.2	Limpieza de Alcantarilla	und	7.00					0.58	0.58	
1.2.3	Limpieza de badén	m ²	0.00					0.00	0.00	
1.2.4	Limpieza de zanjas de coronación	m	0.00					0.00	0.00	
1.2.5	Limpieza de pontones	u	0.00					0.00	0.00	
1.2.6	Encauzamiento de pequeños cursos de agua	m	1.00	241.09				20.09	20.09	
1.3	CONTROL DE VEGETACION									
1.3.1	Roca y Limpieza	m ²	1.00				664.44	55.37	55.37	
1.4	SEGURIDAD VIAL									
1.4.1	Conservación de señales	u	29.00					2.42	2.42	
1.5	MEDIO AMBIENTE									
1.5.1	Reforestación	u	165.00					13.75	13.75	
1.6	VIGILANCIA Y CONTROL									
1.6.1	Vigilancia y Control	km	1.00	169.00				14.08	14.08	
1.7	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA									
1.7.1	Reparación de muros secos	m ³	0.00					0.00	0.00	
1.7.2	Reparación de pontones	u	0.00					0.00	0.00	

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Consejo Departamental Arecañi - Huacay
Matco Velásquez Velásquez
INGENIERO CIVIL
REG. CIP 99468

CONSORCIO SANTA ROSA
Nancy Nicodemos Salazar
DNI: 44797900
REPRESENTANTE COMUN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO
Ing. César Enrique Jazan Cáceres
CIP 171578
INSPECTOR DE OBRAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO

PROYECTO: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES. TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP -LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD
 PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 UBICACIÓN: DPTO: LA LIBERTAD PROV: SANTIAGO DE CHUCO DIST: SANTIAGO DE CHUCO LOC: EL MOLLE - CALLAYGUIDO
 Longitud (Km) 13.00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Parcial	Sub Total
1.0	MANTENIMIENTO RUTINARIO					122,180.23
1.1	CONSERVACION DE CALZADA					100,797.65
1.1.1	Limpieza de calzada	km	13.00	715.47	9,301.11	
1.1.2	Bacheo camino tipo I	m ²	1,448.42	22.96	33,255.68	
1.1.3	Bacheo camino tipo II	m ²	911.57	22.96	20,929.65	
1.1.4	Bacheo camino tipo III	m ²	0.00	22.96	0.00	
1.1.5	Desquinche	m ³	383.00	56.70	21,716.10	
1.1.6	Remoción de derrumbes	m ³	5.40	47.70	257.58	
1.1.7	Perfilado de la superficies sin aporte de material	m ²	7,200.72	2.13	15,337.53	
1.2	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE					18,568.68
1.2.1	Limpieza de cunetas	m	13,000.00	1.18	15,340.00	
1.2.2	Limpieza de alcantarilla	u	7.00	214.64	1,502.48	
1.2.3	Limpieza de baden	m ²	0.00	14.18	0.00	
1.2.4	Limpieza de zanjas de coronación	m	0.00	1.18	0.00	
1.2.5	Limpieza de pontones	u	0.00	283.48	0.00	
1.2.6	Encauzamiento de pequeños cursos de agua	m	241.09	7.16	1,726.20	
1.3	CONTROL DE VEGETACION					239.20
1.3.1	Roce y limpieza	m ²	664.44	0.36	239.20	
1.4	SEGURIDAD VIAL					871.74
1.4.1	Conservación de señales	u	29.00	30.06	871.74	
1.5	MEDIO AMBIENTE					232.65
1.5.1	Reforestación	u	165.00	1.41	232.65	
1.6	VIGILANCIA Y CONTROL					1,470.30
1.6.1	Vigilancia y control	km	169.00	8.70	1,470.30	
1.7	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA					0.00
1.7.1	Reparación de muros secos	m ³	0.00	117.44	0.00	
1.7.2	Reparación de pontones	u	0.00	860.55	0.00	

Costo Directo		122,180.22
Gastos Generales	10.00%	12,218.02
Utilidad	5.00%	6,109.01
Parcial		140,507.25
I.G.V.	18.00%	25,291.31
TOTAL :		165,798.56

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 56/100 SOLES

CONSORCIO SANTA ROSA
 Nancy Nicodemos Salazar
 DNI: 44737900
 REPRESENTANTE COMUN

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
 Consejo Departamental Ancash - Huaraz
 Marco Velasquez Velasquez
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP 99469

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
 DE SANTIAGO DE CHUCO
 Ing. Guimer Enriquez Inzunza Cisneros
 CIP N° 14378
 INSPECTOR DE OBRA

MANTENIMIENTO RUTINARIO

PROYECTO: "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP - LJ 122(QUIGUR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
UBICACIÓN: DPTO: LA LIBERTAD PROV: SANTIAGO DE CHUCO LOC: EL MOLLE - CALLAYGUIDO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	MES Nº01	
				PROGRAMADO	EJECUTADO
				31 DIAS	
1.0	MANTENIMIENTO RUTINARIO				
1.1	CONSERVACION DE CALZADA				
1.1.1	Limpieza de calzada	km	1.08	775.09	775.09
1.1.2	Bacheo camino tipo I	m ²	120.70	2,771.31	2,771.31
1.1.2	Bacheo camino tipo II	m ²	75.96	1,744.14	1,744.14
1.1.2	Bacheo camino tipo III	m ²	0.00	0.00	0.00
1.1.3	Desquinche	m ²	31.92	1,809.68	1,809.68
1.1.4	Remoción de derrumbes	m ³	0.45	21.47	21.47
1.1.5	Perfilado de la superficies sin aporte de material	m ²	600.06	1,278.13	1,278.13
1.2	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE				
1.2.1	Limpieza de cunetas	m	1,083.33	1,278.33	1,278.33
1.2.2	Limpieza de alcantarilla	u	0.58	125.21	125.21
1.2.3	Limpieza de badén	m ²	0.00	0.00	0.00
1.2.4	Limpieza de zanjas de coronación	m	0.00	0.00	0.00
1.2.5	Limpieza de pontones	u	0.00	0.00	0.00
1.2.6	Encauzamiento de pequeños cursos de agua	m	20.09	143.85	143.85
1.3	CONTROL DE VEGETACION				
1.3.1	Roce y limpieza	m ²	55.37	19.93	19.93
1.4	SEGURIDAD VIAL				
1.4.1	Conservación de señales	u	2.42	72.65	72.65
1.5	MEDIO AMBIENTE				
1.5.1	Reforestación	u	13.75	19.39	19.39
1.6	VIGILANCIA Y CONTROL				
1.6.1	Vigilancia y control	km	14.08	122.53	122.53
1.7	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA				
1.7.1	Reparación de muros secos	m ³	0.00	0.00	0.00
1.7.2	Reparación de pontones	u	0.00	0.00	0.00
Costo Directo				10,181.69	10,181.69
Gastos Generales			10.00%	1,018.17	1,018.17
Utilidad			5.00%	509.08	509.08
Parcial				11,708.94	11,708.94
I.G.V.			18.00%	2,107.61	2,107.61
TOTAL :				13,816.55	13,816.55
Porcentaje de avance por Mes				8.33%	8.33%
Porcentaje de avance acumulado				8.33%	8.33%



CONSORCIO SANTA ROSA
Nancy Nicodemos Salazar
DNI: 44797300
REPRESENTANTE COMUN





CRONOGRAMA VALORIZADO VS EJECUTADO


CONSORCIO SANTA ROSA

Nancy Nicodemos Salazar
DNI: 44797900
REPRESENTANTE COMUN


 **COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ**
Consejo Departamental Ancash - Huáraz

Marco Velasquez Velasquez
INGENIERO CIVIL
REG. CIP 99468

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP.LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD

CRONOGRAMA VALORIZADO VS EJECUTADO

PROYECTO : *SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECONIALES, TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUDA BAJA - EMP -
 LI (Z/QUIGURI) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD
 PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 UBICACION : DPTO. LA LIBERTAD PROV. SANTIAGO DE CHUCO DIST. SANTIAGO DE CHUCO LOC. EL MOLLE - CALLAYGUDA

Item	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio	Parcial	Mes 1		Mes 2		Mes 3		EJECUTADO ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR			
						Dic 07/07/2021		Ene 08/08/2021		Feb 09/09/2021		Dic 07/07/2021		Ene 08/08/2021		Feb 09/09/2021	
						METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%
1	MANTENIMIENTO RUTINARIO																
1.1	CONSERVACIÓN DE CALZADA	km	13.00	715.47	9,301.11	1.08	8.33%	1.08	8.33%	1.08	8.33%	1.08	8.33%	11.92	8,526.02	91.67%	
1.1.1	LIMPIEZA DE CALZADA	m²	1,448.42	22.96	33,255.68	120.70	8.33%	120.70	8.33%	120.70	8.33%	120.70	8.33%	1,327.72	30,484.37	91.67%	
1.1.2	BACHEO CAMINO TIPO I	m²	911.57	22.96	20,929.65	75.96	8.33%	75.96	8.33%	75.96	8.33%	75.96	8.33%	835.61	19,185.51	91.67%	
1.1.3	BACHEO CAMINO TIPO II	m²	0.00	22.96													
1.1.4	BACHEO CAMINO TIPO III	m²	363.00	56.70	21,716.10	31.92	8.33%	31.92	8.33%	31.92	8.33%	31.92	8.33%	351.08	19,908.43	91.67%	
1.1.5	DESQUINCHE	m²	5.40	47.70	257.58	0.45	8.33%	0.45	8.33%	0.45	8.33%	0.45	8.33%	4.95	236.12	91.67%	
1.1.6	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m²	7,200.72	2.13	15,337.53	600.06	8.33%	600.06	8.33%	600.06	8.33%	600.06	8.33%	6,800.66	14,059.41	91.67%	
1.1.7	PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORE DE MATERIAL	m²															
1.2	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE	m	13,000.00	1.18	15,340.00	1,083.33	8.33%	1,083.33	8.33%	1,083.33	8.33%	1,083.33	8.33%	11,916.87	14,061.87	91.67%	
1.2.1	LIMPIEZA DE CUNETAS	u	7.00	214.64	1,502.48	0.58	8.33%	0.58	8.33%	0.58	8.33%	0.58	8.33%	6.42	1,377.27	91.67%	
1.2.2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLA	m²	0.00	14.18													
1.2.3	LIMPIEZA DE BADEN	m	0.00	1.18													
1.2.4	LIMPIEZA DE ZANUJAS DE CORONACIÓN	u	0.00	283.48													
1.2.5	LIMPIEZA DE PONTONES	m	241.09	7.16	1,726.20	20.09	8.33%	20.09	8.33%	20.09	8.33%	20.09	8.33%	221.00	1,582.35	91.67%	
1.2.6	ENCAUZAMIENTO DE PEQUEÑOS CURSOS DE AGUA	m															
1.3	CONTROL DE VEGETACIÓN	m²	664.44	0.36	239.20	55.37	8.33%	55.37	8.33%	55.37	8.33%	55.37	8.33%	609.07	219.27	91.67%	
1.3.1	ROCE Y LIMPIEZA	u	29.00	30.06	871.74	2.42	8.33%	2.42	8.33%	2.42	8.33%	2.42	8.33%	26.58	798.10	91.67%	
1.4	SEGURIDAD VIAL	u	165.00	1.41	232.65	13.75	8.33%	13.75	8.33%	13.75	8.33%	13.75	8.33%	151.25	213.26	91.67%	
1.4.1	CONSERVACIÓN DE SEÑALES	Km	169.00	8.70	1,470.30	14.08	8.33%	14.08	8.33%	14.08	8.33%	14.08	8.33%	154.92	1,347.78	91.67%	
1.5	MEDIO AMBIENTE	m²	0.00	117.44													
1.5.1	REFORESTACIÓN	u	0.00	860.55													
1.6	VIGILANCIA Y CONTROL	m²	0.00														
1.6.1	VIGILANCIA Y CONTROL	u	0.00														
1.7	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA	u	0.00														
1.7.1	REPARACIÓN DE MUROS SECOS	m²	122,180.22														
1.7.2	REPARACIÓN DE PONTONES	u	12,218.02														
	Costo directo:		10,181.69														
	Cableo Generales (10.00%)		1,018.17														
	Utilidad (5.00%)		509.08														
	Parcial		11,708.94														
	I.G.V. (18.00%)		2,107.61														
	TOTAL		13,816.55														
	Porcentaje de avance por Mes		8.33%														
	Porcentaje de avance acumulado		8.33%														


CONSORCIO SANTA ROSA
 Nancy Nicodemos Salazar
 DNI 44747900
 REPRESENTANTE COMUN


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 Ing. Giner Enrique Bazañ Osorio
 CIP N° 74375
 INSPECTOR DE OBRA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCÚ
Ing. Güler Enrique Bazán Cisneros
C.P. N° 14375
INSPECTOR DE OBRA

CONTROL DE AVANCE DE EJECUCIÓN

CONSORCIO SANTA ROSA

Nancy Nicodemos Salazar
Nancy Nicodemos Salazar
DNI: 44797800
REPRESENTANTE COMÚN



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Consejo Departamental Ancash - Huaraz

Marco Velasquez Velasquez
Marco Velasquez Velasquez
INGENIERO CIVIL
REG. CIP 99468


SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: “EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP.LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD

CONTROL DE AVANCE DE EJECUCION

"SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP -LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"



ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

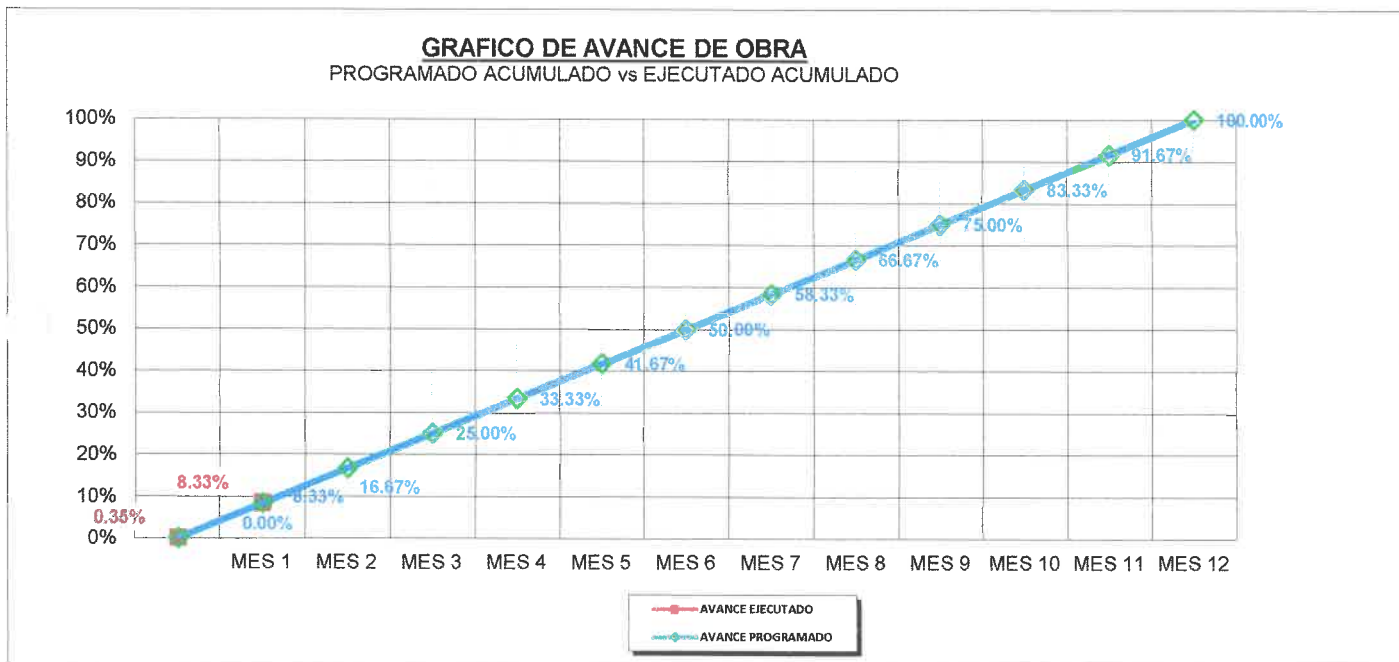
PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO: 365 DIAS CALENDARIO



AVANCE PROGRAMADO					
N° de MES	MES	MONTOS TOTAL (Incl. IGV)		PORCENTAJES	
		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
		S/	S/	%	%
MES 1	ENERO	13,816.55	13,816.55	8.33%	8.33%
MES 2	FEBRERO	13,816.55	27,633.10	8.33%	16.67%
MES 3	MARZO	13,816.55	41,449.66	8.33%	25.00%
MES 4	ABRIL	13,816.55	55,266.21	8.33%	33.33%
MES 5	MAYO	13,816.55	69,082.76	8.33%	41.67%
MES 6	JUNIO	13,816.55	82,899.31	8.33%	50.00%
MES 7	JULIO	13,816.55	96,715.86	8.33%	58.33%
MES 8	AGOSTO	13,816.55	110,532.41	8.33%	66.67%
MES 9	SETIEMBRE	13,816.55	124,348.97	8.33%	75.00%
MES 10	OCTUBRE	13,816.55	138,165.52	8.33%	83.33%
MES 11	NOVIEMBRE	13,816.55	151,982.07	8.33%	91.67%
MES 12	DICIEMBRE	13,816.55	165,798.62	8.33%	100.00%
TOTAL		165,798.62		100.00%	

AVANCE EJECUTADO					
N° de MES	MES	MONTOS TOTAL (Incl. IGV)		PORCENTAJES	
		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
		S/	S/	%	%
MES 1	ENERO	13,816.55	13,816.55	8.33%	8.33%
MES 2	FEBRERO				0.00%
MES 3	MARZO				
MES 4	ABRIL				
MES 5	MAYO				
MES 6	JUNIO				
MES 7	JULIO				
MES 8	AGOSTO				
MES 9	SETIEMBRE				
MES 10	OCTUBRE				
MES 11	NOVIEMBRE				
MES 12	DICIEMBRE				
TOTAL		13,816.54		8.33%	


 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
 Consejo Departamental - Arequipa - Huaraz

Marco Velásquez Velásquez
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP 99468

CONSORCIO SANTA ROSA

Nancy Nicodemos Salazar
 DNI: 44797900
 REPRESENTANTE COMUN


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
 DE SANTIAGO DE CHUCO

Carlos Enrique Bazán Cisneros
 CIP 6174373
 INSPECTOR DE OBRA
